



DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
DE OBRAS CIVILES

JUNIO 2018.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**1.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA
CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 0+000 HASTA EST 2+900, PROV. SAN
CRISTOBAL. PRIMERA ETAPA.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	30 de marzo de 2016
Monto del contrato	RD\$71,572,063.58
Monto del avance (20%)	RD\$14,314,412.71
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	04 meses.
% Avance estimado hasta la fecha	76.18%
Contratista	Constructora PANROD, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, obras complementarias y misceláneos.

2.0 PROYECTO REPARACION CAUCE RIO, BERMA DEL SOCAZ CH ANGOSTURA, PROV. SANTIAGO, ETAPA II.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	21 de julio de 2016
Monto del contrato	RD\$49,575,006.28
Monto del avance (20%)	RD\$8,190,135.25
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	45 Días.
% Avance estimado hasta la fecha	97.90%
Contratista	CONSTRUCTORA METROSTAR, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, hormigón armado 350kg/cm², aceros y perforaciones, drenaje, obras complementarias y misceláneos.

3.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN EN BAIGUAQUE, CON ALCANTARILLA DE 42", CH BAIGUAQUE, SANTIAGO, SEGUNDA ETAPA.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	05 de Octubre de 2016
Monto del contrato	RD\$18,103,655.36
Monto del avance (20%)	RD\$3,620,731.07
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	04 Meses.
% Avance estimado hasta la fecha	80.66%
Contratista	Engeneering & Multiservices, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional de excavación, estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos.

**4.0 PROYECTO ASFALTADO CARRETERA DESDE CENTRAL
HIDROELECTRICA MONCION HASTA LA PRESA DE MONCION, PROVINCIA
SANTIAGO RODRIGUEZ, PRIMERA ETAPA, TRAMO I (DESDE CENTRAL
HIDROELECTRICA MONCION HASTA CRUCE CARRETERA SAN JOSE DE LAS
MATAS (BULLA)) Y TRAMO II (DESDE CENTRAL HIDROELECTRICA
MONCION HASTA EL CONTRAEMBALSE).**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	27 de Diciembre de 2016
Monto del contrato	RD\$76,102,510.63
Monto del avance (20%)	RD\$12,604,221.88
Fecha de inicio de los trabajos	02 de marzo de 2017
Fecha de Fin del contrato	07 Meses.
% Avance estimado hasta la fecha	96.16%
Contratista	RDC Soluciones de Ingeniería, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Hormigón asfáltico mezclado en planta con espesor de 2", trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias, misceláneos y limpieza final.

**5.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA
CRUCE LOS MINEROS, DESDE EST. 2+900 HASTA EST. 5+800, SEGUNDA
ETAPA, LOS CACAOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R. D.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de Marzo de 2017
Monto del contrato	RD\$47,549,938.43
Monto del avance (20%)	RD\$9,509,987.68
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	04 meses.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	Sociedad Roa y Carmona & Asociados, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos generales, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional de material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, drenaje, obras complementarias, señalización horizontal y vertical y misceláneos.

6.0 PROYECTO ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE LOS CACAOS A PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL, TERCERA ETAPA.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	26 de Noviembre de 2017
Monto del contrato	RD\$63,096,903.46
Monto del avance (20%)	RD\$12,619,380.69
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	01 mes.
% Avance estimado hasta la fecha	80.96%
Contratista	Malespín Constructora, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, base y sub-base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias y limpieza final.

**7.0 PROYECTO CONSTRUCCION LOSA DE HORMIGON Y RAMPA EN
ENTRADA, MURO CONTENCION M1 EN CANAL, M2, M3, M4, M5 Y M6 EN
VERJA PERIMETRAL, C.H. NIZAO-NAJAYO, PROV. SAN CRISTOBAL.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	1 de Agosto de 2017
Monto del contrato	RD\$7,931,403.32
Monto del avance (20%)	RD\$1,586,280.66
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	03 meses.
% Avance estimado hasta la fecha	67.21%
Contratista	Constructora Trent, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, capa de rodadura, hormigón armado 350 kg/cm², muro de blocks, hormigón armado 210 kg/cm², estructuras y puentes, obras complementarias, canaletas en C.H., construcción de pozo de achique y limpieza final.

**8.0 PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EST. 14+680,
CONSTRUCCION COLUMNA, VIGA Y LOSA EN EST. 15+400, TRAMO
ACCESO A LA PRESA PALOMINO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	29 de Agosto de 2017
Monto del contrato	RD\$14,600,866.79
Monto del avance (20%)	RD\$2,920,173.35
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	03 Meses.
% Avance estimado hasta la fecha	42.03%
Contratista	Ing. Claudia Luciano Ramirez

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, pernos de acero en columna y zapata de muro, relleno, drenaje, obras complementarias y misceláneos.

9.0 PROYECTO ASFALTADO DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	04 de Septiembre de 2017
Monto del contrato	RD\$28,208,391.81
Monto del avance (20%)	RD\$5,641,678.36
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	30 días.
% Avance estimado hasta la fecha	85.00%
Contratista	Desarrollo Vial, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Elaboración, colocación, transporte, manejo de AC-30, aplicación y riego de adherencia.

**10.0 PROYECTO ASFALTADO ENTRADA PRINCIPAL C.H. RIO BLANCO,
BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	06 de Octubre de 2017
Monto del contrato	RD\$49,643,180.11
Monto del avance (20%)	RD\$RD\$9,928,636.00
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	días.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	Rodson Realty, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos generales, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional de material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, drenaje, obras complementarias, señalización horizontal y vertical y misceláneos.

**11.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CH PINALITO HASTA CHIMENEA DE
EQUILIBRIO, BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, TRAMO FALTANTE
EN HORMIGÓN, SEGUNDA ETAPA**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	04 de Septiembre de 2017
Monto del contrato	RD\$72,026,257.95
Monto del avance (20%)	RD\$14,405,251.59
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	días.
% Avance estimado hasta la fecha	24.61%
Contratista	GRUPO ALVESSA, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, base y sub-base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias y limpieza final.

**12.0 REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS DE LA CARRETERA BOCA DE
BLANCO, LA CIÉNEGA Y EL RODEO, C.H. PINALITO, PROVINCIA
MONSEÑOR NOUEL**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	04 de Septiembre de 2017
Monto del contrato	RD\$52, 486,428.73
Monto del avance (20%)	RD\$10,497,285.74
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	264 días.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	CONSTRUCTORA IROC, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, obras complementarias y misceláneos.

13.0 CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES Y RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA CAMBITA-PUEBLECITO, CH AGUACATE, SAN CRISTÓBAL, R.D.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	08 de Diciembre de 2017
Monto del contrato	RD\$43,266,399.92
Monto del avance (20%)	RD\$8,653,279.98
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	120 días.
% Avance estimado hasta la fecha	41.34%
Contratista	SOCOMATRA, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias, señalización horizontal y limpieza final y bote.

**14.0 CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE ARTE PARA LA CARRETERA PRESA
JIGÜEY-PALO DE CAJA-RODADERO, SAN JOSE DE OCOA, (TRAMO DE
IMPRIMACIÓN), SEGUNDA ETAPA**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de Diciembre de 2017
Monto del contrato	RD\$65,321,559.46
Monto del avance (20%)	RD\$13,064,311.89
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	07 Meses.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos.

**15.0 REHABILITACION DEL CAMINO ADYACENTE A LA PRESA DE JIGUEY
DESDE EL POBLADO DE CRUZ DE SANTA ANA HASTA LA COMUNIDAD DE
TATON (TRAMO DE HORMIGON)**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	08 de Diciembre de 2017
Monto del contrato	RD\$64,512,202.40
Monto del avance (20%)	RD\$12,902,440.48
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	07 Meses.
% Avance estimado hasta la fecha	22.30%
Contratista	Santos Padilla & Asociados, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, drenaje, obras complementarias y misceláneos.



**16.0 CONSTRUCCION TRAMO PUENTE CANAL (FLUMEN) ANIANA VARGAS,
CENTRAL HIDROELECTRICA ANIANA VARGAS, PROVINCIA MONSEÑOR
NOUEL, REPUBLICA DOMINICANA.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	15 de Enero de 2018
Monto del contrato	RD\$23,607,855.49
Monto del avance (20%)	RD\$4,721,571.09
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	89 Días.
% Avance estimado hasta la fecha	26.89%
Contratista	Grupo Alvessa, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, obras complementarias y misceláneos.

**17.0 CONSTRUCCION MURO DE PROTECCION EN MAMPOSTERIA,
MARGEN IZQUIERDO DEL RIO YUNA, DIQUE PROYECTO AGLIPO EN LA
SECCION DE ARENOSO, PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORIS
(BARRIO LOS ESTUDIANTES DESDE EST. 0+720 HASTA EST. 2+420),
REPUBLICA DOMINICANA.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Enero de 2018
Monto del contrato	RD\$40,465,576.76
Monto del avance (20%)	RD\$8,093,115.35
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	08 Meses.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	Radek de Moya Proyectos, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, obras complementarias y misceláneos.

**18.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE LA PRESA DE BAIGUAQUE,
PROVINCIA SANTIAGO, R.D.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	02 de Mayo de 2018
Monto del contrato	RD\$46,150,355.14
Monto del avance (20%)	RD\$9,230,071.02
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	06 Meses.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	DESARROLLO VIAL, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, drenaje, obras complementarias, señalización horizontal y vertical y misceláneos.

19.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE BAIGUAQUE, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	01 de Mayo de 2018
Monto del contrato	RD\$65,668,879.56
Monto del avance (20%)	RD\$13,133,775.91
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	04 Meses.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	DOITECA, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, drenaje, obras complementarias, señalización horizontal y vertical y misceláneos.



20.0 PROYECTO REHABILITACIÓN DE 23 CASSETAS DE COMUNICACIÓN EN DIFERENTES CENTRALES DE EGEHID.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	12 de Octubre de 2017
Monto del contrato	RD\$ 3,729,475.26
Monto del avance (20%)	RD\$ 745,895.05
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	días.
% Avance estimado hasta la fecha	42.64%
Contratista	SOCOMATRA, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, impermeabilizante y limpieza final.

21.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN MEZZANINE EN EL ALMACÉN QUITA SUEÑO, SAN CRISTÓBAL, R.D.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	08 de Diciembre de 2017
Monto del contrato	RD\$688,403.39
Monto del avance (20%)	RD\$133,680.67
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	35 días.
% Avance estimado hasta la fecha	100.00%
Contratista	ING. MIRIAN CASTILLO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, hormigón armado en, estructura metálica, terminaciones, pintura y misceláneos.

22.0 PROYECTO REMODELACIÓN PARROQUIA SANTA CRUZ, YAGUATE, SAN CRISTÓBAL, R.D.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	22 de Diciembre de 2017
Monto del contrato	RD\$5,077,958.18
Monto del avance (20%)	RD\$1,015,591.63
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	13 Semanas.
% Avance estimado hasta la fecha	69.88%
Contratista	MIARJO, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos generales, área de templo, capilla del Santísimo, salón de monjas, áreas relativas a la Parroquia, misceláneos y pintura.

**23.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN TECHO EN ÁREA DE ENFRIADOR
AUXILIAR EN LA CASA DE MAQUINA, C.H. PINALITO, R.D.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	15 de Mayo de 2018
Monto del contrato	RD\$1,236,944.17
Monto del avance (20%)	RD\$247,388.83
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	04 Semanas.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	SOUCHAL MULTI SERVICE, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos generales, andamios, suministro de perfil, suministro de canales, suministro de angulares.

24.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR, C.H.
PINALITO, R.D.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	24 de Mayo de 2018
Monto del contrato	RD\$1,699,748.76
Monto del avance (20%)	RD\$339,949.75
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	03 Semanas.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	SOUCHAL MULTI SERVICE, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos generales, movimiento de tierra, hormigón armado en, muros de bloques, terminación de superficie, terminación de piso, puertas y ventanas, pintura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y misceláneos.

25.0 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GARITA MILITAR EN LA C.H. AGUACATE.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprendió las partidas siguientes:

- Platea, muros de bloques, pañete, pintura, puerta, ventanas, inodoro, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.



26.0 PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN LA C. H. SABANA YEGUA.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	2 de Agosto de 2017
Monto del contrato	RD\$7,599,012.95
Monto del avance (20%)	RD\$1,519,802.59
Fecha de inicio de los trabajos	11/10/2017
Fecha de Fin del contrato	60 Días.
% Avance estimado hasta la fecha	36.20%
Contratista	Ing. Livio Mercedes Castillo

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, obras complementarias y misceláneos.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**27.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO COMBINADO DE GAVIONES Y
HORMIGÓN CICLÓPEO EN CANAL BOCA, CH ROSA JULIA DE LA CRUZ,
NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, R.D.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	09 de Febrero de 2018
Monto del contrato	RD\$ 3,319,690.24
Monto del avance (20%)	RD\$ 663,938.04
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	90 Días.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	Ing. Héctor Uribe Domínguez

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, hormigón ciclópeo, muros de gaviones y misceláneos.

**28.0 PROYECTO LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DEL CANAL HERNAN
CORTES, COMUNIDAD EL BARRO, CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS,
PROVINCIA DE AZUA, R.D.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	11 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,606,837.51
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,521,367.50
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	04 Meses.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	GRUPO BARBELL, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional material de excavación, estructuras y puentes, suministro y colocación de compuertas con mecanismo de elevación y misceláneos.

29.0 INFORME SOBRE LA INSTRUMENTACION DE LA PRESA DE YACAHUEQUE.

ANTECEDENTES

La presa de Yacahueque inicio el proceso de instalación de los instrumentos de control el día 5 de junio del 2018. Ya la Dirección de Proyectos Hidroeléctricos había solicitado la presencia de los ingenieros de instrumentación de presas.

Previo a los trabajos de instalación, los ingenieros de la EGEHID y los del contratista se reunieron y se mostraron los instrumentos que habían llegado al sitio y se le solicito al Contratista una programación de colocación de instrumentos. La instalación estaba prevista para iniciarse en la primera semana de junio y realmente inicio en la segunda semana.

TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO

Desde el día 14 de junio hasta el día 17 de junio, se produce el proceso completo de perforación e instalación del Piezómetro Casagrande #1 PCG-1.

1. Reuniones de coordinación
2. Programación de instalación
3. Prueba de funcionamiento de los instrumentos
4. Instalación de instrumentos.

30.0 ALQUILER EQUIPOS PESADOS.

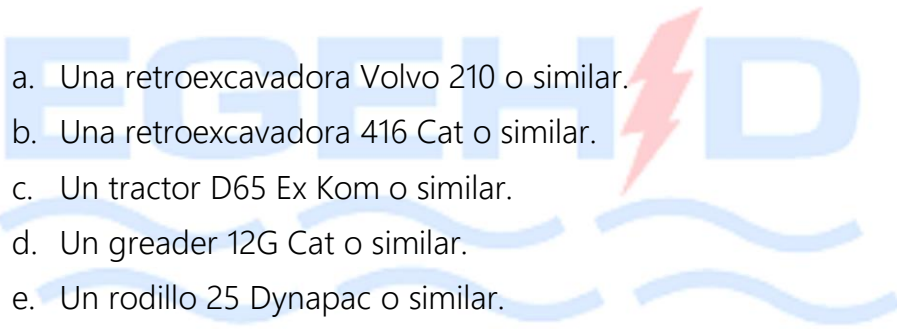
DESCRIPCION

Tenemos los siguientes contratos de alquiler de equipos en vigencia:

- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de Limpieza del Embalse de la Presa Aguacate, el cual consta de:
 - 01 tractor Cat D8 o similar.
 - 01 retroexcavadora Cat 320 o similar.
 - 01 pala 950 Cat o similar.
- Alquiler de equipos pesados para la construcción muro de protección en tierra, margen izquierda del Rio Yuna, Dique Proyecto Aglipo, en la Sección Arenoso, Prov. San Francisco de Macorís (Barrio Los Estudiantes desde Est. 0+000 hasta Est. 0+720), el cual consta de:
 - a. Dos tractores D8K Cat o similar.
 - b. Dos retroexcavadoras 320 Cat o similar.
 - c. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - e. Un greader 12G Cat o similar.
 - f. Un camión de agua.
- Alquiler de equipos pesados para la Reconstrucción Tramo de Tierra en diferentes puntos de las Comunidades La Guama, Los Platanitos, La Ralla, Las Coles y La Garza,

Agua Abajo del Dique Proyecto Aglipo, Sección Arenoso, Prov. San Francisco de Macorís, el cual consta de:

- a. Dos retroexcavadoras 320 Cat o similar.
 - b. Dos retroexcavadoras 416 Cat o similar.
 - c. Dos tractores D8K Cat o similar.
 - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - e. Tres palas 950 Cat o similar.
- Alquiler de equipos pesados para los trabajos de mantenimiento del Camino El Baden-Monteada Nueva-Melitón-Vallejuelo-Los Naranjos, C.H. Jigüey, Prov. San Cristóbal, el cual consta de:

- 
- a. Una retroexcavadora Volvo 210 o similar.
 - b. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - c. Un tractor D65 Ex Kom o similar.
 - d. Un greader 12G Cat o similar.
 - e. Un rodillo 25 Dynapac o similar.
 - f. Un camión cisterna.

- Alquiler de equipos pesados para los trabajos de colocación, transporte y suministro de material de base en los caminos vecinales de las comunidades EL Recodo, La Gina y Parajes Aledaños, Bani.
- Alquiler de equipos pesados para los trabajos de rehabilitación de los tramos de la Carretera La Ceiba, Los Capaces, Comunidad de Blanco, C.H. Pinalito.

- Alquiler de equipos pesados para el mantenimiento del Camino La Sabana, El Quemao, La Florida, C.H. Palomino.
- Suministro y transporte de grava para ser usado en la imprimación de los caminos para ser asfaltados por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones en La Seiba, El Caobal, Callejones Moja casabe, Camino Los Leones, Ingenio Nuevo, Hoyo del Barro, Niza, Montaña, Villegas, La Rosa y Cambita.
- Suministro y transporte de material de base procesado para la rehabilitación de las calles de Doña Chucha en Madre Vieja Norte, Cañada Honda, Lavapiés, Calles del Barrio Don Félix, Canastica y la Calle Prolongación Salcedo en El Fondo.

Nota: Los contratos de alquiler de equipos estipula que el combustible corre por la compañía contratada.

