

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOEL.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo
1	REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO	428 días	lun 8/11/21	mié 26/4/23																				
2	Partidas Generales:	132 días	lun 8/11/21	mié 27/4/22																				
3	Replanteo	1 día	lun 8/11/21	lun 8/11/21																				
4	Caseta de Materiales	3 días	lun 25/4/22	mié 27/4/22																				
5	Letrero en Obra (Señales Informativa 48" x 96")	1 día	lun 14/2/22	lun 14/2/22																				
6	Impermeabilizacion de techo	99 días	sáb 12/2/22	jue 9/6/22																				
7	Preparación de Superficie, incluye retiro y bote de lona vieja	2 días	sáb 12/2/22	lun 14/2/22																				
8	Suministro y colocación de Impermeabilizante elastomérico con tela de refuerzo	4 días	lun 6/6/22	jue 9/6/22																				
9	Remoción	56 días	mar 8/2/22	vie 15/4/22																				
10	Remoción de pañete en techo	3 días	lun 14/2/22	mié 16/2/22																				
11	Remoción de cerámica en pared de baños	3 días	mié 13/4/22	vie 15/4/22																				
12	Remoción de cerámica en piso de baños	2 días	mar 8/2/22	mié 9/2/22																				
13	Bote de material de remoción a mano	6 días	vie 11/2/22	jue 17/2/22																				
14	Suministro y Colocacion de:	290 días	mar 15/3/22	vie 24/2/23																				
15	Pañete en techo	4 días	mar 15/3/22	vie 18/3/22																				
16	Cerámica en pared de baños (20x20)cm, h=1.80m	5 días	lun 13/2/23	vie 17/2/23																				
17	Cerámica en piso de baños (30x30)cm	3 días	lun 20/2/23	mié 22/2/23																				
18	Plafond pvc en baños	2 días	jue 23/2/23	vie 24/2/23																				
19	Instalaciones Sanitarias:	271 días	mié 13/4/22	vie 3/9/23																				
20	Desmontar Inodoro y Lavamanos	1 día	mié 13/4/22	mié 13/4/22																				
21	Inodoro mediano Blancos c/Tapa	2 días	lun 27/2/23	mar 28/2/23																				
22	Lavamanos pequeño Blanco Incluye Mezcladora	2 días	mié 1/3/23	jue 2/3/23																				
23	Accesorios de baños (papelera, jabonera, toallero, porta vaso)	1 día	vie 3/3/23	vie 3/3/23																				
24	Plomería general	5 días	lun 6/6/22	vie 10/6/22																				
25	Puertas y Ventanas:	311 días	lun 21/2/22	mié 1/3/23																				
26	Desmonte de puerta y ventanas existentes	1 día	lun 21/2/22	lun 21/2/22																				
27	Suministro y colocación de Puerta de polimetel, incluye llavín	5 días	lun 20/2/23	vie 24/2/23																				



Tarea

División

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

[illegible]

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviem	diciemb	enero	febre	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiem	octubre	noviem	diciemb	enero	febre	marzo	abril	mayo
54	Columnas C1(0.20X0.20)m, Acero 4Ø1/2" y 3/8" A 0.20M, altura =2.63m	3 días	mar 15/3/22	jue 17/3/22																				
55	Muros de Bloques	1 día	mar 22/3/22	mar 22/3/22																				
56	Bloques de 0.15 M, Ø3/8" A 0.80 M cámara Llena BNP, h= 0.40 m	1 día	mar 22/3/22	mar 22/3/22																				
57	Bloques de 0.15 M, Ø3/8" A 0.80 M cámara Llena SNP, altura=0.40m	1 día	mar 22/3/22	mar 22/3/22																				
58	Pañete	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22																				
59	Pañete muros y columnas	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22																				
60	Zabaleta doble	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22																				
61	Fraguache muros y columnas	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22																				
62	Cantos	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22																				
63	Verja en Malla Ciclonica	1 día	jue 24/3/22	jue 24/3/22																				
64	Malla Ciclonica de 6 pies (Suministro e Instalación)	1 día	jue 24/3/22	jue 24/3/22																				
65	Suministro y Colocación de Palometas Dobles	1 día	jue 24/3/22	jue 24/3/22																				
66	Pintura:	2 días	mié 1/6/22	jue 2/6/22																				
67	Pintura Acrilica en verja	2 días	mié 1/6/22	jue 2/6/22																				
68	Miscelaneos	7 días	lun 13/6/22	lun 20/6/22																				
69	Jardineria	5 días	lun 13/6/22	vie 17/6/22																				
70	Limpieza Final y Bote	2 días	sáb 18/6/22	lun 20/6/22																				
71	ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS	323 días	mar 8/2/22	jue 2/3/23																				
72	Fino de Techo	12 días	mar 8/2/22	lun 21/2/22																				
73	Remoción de fino de techo	4 días	mar 8/2/22	vie 11/2/22																				
74	Bote de material de remoción a mano	2 días	sáb 12/2/22	lun 14/2/22																				
75	Fino de Techo	1 día	lun 21/2/22	lun 21/2/22																				
76	Pisos	307 días	jue 10/2/22	vie 10/2/23																				
77	Remoción de piso de cerámica y zocalos existente salones	4 días	jue 10/2/22	lun 14/2/22																				
78	Bote de material de remoción piso a mano	3 días	sáb 12/2/22	mar 15/2/22																				



Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo
79	Suministro y colocacion de Pisos Porcelanato de 0.40 x 0.40m salones de alta calidad	7 días	lun 30/1/23	mar 7/2/23																				
80	Suministro y colocacion de zocalos de Porcelanato de 0.07mx 0.40m salones	3 días	mié 8/2/23	vie 10/2/23																				
81	Puertas y Ventanas:	71 días	lun 21/2/22	lun 16/5/22																				
82	Desmonte de puerta	1 día	mar 22/2/22	mar 22/2/22																				
83	Desmonte de Ventanas	1 día	lun 21/2/22	lun 21/2/22																				
84	Hueco en pared para colocacion de ventana, incluye Demolicion muro block y Dintel, bote material, pañete en dintel, mocheta y cantos.	17 días	mié 23/2/22	mar 15/3/22																				
85	Construccion de dintel en ampliacion de ventana de (0.15*0.20 x (3.9+ .2*2)), acero 4Ø3/8" y 3/8" a 0.20	2 días	mié 23/2/22	jue 24/2/22																				
86	Suministro y colocación de Puerta Principal en Caoba, incluye llavín de (1.45*2.10)m	2 días	sáb 14/5/22	lun 16/5/22																				
87	ABANICOS DE TECHO	101 días	mar 15/2/22	mar 14/6/22																				
88	Suministro y Colocacion de Abanicos de techo de buena calidad	2 días	lun 13/6/22	mar 14/6/22																				
89	Desmonte de Abanicos de techo existente	2 días	mar 15/2/22	mié 16/2/22																				
90	Construccion de Cuneta encachada	9 días	jue 24/2/22	sáb 5/3/22																				
91	Construccion de cunetas encachada	5 días	sáb 26/2/22	jue 3/3/22																				
92	Hormigón simple en fondo de cunetas e1 80 kg/cm2	3 días	jue 3/3/22	sáb 5/3/22																				
93	Excavacion de material inservible para cunetas	2 días	jue 24/2/22	vie 25/2/22																				
94	Bote de material producto de excavacion a mano	1 día	sáb 26/2/22	sáb 26/2/22																				
95	Reconstruccion Escalones Entrada	314 días	vie 18/2/22	jue 2/3/23																				
96	Remover ceramica existente	2 días	vie 18/2/22	sáb 19/2/22																				
97	Bote de material producto de remocion a mano	1 día	sáb 19/2/22	sáb 19/2/22																				
98	Colocación de Ceramica en exterior en escalones de (0.30X0.30)m	4 días	lun 27/2/23	jue 2/3/23																				
99	Miscelaneos	304 días	jue 24/2/22	jue 23/2/23																				
100	Fraguache techo hormigón	1 día	lun 14/3/22	lun 14/3/22																				



CENTRO COMUNAL	Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha limite
ARROYO TORO	División	Tarea inactiva	solo duracion	solo fin	Progreso
	Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
	Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo
101	Impermeabilizante en los muros interiores	6 días	vie 18/3/22	jue 24/3/22																				
102	Limpieza y desinfección de muros interior y exterior	5 días	jue 24/2/22	mar 1/3/22																				
103	Construcción de Hormigón en area parques con malla electrosoldada, 2.3 x 2.3 x 10 x10, e=0.15m, 210 Kg/cm2	4 días	lun 20/2/23	jue 23/2/23																				
104	Excavacion de material inservible para parqueo y encache	3 días	mié 15/2/23	vie 17/2/23																				
105	Bote de material producto de excavacion a mano	2 días	vie 20/5/22	sáb 21/5/22																				
106	Encache en talud (8.9x 1.9)m	5 días	mié 25/5/22	lun 30/5/22																				
107	Verja en Malla Ciclonica	2 días	lun 13/2/23	mar 14/2/23																				
108	Puerta de Malla Ciclonica de 6 pies de 1*2.10m (Suministro e Instalación)	2 días	lun 13/2/23	mar 14/2/23																				
109																								
110	FACHADA DEL CENTRO COMUNAL	309 días	mié 13/4/22	mié 26/4/23																				
111	Remoción de losa de hormigon armado en techo inclinado fachada existente, e= 0.12m	3 días	mié 23/11/22	vie 25/11/22																				
112	Remoción de Antepecho en block de 6" fachada existente	2 días	lun 21/11/22	mar 22/11/22																				
113	Remoción de Encache en talud	5 días	mié 13/4/22	lun 18/4/22																				
114	Bote de material de remoción a mano	2 días	mié 13/4/22	jue 14/4/22																				
115	Desmonte de hierro en lateral y frente existentes	1 día	sáb 26/11/22	sáb 26/11/22																				
116	Encache en talud	6 días	mié 13/4/22	mar 19/4/22																				
117	Perforación de piso y colocación de epoxica con colocación de varillas de3/8" a 0.2m prot de 0.20 m para construcción de muro de block de 6"	1 día	lun 28/11/22	lun 28/11/22																				
118	Uso de Resina epoxica para unir hormigon viejo con nuevo en area muro block	1 día	mar 29/11/22	mar 29/11/22																				
119	Construcción de muro de block de 6" con bastones 3/8" a 0.20 m camara llena, en fachada y laterales	4 días	mié 30/11/22	sáb 3/12/22																				
120	Construcción de losa en fachada con acero 3/8" a 0.20 m AD, e= 0.12 m	5 días	vie 9/12/22	mié 14/12/22																				

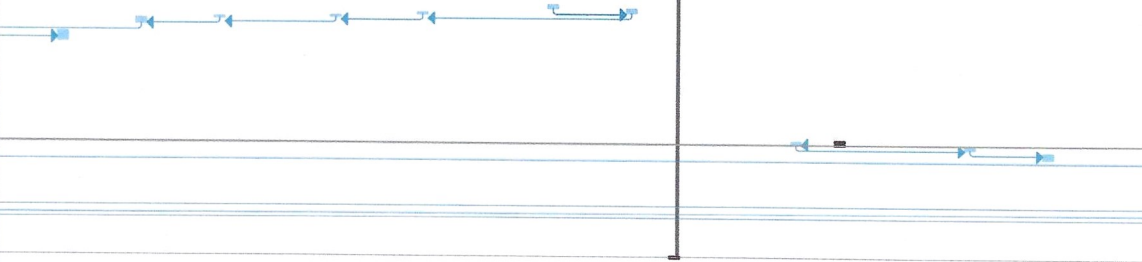

CENTRO COMUNAL
ARROYO TORO

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Tarea duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

ING. NOVO

5 de 7

CONOTO, SRL

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo
121	Construcción de viga perimetral en fachada con acero 4 Ø3/8" y est 3/8" a 0.20 m AD(0.15X0.20)M	4 días	lun 5/12/22	jue 8/12/22																				
122	Construcción de antepecho con altura de 0.20 m	2 días	vie 9/12/22	sáb 10/12/22																				
123	Bejante pluvial de 3" SDR -4.1	1 día	lun 12/12/22	lun 12/12/22																				
124	Fino de techo plano	2 días	mar 13/12/22	mié 14/12/22																				
125	Zabaleta de techo plano	1 día	jue 15/12/22	jue 15/12/22																				
126	Suministro y colocación de Impermeabilizante elastomérico con tela de refuerzo en fachada	3 días	vie 31/3/23	mar 4/4/23																				
127	Pañete de Losa fachada	2 días	lun 19/12/22	mar 20/12/22																				
128	Pañete de muro interior	2 días	mié 21/12/22	jue 22/12/22																				
129	Pañete de muro exterior según diseño	3 días	vie 23/12/22	lun 26/12/22																				
130	Fraguache muros y Viga	2 días	vie 16/12/22	sáb 17/12/22																				
131	Cantos en fachada	2 días	lun 19/12/22	mar 20/12/22																				
132	Pintura interior y exterior fachada	2 días	vie 24/3/23	lun 27/3/23																				
133	Pintura Economica en Techo fachada	1 día	mar 28/3/23	mar 28/3/23																				
134	Zócalo de porcelanato en entrada	3 días	jue 23/2/23	lun 27/2/23																				
135	Salida de luces de techo con bombillo	3 días	vie 31/3/23	mar 4/4/23																				
136	Interruptores Doble, incluye ranurado pared	6 días	lun 23/1/23	lun 30/1/23																				
137	Tubo 2"SDR- 26 electrico,	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23																				
138	mano de obra electrico	6 días	lun 23/1/23	lun 30/1/23																				
139	Puertas de Hierro entrada, incluye instalacion y llavín, perfil de 2"x2" y barras cuadradas de 5/8" separada a 0.03m, (1.45*2.20)M, marco en perfil de 3" x 2"	2 días	lun 17/4/23	mar 18/4/23																				
140	Letra de Bronce con nombre del Centro Comunal La Alegria Arroyo Toro (35 letras de 8 Pulgadas)	2 días	mar 25/4/23	mié 26/4/23																				
141	Pintura mantenimiento de Techo metalico con andamio	4 días	lun 3/4/23	jue 6/4/23																				
142	Tomacorriente doble para UPS, incluye ranurado pared	2 días	mié 29/3/23	jue 30/3/23																				
143																								



CENTRO COMUNAL

ARROYO TORO

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Resumen manual

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOEL.

Duración		Comienzo		Fin		octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		26 días	Jun 20/3/23	Jun 24/4/23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



Tarea

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito

Resumen inactivo

Tarea manual

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
