



EMPRESA DE GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA DOMINICANA


PROYECTO HIDROELÉCTRICO ARTIBONITO,
PROVINCIA ELÍAS PIÑA, R. D.

CRONOGRAMA Etapa 1 de la Fase I

Rev. 10 - Nov 15 2022



CONSORCIO
ARTIBONITO

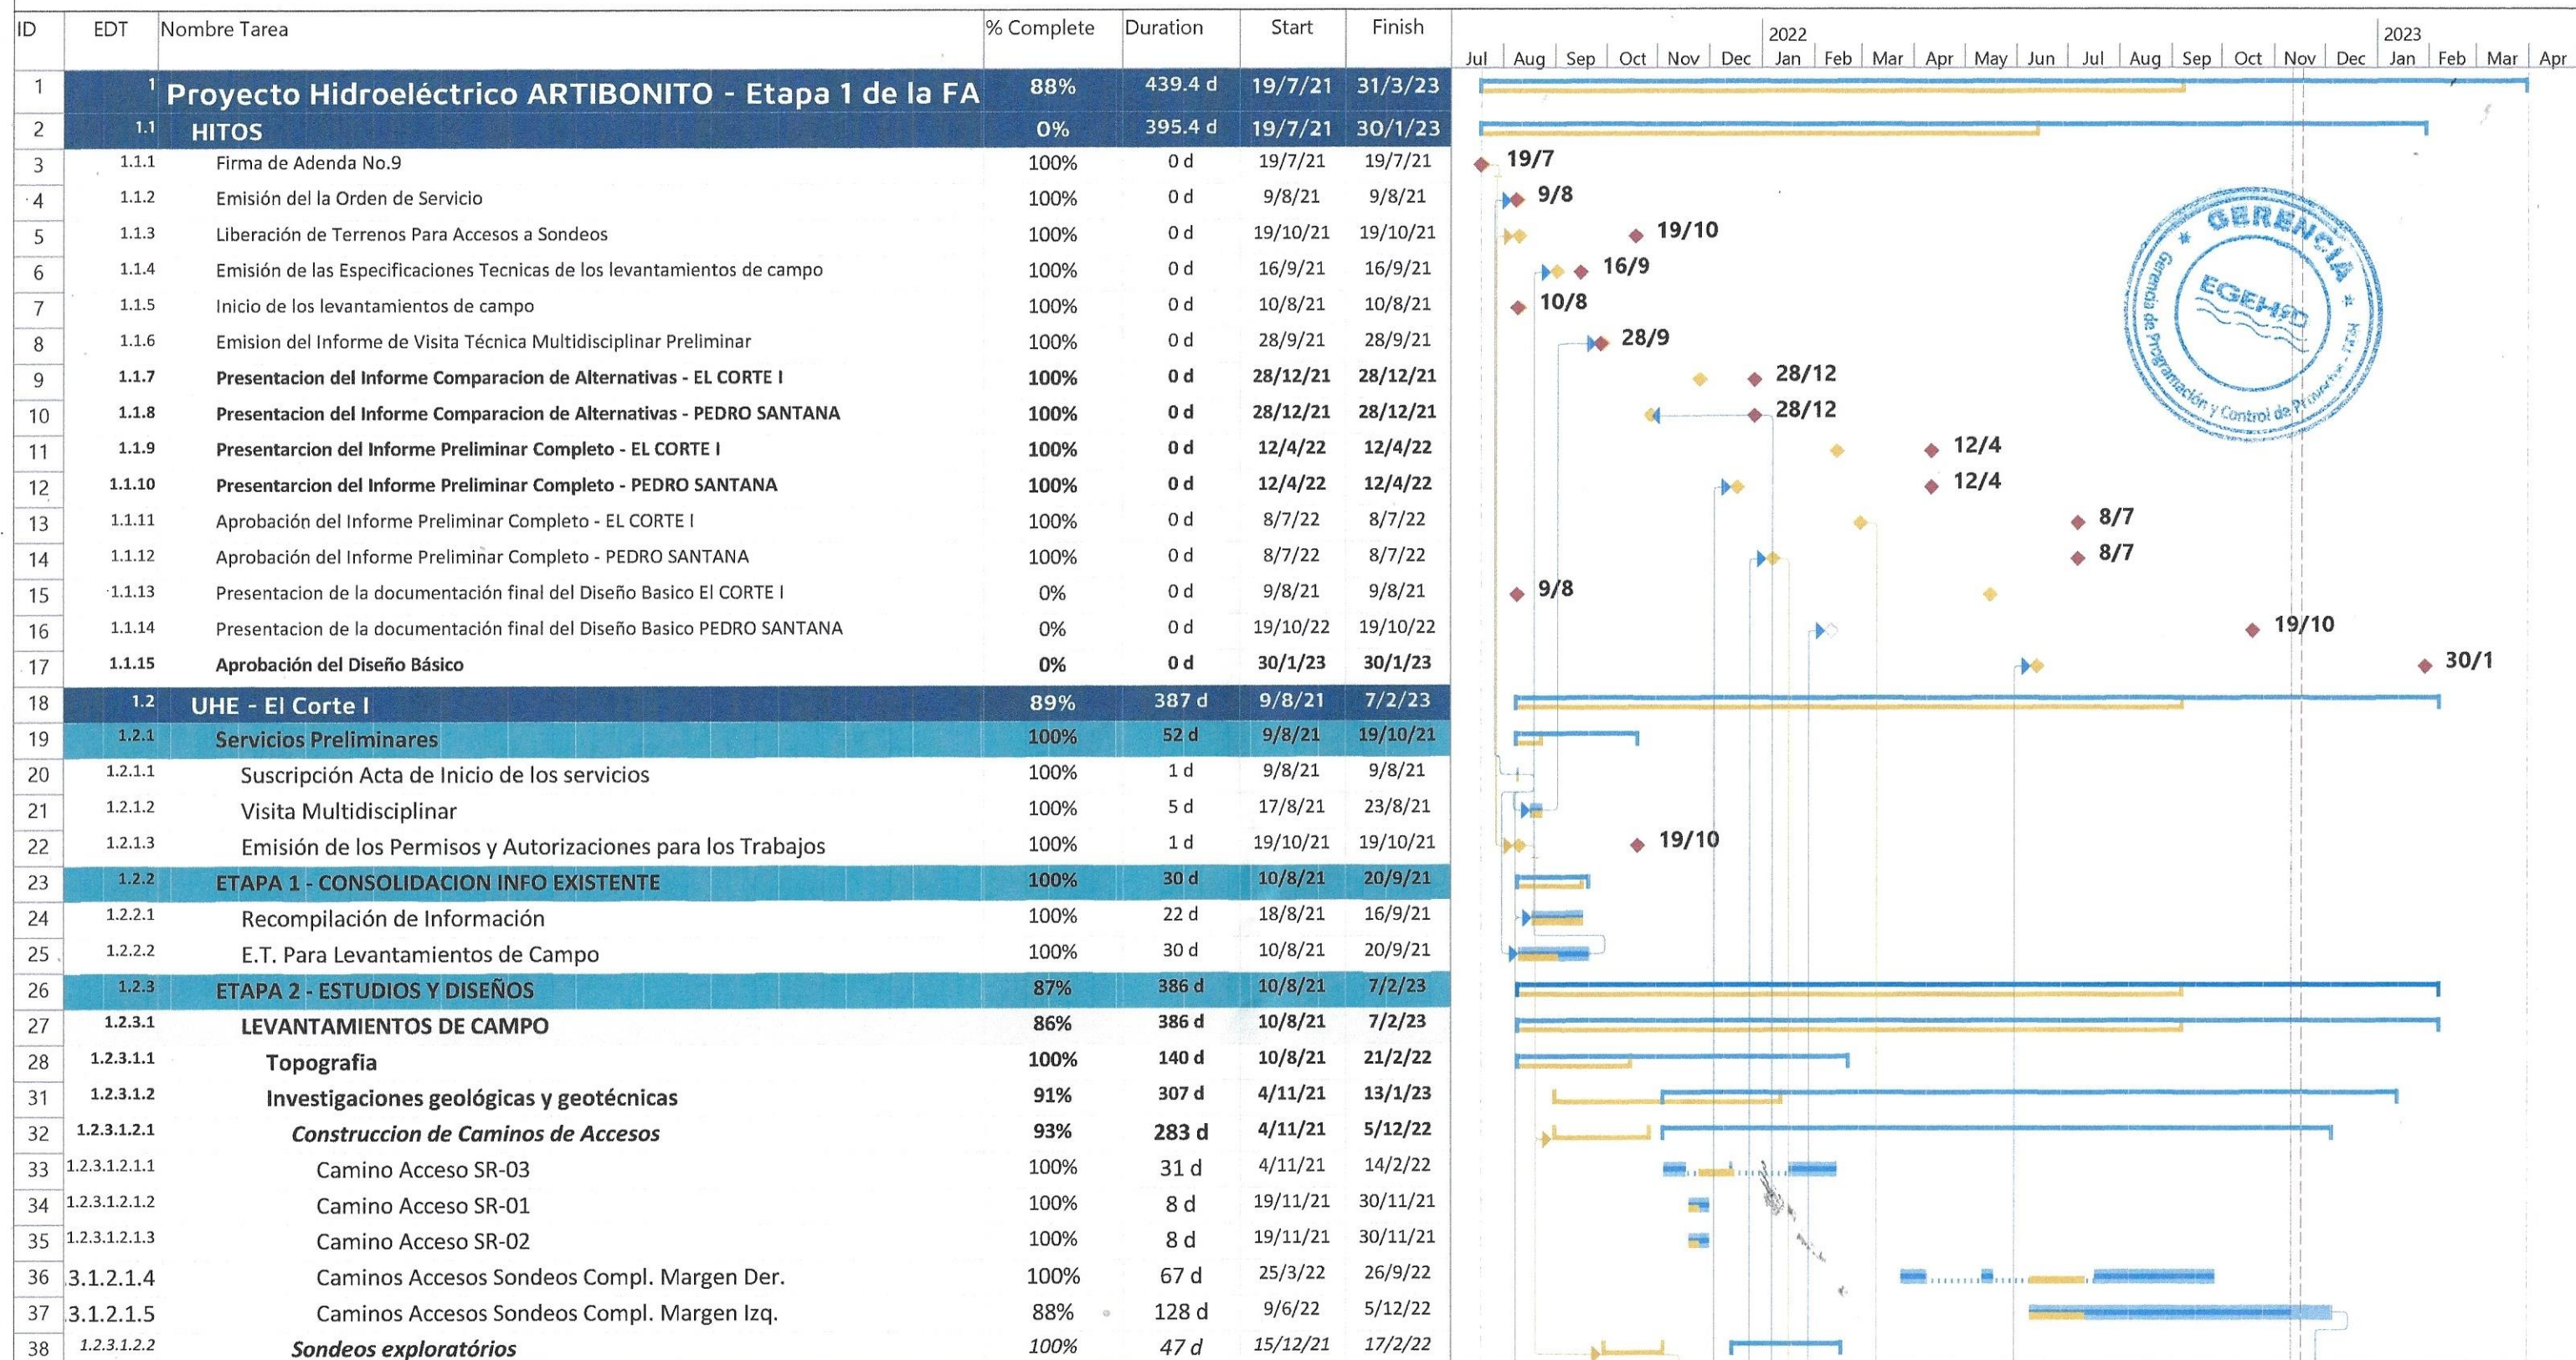

- Nota: Según lo solicitado por EGEHID, se consideran que las actividades de Aforos de Caudales (Id 53 y 123) y de Lectura de Mira (Id 56 y 125) serán interrumpidas al Final de la ETAPA I.



EMPRESA DE GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA DOMINICANA

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ARTIBONITO,
PROVINCIA ELÍAS PIÑA, R. D.

CRONOGRAMA Etapa 1 de la Fase I

Rev. 10 - Nov 15 2022



CONSORCIO
ARTIBONITO

ID	EDT	Nombre Tarea	% Complete	Duration	Start	Finish	2022												2023											
							Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr		
42	1.2.3.1.2.3	Sondeos complementarios	44%	144 d	21/6/22	13/1/23																								
43	3.1.2.3.1	Sondeo SR-106	100%	3 d	27/6/22	29/6/22																								
44	3.1.2.3.2	Sondeo SR-105	100%	2 d	24/6/22	27/6/22																								
45	3.1.2.3.3	Sondeo SR-104	100%	3 d	21/6/22	23/6/22																								
46	3.1.2.3.4	Sondeo SR-107	100%	11 d	9/10/22	24/10/22																								
47	3.1.2.3.5	Sondeo SR-102	0%	13 d	6/12/22	22/12/22																								
48	3.1.2.3.6	Sondeo SR-101	0%	11 d	23/12/22	13/1/23																								
49	1.2.3.1.2.4	Ensayos de laboratorio	100%	120 d	4/3/22	26/10/22																								
50	1.2.3.1.3	Aforos	81%	305 d	1/12/21	7/2/23																								
51	1.2.3.1.3.1	Aforos de Caudales	81%	305 d	1/12/21	7/2/23																								
52	1.2.3.1.3.2	Instalación de Miras EL CORTE I	100%	42 d	7/12/21	25/2/22																								
53	1.2.3.1.3.3	Rehabilitación de Miras Rio Joca	100%	4 d	22/12/21	27/12/21																								
54	1.2.3.1.3.4	Lecturas de Mira	77%	248.6 d	7/1/22	7/2/23																								
55	1.2.3.2	ESTUDIOS BÁSICOS	95%	200 d	18/10/21	22/7/22																								
60	1.2.4	ETAPA 3 - CONSOLIDACIÓN ALTERNATIVAS DE ARREGLO	87%	310 d	4/11/21	18/1/23																								
61	1.2.4.1	Consolidación base de datos	22%	234 d	18/2/22	18/1/23																								
62	1.2.4.1.1	Modelo geológico preliminar	100%	5 d	18/2/22	24/2/22																								
63	1.2.4.1.2	Modelo geológico final	0%	18 d	19/12/22	18/1/23																								
64	1.2.4.2	Alternativas de tipos de presa y layout	100%	113 d	4/11/21	11/4/22																								
69	1.2.4.3	Estudios de LT y Subestación	0%	30 d	19/5/22	29/6/22																								
70	1.2.5	ETAPA 4 - DISEÑO BÁSICO	94%	116 d	27/6/22	5/12/22																								
71	1.2.5.1	Planos Generales	100%	55 d	27/6/22	12/9/22																								
72	1.2.5.2	Diseños Mecánicos	100%	35 d	18/7/22	2/9/22																								
73	1.2.5.3	Diseños Eléctricos	100%	35 d	18/7/22	2/9/22																								
74	1.2.5.4	E.T.s	100%	35 d	18/7/22	2/9/22																								
75	1.2.5.5	Cronograma de Implantación	100%	40 d	26/7/22	19/9/22																								
76	1.2.5.6	Listado de Cantidades	100%	20 d	30/8/22	26/9/22																								
77	1.2.5.7	Documentos de LT	0%	15 d	15/8/22	2/9/22																								
78	1.2.5.8	Informe Final de Diseño Básico - EL CORTE 1	75%	65 d	6/9/22	5/12/22																								
79	1.3	UHE - Pedro Santana	93%	387 d	9/8/21	7/2/23																								
80	1.3.1	Servicios Preliminares	100%	52 d	9/8/21	19/10/21																								
84	1.3.2	ETAPA 1 - CONSOLIDACION INFO EXISTENTE	100%	30 d	10/8/21	20/9/21																								
87	1.3.3	ETAPA 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	89%	386 d	10/8/21	7/2/23																								
88	1.3.3.1	LEVANTAMIENTOS DE CAMPO	86%	386 d	10/8/21	7/2/23																								
89	1.3.3.1.1	Topografia	100%	140 d	10/8/21	21/2/22																								
92	1.3.3.1.2	Investigaciones geológicas y geotécnicas	100%	173 d	20/10/21	17/6/22																								

GENENCIA

EGEHET

Gerencia de Programación y Control de Proyectos



- Nota: Según lo solicitado por EGEHID, se consideran que las actividades de Aforos de Caudales (Id 53 y 123) y de Lectura de Mira (Id 56 y 125) serán interrumpidas al Final de la ETAPA I.

nc



EMPRESA DE GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA DOMINICANA

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ARTIBONITO,
PROVINCIA ELÍAS PIÑA, R. D.

CRONOGRAMA Etapa 1 de la Fase I

Rev. 10 - Nov 15 2022



CONSORCIO
ARTIBONITO

ID	EDT	Nombre Tarea	% Complete	Duration	Start	Finish	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2022	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2023	Jan	Feb	Mar	Apr
93	1.3.3.1.2.1	Construcción de Caminos de Accesos	100%	171 d	20/10/21	15/6/22																								
103	1.3.3.1.2.2	Sondeos exploratorios	100%	87 d	3/11/21	3/3/22																								
110	1.3.3.1.2.3	Sondeos complementarios	100%	33 d	4/5/22	17/6/22																								
118	1.3.3.1.2.4	Ensayos de laboratorio	100%	30 d	11/3/22	2/6/22																								
119	1.3.3.1.3	Aforos	81%	331 d	26/10/21	7/2/23																								
120	1.3.3.1.3.1	Aforos de Caudales Pedro Santana	81%	305 d	1/12/21	7/2/23																								
121	1.3.3.1.3.2	Instalación de Miras Pedro Santana	100%	20 d	26/10/21	12/1/22																								
122	1.3.3.1.3.3	Lectura de Miras	80%	289 d	23/12/21	7/2/23																								
123	1.3.3.2	ESTUDIOS BÁSICOS	100%	200 d	18/10/21	22/7/22																								
124	1.3.3.2.1	Hidrología Preliminar	100%	50 d	18/10/21	31/1/22																								
125	1.3.3.2.2	Hidrología Definitiva	100%	99 d	1/2/22	17/6/22																								
126	1.3.3.2.3	Sismo (MARIA LAPORTE)	100%	70 d	25/10/21	9/3/22																								
127	1.3.3.2.4	Criterios de Diseño	100%	20 d	27/6/22	22/7/22																								
128	1.3.4	ETAPA 3 - CONSOLIDACIÓN ALTERNATIVAS DE ARREGLO	100%	182 d	4/11/21	15/7/22																								
129	1.3.4.1	Consolidación base de datos	100%	172 d	18/11/21	15/7/22																								
130	1.3.4.1.1	Modelo geológico preliminar	100%	62.5 d	18/11/21	7/3/22																								
131	1.3.4.1.2	Modelo geológico final	100%	30 d	6/6/22	15/7/22																								
132	1.3.4.2	Alternativas de tipos de presa y layout	100%	113 d	4/11/21	11/4/22																								
133	1.3.4.2.1	Informe de alternativas	100%	39 d	4/11/21	28/12/21																								
134	1.3.4.2.2	SELECCION ALTERNATIVAS	100%	20 d	29/12/21	25/1/22																								
135	1.3.4.2.3	Desarrollo de Alternativa Seleccionada	100%	44 d	26/1/22	28/3/22																								
136	1.3.4.2.4	Informe Preliminar Completo	100%	10 d	29/3/22	11/4/22																								
137	1.3.4.3	Estudios de LT y Subestación	0%	30 d	19/5/22	29/6/22																								
138	1.3.5	ETAPA 4 - DISEÑO BÁSICO	100%	80 d	30/6/22	19/10/22																								
139	1.3.5.1	Planos Generales	100%	45 d	30/6/22	31/8/22																								
140	1.3.5.2	Diseños Mecánicos	100%	50 d	14/7/22	21/9/22																								
141	1.3.5.3	Diseños Eléctricos	100%	50 d	14/7/22	21/9/22																								
142	1.3.5.4	E.T.s	100%	50 d	14/7/22	21/9/22																								
143	1.3.5.5	Cronograma de Implantación	100%	50 d	30/6/22	21/9/22																								
144	1.3.5.6	Listado de Cantidades	100%	24 d	14/7/22	23/9/22																								
145	1.3.5.7	Documentos de LT	0%	15 d	3/9/22	21/9/22																								
146	1.3.5.8	Informe Final de Diseño Básico - PEDRO SANTANA	100%	20 d	22/9/22	19/10/22																								
147	1.4	DISCUSION Y APROBACION DISENO BASICO	16%	60 d	30/9/22	30/1/23																								
148	1.5	PRESUPUESTO	0%	44 d	30/1/23	31/3/23																								



- Nota: Según lo solicitado por EGEHID, se consideran que las actividades de Aforos de Caudales (Id 53 y 123) y de Lectura de Mira (Id 56 y 125) serán interrumpidas al Final de la ETAPA I.
