



Cronograma de ejecución - Reparación Cancha Club - La Salvia, Los Quemados y Blanco - Bonao

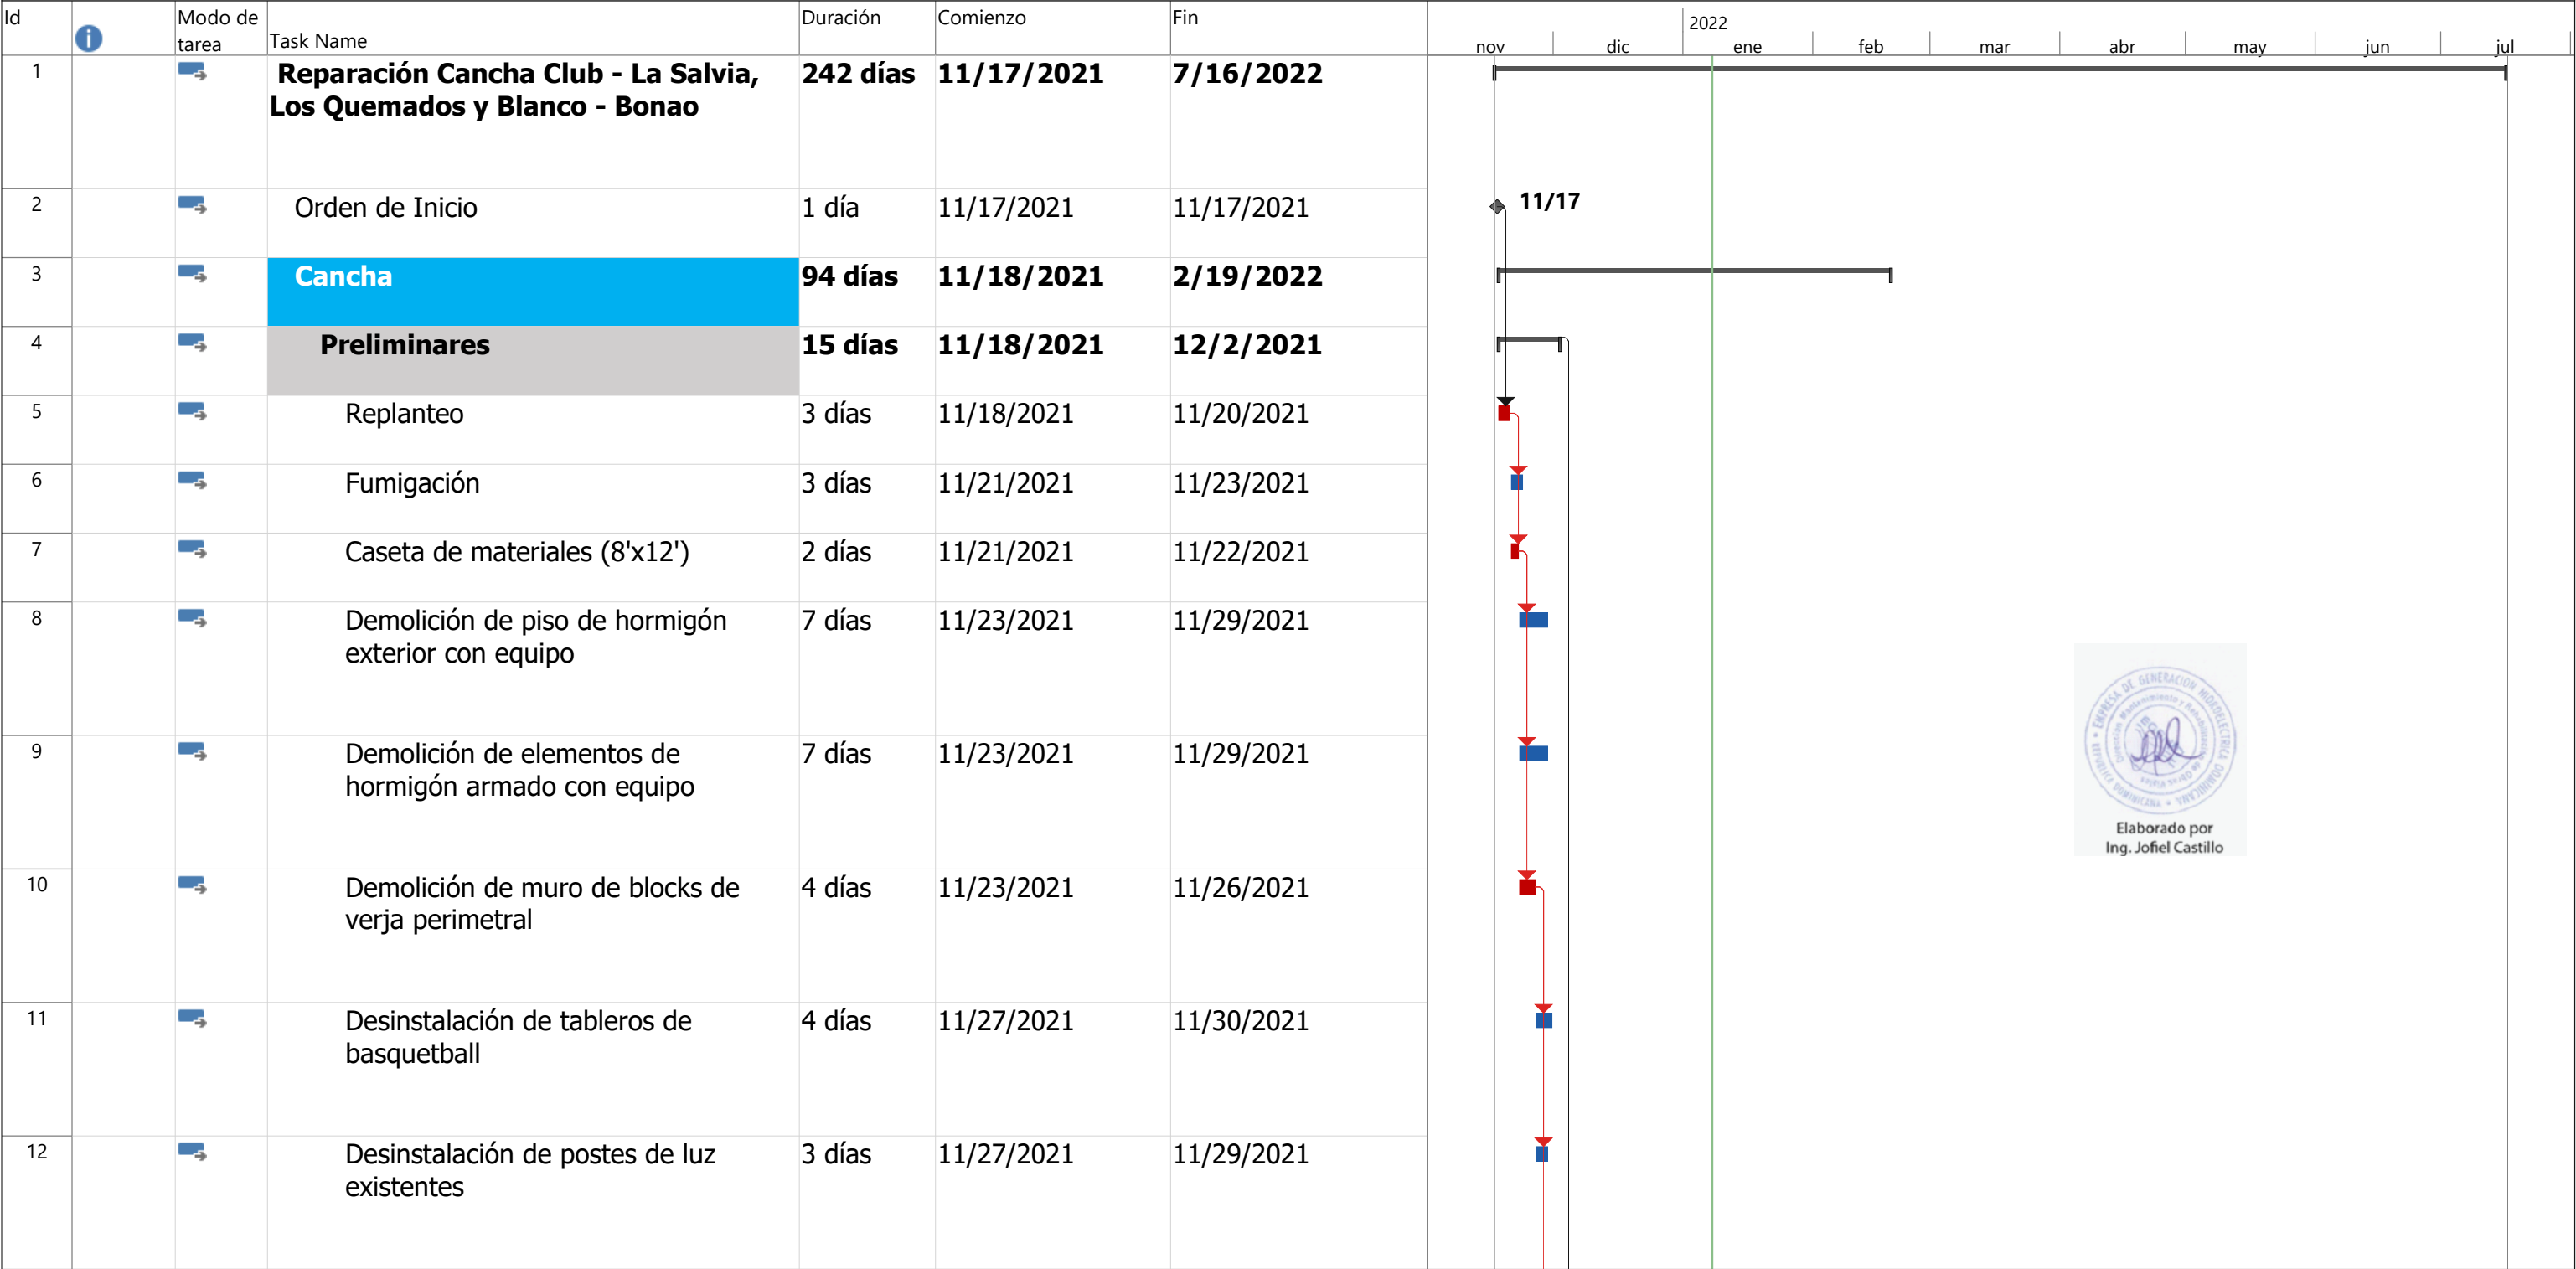

Date: 1/8/2022

División crítica		Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress	
Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline		Tareas críticas	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			

Cronograma de ejecución - Reparación Cancha Club - La Salvia, Los Quemados y Blanco - Bonao

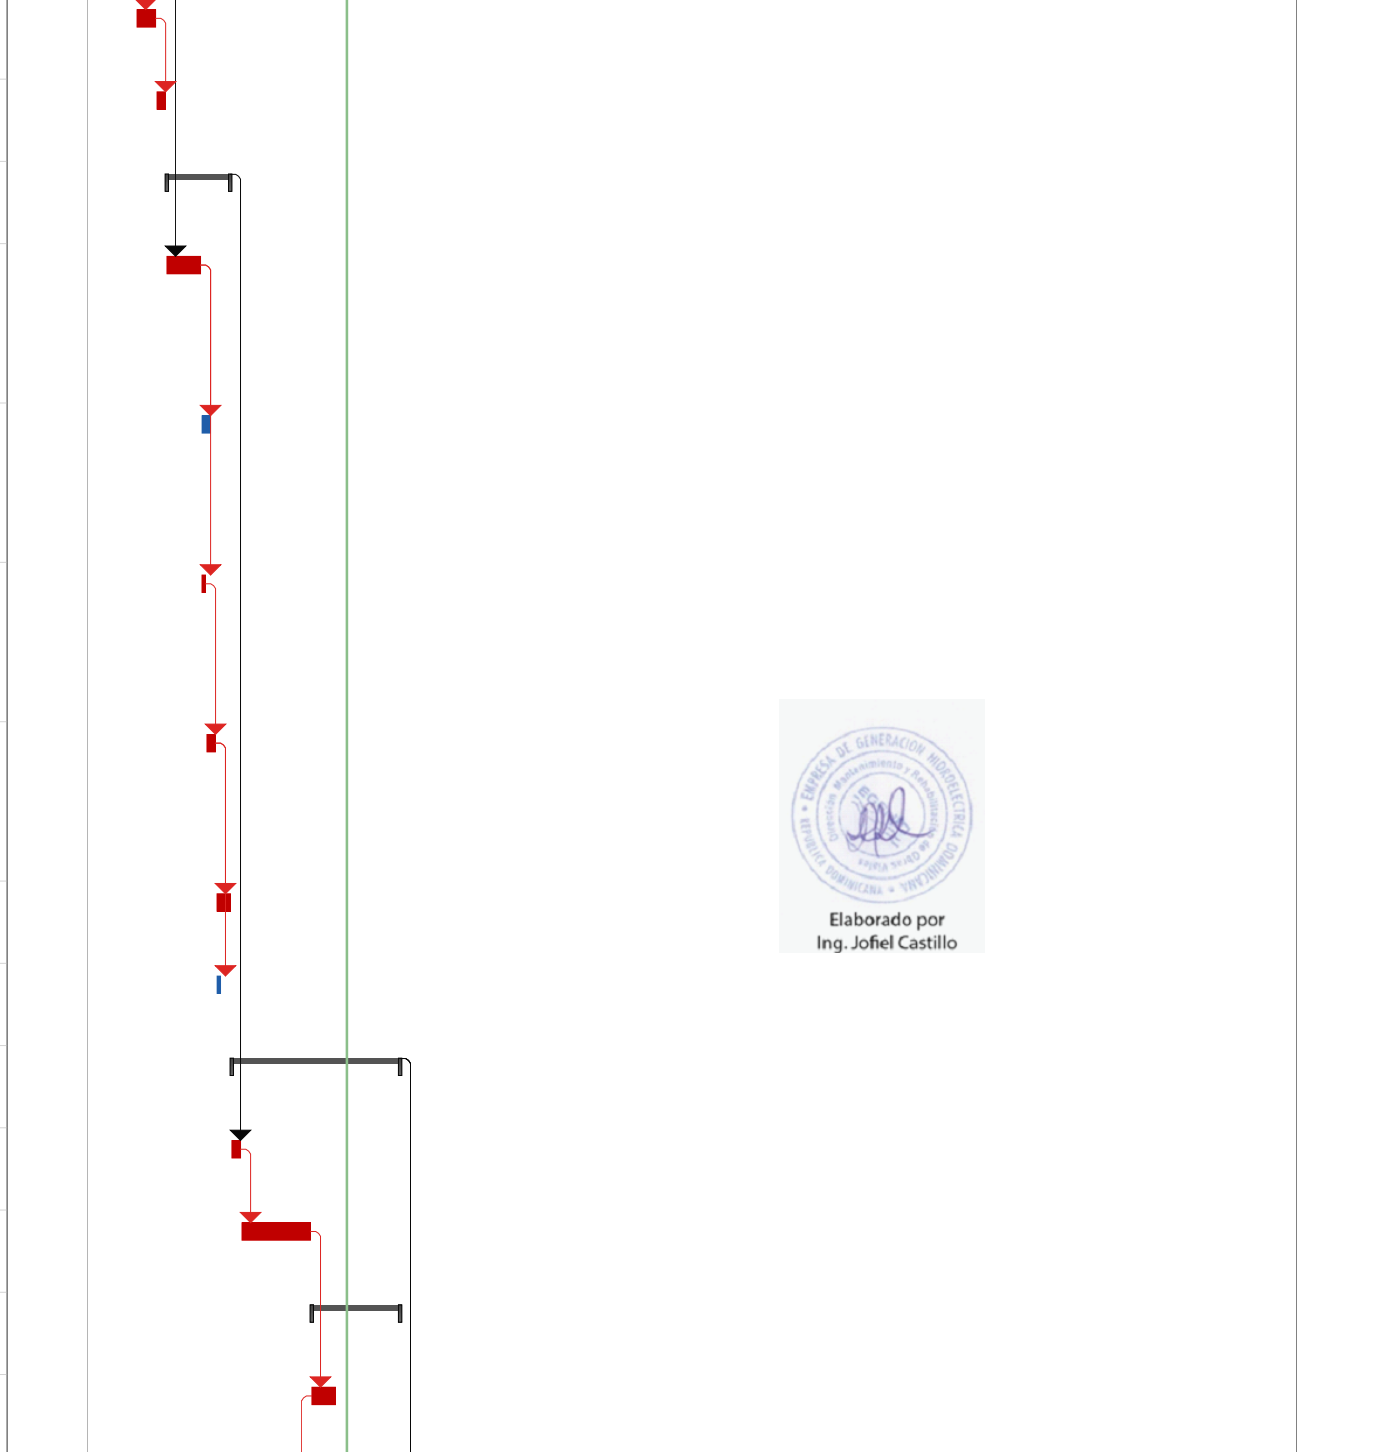Id		Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022											
							nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul			
13			Desinstalación de malla ciclónica	4 días	11/27/2021	11/30/2021												
14			Bote de escombros	2 días	12/1/2021	12/2/2021												
15			Movimiento de Tierra	13 días	12/3/2021	12/15/2021												
16			Regado, nivelación y compactación del terreno	7 días	12/3/2021	12/9/2021												
17			Excavación en caliche de zapatas de muros de contención	2 días	12/10/2021	12/11/2021												
18			Excavación en caliche de zapatas de columnas	1 día	12/10/2021	12/10/2021												
19			Excavación en caliche de verja perimetral	2 días	12/11/2021	12/12/2021												
20			Relleno de reposición	3 días	12/13/2021	12/15/2021												
21			Bote de escombros	1 día	12/13/2021	12/13/2021												
22			Hormigón Armado	34 días	12/16/2021	1/18/2022												
23			Hormigón de nivelación	2 días	12/16/2021	12/17/2021												
24			Zapata de muro y Columnas	14 días	12/18/2021	12/31/2021												
25			Columnas	18 días	1/1/2022	1/18/2022												
26			Encofrado	5 días	1/1/2022	1/5/2022												




Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Date: 1/8/2022

División crítica		Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress	
Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline		Tareas críticas	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			

Cronograma de ejecución - Reparación Cancha Club - La Salvia, Los Quemados y Blanco - Bonao

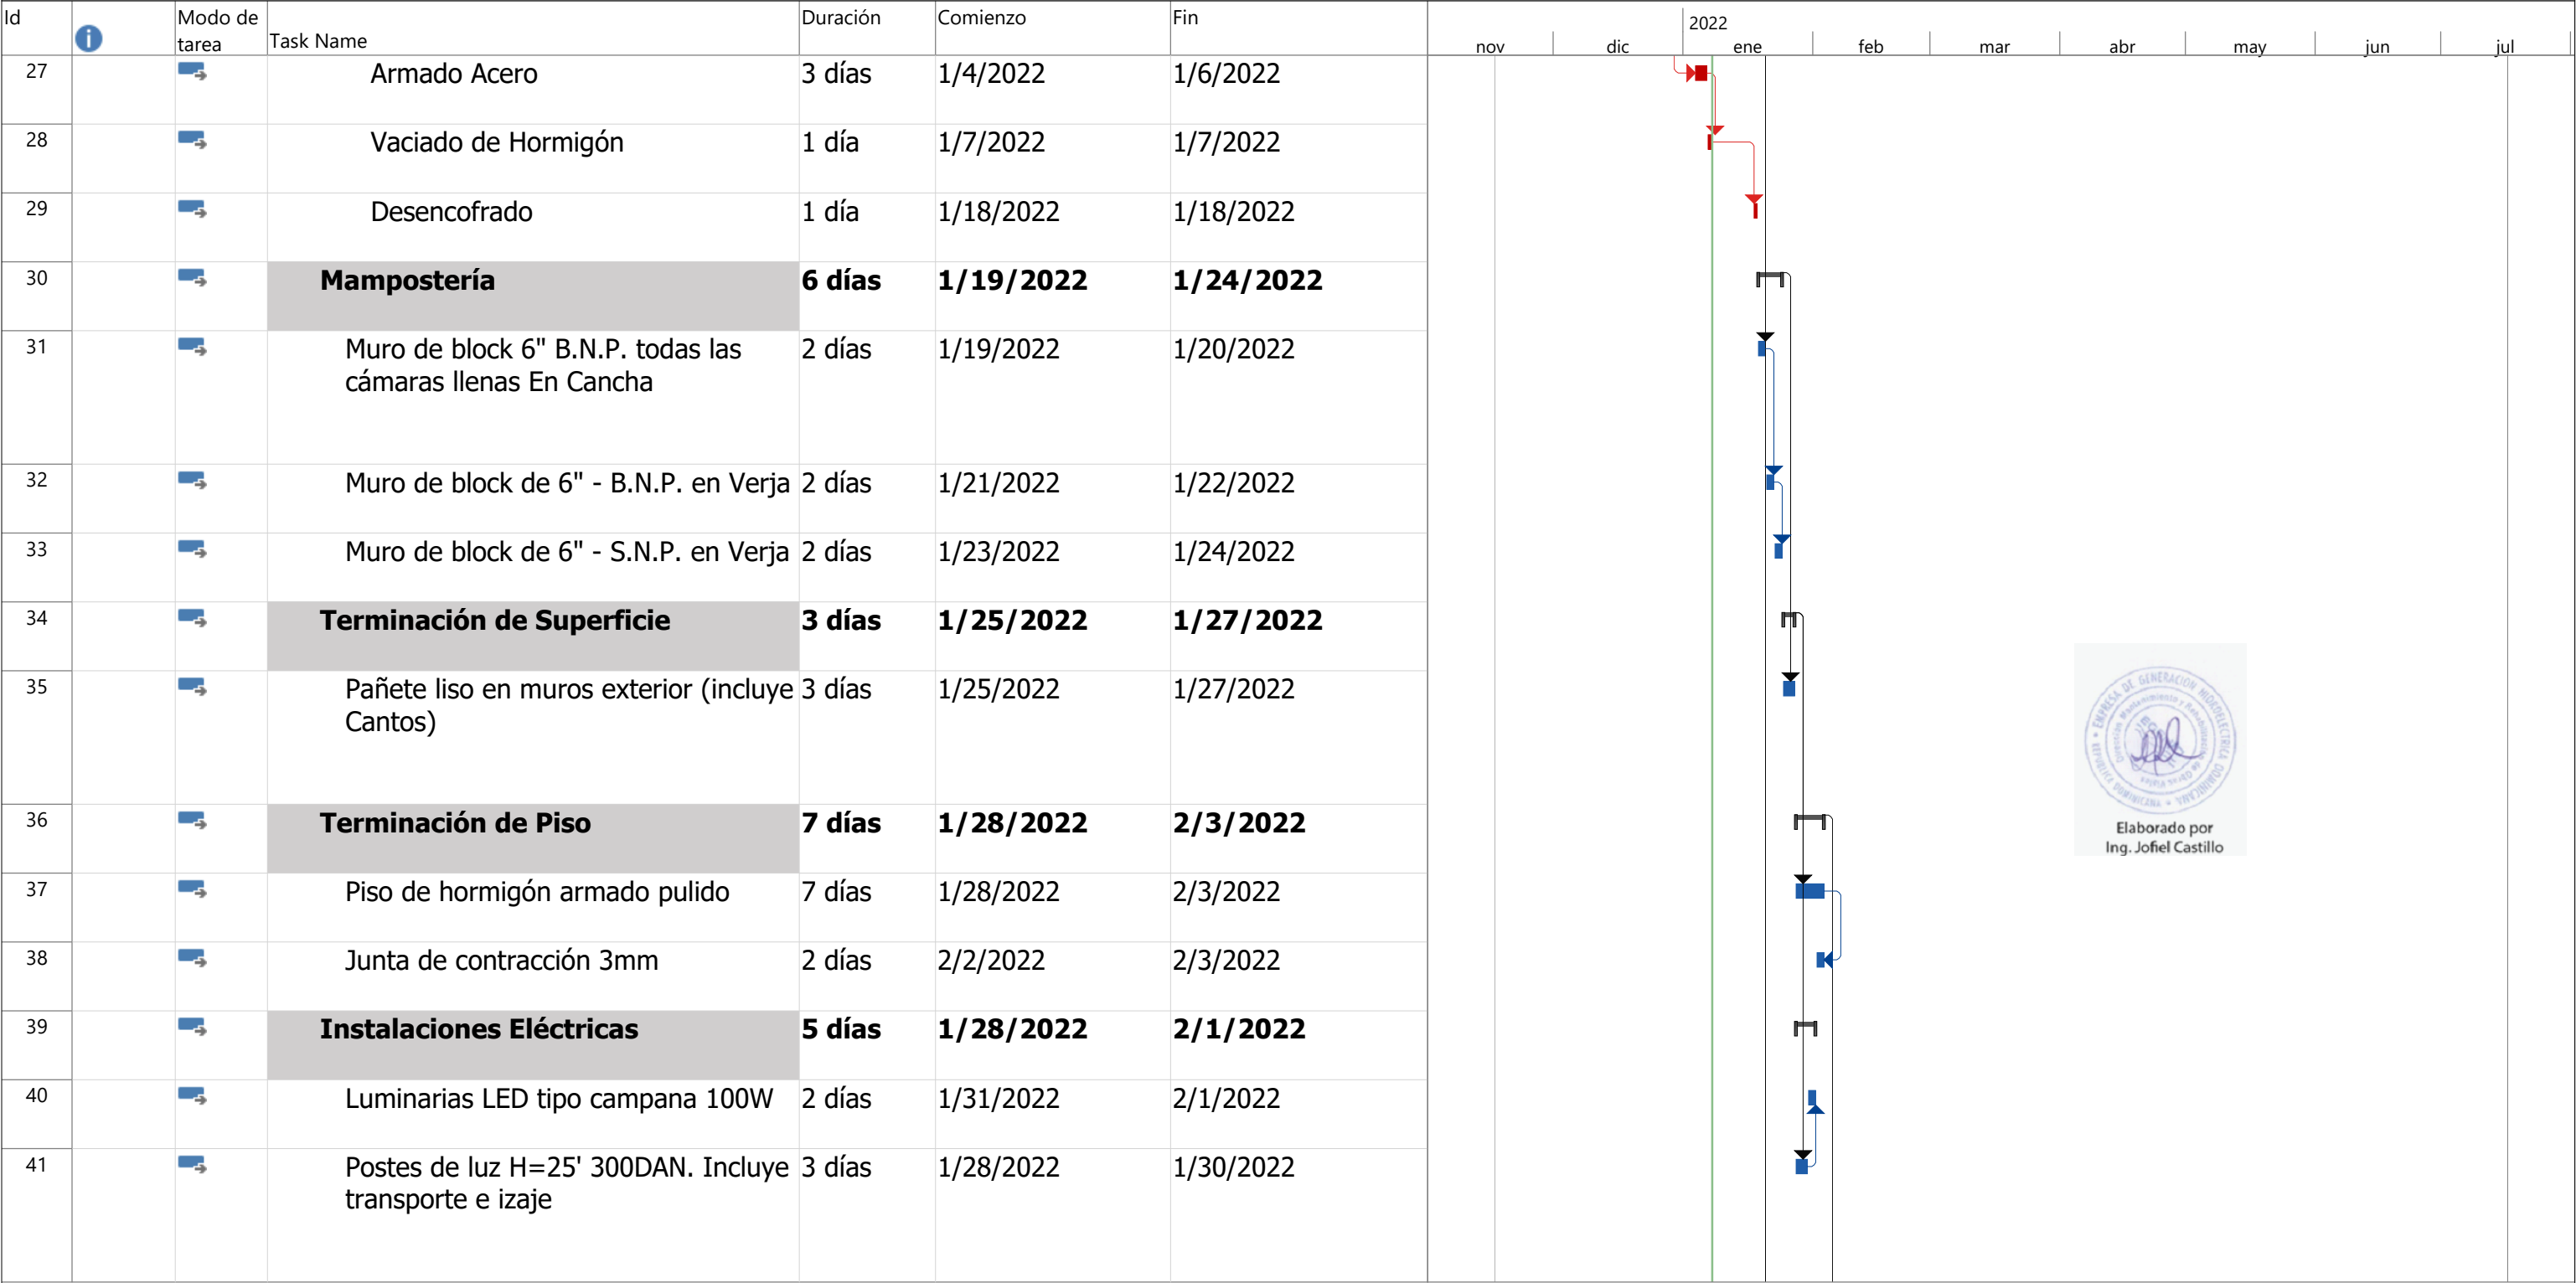

Date: 1/8/2022

División crítica

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split


Progress

Manual Progress

Tareas críticas


Page 3

Cronograma de ejecución - Reparación Cancha Club - La Salvia, Los Quemados y Blanco - Bonao

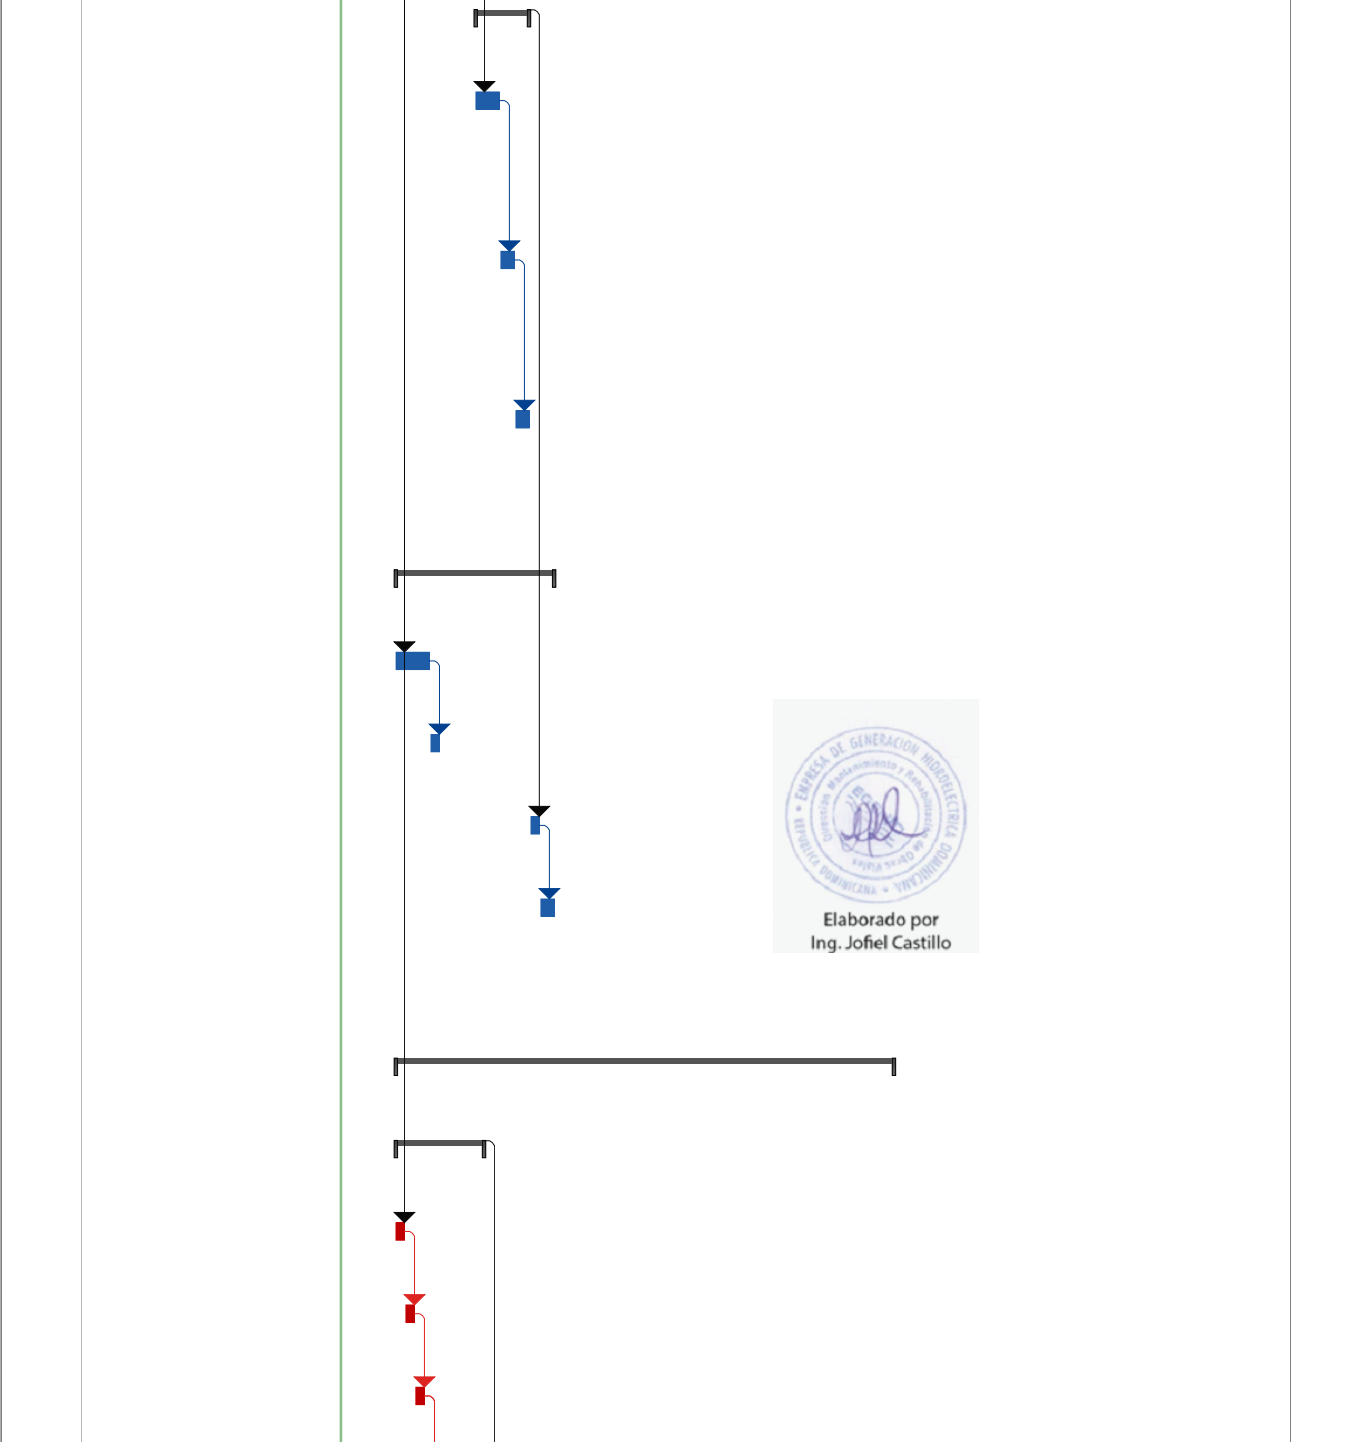Id		Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022											
							nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul			
42			Pintura	11 días	2/4/2022	2/14/2022												
43			Pintura acrílica satinada de cancha (2 manos)	5 días	2/4/2022	2/8/2022												
44			Pintura acrílica satinada de elemento de hormigón (2 manos)	3 días	2/9/2022	2/11/2022												
45			Pintura acrílica en verja perimetral (2 manos)	3 días	2/12/2022	2/14/2022												
46			Miscelaneos	32 días	1/19/2022	2/19/2022												
47			Acera hormigón frotado	7 días	1/19/2022	1/25/2022												
48			Malla ciclónica 6' c/ alambre trinchera	2 días	1/26/2022	1/27/2022												
49			Tablero, aro y malla de baloncesto	2 días	2/15/2022	2/16/2022												
50			Tubos metálicos para malla de volleyball. Incluye red	3 días	2/17/2022	2/19/2022												
51			Gradas	100 días	1/19/2022	4/28/2022												
52			Preliminares	18 días	1/19/2022	2/5/2022												
53			Replanteo	2 días	1/19/2022	1/20/2022												
54			Fumigación	2 días	1/21/2022	1/22/2022												
55			Caseta de materiales (8'x12')	2 días	1/23/2022	1/24/2022												

Date: 1/8/2022	División crítica		Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress	
	Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
	Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline		Tareas críticas	
	Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
	Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			

Cronograma de ejecución - Reparación Cancha Club - La Salvia, Los Quemados y Blanco - Bonao

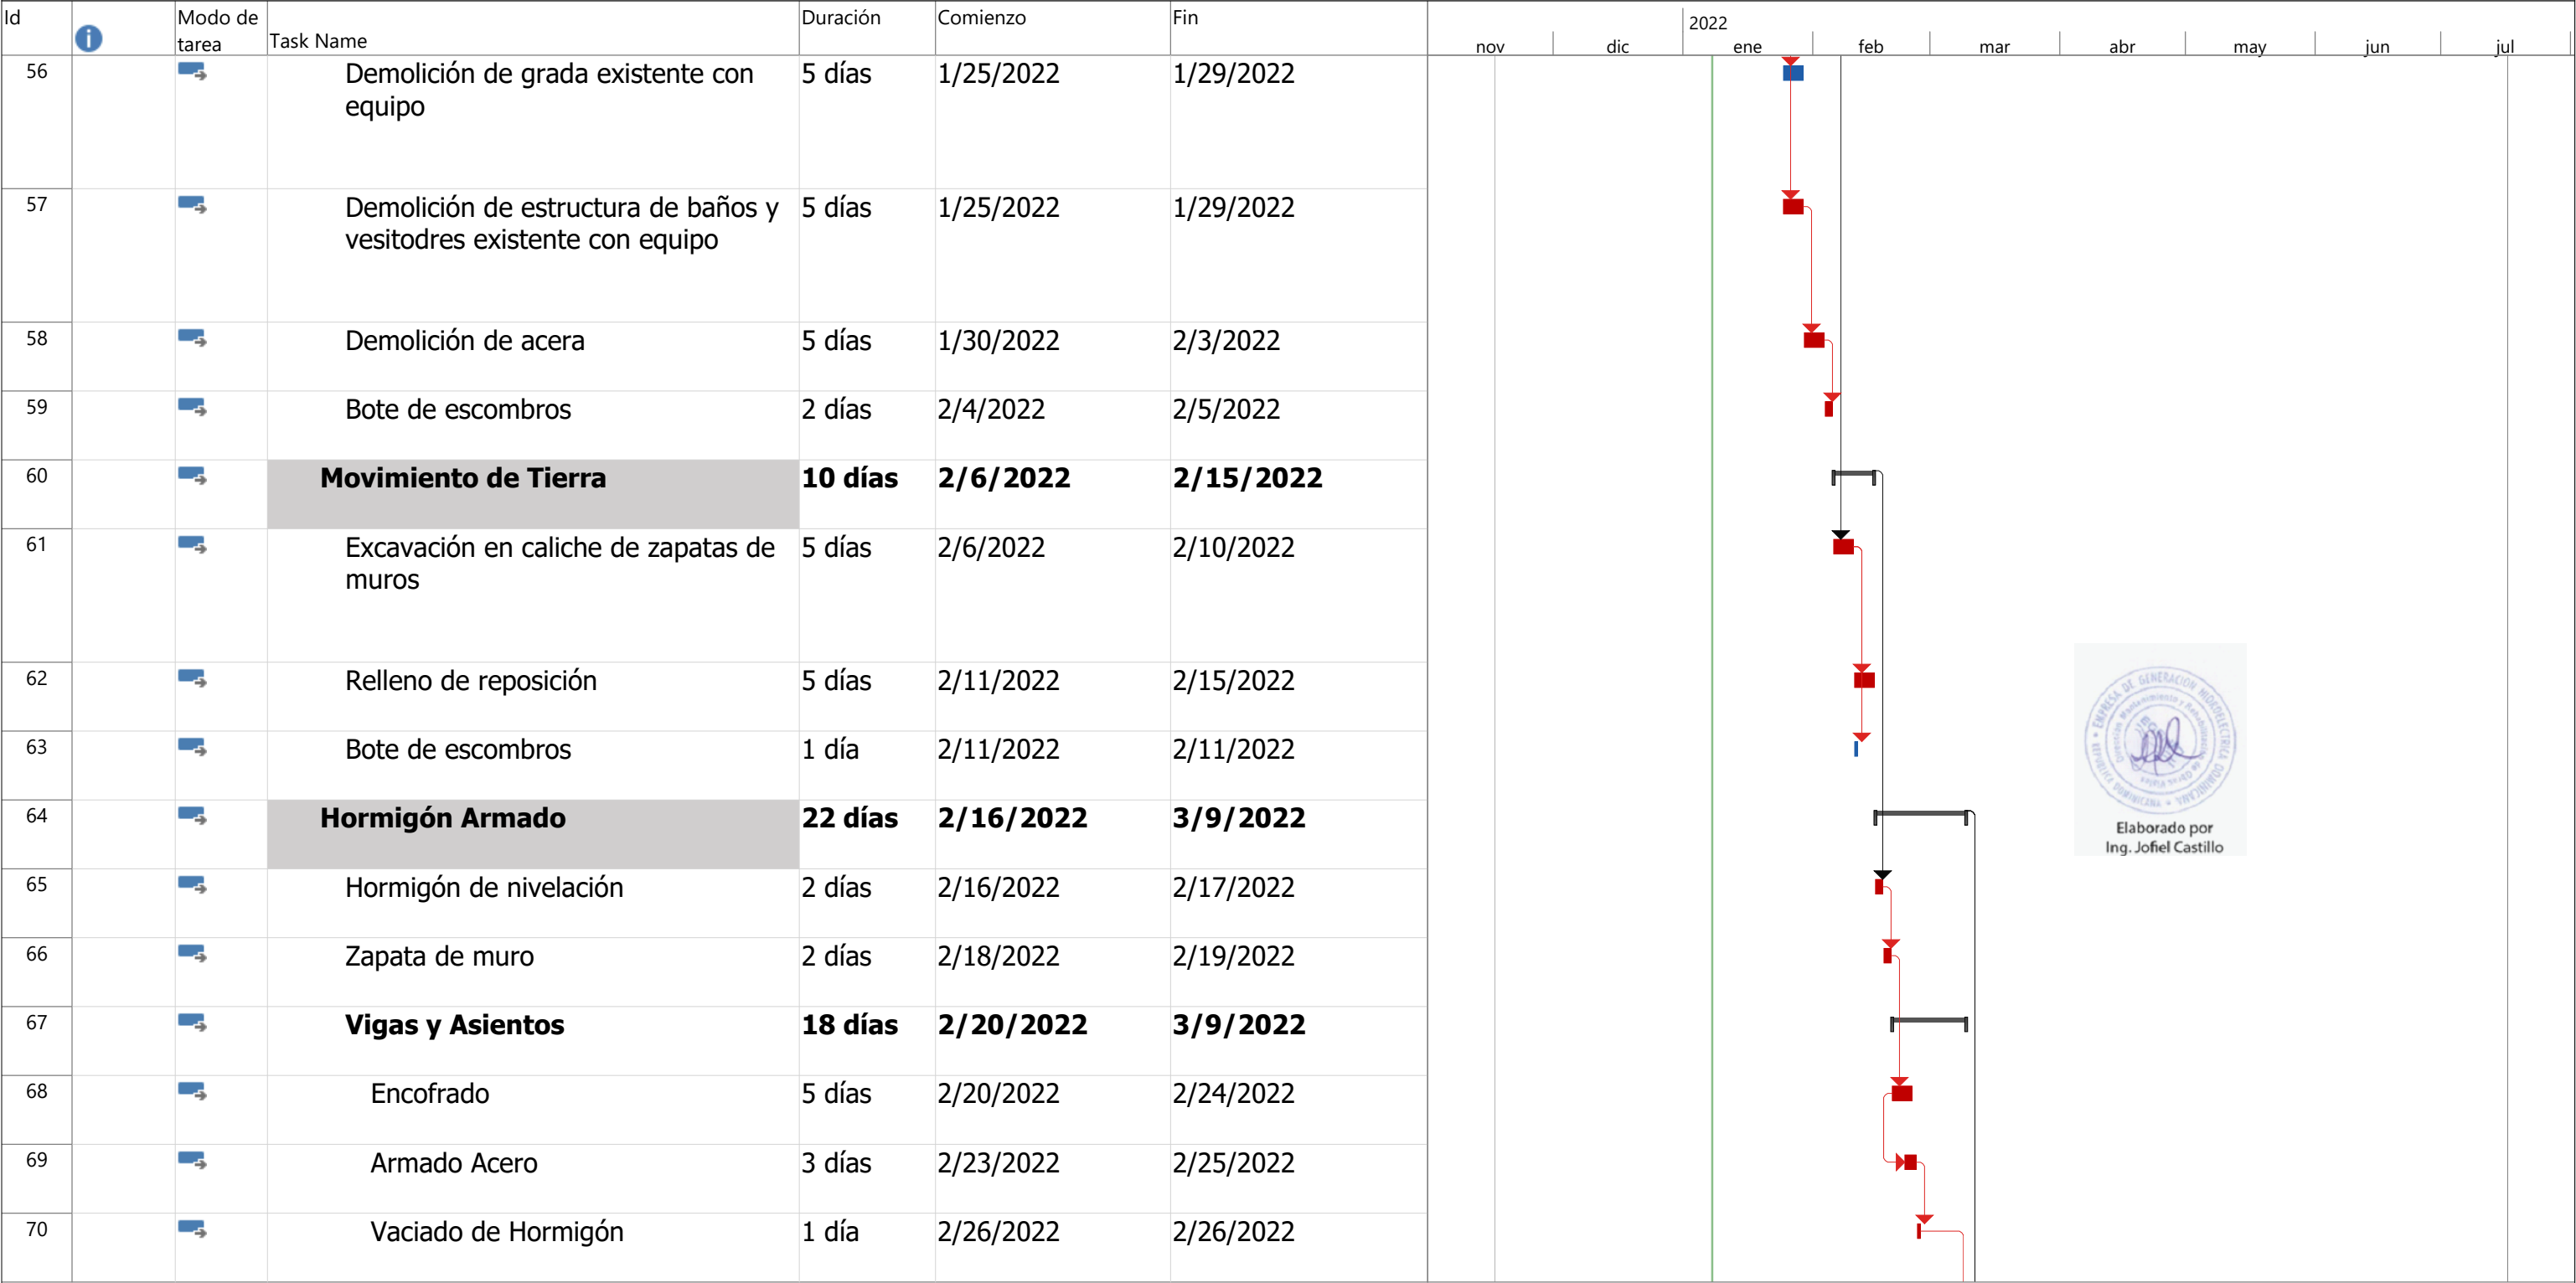

Date: 1/8/2022

División crítica

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress


Manual Progress

Tareas críticas

Page 5

Id	i	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022								
							nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
71			Desencofrado	1 día	3/9/2022	3/9/2022									
72			Mampostería	11 días	3/10/2022	3/20/2022									
73			Muro de block de 6" B.N.P.	4 días	3/10/2022	3/13/2022									
74			Muro de block de 6" - S.N.P.	7 días	3/14/2022	3/20/2022									
75			Terminación de Superficie	19 días	3/21/2022	4/8/2022									
76			Pañete liso en muros interior	7 días	3/21/2022	3/27/2022									
77			Pañete liso en muros exterior	7 días	3/28/2022	4/3/2022									
78			Pañete liso en techos y asientos	5 días	4/4/2022	4/8/2022									
79			Terminación de Piso	4 días	4/9/2022	4/12/2022									
80			Cerámica de piso (incluye quicios y zocalos)	2 días	4/9/2022	4/10/2022									
81			Cerámica de piso en Baño (incluye quicios y zocalos)	2 días	4/11/2022	4/12/2022									
82			Revestimineto de Pared	2 días	4/9/2022	4/10/2022									
83			Revestimiento de cerámica de pared en Baño	2 días	4/9/2022	4/10/2022									
84			Estructuras Ligeras	3 días	4/13/2022	4/15/2022									
85			Plafond PVC 2'x2'	3 días	4/13/2022	4/15/2022									

Cronograma de ejecución - Reparación Cancha Club - La Salvia, Los Quemados y Blanco - Bonao

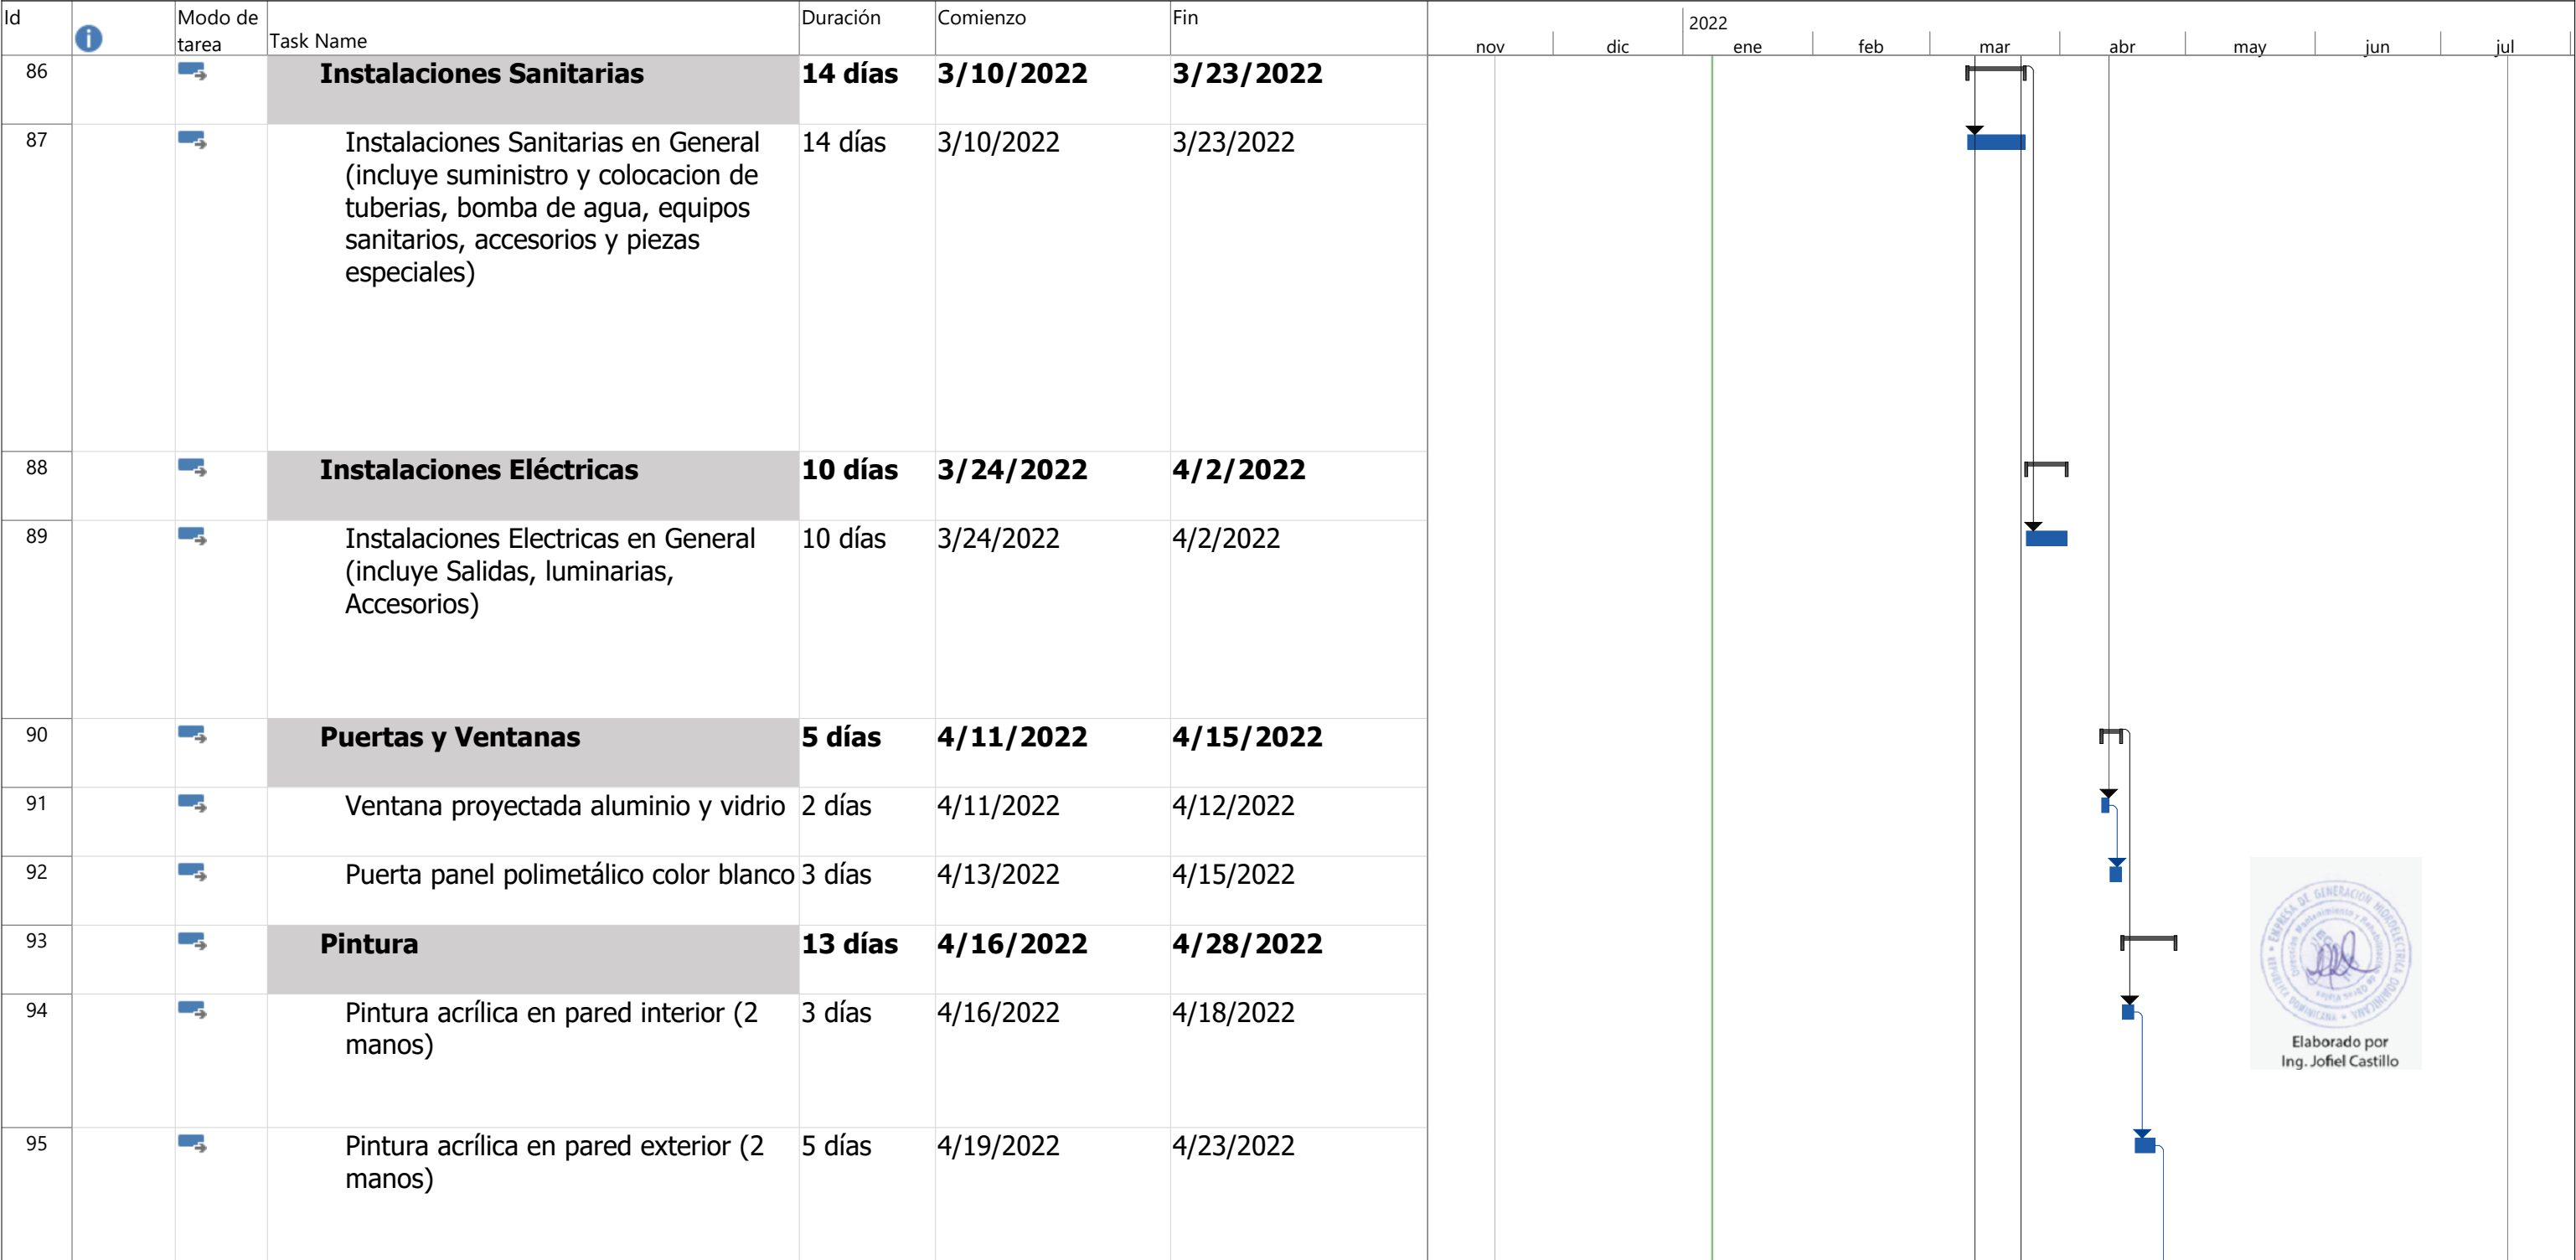

Date: 1/8/2022

División crítica		Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress	
Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline		Tareas críticas	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			

Id		Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022											
							nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul			
96			Pintura acrílica en techo y asientos (2 manos)	5 días	4/24/2022	4/28/2022												
97			Miscelaneos	5 días	3/21/2022	3/25/2022												
98			Acera hormigón frotado	5 días	3/21/2022	3/25/2022												
99			Casa Club	129 días	3/10/2022	7/16/2022												
100			Preliminares	19 días	3/10/2022	3/28/2022												
101			Demolición muro de blocks	1 día	3/10/2022	3/10/2022												
102			Demolición de piso de hormigón pulido para colocar cerámica e=4 cm	3 días	3/11/2022	3/13/2022												
103			Demolición fino de techo Baños	2 días	3/11/2022	3/12/2022												
104			Desinstalación estructura de techo aluzinc	18 días	3/11/2022	3/28/2022												
105			Desinstalación de ventanas	5 días	3/11/2022	3/15/2022												
106			Desinstalación de puertas	5 días	3/11/2022	3/15/2022												
107			Desinstalación de puerta de hierro	3 días	3/11/2022	3/13/2022												
108			Traslado de elementos metálicos	5 días	3/14/2022	3/18/2022												
109			Bote de escombros	2 días	3/19/2022	3/20/2022												
110			Estructura Metálica	21 días	3/29/2022	4/18/2022												


Cronograma de ejecución - Reparación Cancha Club - La Salvia, Los Quemados y Blanco - Bonao

Id		Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022											
							nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul			
111			Techo en aluzinc cal.26. Incluye tijerillas metálicas, caños, bajantes y caballete	21 días	3/29/2022	4/18/2022												
112			Mampostería	1 día	4/19/2022	4/19/2022												
113			Muro de block de 6", Cierre de ventan	1 día	4/19/2022	4/19/2022												
114			Terminación de Superficie	2 días	4/20/2022	4/21/2022												
115			Pañete liso en muros interior	1 día	4/20/2022	4/20/2022												
116			Pañete liso en muros exterior	1 día	4/21/2022	4/21/2022												
117			Terminación de Piso	8 días	4/22/2022	4/29/2022												
118			Cerámica de piso (incluye quicio y zocalos)	5 días	4/22/2022	4/26/2022												
119			Cerámica de piso en Baño (incluye quicio y zocalos)	3 días	4/27/2022	4/29/2022												
120			Revestimineto de Pared	3 días	4/30/2022	5/2/2022												
121			Revestimiento de cerámica de pared en Baño	3 días	4/30/2022	5/2/2022												
122			Estructuras Ligeras	20 días	4/30/2022	5/19/2022												
123			Plafond fisurado en fibra mineral 2'x2'	5 días	4/30/2022	5/4/2022												

Elaborado por Ing. Jofiel Castillo

Date: 1/8/2022	División crítica		Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress	
	Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
	Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline		Tareas críticas	
	Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
	Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			

Cronograma de ejecución - Reparación Cancha Club - La Salvia, Los Quemados y Blanco - Bonaó

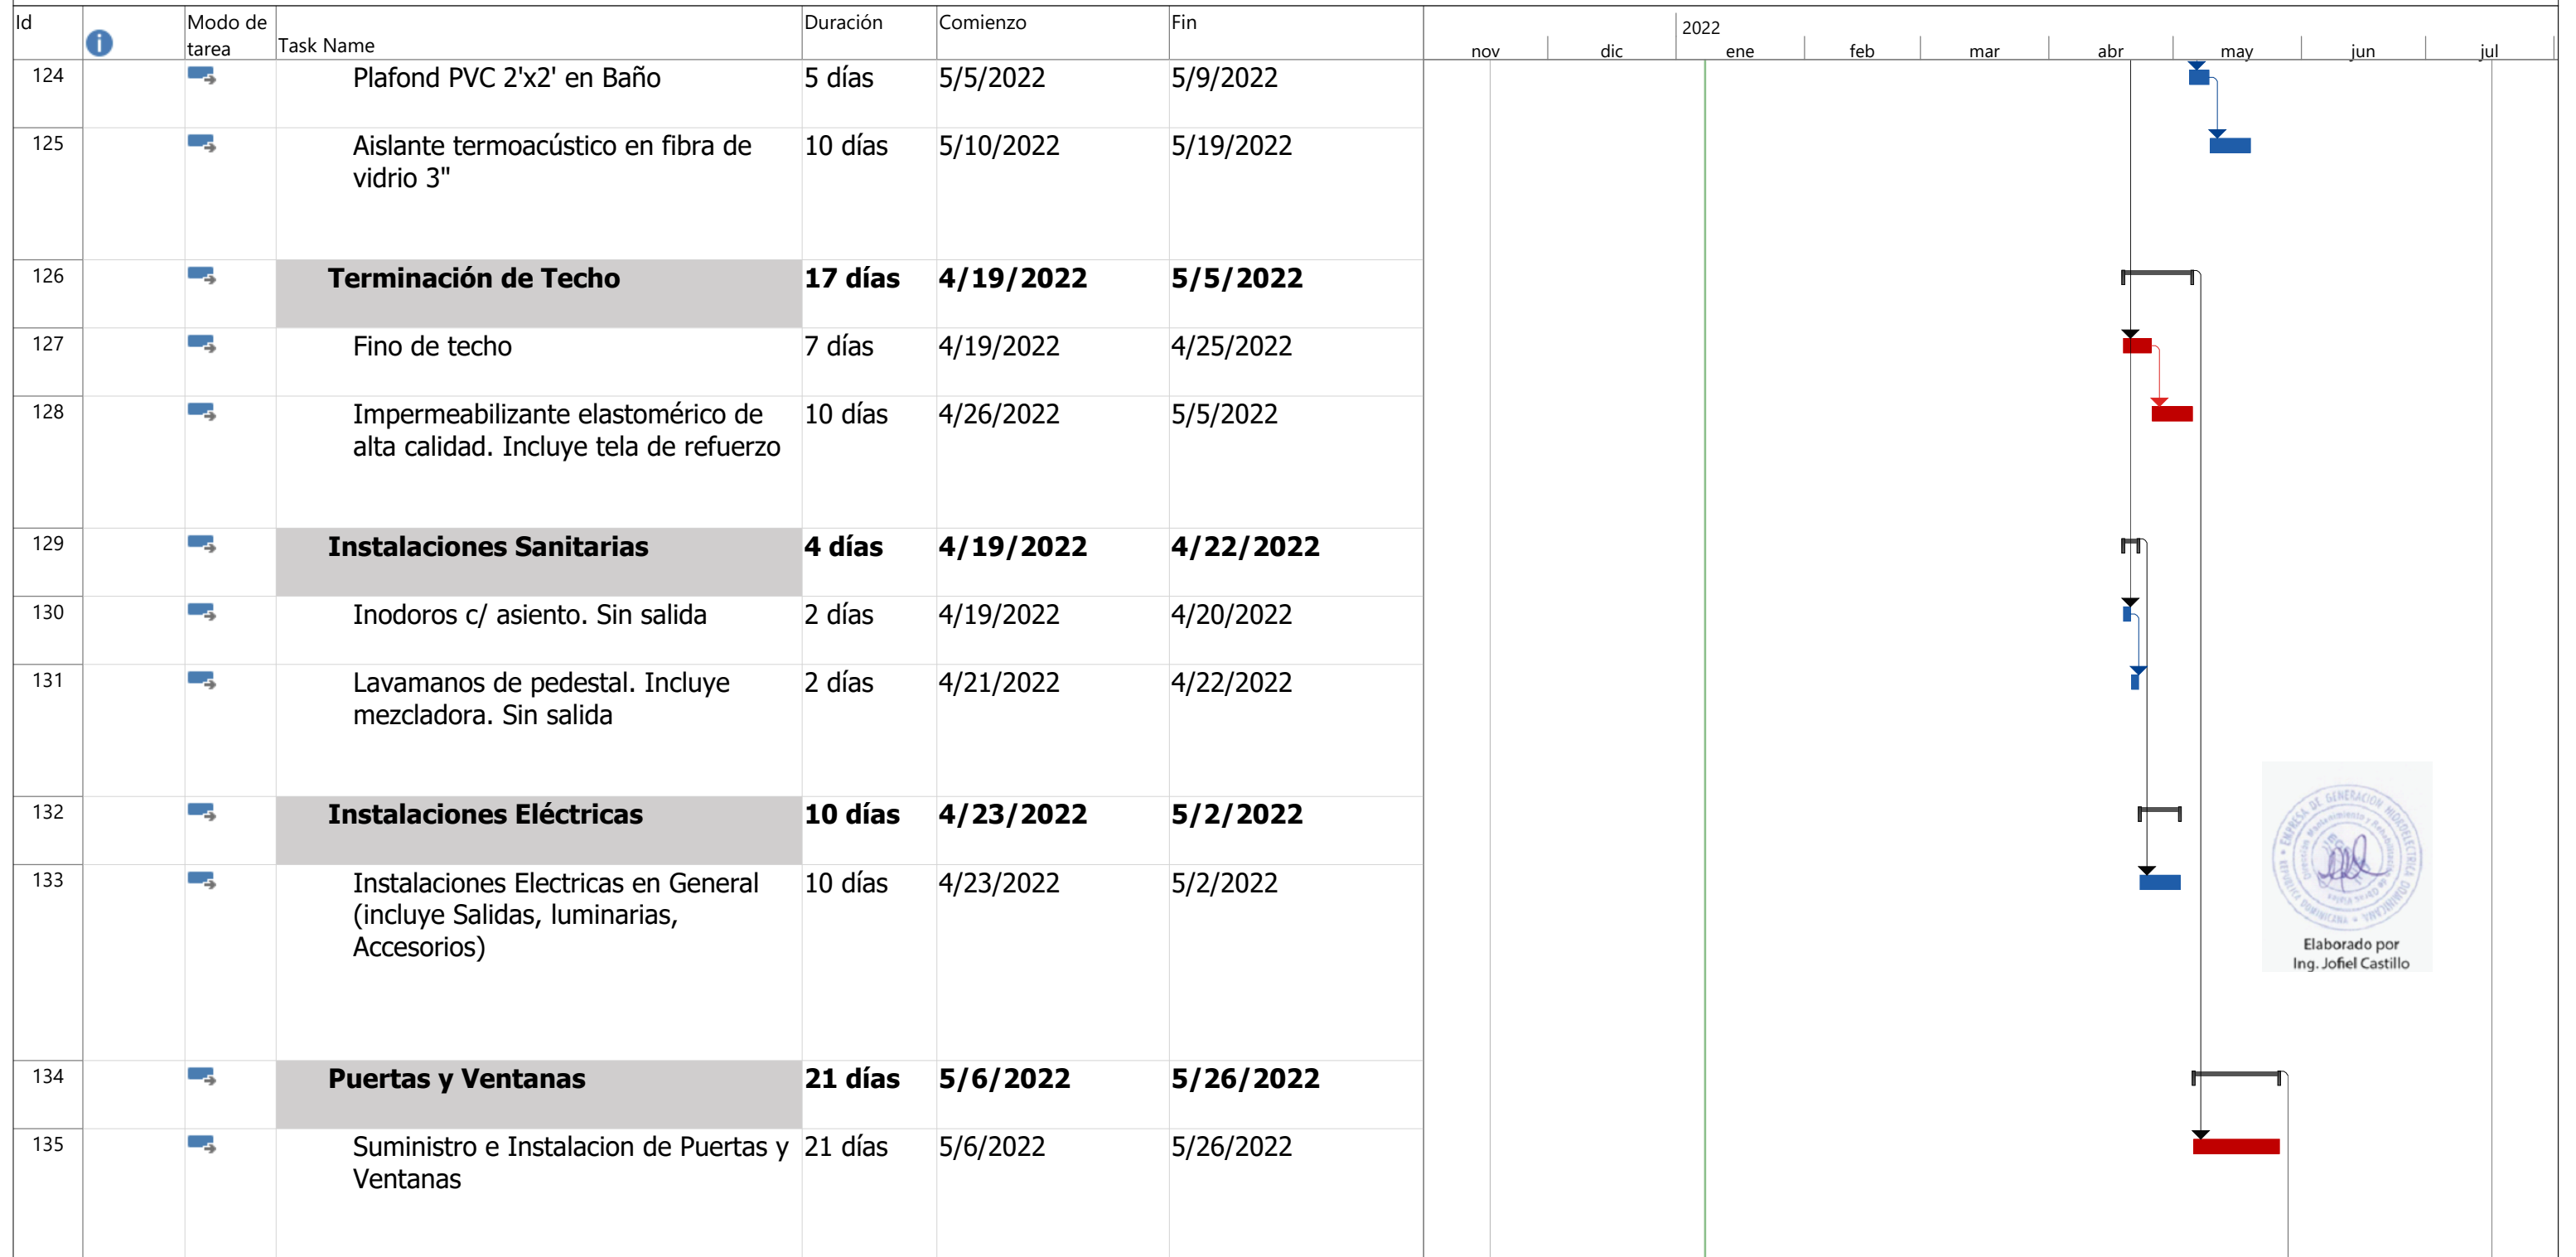

Date: 1/8/2022

División crítica		Project Summary
Task		Inactive Task
Split		Inactive Milestone
Milestone		Inactive Summary
Summary		Manual Task

	Duration-only
	Manual Summary Rollup
	Manual Summary
	Start-only
	Finish-only

	External Tasks
	External Milestone
	Deadline
	Critical
	Critical Split

Progress

Manual Progress

Tareas críticas

Cronograma de ejecución - Reparación Cancha Club - La Salvia, Los Quemados y Blanco - Bonaó															
Id		Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022								
							nov	diciembre	ene	feb	mar	abr	may	jún	jul
136			Pintura	27 días	5/27/2022	6/22/2022									
137			Pintura acrílica en pared interior (2 manos)	7 días	5/27/2022	6/2/2022									
138			Pintura acrílica en pared exterior (2 manos)	5 días	6/3/2022	6/7/2022									
139			Pintura acrílica en techo interior (2 manos)	5 días	6/8/2022	6/12/2022									
140			Pintura verja de hierro de ventana (2 manos)	5 días	6/8/2022	6/12/2022									
141			Pintura acrílica satinada para acera (2 manos)	10 días	6/13/2022	6/22/2022									
142			Paisajismo	7 días	6/23/2022	6/29/2022									
143			Paisajismo en General (incluye siembra de arboles)	7 días	6/23/2022	6/29/2022									
144			Miscelaneos	24 días	6/23/2022	7/16/2022									
145			Acera hormigón frotado	10 días	6/30/2022	7/9/2022									
146			Alambre de púas 3 líneas	5 días	7/10/2022	7/14/2022									

Date: 1/8/2022

División crítica		Project Summary
Task		Inactive Task
Split		Inactive Milestone
Milestone		Inactive Summary
Summary		Manual Task

	Duration-only
	Manual Summary Rollup
	Manual Summary
	Start-only
	Finish-only

	External Tasks
	External Milestone
	Deadline
	Critical
	Critical Split

The diagram illustrates a project management dashboard with three main sections:

- Progress:** Represented by a long grey horizontal bar.
- Manual Progress:** Represented by a small grey diamond icon.
- Tareas críticas:** Represented by a green downward-pointing arrow icon.

Below these sections, there is a red horizontal bar and a row of small red dots.



Cronograma de ejecución - Reparación Cancha Club - La Salvia, Los Quemados y Blanco - Bonao

Id		Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2022											
							nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul			
147			Suministro e Instalacion de Juegos en Exterior	5 días	6/23/2022	6/27/2022												
148			Limpieza final	2 días	7/15/2022	7/16/2022												



Date: 1/8/2022

División crítica		Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress	
Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline		Tareas críticas	
Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
