

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	T	W	T	W	T	F	S	S	Mar 22, '20	S	M	T	W	T	F	S	S	Apr 5, '20	M
1		DIVERSOS DE LA																								
2																										
3																										
4																										
5																										
6			Solución Agua Potable Sector Vista Hermosa y la Plata.																							
7		Trabajos Preliminares:																								
8																										
9			Ingeniería	2 days	Fri 4/24/20	Mon 4/27/20																				
10			Campamento	4 days	Tue 4/28/20	Fri 5/1/20	9																			
11			Limpieza de Cañada	5 days	Mon 5/4/20	Fri 5/8/20	10																			
12		Demolición de Acera	3 days	Mon 5/11/20	Wed 5/13/20	11																				
13		Movimiento de Tierra																								
14																										
15			Excavación para Tubería	2 days	Mon 5/11/20	Tue 5/12/20	11																			
16			Excavación para Manguera	2 days	Mon 5/11/20	Tue 5/12/20	11																			
17		Bote de Material	3 days	Wed 5/13/20	Fri 5/15/20	16																				
18		Miscelaneo																								
19																										
20			Suministro y Colocación de Tuberí de a Ø 2" en línea de impulsión Paso del Tunel.	3 days	Wed 5/13/20	Fri 5/15/20	15																			
21			Suministro y Colocación de Tubería de Ø 3" Hg en línea de descarga Paso del Tunel.	3 days	Wed 5/13/20	Fri 5/15/20	15																			
22		Suministro y Colocación de Manguera Ø 90 mm en línea de Impulsión pn4.	2 days	Wed 5/13/20	Thu 5/14/20	15																				
23		Suministtro y Colocación Tubería Ø 3" PVC SDR-26 para empalme línea de	2 days	Wed 5/13/20	Thu 5/14/20	15																				
Proyecto: Vista hermosa, la plat		Tarea		Resumen del proyecto			Tarea manual		solo el comienzo			Fecha límite														
Fecha: Wed 3/18/20		División		Tarea inactiva			solo duración		solo fin			Progreso														
		Hito		Hito inactivo			Informe de resumen manual		Tareas externas			Progreso manual														
		Resumen		Resumen inactivo			Resumen manual		Hito externo																	
														Página 1												



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	T	W	T	W	T	F	S	Mar 22, '20	Mar 29, '20	Apr 5, '20
24	📌	Suministro y Colocación de Piezas Especiales para empalme varios en Hg y Pvc.	2 days	Wed 5/13/20	Thu 5/14/20 15												
25	📌	Perforación de (1) Pozo con maquina de rotación para abastecimiento de agua en diametro de 8 pulgs. Para ser encamisado en tubería de hierro negro de 6 pulgs. Con un espesor de 1/4", incluye	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	16											
26	📌	Suministro y Colocación Valvula de Ø 2" en Hg.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20 24												
27	📌	Suministro y Colocación de Valvula de Ø 3" en Hg	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20 24												
28	📌	Suministro e Instalación de Bomba Sumergible monofásica de 3HP, Incluye Bomba Sumergible con su caja de control, tubería de 1de presión, alambre de vinil 10/3, tubos eléctricos de 3/4", alambre eléctrico No. 8, tapa de seguridad para pozo, cable de acero	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20 24												
29	📌	Suministro Switch de seguridad de 50 amp. , incluye alambrado desde transformador hasta Bomba.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20 24												
30	📌	Mano de Obra Switch de seguridad de 50 amp. Incluye alambrado desde transformador hasta la	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20 24												
31	📌	Suministtro de Postes de Luz de 35 DAN	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20 25												
32	📌	Instalación de Postes de 35 DAN, incluye hincado	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20 25												
33	📌	Suministro e Instalación Herrajes Postes de Luz de 35	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20 25												
34	📌	Suministro Transformador de 15 KVA incluye instalación.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20 33												
35	📌	Suministro e Instalación de Cutao y Pararrayos.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20 33												
Proyecto: Vista hermosa, la plat Fecha: Wed 3/18/20 Tarea División Hito Resumen Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual																	
Elaborado por Ing. Jofiel Castillo																	
Página 2																	

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names							
36		Suministro de alambrado Triple AAA 1/0.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	33								
37		Instalación Tendido Eléctrico.	2 days	Fri 5/15/20	Mon 5/18/20	33								
38		Transporte Postes de Luz (5unds.).	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	33								
39		Acera de Hormigón	2 days	Mon 5/18/20	Tue 5/19/20	35								
40		Construcción de Zaabaleta de Protección a Tubería Hg Paso del Tunel.	2 days	Mon 5/18/20	Tue 5/19/20	35								
41														
42														
43		Caseta de Bombeo												
44		Replanteo y Nivelación.	1 day	Mon 5/4/20	Mon 5/4/20	10								
45		Platea de Fundación	2 days	Tue 5/5/20	Wed 5/6/20	44								
46		Dinteles	2 days	Thu 5/7/20	Fri 5/8/20	45								
47		Losa de Techo de Ø 3/8 " a 0.15m en AD doblemente armada.	3 days	Mon 5/11/20	Wed 5/13/20	46								
48		Blocks de 6" SNP	1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20	45								
49		Pañete en Muros	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	48								
50		Pañete en Techo.	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	48								
51		Piso de Hormigón Frotado.	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50								
52		Suministro y Colocación de Puerta Enrollable	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	51								
53		Pintura Acrílica en Muro.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	51								
54		Pintura Económica en Techo	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	51								
55		Salida de Luces Genitales	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50								
56		Interruptores Sencillos	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50								
57		Tomacorriente Doble 120V, Polarizado	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50								
58		Caja de Breakers de 2 a 4	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50								
59		Mano Obra de Electricidad	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50								
60		Tubería y Piezas	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50								
61		Limpieza Final	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	60								
62														
63		Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en el Sector La Movimiento de Tierra.												
64														
65		Construcción Terracería.	2 days	Tue 5/5/20	Wed 5/6/20	44								

Proyecto: Vista hermosa, la plat

Fecha: Wed 3/18/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Elaborado por

Ing. Jofel Castillo

Mar 22, '20

Mar 29, '20

Apr 5, '20

T

W

T

W

T

F

S

S

M

Página 3

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	T	W	T	W	T	F	S	Mar 22, '20	Mar 29, '20	Apr 5, '20
66		Excavación para desplante de estructura.	2 days	Thu 5/7/20	Fri 5/8/20	65											
67		Bote de Material.	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20												
68		Hormigón Armado f'c=210 kg/cm² en:															
69		Base de Fondo Ø1/2" a 0.15m en AD doblemente armada.	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	66											
70		Riostras.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	69											
71		Losa de Techo Ø 3/8" a 0.15 m en AD doblemente	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	69											
72		Muros Laterales Ø1/2" a 0.20 m en AD.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	69											
73		Fraguache	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	72											
74		Pañete Interior a Punta de Llave	2 days	Thu 5/14/20	Fri 5/15/20	73											
75		Pañete exterior.	2 days	Thu 5/14/20	Fri 5/15/20	73											
76		Cantos General.	2 days	Thu 5/14/20	Fri 5/15/20	73											
77		Zabaleta.	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	73											
78		Pintura.	2 days	Fri 5/15/20	Mon 5/18/20	77											
79		Suministro y colocación de Tapa Pesada (1.00 x 1.00) en registro de techo (incluye	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	77											
80		Suministro y colocación de Escalera Exterior de 10' en angular 2 x 3/16, empotrada.	2 days	Fri 5/15/20	Mon 5/18/20	77											
81		Suministro y Colocación de Escalera Interior de 10' en Acero Inoxidable.	2 days	Fri 5/15/20	Mon 5/18/20	77											
82																	
83		Miscelaneos:															
84		Excavación para Tuberías.	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	66											
85		Relleno de Reposición.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	84											
86		Bote de Material.	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	85											
87		Suministro y Colocación de Tubería de Ø 2" en línea de impulsión.	2 days	Tue 5/12/20	Wed 5/13/20	84											
88		Suministro y Colocación de Tubería de Ø 3" HG en línea de descarga.	2 days	Tue 5/12/20	Wed 5/13/20	84											
89		Suministro y Colocación de Clan 3 x 1/2".	2 days	Tue 5/12/20	Wed 5/13/20	84											
Proyecto: Vista hermosa, la plaza Fecha: Wed 3/18/20 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual Elaborado por Ing. Jofiel Castillo Página 4																	

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names														
90		Suministro y Colocación Tubería Ø 3" PVC SDR-26 para empalme de distribución.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	84															
91		Suministro y Colocación de Tubería de 1/2" acometidas.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	84															
92		Suministro e Instalación de Bomba Sumergible monofásica de 3 HP, incluye Bomba Sumergible con su caja de control, tubería de 1" de Presión, alambre eléctrico No. 8, tapa de seguridad para pozo, soga de nylon y demás accesorios e instalación de	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91															
93		SuministroSwitch de seguridad de 50 amp. Incluye alambrado desde	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91															
94		Transformador hasta Bomba. Mano Obra Switch de seguridad de 50 amp. Incluye alambrado desde	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91															
95		Suministro de Postes de 35 DA	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91															
96		Instalación Postes de Luz de 35 DAN, incluye hincado.	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91															
97		Suministro e Instalación Herrajes Postes de Luz de 35	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91															
98		Suministro Transformador de 15 KVA incluye instalación.	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91															
99		Suministro e Instalación Cutao y Pararrayos.	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91															
100		Suministro Alambrado Triple AAA 1/0.	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91															
101		Instalación Tendido Eléctrico.	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	100															
102		Transporte Postes de Luz (5Uc	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	100															
103		Suministro y Colocación de Alcantarilla de 42" clase 3, (incluye movimiento de	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91															
104																					
105		Caseta de Bombeo																			
106		Replanteo y Nivelación.	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	44															
107		Platea de Fundación	1 day	Wed 5/6/20	Wed 5/6/20	106															
Proyecto: Vista hermosa, la plat Fecha: Wed 3/18/20								Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual													

T

W

T

F

S

Apr 12, '20

S

M

T

W

T

F

S

Apr 19, '20

S

M

T

W

T

F

S

Apr 26, '20

S

M

T

W

T

F

S

May 3, '20

S

M

T

W

T

F

S

May 10, '20

S

M

T

W

T

F

S

May 17, '20

S

M

T

W

T




Proyecto: Vista hermosa, la plat Fecha: Wed 3/18/20	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

[illegible]




Proyecto: Vista hermosa, la plat Fecha: Wed 3/18/20	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

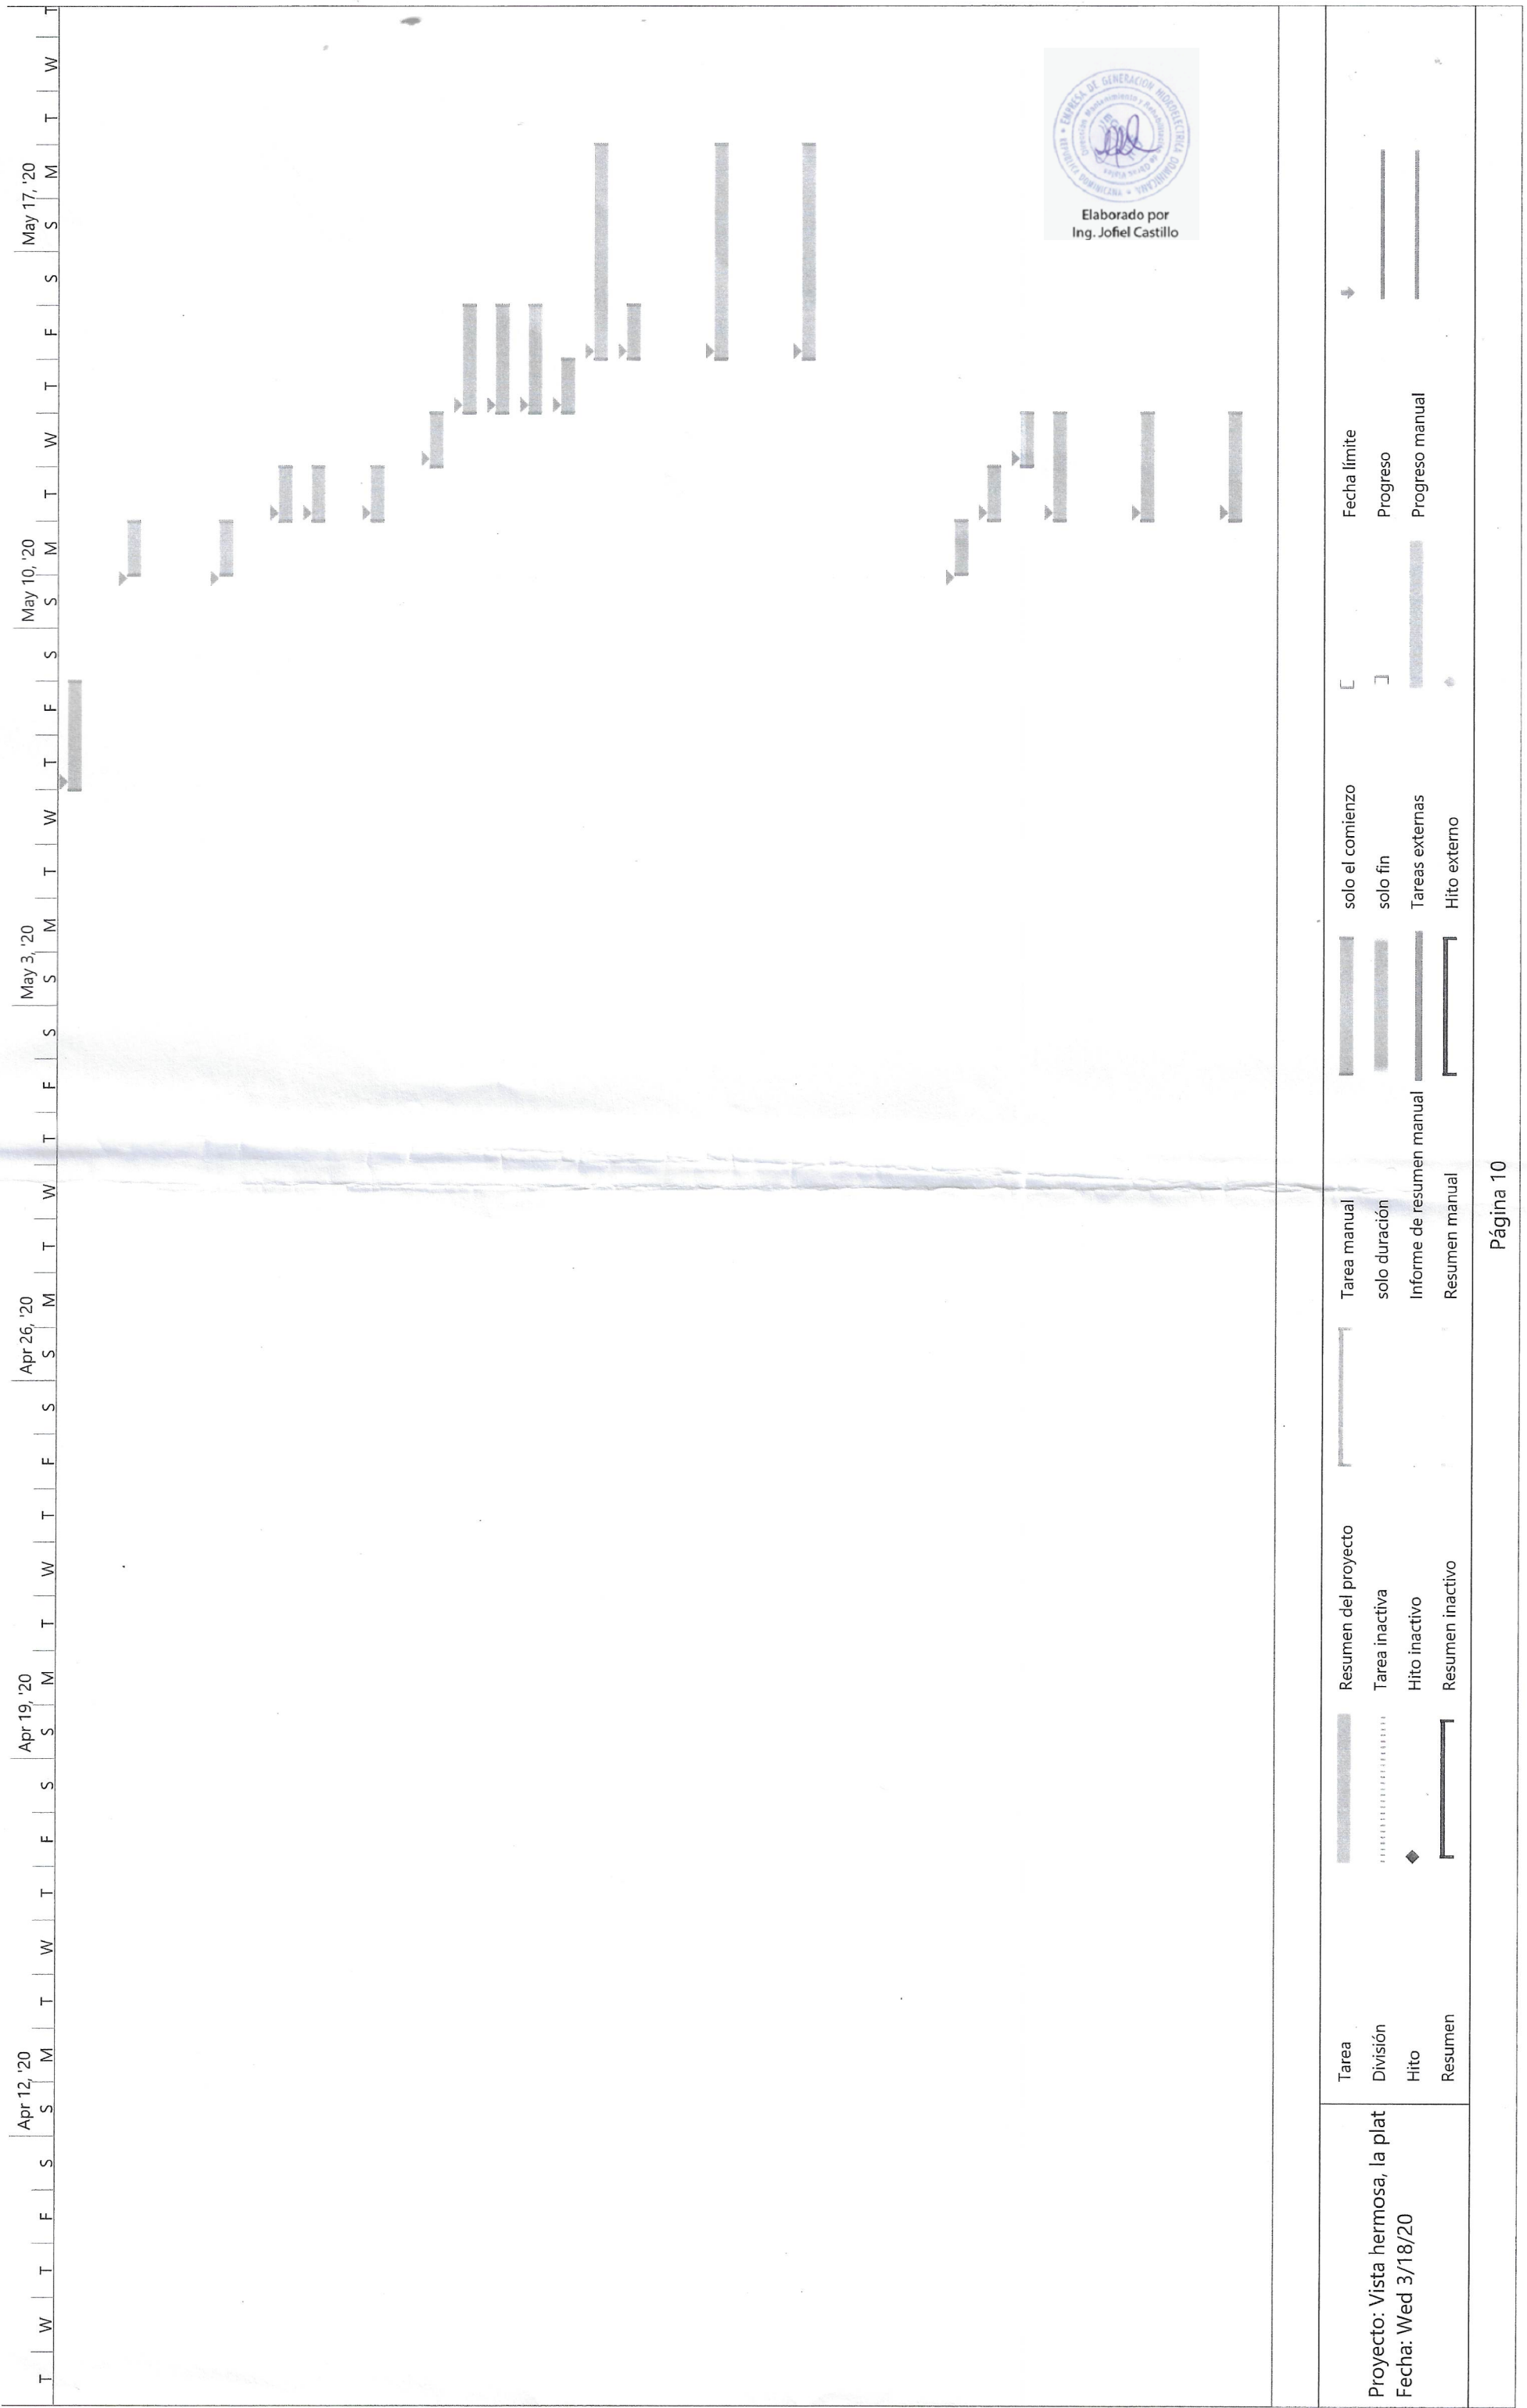



Proyecto: Vista hermosa, la plat Fecha: Wed 3/18/20	Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
	División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
	Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
	Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

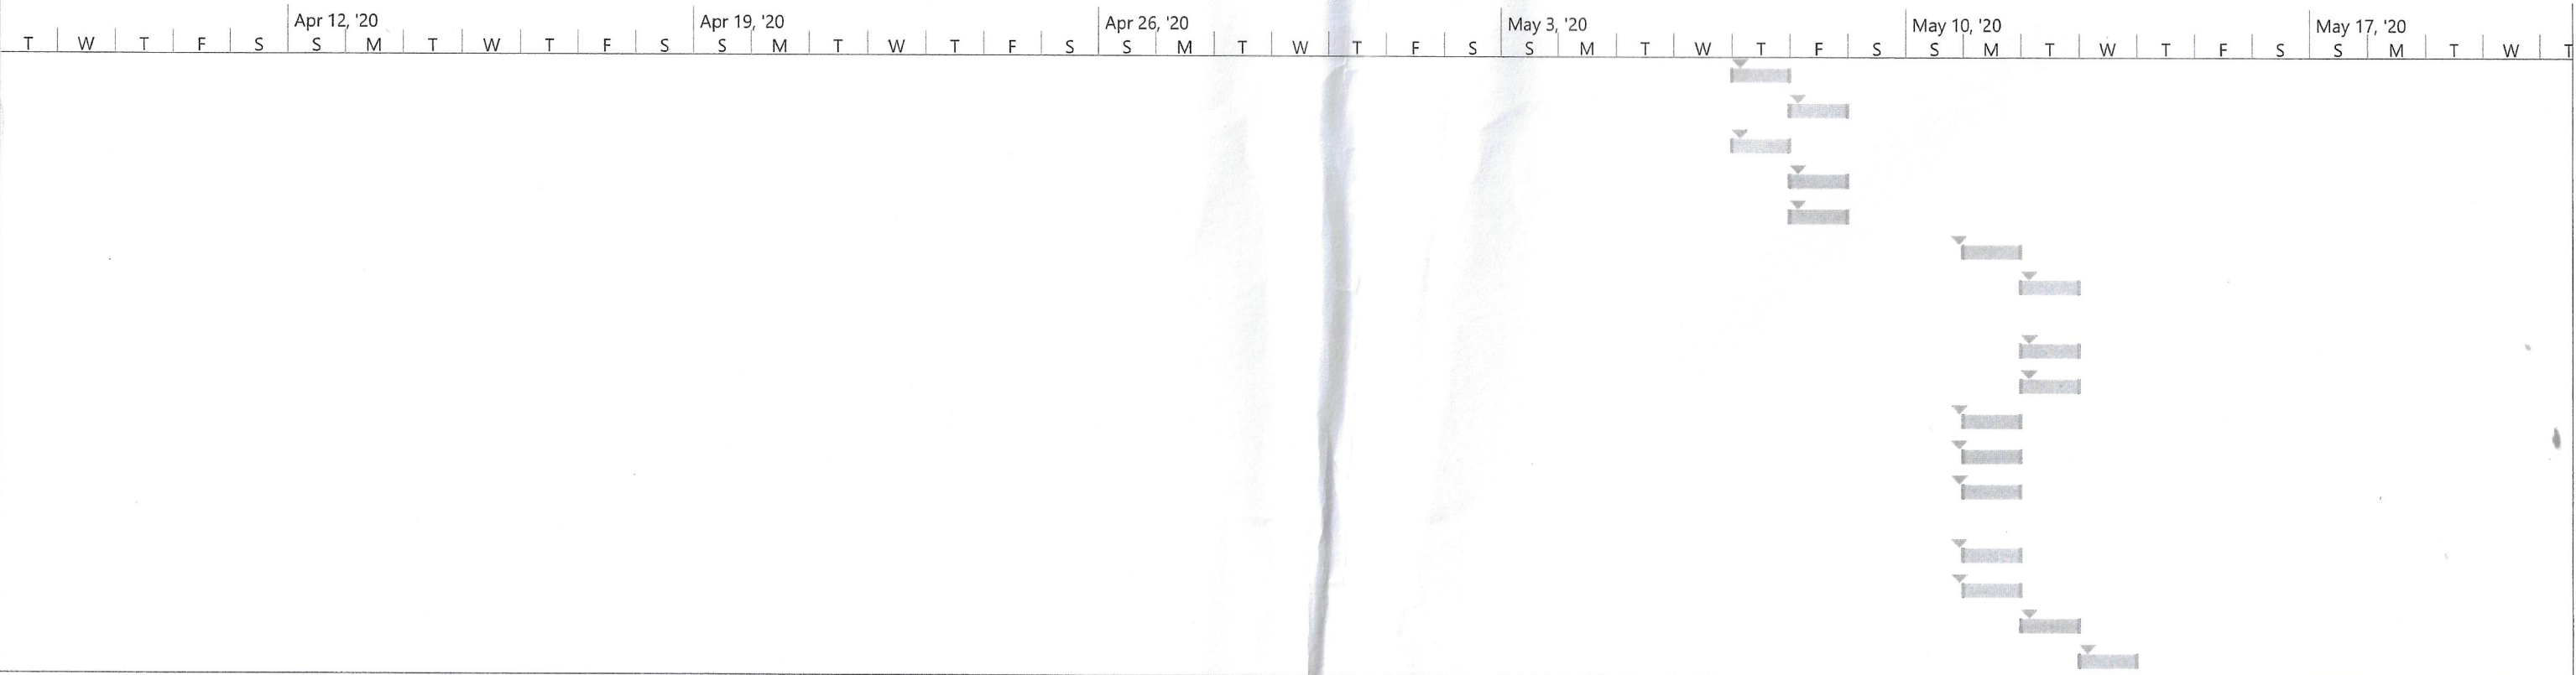

Proyecto: Vista hermosa, la plat Fecha: Wed 3/18/20	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
