


ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	T	W	T	W	T	F	S	S	M	Mar 22, '20	S	M	Mar 29, '20	S	F	S	S	M	Apr 5, '20
1	?	DIVERSOS DE																								
2	?	LA																								
3	?	Solución Agua																								
4	?	Potable Sector																								
5	?	Vista Hermosa y																								
6	?	la Plata.																								
7	?	Trabajos Preliminares:																								
8	?	Ingeniería	2 days	Fri 4/24/20	Mon 4/27/20																					
9	?	Campamento	4 days	Tue 4/28/20	Fri 5/1/20	9																				
10	?	Limpieza de Cañada	5 days	Mon 5/4/20	Fri 5/8/20	10																				
11	?	Demolición de Acera	3 days	Mon 5/11/20	Wed 5/13/20	11																				
12	?	Movimiento de Tierra																								
13	?	Excavación para Tubería	2 days	Mon 5/11/20	Tue 5/12/20	11																				
14	?	Excavación para Manguera	2 days	Mon 5/11/20	Tue 5/12/20	11																				
15	?	Bote de Material	3 days	Wed 5/13/20	Fri 5/15/20	16																				
16	?	Miscelaneo																								
17	?	Suministro y Colocación de Tubería de a Ø 2" en línea de impulsión Paso del Tunnel.	3 days	Wed 5/13/20	Fri 5/15/20	15																				
18	?	Suministro y Colocación de Tubería de Ø 3" Hg en línea de descarga Paso del Tunnel.	3 days	Wed 5/13/20	Fri 5/15/20	15																				
19	?	Suministro y Colocación de Manguera Ø 90 mm en línea de impulsión pn4.	2 days	Wed 5/13/20	Thu 5/14/20	15																				
20	?	Suministro y Colocación de Tubería Ø 3" PVC SDR-26 para empalme línea de	2 days	Wed 5/13/20	Thu 5/14/20	15																				
21	?																									
22	?																									
23	?																									



Proyecto: Vista hermosa, la plata
 Fecha: Wed 3/18/20

Tarea [Bar chart icon] Resumen del proyecto
División [Dotted line icon] Tarea inactiva
Hito [Diamond icon] Hito inactivo
Resumen [Bracket icon] Resumen inactivo

Tarea manual [Bar chart icon] solo el comienzo
solo duración [Bar chart icon] solo fin
Informe de resumen manual [Bar chart icon] Tareas externas
Resumen manual [Bracket icon] Hito externo

Fecha límite [Arrow icon] Progreso
Progreso [Bar chart icon] Progreso manual

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	T	W	T	W	T	F	S	Mar 22, '20	S	M	T	W	T	F	S	Mar 29, '20	S	M	T	W	T	F	S	Apr 5, '20	S	M	
24	✦	Suministro y Colocación de Piezas Especiales para empalme varios en Hg y Pvc.	2 days	Wed 5/13/20	Thu 5/14/20	15																												
25	✦	Perforación de (1) Pozo con maquina de rotación para abastecimiento de agua en diametro de 8 pulgs. Para ser encamisado en tubería de hierro negro de 6 pulgs. Con un espesor de 1/4", incluye	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	16																												
26	✦	Suministro y Colocación Valvula de Ø 2" en Hg.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																												
27	✦	Suministro y Colocación de Valvula de Ø 3" en Hg	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																												
28	✦	Suministro e Instalación de Bomba Sumergible monofásica de 3HP, Incluye Bomba Sumergible con su caja de control, tubería de 1de presión, alambre de vinil 10/3, tubos eléctricos de 3/4", alambre eléctrico No. 8, tapa de seguridad para pozo, cable de acero	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																												
29	✦	Suministro Switch de seguridad de 50 amp. , incluye alambrado desde trasformador hasta Bomba.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																												
30	✦	Mano de Obra Switch de seguridad de 50 amp. Incluye alambrado desde transformador hasta la	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																												
31	✦	Suministro de Postes de Luz de 35 DAN	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	25																												
32	✦	Instalación de Postes de 35 DAN, incluye hincado	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	25																												
33	✦	Suministro e Instalación Herrajes Postes de Luz de 35	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	25																												
34	✦	Suministro Transformador de 15 KVA incluye instalación.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	33																												
35	✦	Suministro e Instalación de Cutao y Pararrayos.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	33																												




Proyecto: Vista hermosa, la plat	Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite
Fecha: Wed 3/18/20	División	Tarea inactiva	solo duración	Progreso
	Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Progreso manual
	Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	
			solo el comienzo	
			solo fin	
			Tareas externas	
			Hito externo	


ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
90	★	Suministro y Colocación Tubería Ø 3" PVC SDR-26 para empalme de distribución.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	84	
91	★	Suministro y Colocación de Tubería de 1/2" acometidas.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	84	
92	★	Suministro e Instalación de Bomba Sumergible monofásica de 3 HP, incluye Bomba Sumergible con su caja de control, tubería de 1" de Presión, alambre eléctrico No. 8, tapa de seguridad para pozo, sogas de nylon y demás accesorios e instalación de	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
93	★	Suministro Switch de seguridad de 50 amp. Incluye alambrado desde	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
94	★	Transformador hasta Bomba. Mano Obra Switch de seguridad de 50 amp. Incluye alambrado desde	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
95	★	transformador hasta Bomba. Suministro de Postes de 35 Df1	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
96	★	Instalación Postes de Luz de 35 DAN, incluye hincado.	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
97	★	Suministro e Instalación Herrajes Postes de Luz de 35	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
98	★	Suministro Transformador de 15 KVA incluye instalación.	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
99	★	Suministro e Instalación Cutao y Pararrayos.	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
100	★	Suministro Alambrado Triple AAA 1/0.	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
101	★	Instalación Tendido Eléctrico.	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	100	
102	★	Transporte Postes de Luz (5Uc1	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	100	
103	★	Suministro y Colocación de Alcantarilla de 42" clase 3, (incluye movimiento de	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
104	★						
105	?	Caseta de Bombeo					
106	★	Replanteo y Nivelación.	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	44	
107	★	Plata de Fundación	1 day	Wed 5/6/20	Wed 5/6/20	106	




Proyecto: Vista hermosa, la plat
 Fecha: Wed 3/18/20

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha limite
Division	Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito	Hito inactivo	solo fin	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Tareas externas	
		Hito externo	

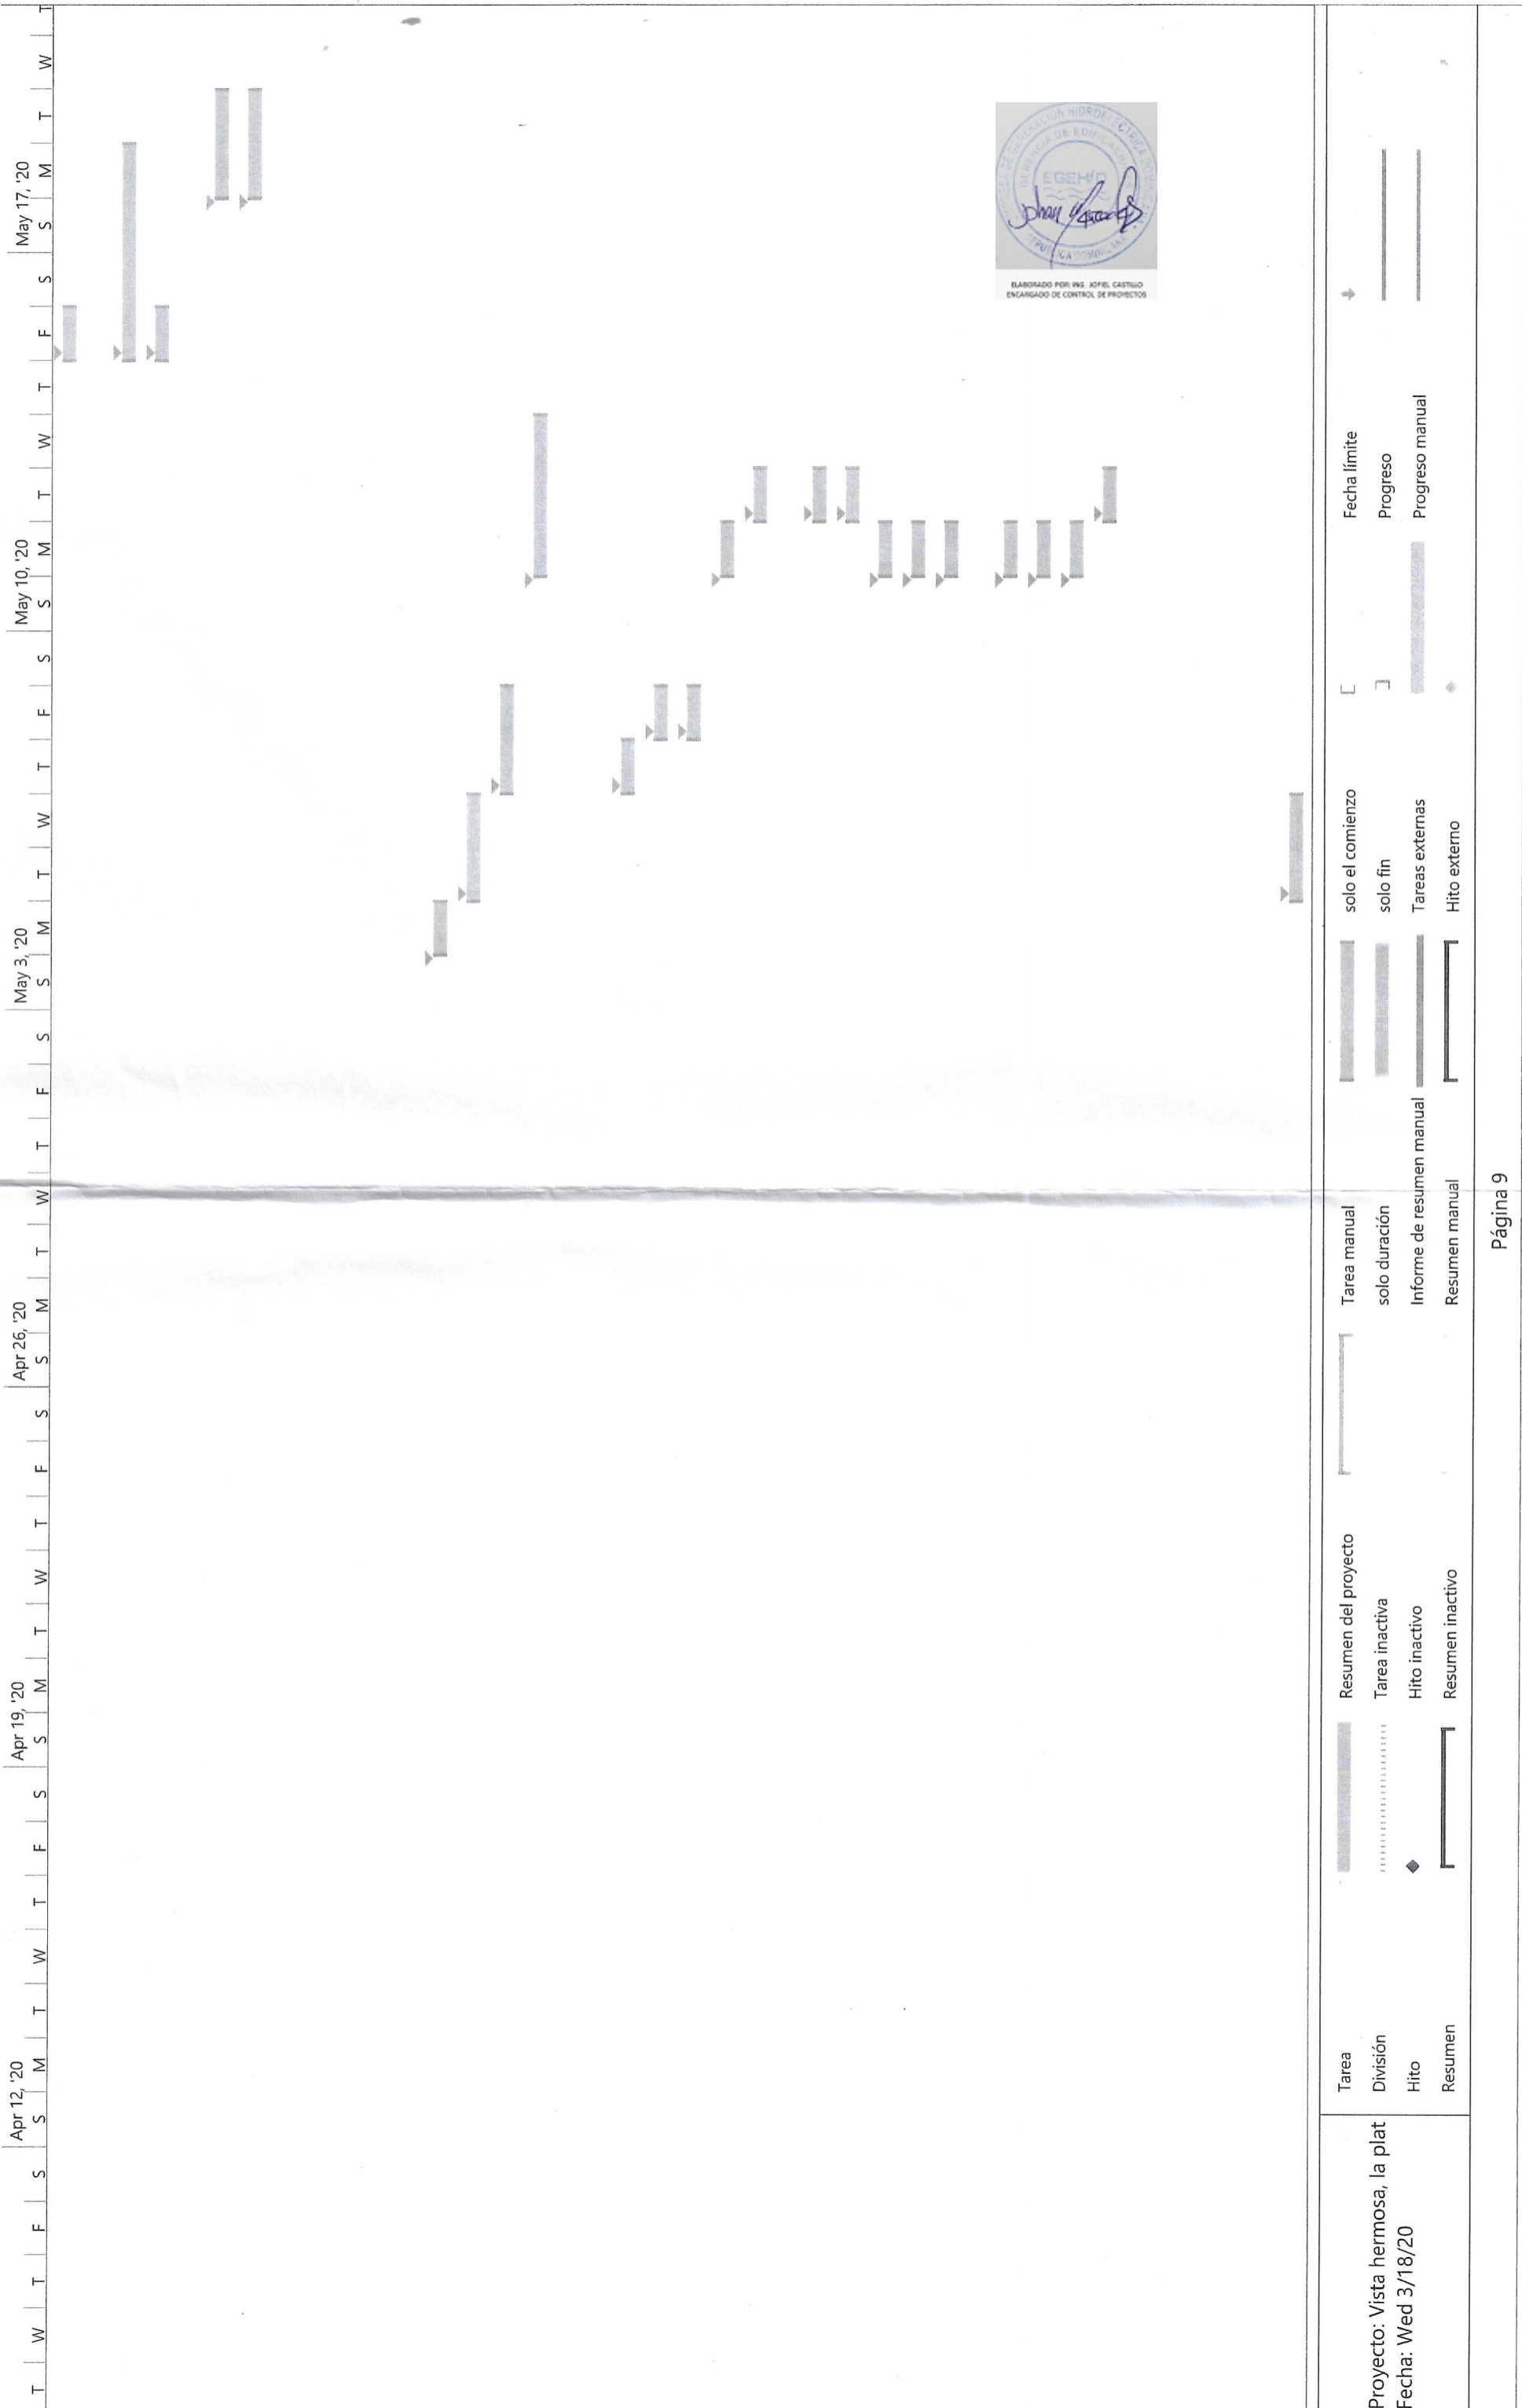

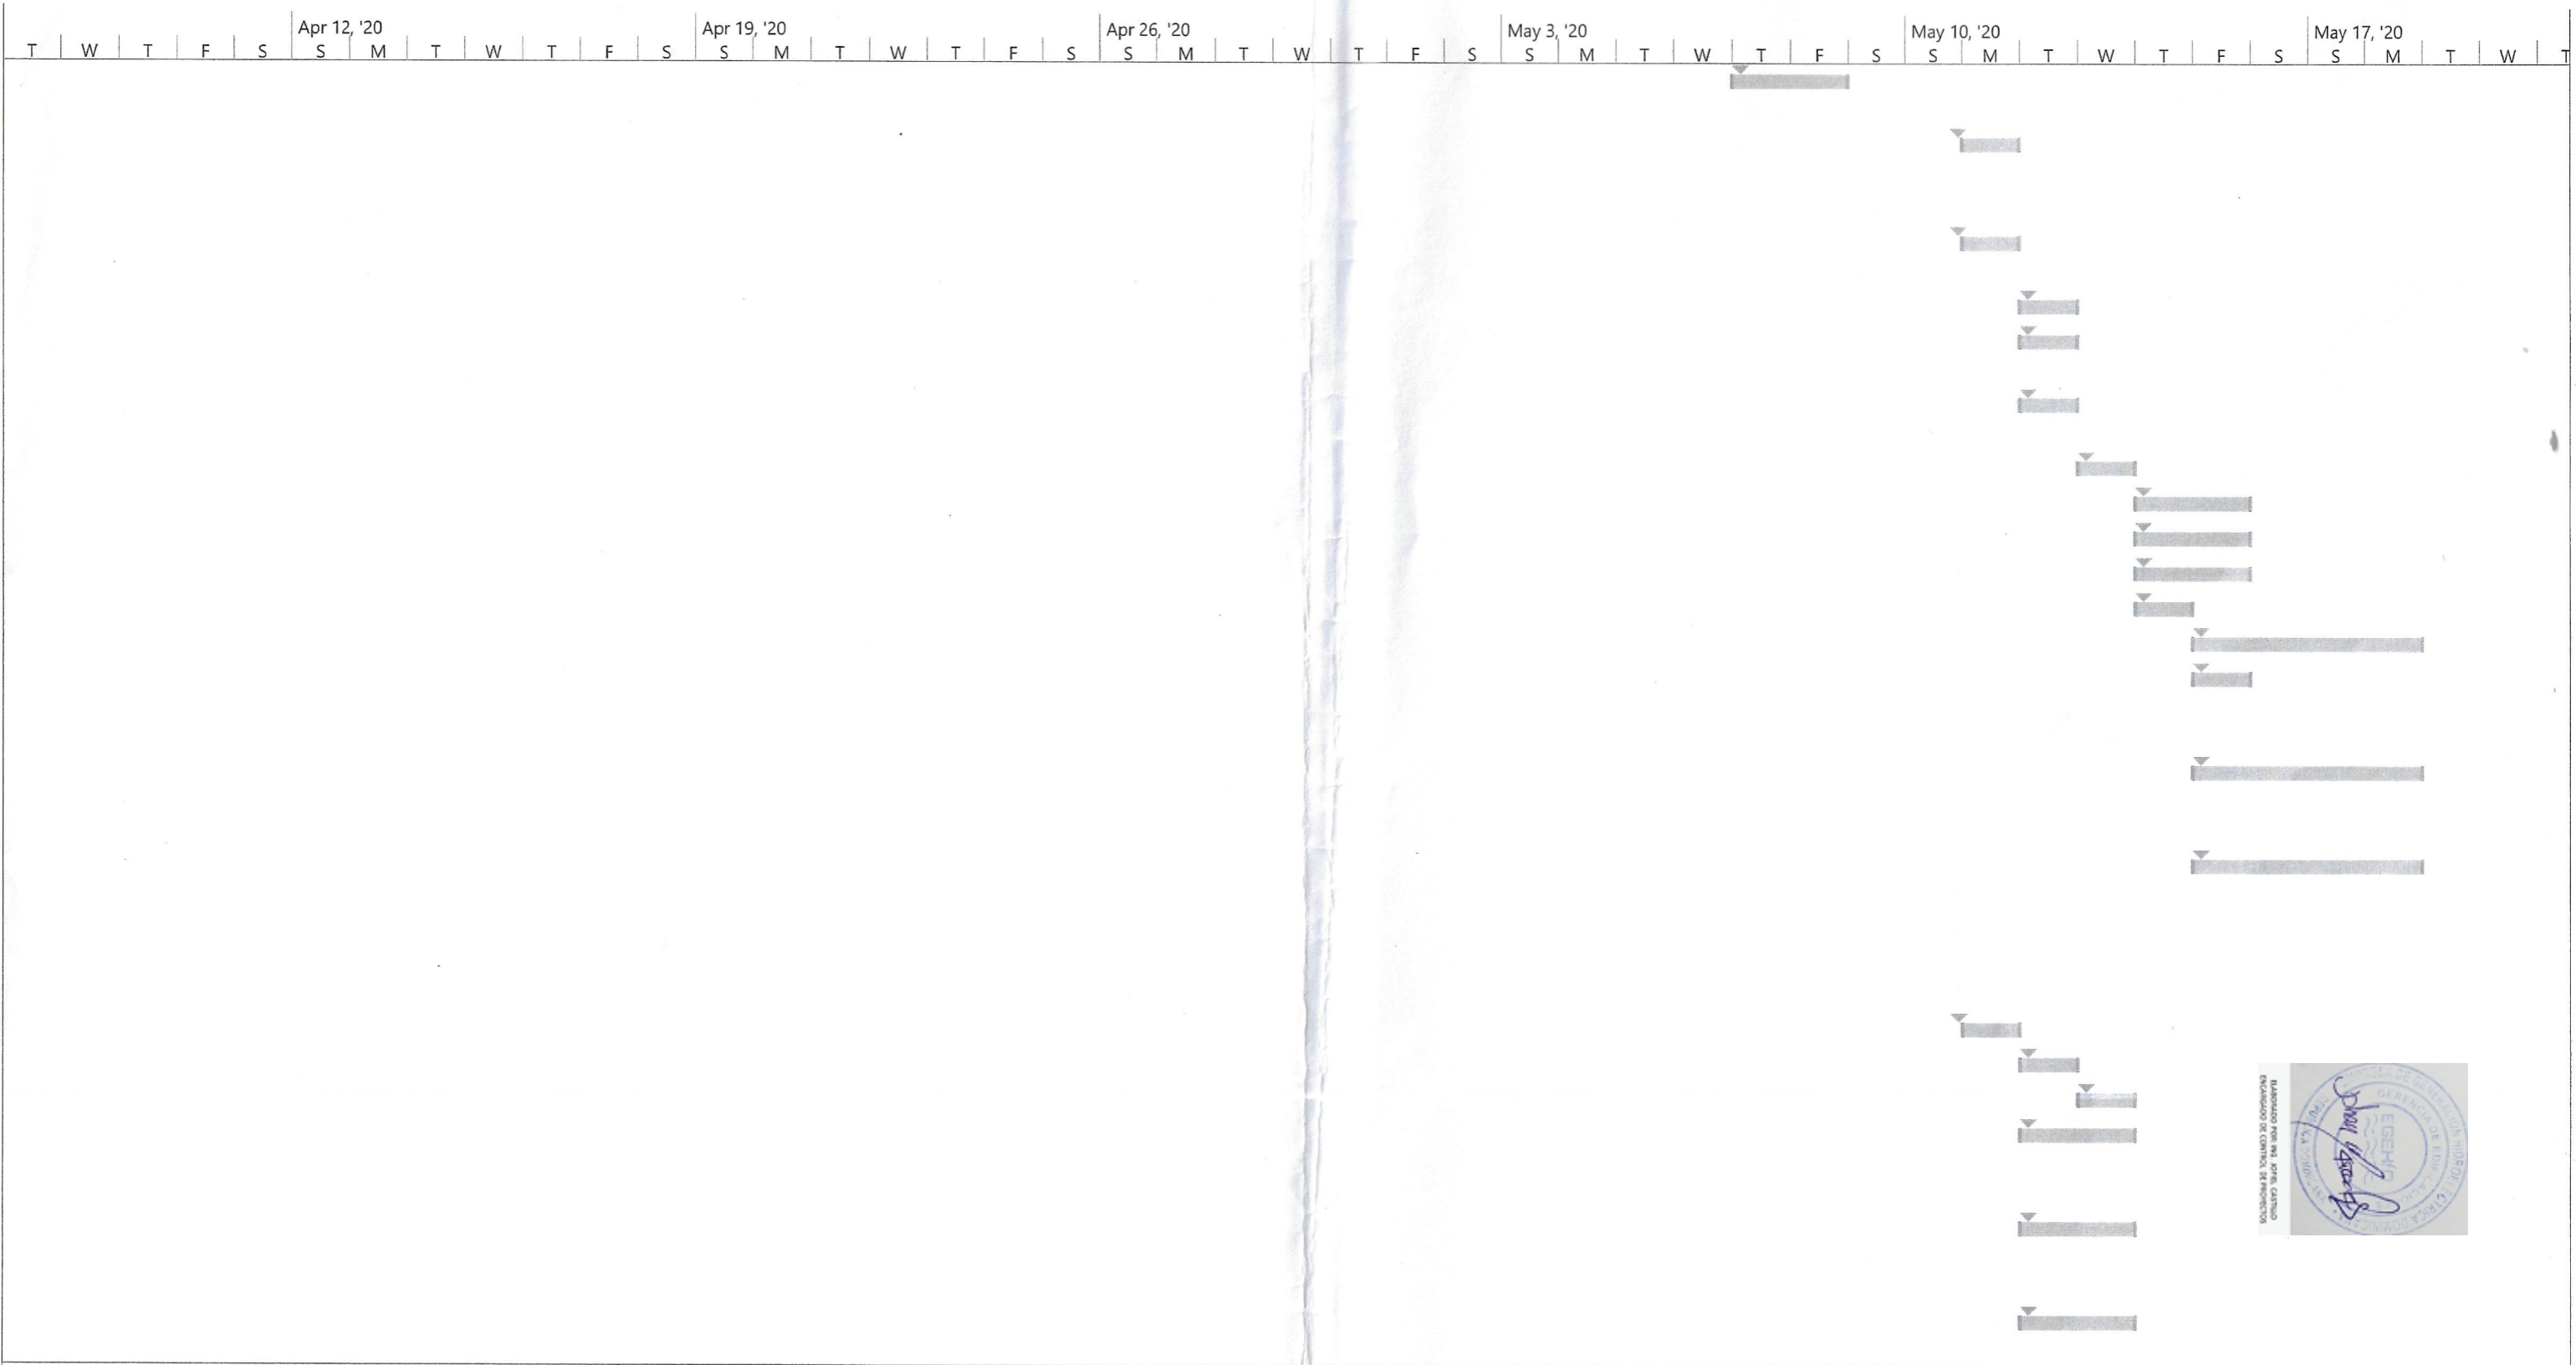


Proyecto: Vista hermosa, la plat Fecha: Wed 3/18/20	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

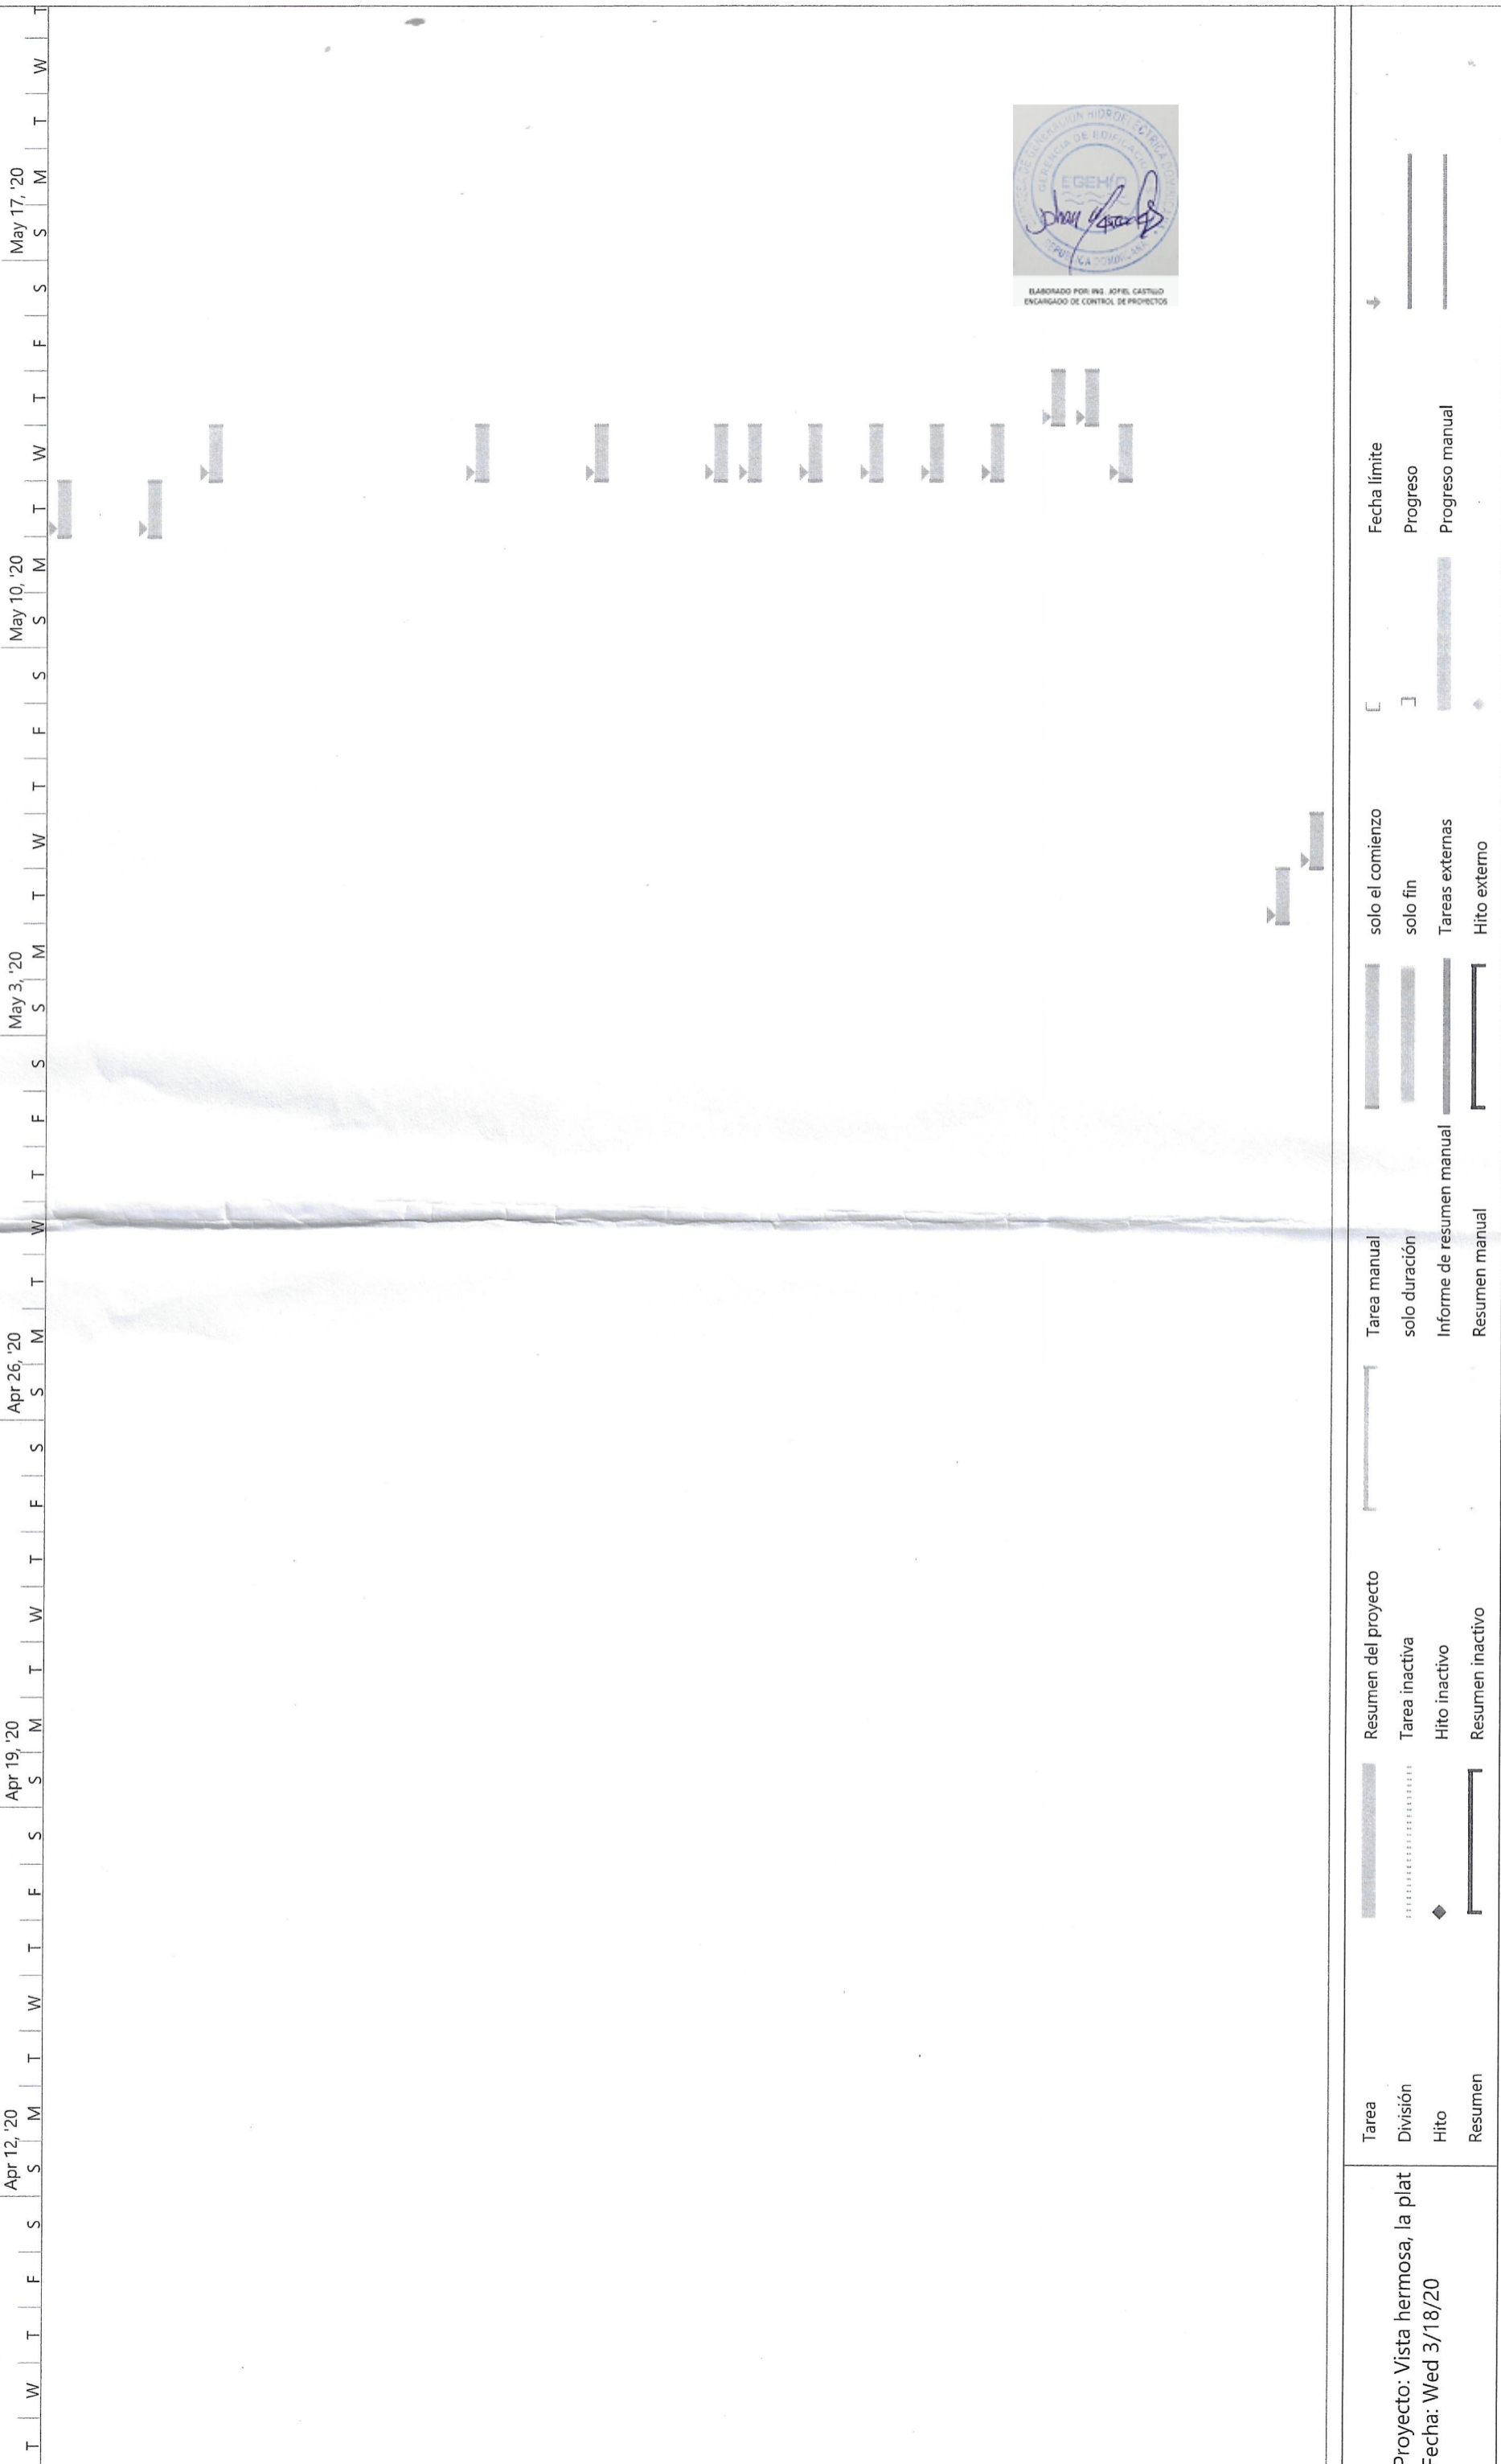

Proyecto: Vista hermosa, la plat
 Fecha: Wed 3/18/20

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha limite
División	Tarea inactiva	solo duracion	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

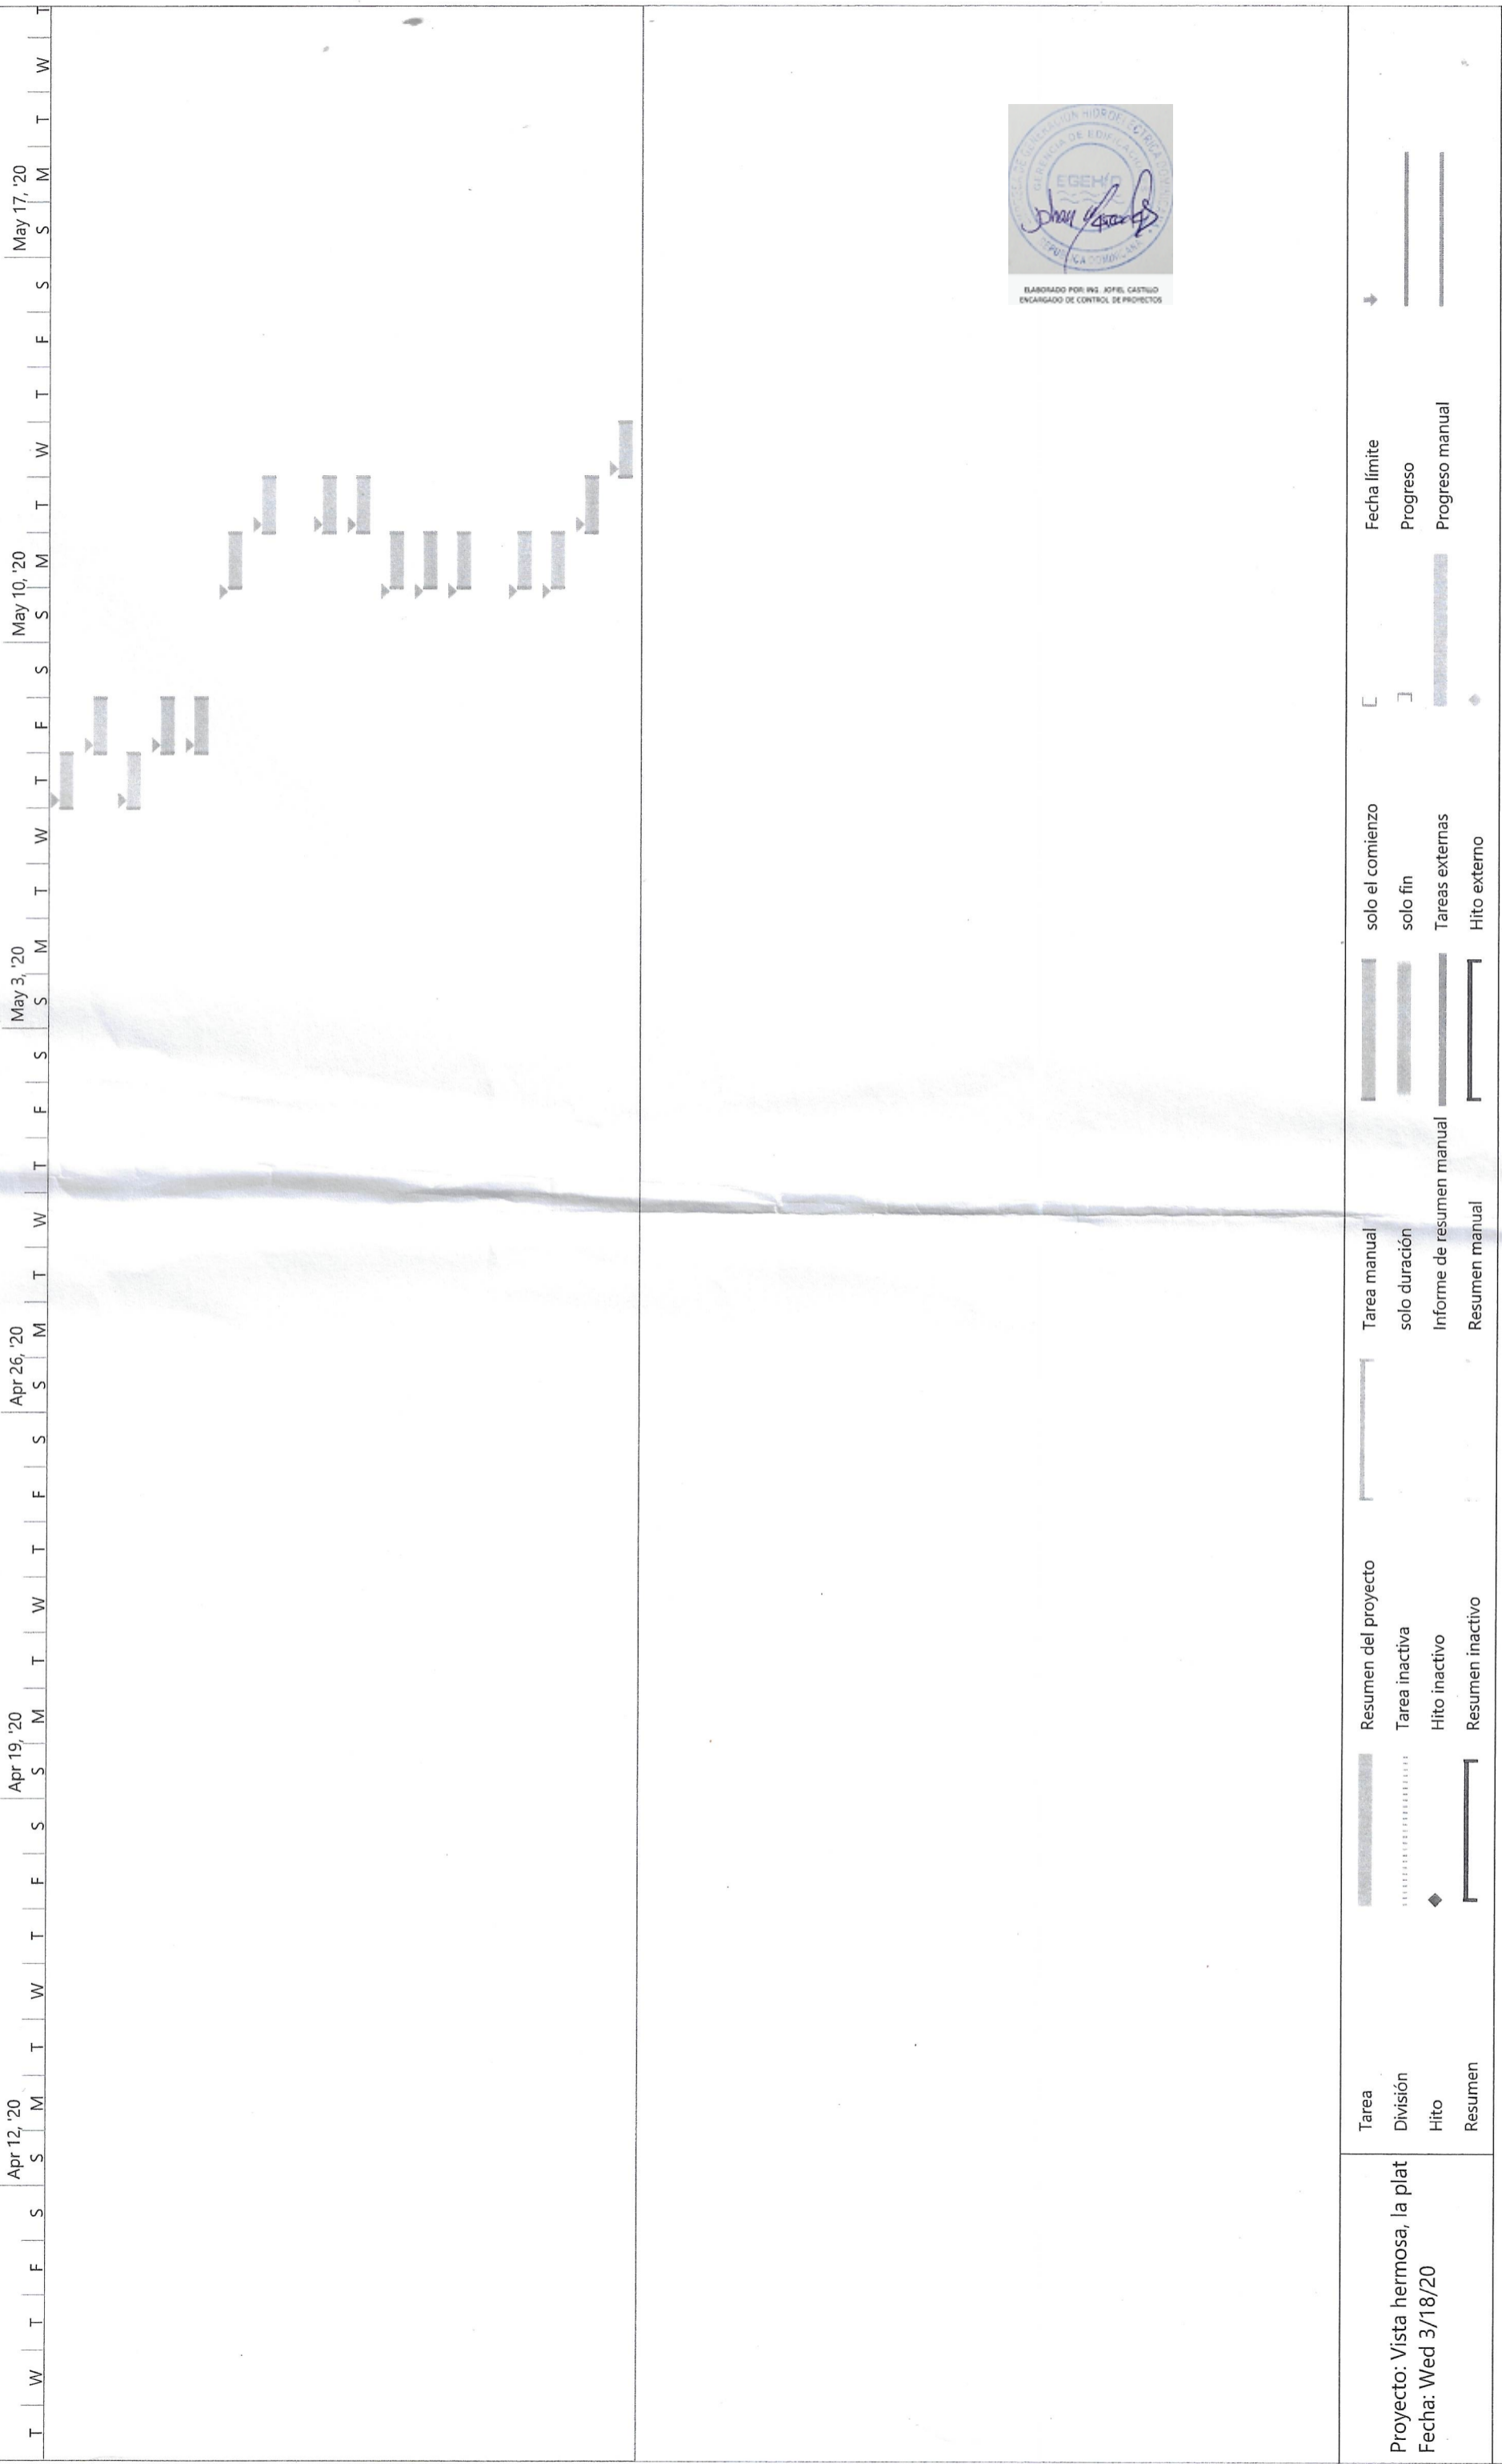

Proyecto: Vista hermosa, la plat
 Fecha: Wed 3/18/20

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite
Division	Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito	Hito inactivo	solo fin	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Tareas externas	
		Hito externo	
