


IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO

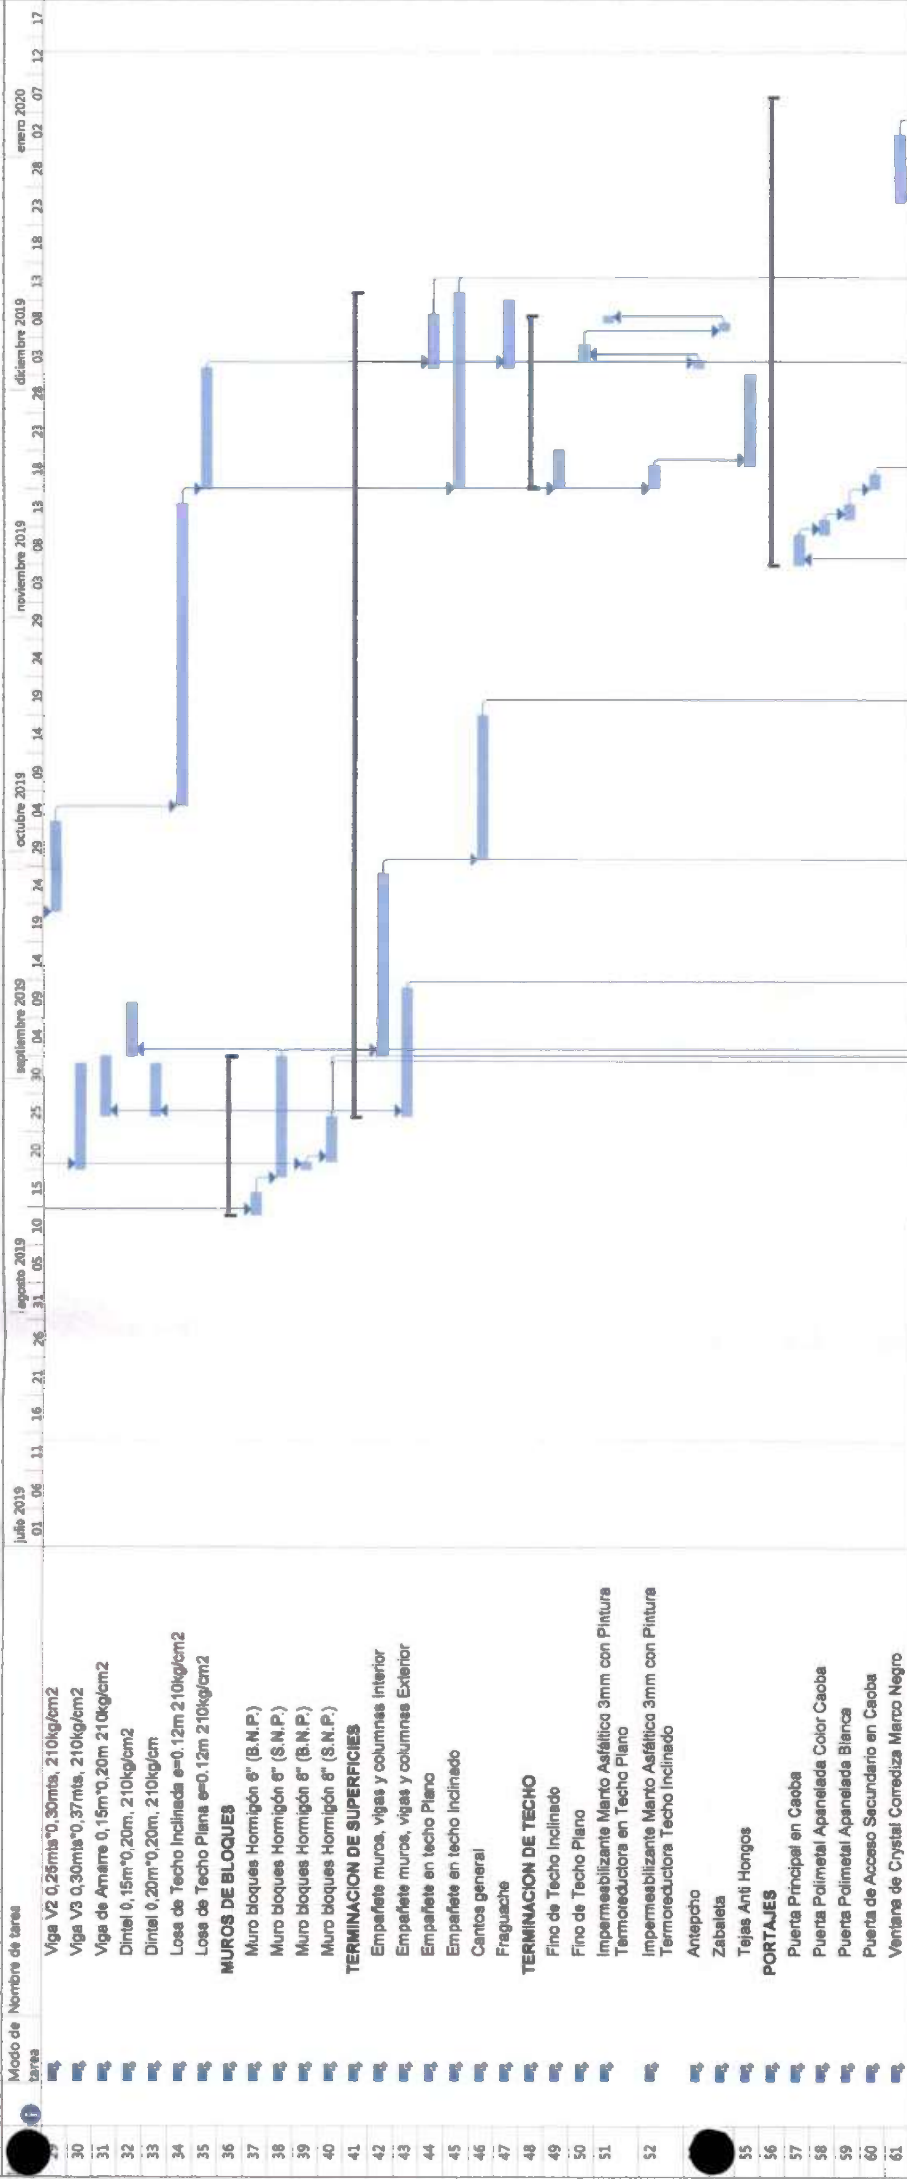

Modo de Nombre de tarea
Tarea

Viga V2 0,25m*0,30mts, 210kg/cm2
 Viga V3 0,30m*0,37mts, 210kg/cm2
 Viga de Amarre 0,15m*0,20m, 210kg/cm2
 Dintel 0,15m*0,20m, 210kg/cm2
 Dintel 0,20m*0,20m, 210kg/cm2
 Losa de Techo Inclínada e=0,12m 210kg/cm2
MUROS DE BLOQUES
 Muro bloques Hormigón 6" (B.N.P.)
 Muro bloques Hormigón 8" (S.N.P.)
 Muro bloques Hormigón 8" (B.N.P.)
 Muro bloques Hormigón 8" (S.N.P.)
TERMINACION DE SUPERFICIES
 Empaquete muros, vigas y columnas interior
 Empaquete muros, vigas y columnas Exterior
 Empaquete en techo Plano
 Empaquete en techo Inclinado
 Cantos general
 Fraguache
TERMINACION DE TECHO
 Fin de Techo Inclinado
 Fin de Techo Plano
 Impermeabilizante Marto Asfáltico 3mm con Pintura
 Termoreductora en Techo Plano
 Impermeabilizante Marto Asfáltico 3mm con Pintura
 Termoreductora Techo Inclinado
 Antepicho
 Zabaleta
 Tejas Anti Hongos
PORTALES
 Puerta Principal en Caoba
 Puerta Polimetálica Apaiselada Color Caoba
 Puerta Polimetálica Apaiselada Blanca
 Puerta de Acceso Secundario en Caoba
 Ventana de Cristal Comediza Marco Negro

Tarea
 División
 Hito
 Resumen

Resumen del proyecto
 Tarea inactiva
 Hito inactivo
 Resumen inactivo

Tarea manual
 solo duración
 Informe de resumen manual

Tarea manual
 solo inicio
 Tareas externas
 Hito externo

Fecha límite
 Progreso
 Progreso manual


Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
 Fecha inicio 15-07-2019
 Fecha termino 14-01-2020

Ing. Rosa Pérez
 Ced. 001-0625658-5
 Codia 9838



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO

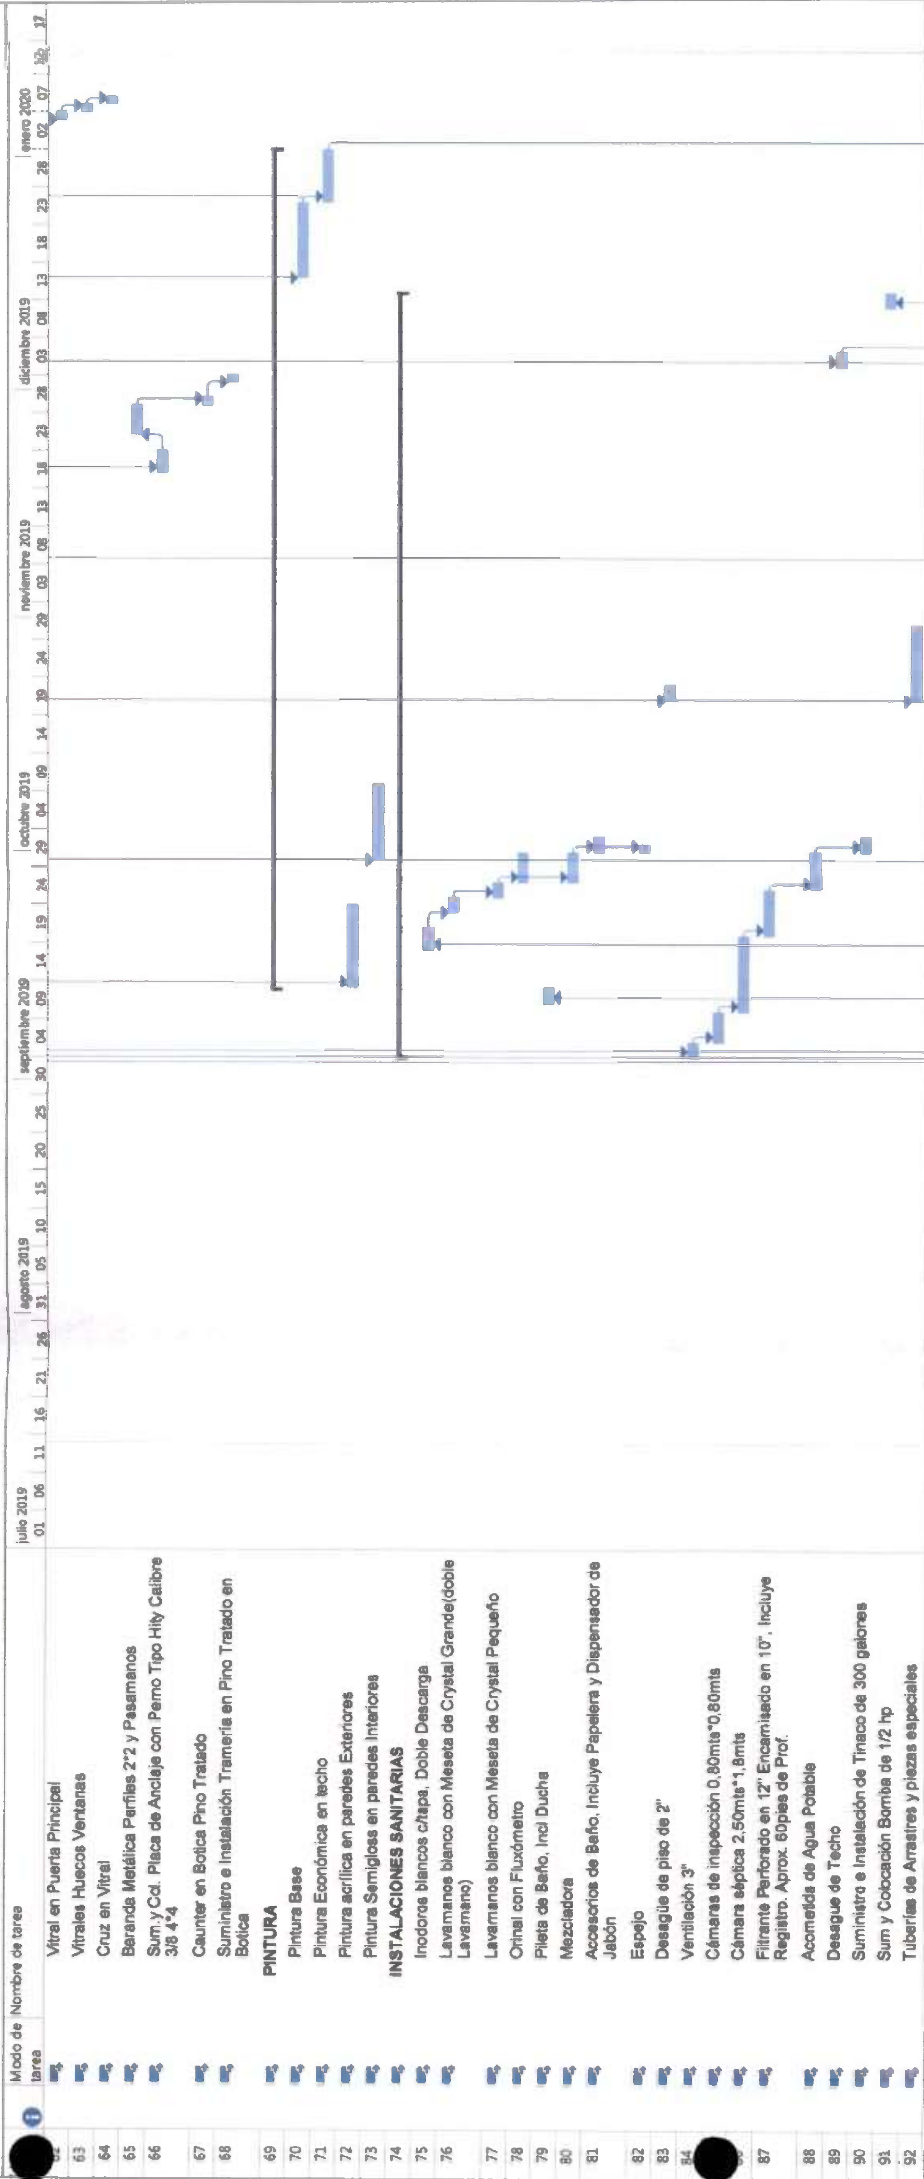

Tarea: [Barra azul] Resumen del proyecto: [Barra blanca] Tarea manual: [Barra verde] solo el comienzo: [Barra verde] solo fin: [Barra verde] Tareas externas: [Barra verde] Hito externo: [Barra verde]

División: [Barra blanca] Tarea inactiva: [Barra gris] Informe de resumen manual: [Barra verde] Resumen manual: [Barra verde]

Hito: [Barra blanca] Hito inactivo: [Barra gris] Resumen manual: [Barra verde]

Resumen: [Barra blanca]

Fecha límite: [Barra azul] Progreso: [Barra azul] Progreso manual: [Barra azul]


Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
 Fecha inicio 15-07-2019
 Fecha termino 14-01-2020



Elaborado por Ing. Jofiel Castillo

Ing. Rosa Pérez
 Ced 001-0625858-5
 Codia 9638

IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO

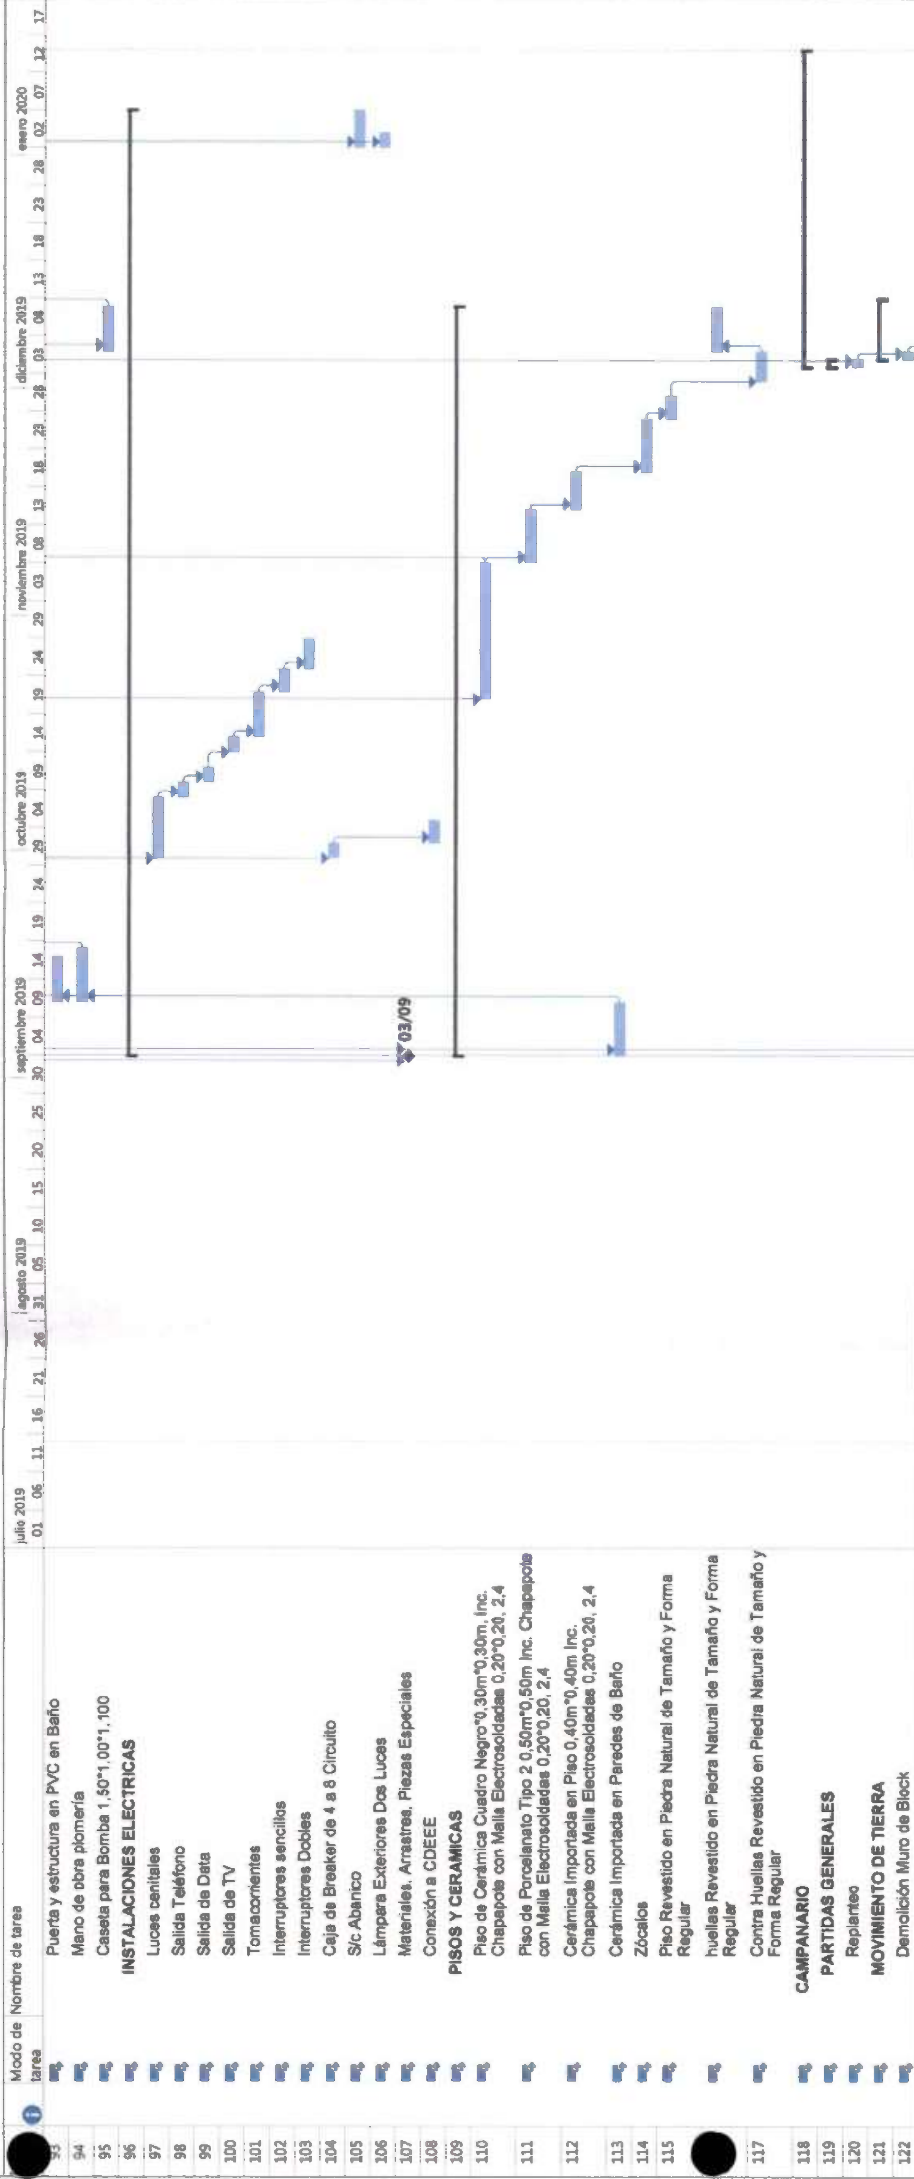

Tarea: [Barra azul] Resumen del proyecto [Barra blanca]
 División: [Barra blanca] Tarea inactiva [Barra blanca]
 Hito: [Barra blanca] Hito inactivo [Barra blanca]
 Resumen: [Barra blanca] Resumen manual [Barra blanca]

Fecha límite: [Barra azul]
 Progreso: [Barra azul]
 Progreso manual: [Barra azul]

solo el comienzo [Barra azul]
 solo fin [Barra azul]
 Tareas externas [Barra azul]
 Hito externo [Barra azul]




Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Ing. Rosa Perez
Ced 001-0625850-6
Codia 9838

Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
 Fecha inicio 15-07-2019
 Fecha termino: 14-01-2020

IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO

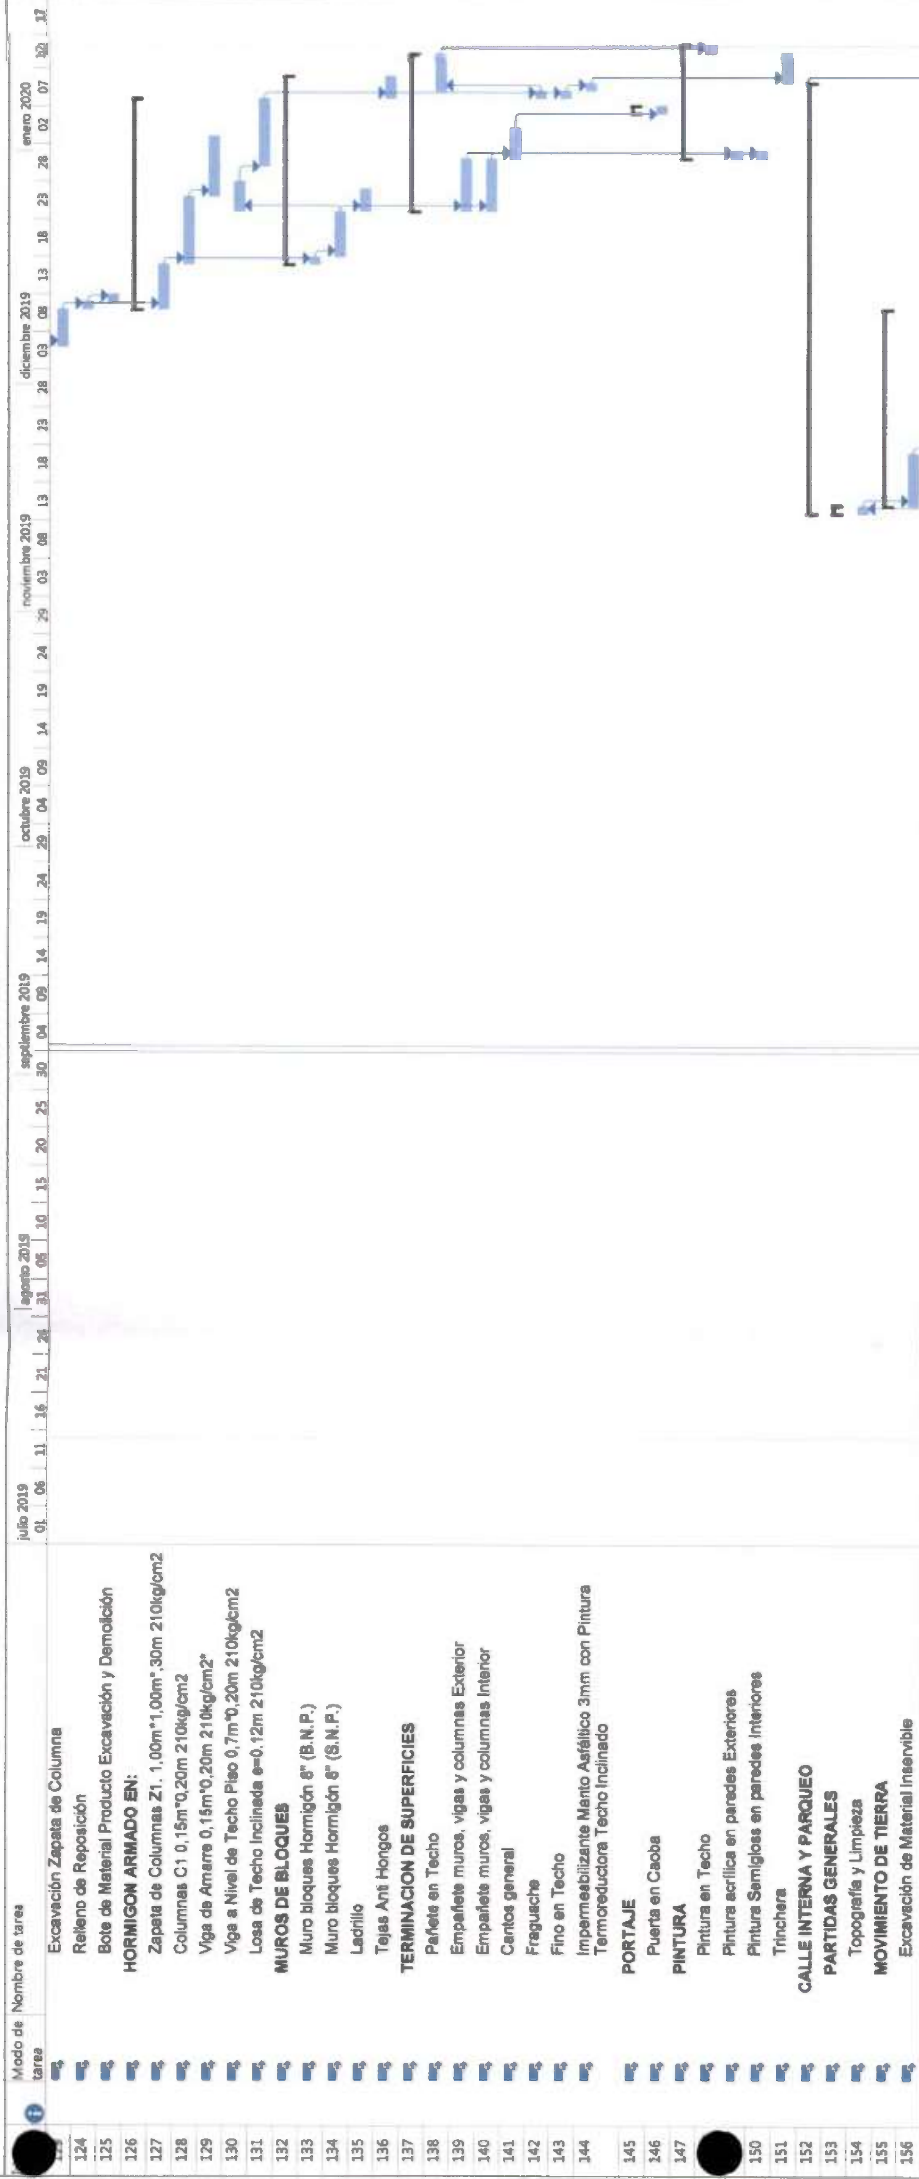

Modo de tarea	Nombre de tarea
124	Excavación Zapata de Columna
125	Relleno de Reposición
126	Bote de Material Producto Excavación y Demolición
127	HORMIGON ARMADO EN:
128	Zapata de Columnas Z1. 1,00m*1,00m* 30m 210kg/cm2
129	Columnas C1 0,15m*0,20m 210kg/cm2
130	Viga de Arriete 0,15m*0,20m 210kg/cm2*
131	Viga a Nivel de Techo 0,7m*0,20m 210kg/cm2
132	Losas de Techo Inclinada e=0,12m 210kg/cm2
133	MUROS DE BLOQUES
134	Muro bloques Hormigón 8" (B.N.P.)
135	Muro bloques Hormigón 8" (S.N.P.)
136	Ladrillo
137	Tejas Anti Hongos
138	TERMINACION DE SUPERFICIES
139	Pafete en Techo
140	Empaquete muros, vigas y columnas Exterior
141	Empaquete muros, vigas y columnas Interior
142	Cerros general
143	Fraguache
144	Fino en Techo
145	Impermeabilizante Manto Asfáltico 3mm con Pintura
146	Termoreductora Techo Inclinado
147	PORTAJE
148	Puerta en Caoba
149	PINTURA
150	Pintura en Techo
151	Pintura acrílica en paredes Exteriores
152	Pintura Semiglosa en paredes Interiores
153	Trinchera
154	CALLE INTERNA Y PARQUEO
155	PARTIDAS GENERALES
156	Topografía y Limpieza
157	MOVIMIENTO DE TIERRA
158	Excavación de Material Inservible

Tarea: Resumen de proyecto
 División: Tarea inactiva
 Hito: Hito inactivo
 Resumen: Resumen Inactivo

Tarea manual: Tarea manual
 solo dirección: solo dirección
 Informe de resumen manual: Informe de resumen manual
 Resumen manual: Resumen manual

solo el comienzo: solo el comienzo
 solo fin: solo fin
 Tareas enteras: Tareas enteras
 Hito entero: Hito entero

Fecha límite: Fecha límite
 Progreso: Progreso
 Progreso manual: Progreso manual


Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
 Fecha Inicio 15-07-2019
 Fecha termino 14-01-2020

Ing. Rosa Pérez
 Ced. 001-0625858-5
 Codia 9838



Elaborado por
 Ing. Jofel Castillo

IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO

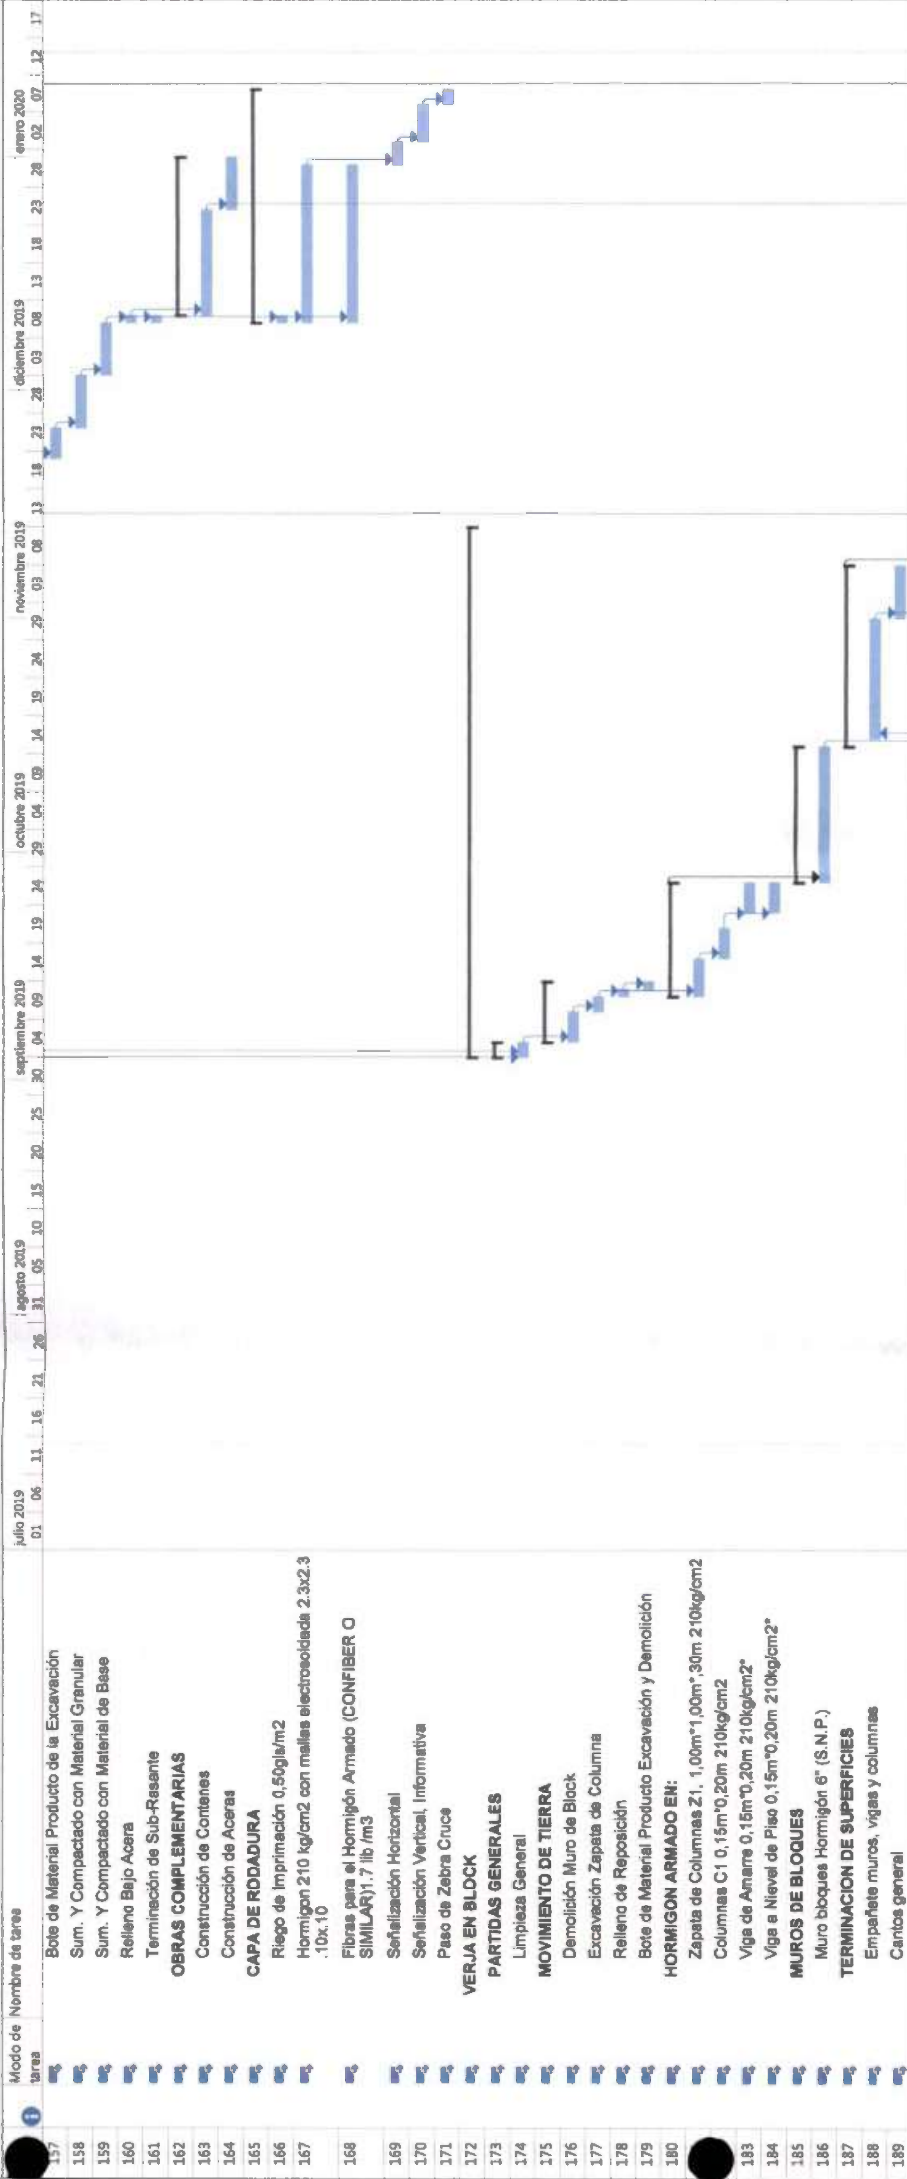

Modo de tareas	Nombre de tareas	Inicio	Fin	Estado
157	Bote de Material Producto de la Excavación	01/07/2019	01/07/2019	Completado
158	Sum. Y Compactado con Material Granular	01/07/2019	01/07/2019	Completado
159	Sum. Y Compactado con Material de Base	01/07/2019	01/07/2019	Completado
160	Relleno Bajo Acera	01/07/2019	01/07/2019	Completado
161	Terminación de Sub-Resante	01/07/2019	01/07/2019	Completado
162	OBRAS COMPLEMENTARIAS			
163	Construcción de Contenes	01/07/2019	01/07/2019	Completado
164	Construcción de Aceras	01/07/2019	01/07/2019	Completado
165	CAPA DE RODADURA			
166	Riego de Imprimación 0,50kg/m2	01/07/2019	01/07/2019	Completado
167	Hormigon 210 kg/cm2 con mallas electrosoldada 2.3x2.3 .10x.10	01/07/2019	01/07/2019	Completado
168	Fibras para el Hormigón Armado (CONFIBER O SIMILAR)1.7 lb/m3	01/07/2019	01/07/2019	Completado
169	Señalización Horizontal	01/07/2019	01/07/2019	Completado
170	Señalización Vertical, Informativa	01/07/2019	01/07/2019	Completado
171	Peso de Zebra Cruce	01/07/2019	01/07/2019	Completado
172	VERJA EN BLOCK			
173	PARTIDAS GENERALES			
174	Limpieza General	01/07/2019	01/07/2019	Completado
175	MOVIMIENTO DE TIERRA			
176	Demolición Muro de Block	01/07/2019	01/07/2019	Completado
177	Excavación Zapata de Columna	01/07/2019	01/07/2019	Completado
178	Relleno de Reposición	01/07/2019	01/07/2019	Completado
179	Bote de Material Producto Excavación y Demolición	01/07/2019	01/07/2019	Completado
180	HORMIGON ARMADO EN:			
	Zapata de Columnas Z1, 1,00m*1,00m, 30m 210kg/cm2	01/07/2019	01/07/2019	Completado
	Columnas C1 0,15m*0,20m 210kg/cm2	01/07/2019	01/07/2019	Completado
183	Viga de Anarre 0,15m*0,20m 210kg/cm2*	01/07/2019	01/07/2019	Completado
184	Viga e Nivel de Piso 0,15m*0,20m 210kg/cm2*	01/07/2019	01/07/2019	Completado
185	MUROS DE BLOQUES			
186	Muro bloques Hormigón 6" (S.N.P.)	01/07/2019	01/07/2019	Completado
187	TERMINACION DE SUPERFICIES			
188	Empaquete muros, vigas y columnas	01/07/2019	01/07/2019	Completado
189	Cantos general	01/07/2019	01/07/2019	Completado


Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
 Fecha inicio 15-07-2019
 Fecha termino 14-01-2020

Ing. Rosa Pérez
 Ced. 001-0625858-5
 Godia 9838



Elaborado por
 Ing. Jofiel Castillo

IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO

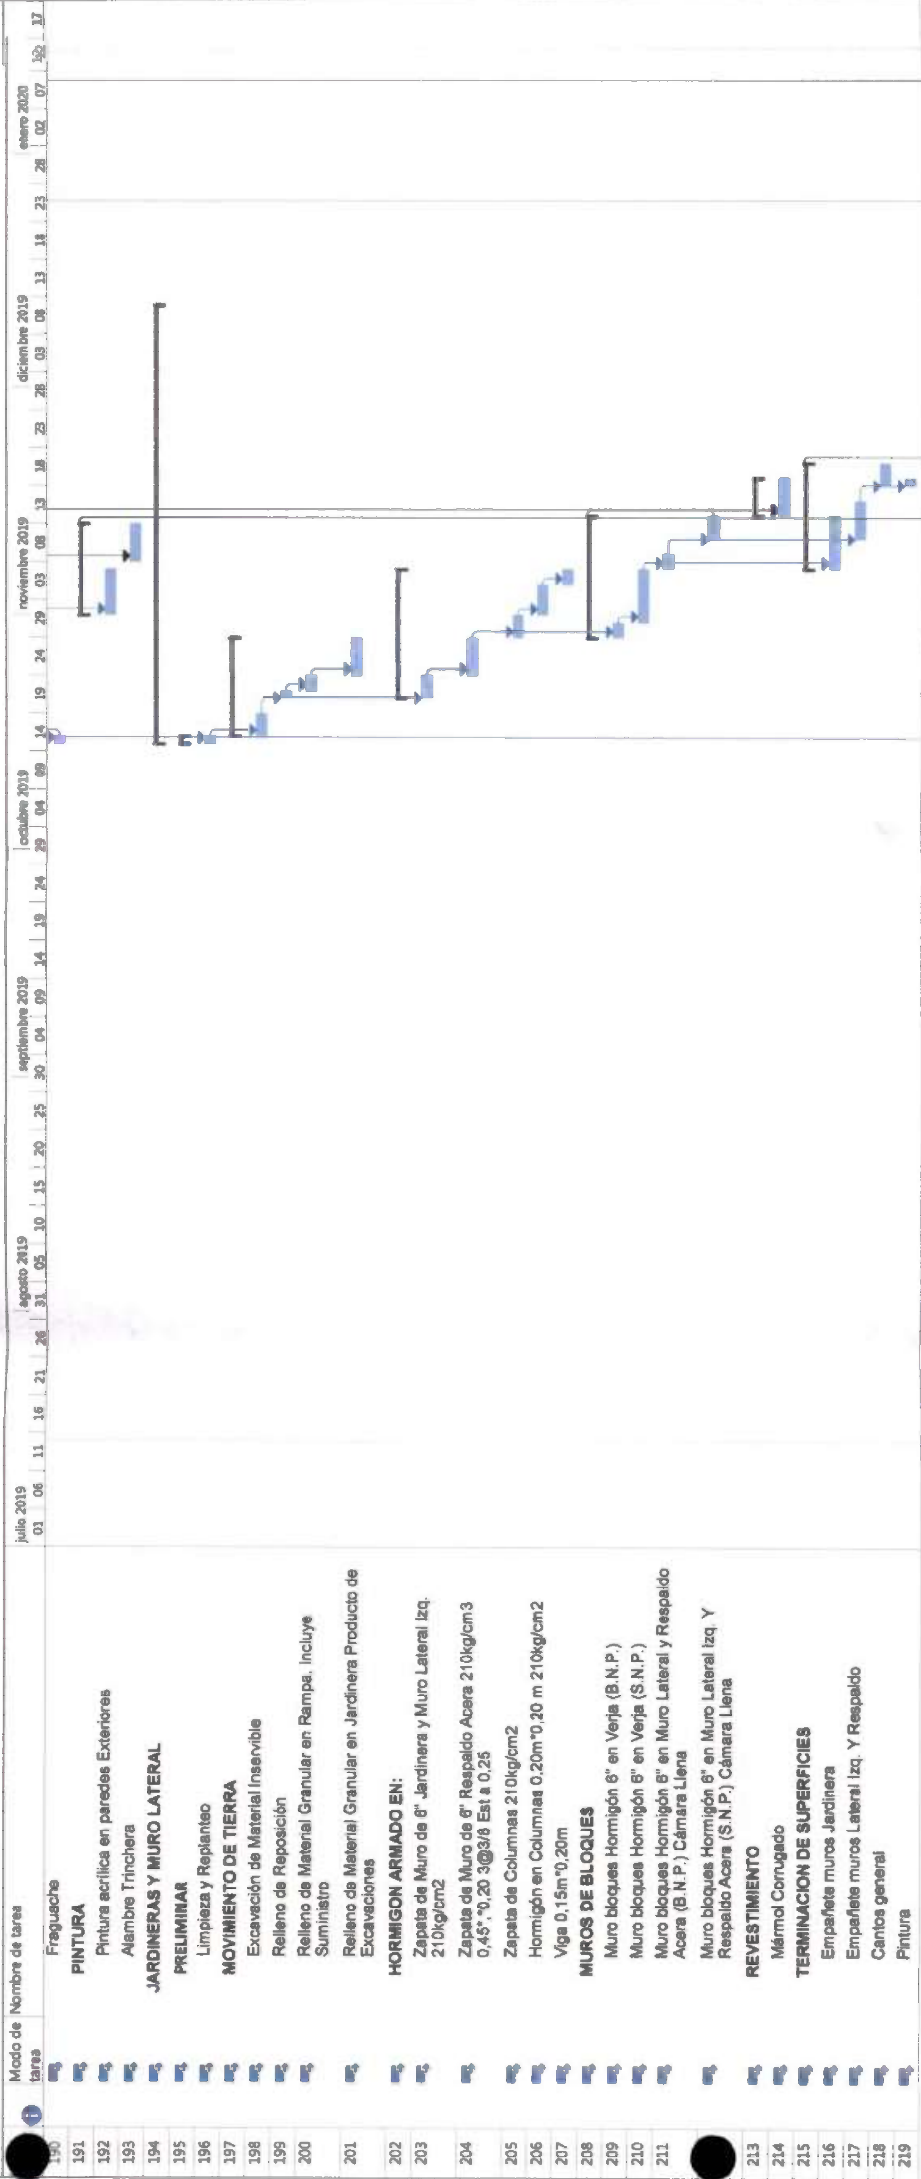

Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
 Fecha inicio 15-07-2019
 Fecha termino 14-01-2020

Tarea: [Barra azul] Resumen del proyecto: [Barra blanca] Fecha limite: [Barra azul con flecha]
 División: [Barra blanca] Tarea inactiva: [Barra gris] Progreso: [Barra azul con flecha]
 Hito: [Barra blanca] Hito inactivo: [Barra gris] Progreso manual: [Barra azul con flecha]
 Resumen: [Barra blanca] Resumen inactivo: [Barra gris] Resumen manual: [Barra azul con flecha]

solo el comienzo: [Barra azul] Tarea manual: [Barra azul] solo el fin: [Barra azul]
 Tareas externas: [Barra azul] solo duración: [Barra azul] Hitos externos: [Barra azul]


Informe de resumen manual: [Barra azul] Resumen manual: [Barra azul]

Ing. Rosa Pérez
 Ced. 001-0625858-5
 Codia 9838



Elaborado por
 Ing. Jofel Castillo

IGLESIA DEL PERPETUO SOCORRO

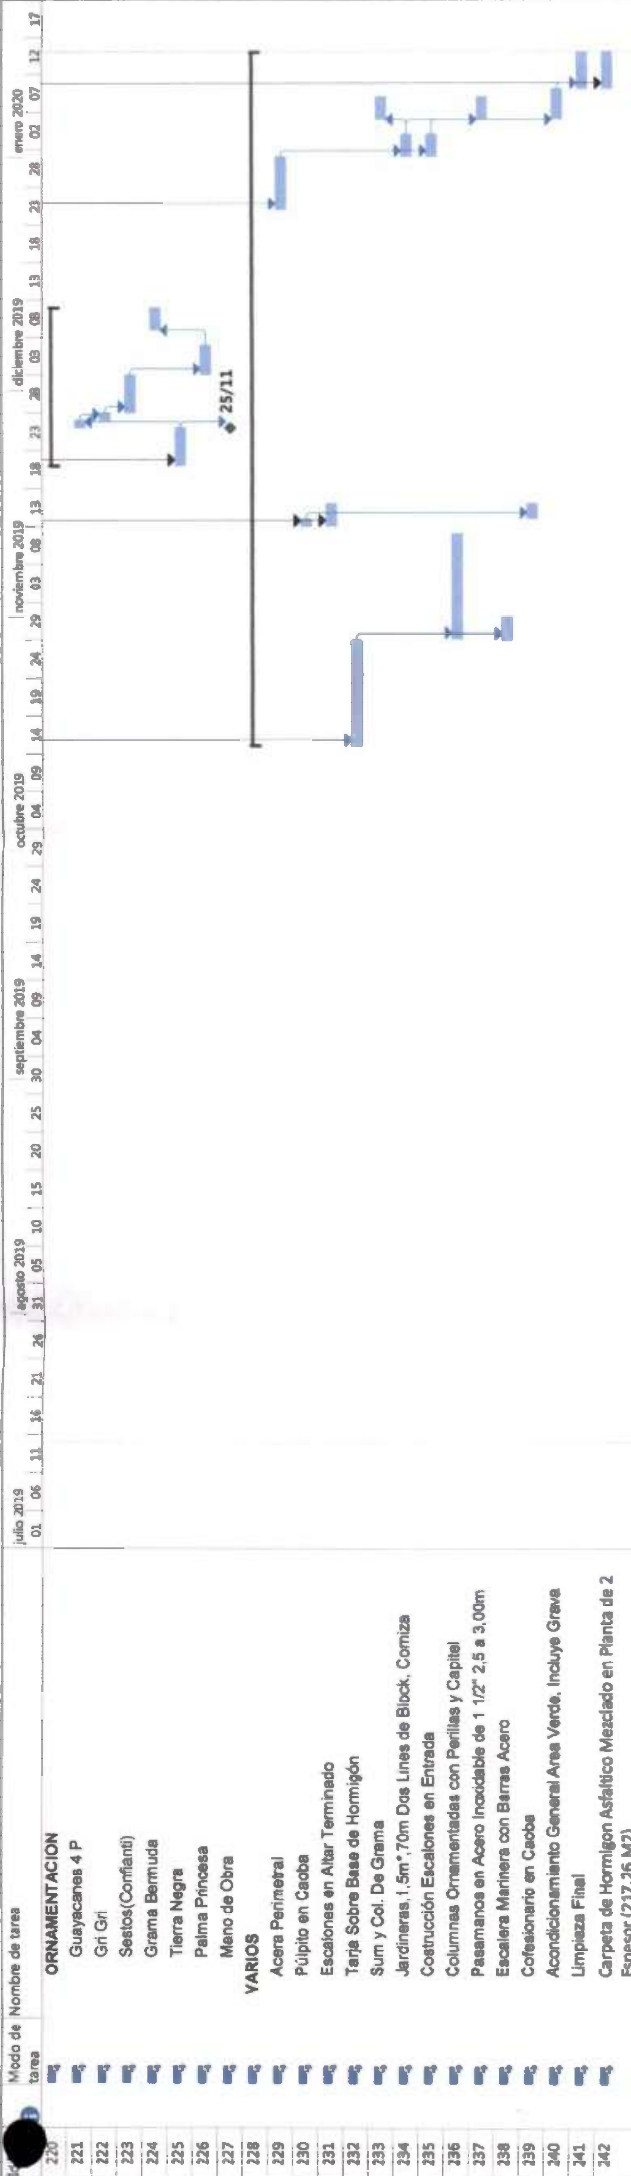

Ing. Rosa Perez
Céd. 001-0626858-9
Codigo 9999

Proyecto: PROGRAMACION ESCUELA LAS MATAS DE FARFAN
Fecha inicio: 15-07-2019
Fecha termino: 14-01-2020

Elaborado por: Ing. Jofiel Castillo

Fecha limite: []
Progreso: []
Progreso manual: []

Tarea: []
Division: []
Hito: []
Resumen: []

Resumen del proyecto: []
Tarea inactiva: []
Hito inactivo: []
Resumen inactivo: []

Tarea manual: []
solo duracion: []
Informe de resumen manual: []
Resumen manual: []

solo el comienzo: []
solo fin: []
Tareas reservadas: []
Hito externo: []

Página 8
