

ID	Task Name	Duration/Start	Finish
1	TRABAJOS PRELIMINARES	3 days	Mon 4/27/20 Wed 4/29/20
2	Ingeniería	1 day	Mon 4/27/20 Mon 4/27/20
3	Campamento	3 days	Mon 4/27/20 Wed 4/29/20
4	REMOZAMIENTO CASA DE EMPLEADOS DE TECHO PLANO I Y II	6 days	Sat 5/23/20 Thu 5/28/20
5	MOVIMIENTO DE TIERRA	3 days	Sat 5/23/20 Mon 5/25/20
6	Remoción de Fino e impermeabilizante existente	2 days	Sat 5/23/20 Sun 5/24/20
7	Bote de Material de Remoción fino e impermeabiliz. 1 day	1 day	Mon 5/25/20 Mon 5/25/20
8	Limpieza en area de fino con detergente y cloro	1 day	Mon 5/25/20 Mon 5/25/20
9	Limpieza de techo con detergente (cloro) y remoci. 1 day	1 day	Mon 5/25/20 Mon 5/25/20
10	PINTURA:	2 days	Wed 5/27/20 Thu 5/28/20
11	Pintura Acrilica superior en techo	2 days	Wed 5/27/20 Thu 5/28/20
12	Pintura acrílica en muros general	2 days	Wed 5/27/20 Thu 5/28/20
13	TERMINACION DE TECHO	2 days	Tue 5/26/20 Wed 5/27/20
14	Fino en techo plano, e=0.07 m	1 day	Tue 5/26/20 Tue 5/26/20
15	Suministro y Colocación de Lona Asfáltica Granul. 1 day	1 day	Wed 5/27/20 Wed 5/27/20
16	REMOZAMIENTO CASA ALMACEN	25 days	Tue 4/28/20 Fri 5/22/20
17	MOVIMIENTO DE TIERRA	5 days	Tue 4/28/20 Sat 5/2/20
18	Desmonte de Techo de asbesto cemento y de estructuras Existentes	5 days	Tue 4/28/20 Sat 5/2/20
19	TECHO	5 days	Sun 5/3/20 Thu 5/7/20
20	En Aluzinc Cal.26 Con Aislante Prepintado (Inc. Tijerilla, Estructura Metálica, mano de obra, Suministro y Colocación Placas metálicas de (0.3x0.3) m HN e= 3/16" y Pernos de 3/4"	5 days	Sun 5/3/20 Thu 5/7/20
21	TERMINACION PISOS:	5 days	Sat 5/9/20 Wed 5/13/20
22	Pisos de Granito fondo blanco 0.4 m x 0.40 m	3 days	Sat 5/9/20 Mon 5/11/20
23	Zócalos de Granito fondo Blanco 0.07 m x 0.40 m	2 days	Tue 5/12/20 Wed 5/13/20
24	PORTAJE :	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
25	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.94 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
26	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.80 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
27	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.78 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
28	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.72 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
29	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.67 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
30	Suministro y Colocacion Puerta Plegable en despensa(#218 caoba en diamond panel flex o Cerradura para Puerta	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
31	PINTURA:	8 days	Thu 5/14/20 Thu 5/21/20
32	Pintura acrílica en muros general	8 days	Thu 5/14/20 Thu 5/21/20
33	TERMINACION	4 days	Thu 5/14/20 Sun 5/17/20
34	Plafon PVC con estructura metálica (incluye suministro e instalación)	4 days	Thu 5/14/20 Sun 5/17/20
35	INSTALACIONES ELECTRICAS:	12 days	Fri 5/8/20 Tue 5/19/20
36	Lamparas Fluorescentes de 3 tubos de (2x4) pies	2 days	Mon 5/18/20 Tue 5/19/20
37			
38			

July 2020
30 27 24 21 18 15 12 9 6 3

June 2020
31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1

May 2020
28 25 22 19 16 13 10 7 4 1




J. Jofiel



Nombre: Complejo Jimenoa
Inicio: Mon 4/27/20
Terminación: Fri 7/17/20

Legend:
 ■ Task
 ■ Project Summary
 ■ Inactive Task
 ■ Inactive Milestone
 ■ Inactive Summary
 ■ Manual Task
 ■ Duration-only
 ■ Manual Summary Rollup
 ■ Manual Summary
 ■ Start-only
 ■ Finish-only
 ■ External Tasks
 ■ External Milestone
 ▾ Deadline
 ▾ Progress
 ▾ Manual Progress

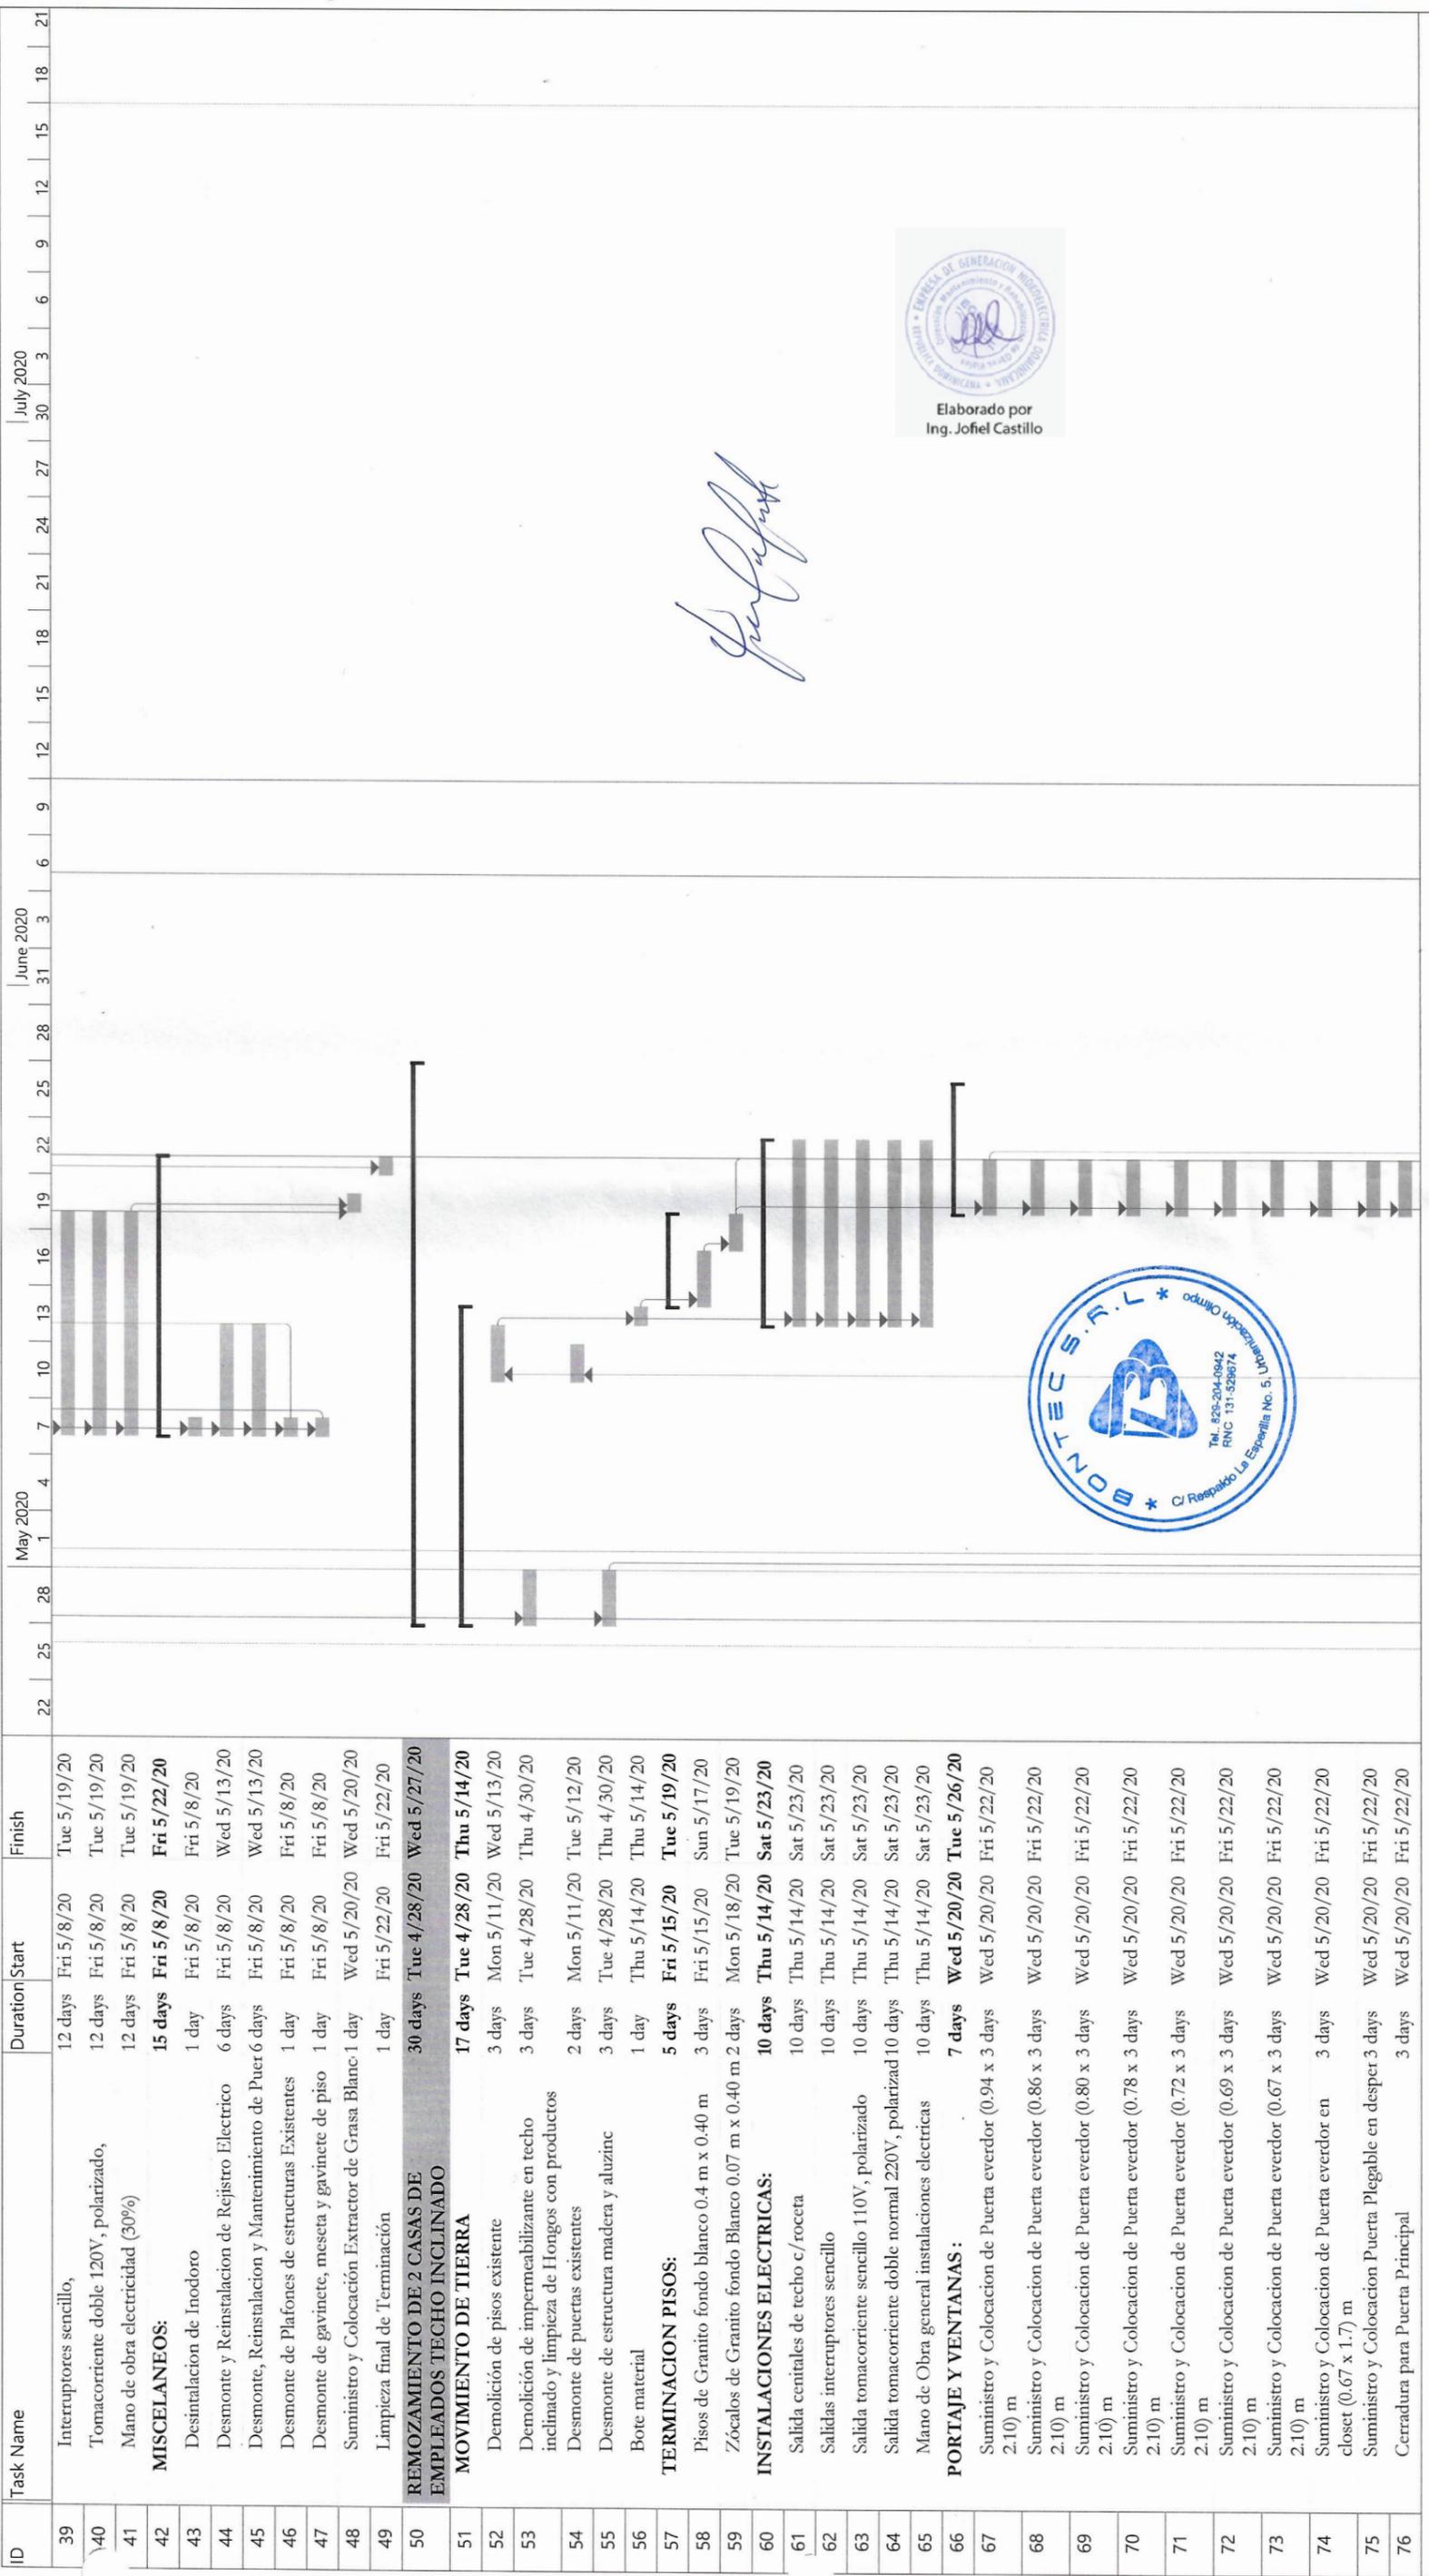

J. J. Jimenoa



Nombre: Complejo Jimenoa
Inicio: Mon 4/27/20
Terminación: Fri 7/17/20

Task Legend:
 Task: [Grey Bar]
 Split: [Dotted Line]
 Milestone: [Diamond]
 Summary: [Thick Line]

Summary Legend:
 Project Summary: [Grey Bar]
 Inactive Task: [Dotted Line]
 Inactive Milestone: [Diamond]
 Inactive Summary: [Thick Line]

Task Legend:
 Manual Task: [Grey Bar]
 Duration-only: [Light Grey Bar]
 Manual Summary Rollup: [Thick Line]
 Manual Summary: [Thin Line]

Task Legend:
 Start-only: [Grey Bar]
 Finish-only: [Light Grey Bar]
 External Task: [Thick Line]
 External Milestone: [Diamond]

Task Legend:
 Deadline: [Arrow]
 Progress: [Grey Bar]
 Manual Progress: [Thick Line]



Nombre: Complejo Jimenoa
 Inicio: Mon 4/27/20
 Terminación: Fri 7/17/20

Legend:
 Task: [Bar] Project Summary
 Split: [Dotted] Inactive Task
 Milestone: [Diamond] Inactive Milestone
 Summary: [Line] Inactive Summary

Legend:
 Manual Task: [Bar] Manual Task
 Duration-only: [Bar] Duration-only
 Manual Summary Rollup: [Bar] Manual Summary Rollup
 Manual Summary: [Bar] Manual Summary

Legend:
 Start-only: [Bar] Start-only
 Finish-only: [Bar] Finish-only
 External Tasks: [Bar] External Tasks
 External Milestone: [Diamond] External Milestone

Legend:
 Deadline: [Arrow] Deadline
 Progress: [Bar] Progress
 Manual Progress: [Bar] Manual Progress


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	May 2020	June 2020	July 2020
117	Viga de amarre superior (0.15 x 0.20)m	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20			
118	Losa, c=0.12 m, con H.L.	2 days	Fri 5/8/20	Sat 5/9/20			
119	MUROS DE BLOQUES	5 days	Sun 5/3/20	Thu 5/7/20			
120	Muros block 0.15 mts s/cruce 0 3/8" A 0.80 mts s 4 days	Mon 5/4/20	Mon 5/4/20	Thu 5/7/20			
121	Muros block 0.15 mts s/cruce 0 3/8" A 0.80 mts b 1 day	Sun 5/3/20	Sun 5/3/20	Sun 5/3/20			
122	TERMINACION DE SUPERFICIE:	7 days	Sun 5/10/20	Sat 5/16/20			
123	Pañete interior en muros	2 days	Tue 5/12/20	Wed 5/13/20			
124	Pañete exterior en muros	2 days	Thu 5/14/20	Fri 5/15/20			
125	Pañete en techo	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20			
126	Careteo en elementos de h.a.	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20			
127	Fraguache en muros y techo	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20			
128	Cantos y Mochetas	6 days	Mon 5/11/20	Sat 5/16/20			
129	TERMINACION PISOS:	4 days	Thu 5/14/20	Sun 5/17/20			
130	Pisos de Granito fondo blanco 0.4 m x 0.40 m	2 days	Thu 5/14/20	Fri 5/15/20			
131	Zócalos de Granito fondo Blanco 0.07 m x 0.40 m	2 days	Sat 5/16/20	Sun 5/17/20			
132	INSTALACIONES ELECTRICAS:	7 days	Fri 5/8/20	Thu 5/14/20			
133	Salida centrales de techo c/rocera	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20			
134	Salidas interruptores sencillo	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20			
135	Salida tomacorriente doble normal 110V, polarizad 1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20			
136	Salida tomacorriente doble normal 220V, polarizad 1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20			
137	Panel de Distribución (PA), Barra de 125Amp., 4/8ctos., 1F, 120/240v, compuesto por: 4 Bklers. De 20Amp/1p, 1 Bklers de 30Amp/2p, Alimentador desde Modulo de contador hasta Panel PA compuesto por: 2C #8 THW (1P/fase), 1C #10 THW (neutro), 1C # 10 THW (tierra) en tubería de 1"x19" PVC sdr-26	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20			
138	Registro eléctrico 6"x6"x4", N-1, Mano de Obra	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20			
139		1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20			
140		1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20			
141	PORTAJE Y VENTANAS :	12 days	Fri 5/8/20	Tue 5/19/20			
142	Puerta Enrollable (1.80 x 2.20) m	1 day	Tue 5/19/20	Tue 5/19/20			
143	Block calados	2 days	Fri 5/8/20	Sat 5/9/20			
144	PINTURA:	3 days	Sat 5/16/20	Mon 5/18/20			
145	Pintura acrílica superior en techo	1 day	Sat 5/16/20	Sat 5/16/20			
146	Pintura acrílica en general	3 days	Sat 5/16/20	Mon 5/18/20			
147	TERMINACION DE TECHO	7 days	Sun 5/10/20	Sat 5/16/20			
148	Fino en techo plano, ep=0.05 m	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20			
149	Suministro y Colocación de Lona Asfáltica Granulada 4.5	1 day	Sat 5/16/20	Sat 5/16/20			
150	MISCELANEOS:	10 days	Sun 5/10/20	Tue 5/19/20			
151	Bote de escombros durante constr.	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20			
152	Limpieza final de terminación	1 day	Tue 5/19/20	Tue 5/19/20			
153	CONSTRUCCION DE BAÑO DE EMPLEADO EN JIMENOA	14 days	Tue 4/28/20	Mon 5/11/20			
154	TRABAJOS PRELIMINARES	1 day	Tue 4/28/20	Tue 4/28/20			
155	Replanteo en pendiente fuerte	1 day	Tue 4/28/20	Tue 4/28/20			

J. Jofiel Castillo



Nombre: Complejo Jimenoa
Inicio: Mon 4/27/20
Terminación: Fri 7/17/20

Task (Solid bar) **Project Summary** (Dashed bar) **Start-only** (Thin bar) **Deadline** (Arrow) **Progress** (Thin bar)
Split (Dotted bar) **Inactive Task** (Thin bar) **Finish-only** (Thin bar) **Manual Task** (Thin bar) **Manual Progress** (Thin bar)
Milestone (Diamond) **Inactive Milestone** (Thin bar) **External Tasks** (Thin bar) **Manual Summary Rollup** (Thin bar) **External Milestone** (Thin bar)
Summary (Thin bar) **Inactive Summary** (Thin bar) **Manual Summary** (Thin bar)

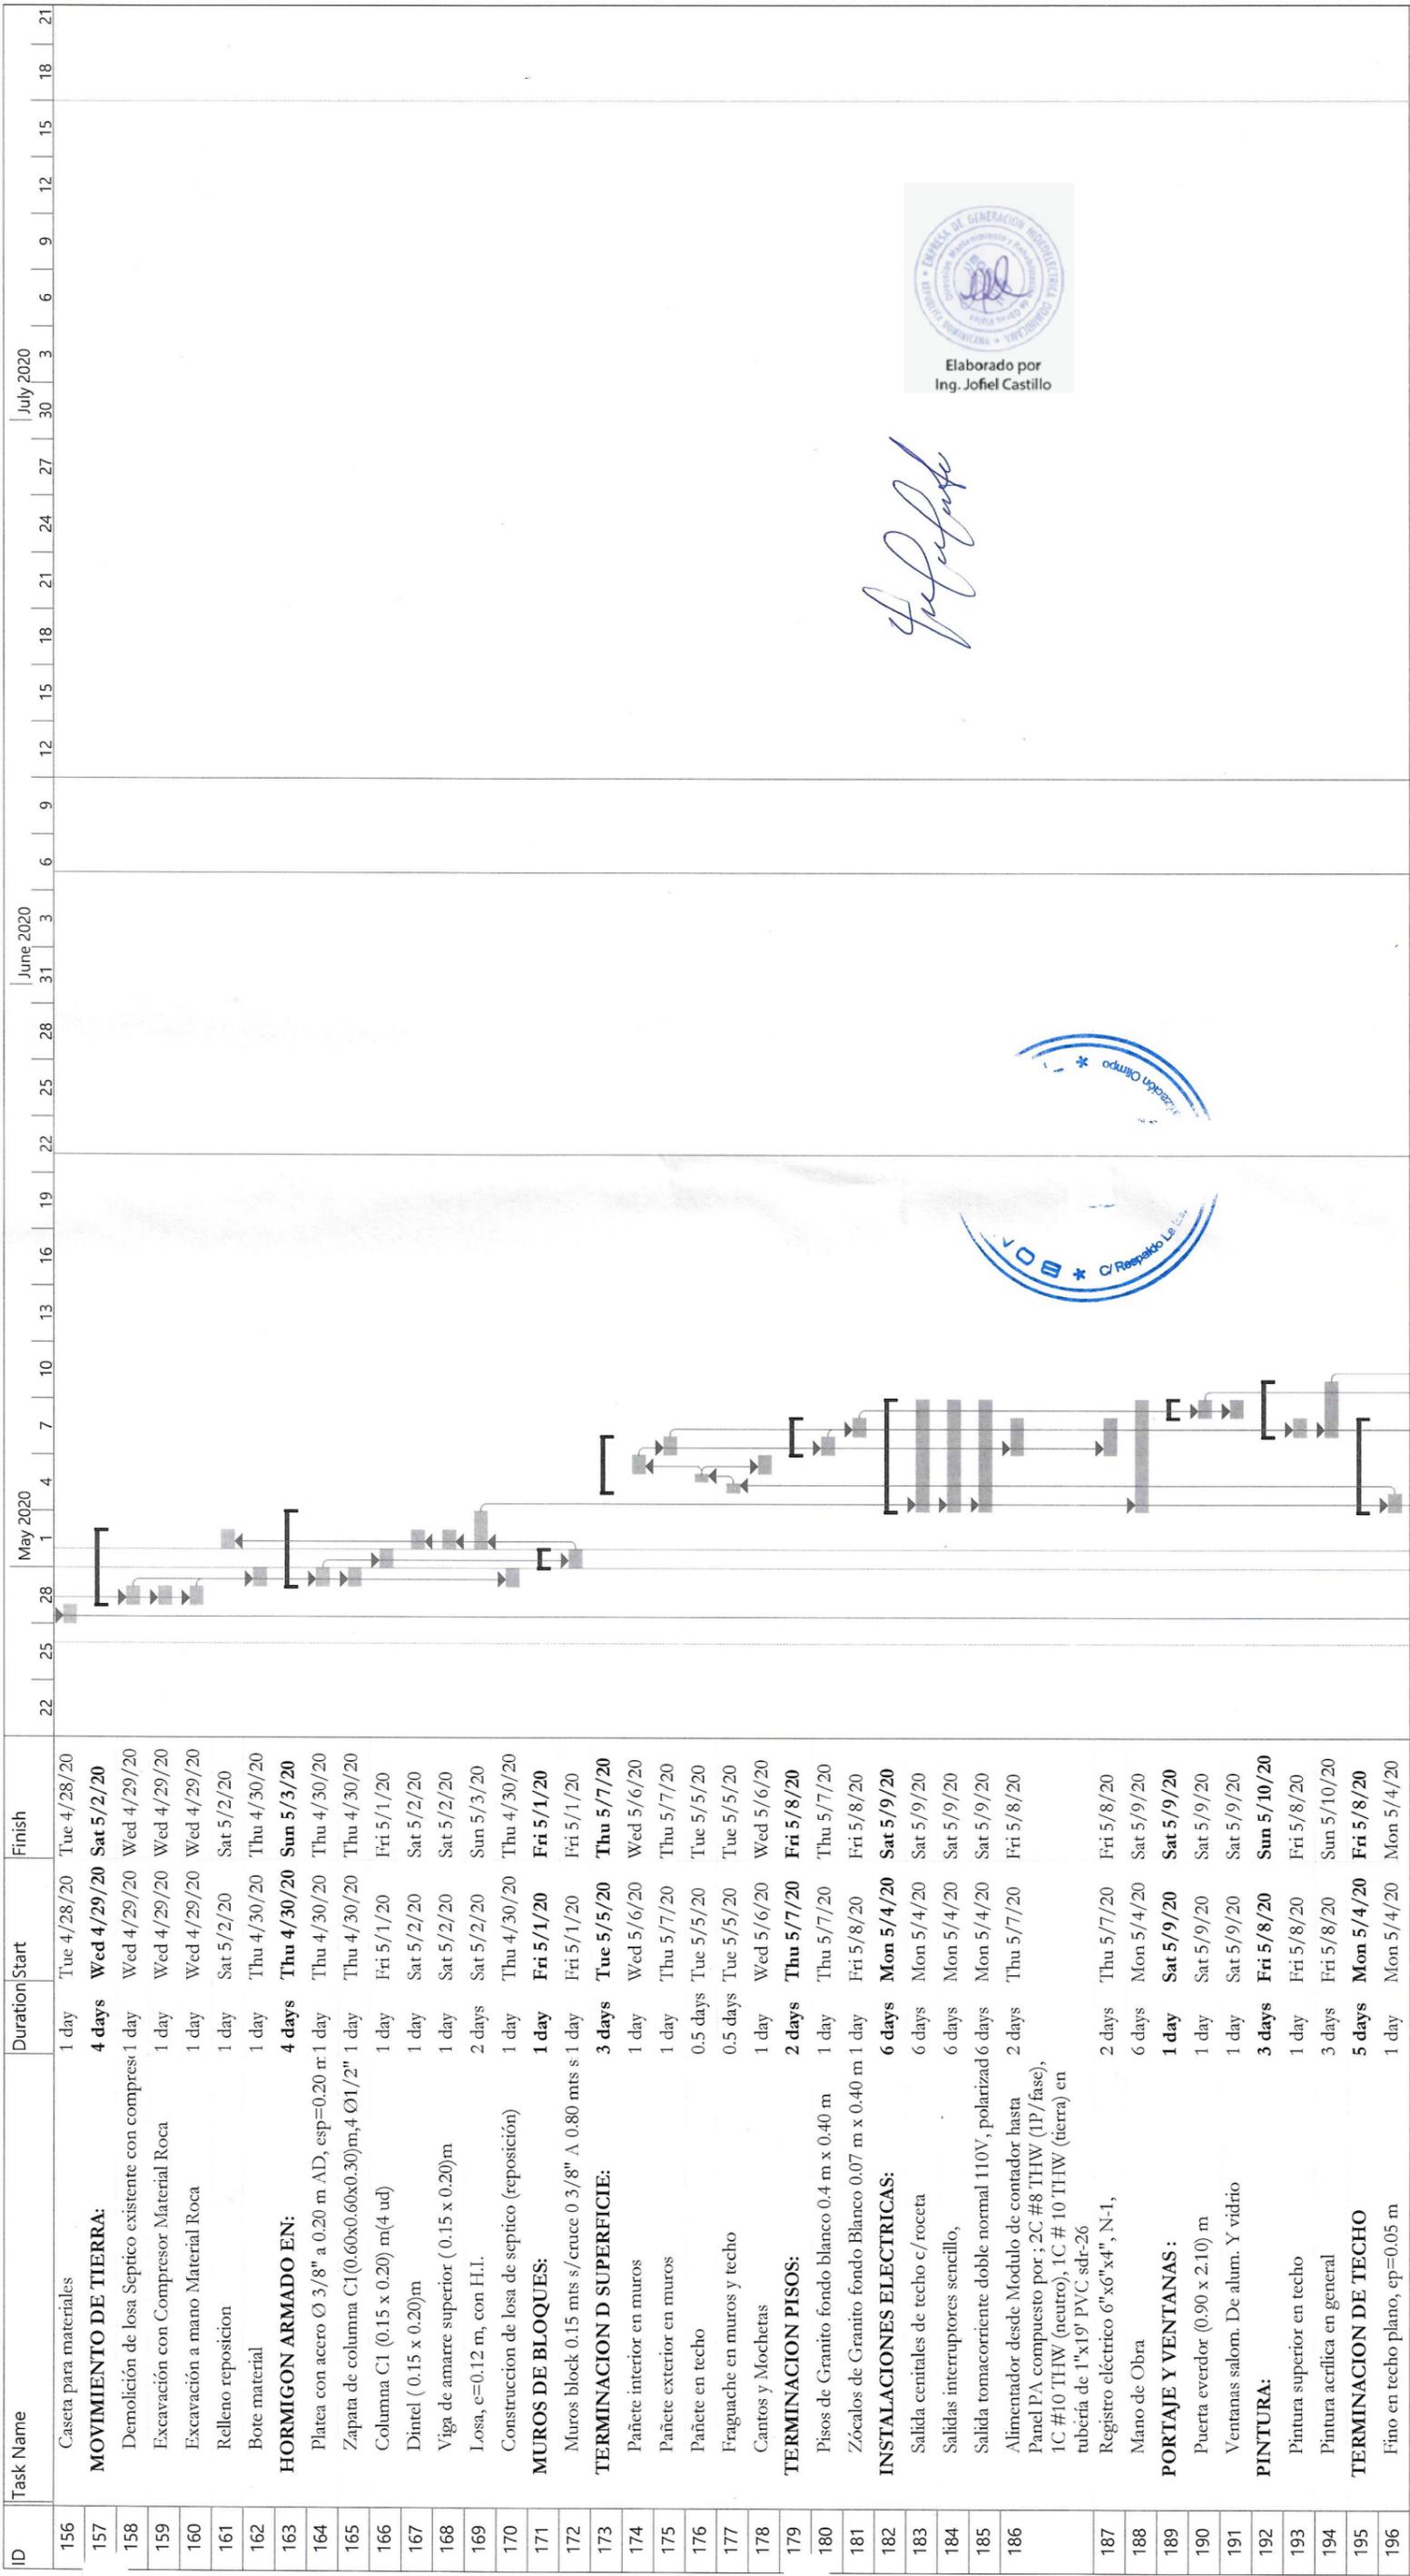

ID	Task Name	Duration/Start	Finish
156	Caseta para materiales	1 day Tue 4/28/20	Tue 4/28/20
157	MOVIMIENTO DE TIERRA:	4 days Wed 4/29/20	Sat 5/2/20
158	Demolición de losa Septico existente con compresor	1 day Wed 4/29/20	Wed 4/29/20
159	Excavación con Compresor Material Roca	1 day Wed 4/29/20	Wed 4/29/20
160	Excavación a mano Material Roca	1 day Wed 4/29/20	Wed 4/29/20
161	Relleno reposición	1 day Sat 5/2/20	Sat 5/2/20
162	Bote material	1 day Thu 4/30/20	Thu 4/30/20
163	HORMIGON ARMADO EN:	4 days Thu 4/30/20	Sun 5/3/20
164	Placa con acero Ø 3/8" a 0.20 m AD, esp=0.20 m	1 day Thu 4/30/20	Thu 4/30/20
165	Zapata de columna C1(0.60x0.60x0.30)m,4 Ø1/2"	1 day Thu 4/30/20	Thu 4/30/20
166	Columna C1 (0.15 x 0.20) m(4 ud)	1 day Fri 5/1/20	Fri 5/1/20
167	Dintel (0.15 x 0.20)m	1 day Sat 5/2/20	Sat 5/2/20
168	Viga de amarre superior (0.15 x 0.20)m	1 day Sat 5/2/20	Sat 5/2/20
169	Losa, e=0.12 m, con H.I.	2 days Sat 5/2/20	Sun 5/3/20
170	Construcción de losa de septico (reposición)	1 day Thu 4/30/20	Thu 4/30/20
171	MUROS DE BLOQUES:	1 day Fri 5/1/20	Fri 5/1/20
172	Muros block 0.15 mts s/cruce 0.3/8" Λ 0.80 mts s 1 day	Fri 5/1/20	Fri 5/1/20
173	TERMINACION D SUPERFICIE:	3 days Tue 5/5/20	Thu 5/7/20
174	Pañete interior en muros	1 day Wed 5/6/20	Wed 5/6/20
175	Pañete exterior en muros	1 day Thu 5/7/20	Thu 5/7/20
176	Pañete en techo	0.5 days Tue 5/5/20	Tue 5/5/20
177	Fraguache en muros y techo	0.5 days Tue 5/5/20	Tue 5/5/20
178	Cantos y Mochetas	1 day Wed 5/6/20	Wed 5/6/20
179	TERMINACION PISOS:	2 days Thu 5/7/20	Fri 5/8/20
180	Pisos de Granito fondo blanco 0.4 m x 0.40 m	1 day Thu 5/7/20	Thu 5/7/20
181	Zócalos de Granito fondo Blanco 0.07 m x 0.40 m	1 day Fri 5/8/20	Fri 5/8/20
182	INSTALACIONES ELECTRICAS:	6 days Mon 5/4/20	Sat 5/9/20
183	Salida cénitales de techo c/roceta	6 days Mon 5/4/20	Sat 5/9/20
184	Salidas interruptores sencillo,	6 days Mon 5/4/20	Sat 5/9/20
185	Salida tomacorriente doble normal 110V, polarizad	6 days Mon 5/4/20	Sat 5/9/20
186	Alimentador desde Modulo de contador hasta Panel PA compuesto por : 2C #8 THW (1P/fase), 1C #10 THW (neutro), 1C # 10 THW (tierra) en tubería de 1"x1/2" PVC sdr-26	2 days Thu 5/7/20	Fri 5/8/20
187	Registro eléctrico 6"x6"x4", N-1,	2 days Thu 5/7/20	Fri 5/8/20
188	Mano de Obra	6 days Mon 5/4/20	Sat 5/9/20
189	PORTAJE Y VENTANAS :	1 day Sat 5/9/20	Sat 5/9/20
190	Puerta everdor (0.90 x 2.10) m	1 day Sat 5/9/20	Sat 5/9/20
191	Ventanas salom. De alum. Y vidrio	1 day Sat 5/9/20	Sat 5/9/20
192	PINTURA:	3 days Fri 5/8/20	Sun 5/10/20
193	Pintura superior en techo	1 day Fri 5/8/20	Fri 5/8/20
194	Pintura acrílica en general	3 days Fri 5/8/20	Sun 5/10/20
195	TERMINACION DE TECHO	5 days Mon 5/4/20	Fri 5/8/20
196	Fino en techo plano, ep=0.05 m	1 day Mon 5/4/20	Mon 5/4/20



Nombre: Complejo Jimenoa
Inicio: Mon 4/27/20
Terminación: Fri 7/17/20

Task
 Split
 Milestone
 Summary

Project Summary
 Inactive Task
 Inactive Milestone
 Inactive Summary

Manual Task
 Duration-only
 Manual Summary Rollup
 Manual Summary

Start-only
 Finish-only
 External Tasks
 External Milestone

Deadline
 Progress
 Manual Progress


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	May 2020	June 2020	July 2020
197	Suministro y Colocación de Lona Asfáltica Granulada 4.5	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20			
198	INSTALACIONES SANITARIAS:	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
199	Inodoros sencillos completos	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20			
200	Lavamanos medianos completos	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20			
201	Duchas y llaves empotrar	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20			
202	Desagüe de piso en 2" PVC	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
203	Bajantes pluviales de 3" PVC	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
204	Bajantes de descargas de 4" PVC	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
205	Columnas de Ventilación de 3" PVC	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
206	Barras para cortinas de baños	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20			
207	Llave de paso de 3/4"	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
208	Cámaras de inspección 0.70 x 0.70 x 0.60	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
209	Tuberías y piezas PVC agua potable	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
210	Tuberías y piezas PVC para drenaje Ø4" pvc	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
211	Mano de obra plomería interior	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
212	Mano de obra plomería exterior	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
213	Cámara séptica prefabricada	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
214	Sistema de Clorificación	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20			
215	Tuberías Ø4" acero (e=1/4") exterior	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
216	Codos 4 x 90 acero soldable HIN	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
217	Suministro y Colocación de Tinaco 300 gls	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20			
218	Suministro y Colocación de Calentador eléctrico	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20			
219	MISCELANEOS:	8 days	Mon 5/4/20	Mon 5/11/20			
220	Anclaje en tubería Hormigón Simple 210 kg/cm2	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20			
221	Bote de escombros durante constr.	7 days	Mon 5/4/20	Sun 5/10/20			
222	Limpieza final de terminación	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20			
223	REMOZAMIENTO DESTACAMENTO MILITAR	10 days	Sat 5/23/20	Mon 6/1/20			
224	Desinstalación de puertas existentes	1 day	Sat 5/23/20	Sat 5/23/20			
225	Desinstalación de Aparatos Sanitarios	1 day	Sun 5/24/20	Sun 5/24/20			
226	Demolición y Bote de Meseta (1.90 *0.60)m	1 day	Sun 5/24/20	Sun 5/24/20			
227	Remoción Cerámica de Pared	1 day	Sun 5/24/20	Sun 5/24/20			
228	Gabinete en Pared y piso de Caoba	1 day	Mon 5/25/20	Mon 5/25/20			
229	Suministro e Instalación de Tope de Granito con fregadero, incluye Mezcladora	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20			
230	Trameras (3 uds de 0.55*0.80m) y Puerta de Despensa	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20			
231	Suministro y Colocación de Puertas de Polimetral	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20			
232	Desagüe de piso en 2" PVC	1 day	Thu 5/28/20	Thu 5/28/20			
233	Revestimiento de Cerámica en Baños	1 day	Fri 5/29/20	Fri 5/29/20			
234	Pulido y Brillado de Pisos de Granito	1 day	Sat 5/30/20	Sat 5/30/20			
235	Inodoros sencillos completos	1 day	Sat 5/30/20	Sat 5/30/20			
236	Lavamanos medianos completos	1 day	Sat 5/30/20	Sat 5/30/20			
237	Duchas y llaves empotradas, incluye Plomería	1 day	Sat 5/30/20	Sat 5/30/20			
238	Suministro e Instalación de Porta Papel plástico	1 day	Sat 5/30/20	Sat 5/30/20			



Handwritten signature

Nombre: Complejo Jimenoa
Inicio: Mon 4/27/20
Terminación: Fri 7/17/20

Legend:
 Manual Task: [Grey bar]
 Duration-only: [Light grey bar]
 Manual Summary Rollup: [Thick grey bar]
 Manual Summary: [Thin grey bar]
 Project Summary: [Dark grey bar]
 Inactive Task: [Dotted line]
 Inactive Milestone: [Dotted line with diamond]
 Inactive Summary: [Dotted line]
 Start-only: [Thin grey bar]
 Finish-only: [Thin grey bar]
 External Tasks: [Thin grey bar]
 External Milestone: [Thin grey bar with diamond]
 Deadline: [Arrow]
 Progress: [Thin grey bar]
 Manual Progress: [Thin grey bar]

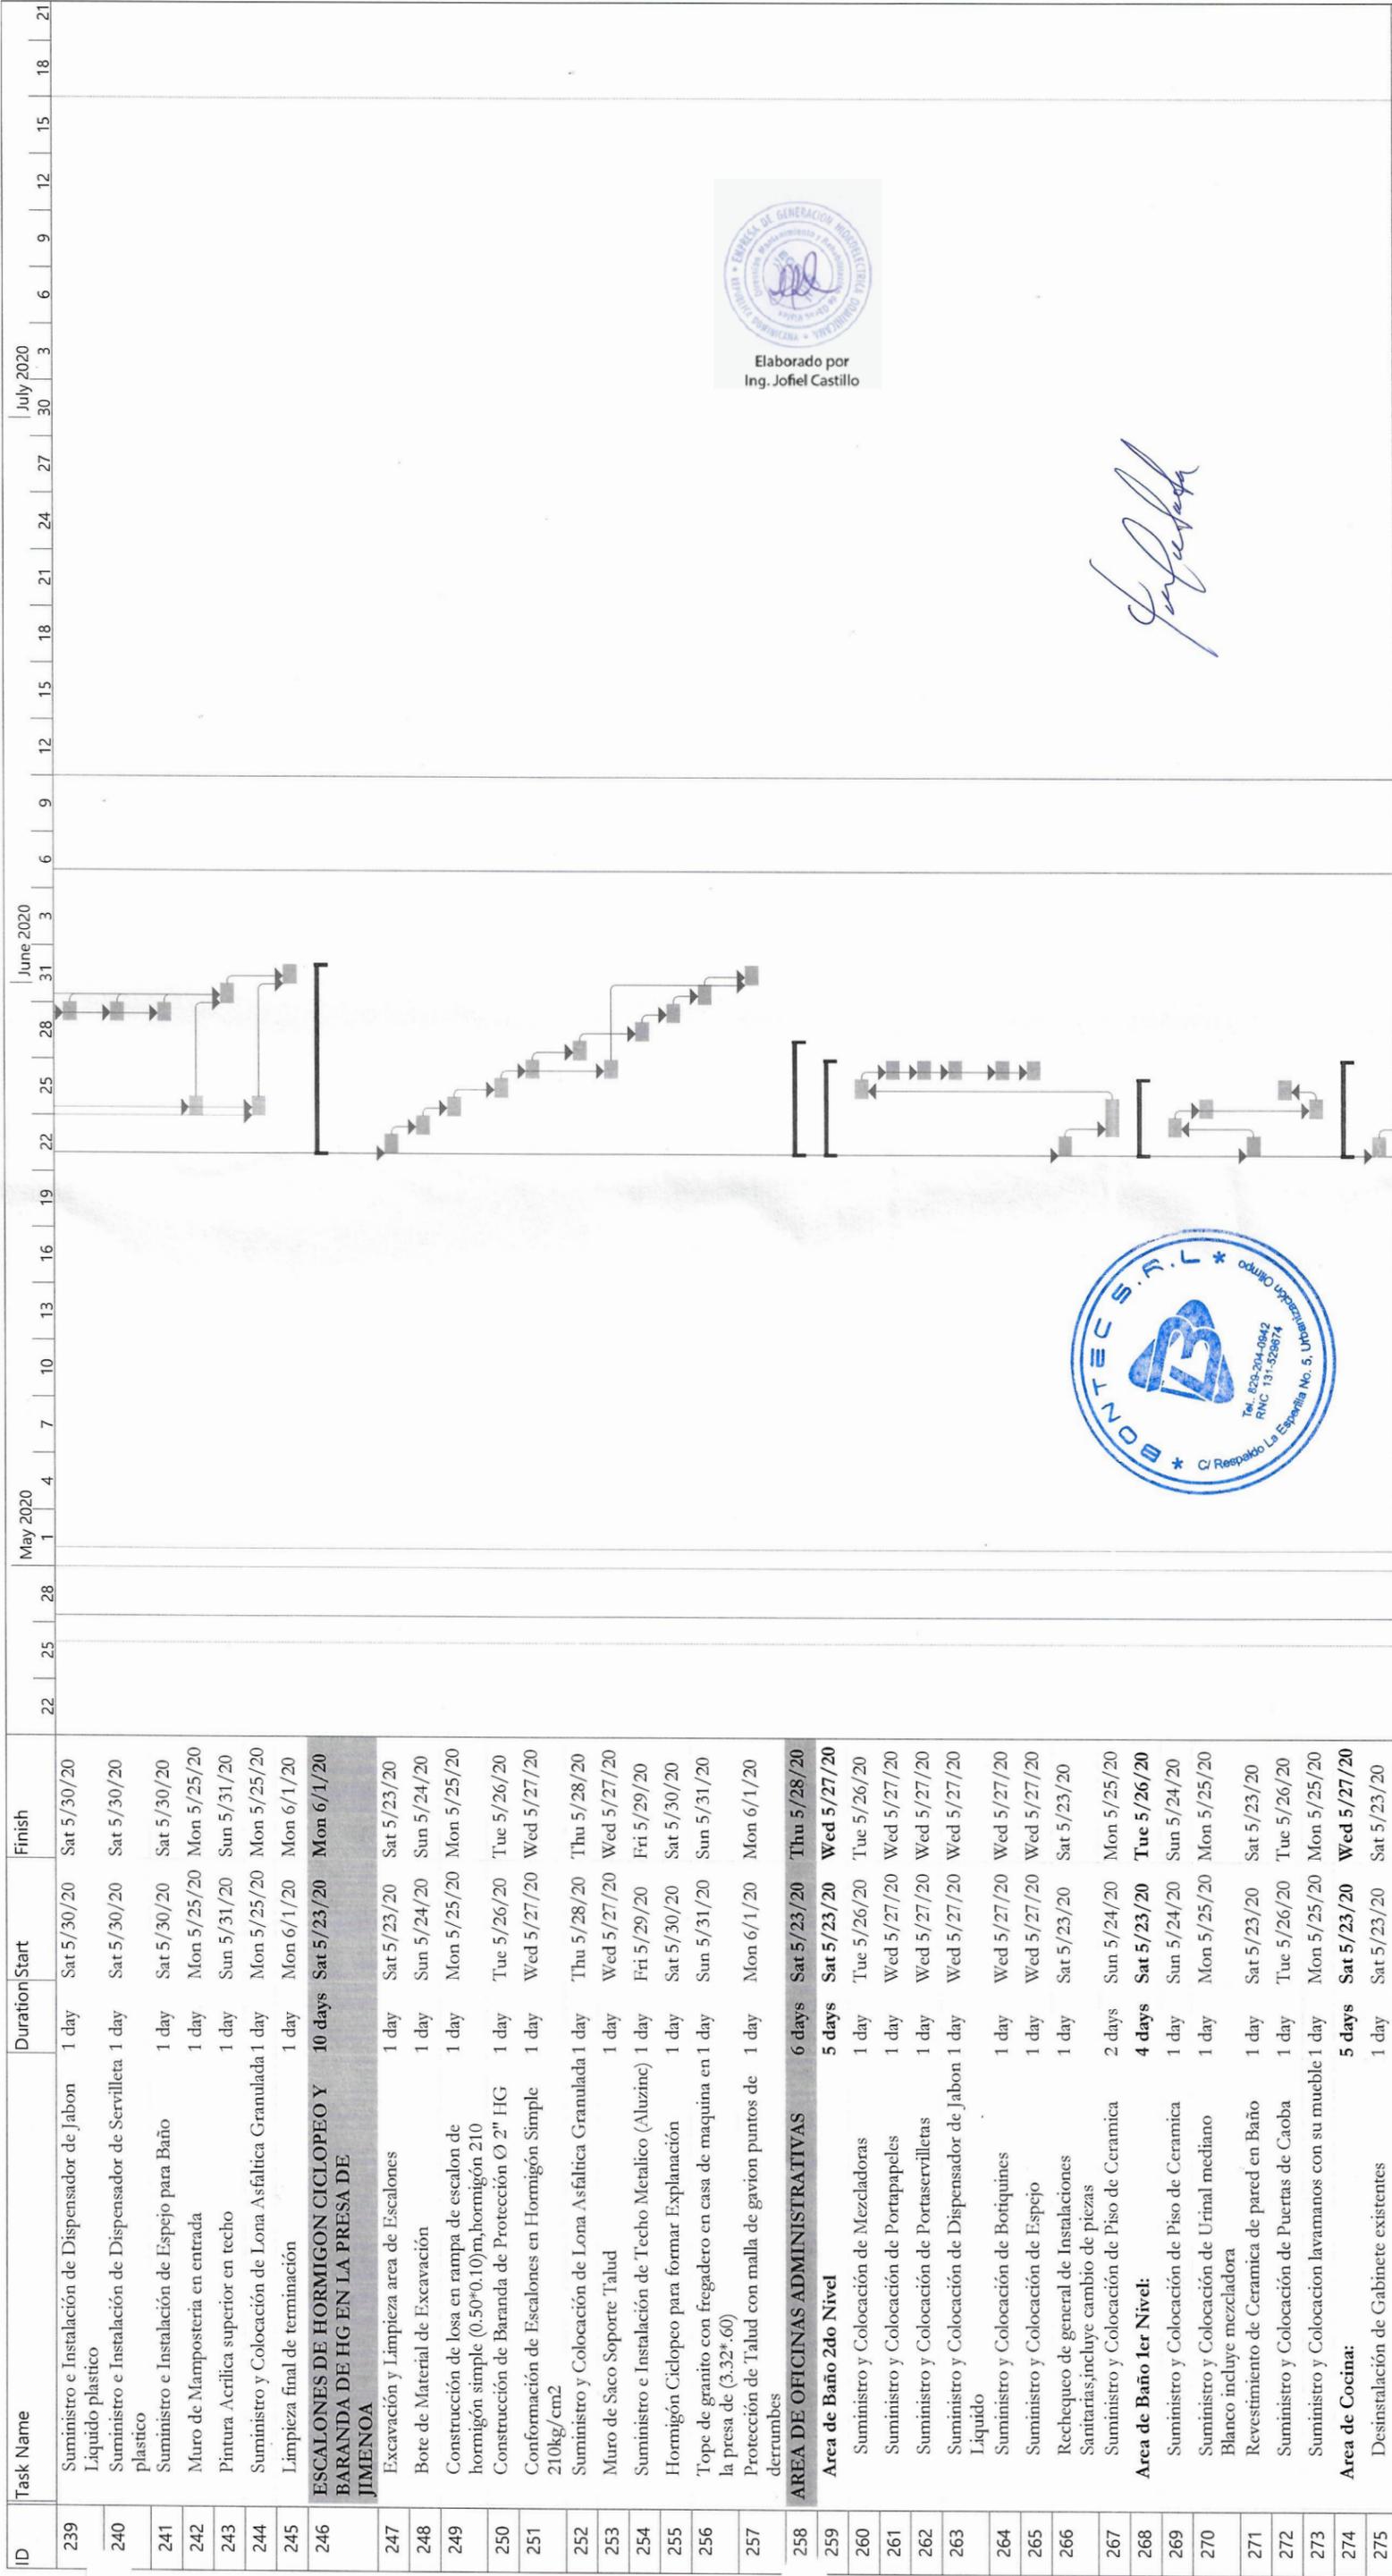


Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Jofiel Castillo

Nombre: Complejo Jimenoa
Inicio: Mon 4/27/20
Terminación: Fri 7/17/20

Task Legend:
 Task: [Bar] Task
 Split: [Dotted line] Split
 Milestone: [Diamond] Milestone
 Summary: [Bracket] Summary
 Project Summary: [Thick bar] Project Summary
 Inactive Task: [Thin bar] Inactive Task
 Inactive Milestone: [Thin diamond] Inactive Milestone
 Inactive Summary: [Thin bracket] Inactive Summary
 Manual Task: [Thick bar] Manual Task
 Duration-only: [Thin bar] Duration-only
 Manual Summary Rollup: [Thick bar] Manual Summary Rollup
 Manual Summary: [Thin bar] Manual Summary
 Start-only: [Thin bar] Start-only
 Finish-only: [Thin bar] Finish-only
 External Tasks: [Thin bar] External Tasks
 External Milestone: [Thin diamond] External Milestone
 Deadline: [Arrow] Deadline
 Progress: [Thin bar] Progress
 Manual Progress: [Thin bar] Manual Progress

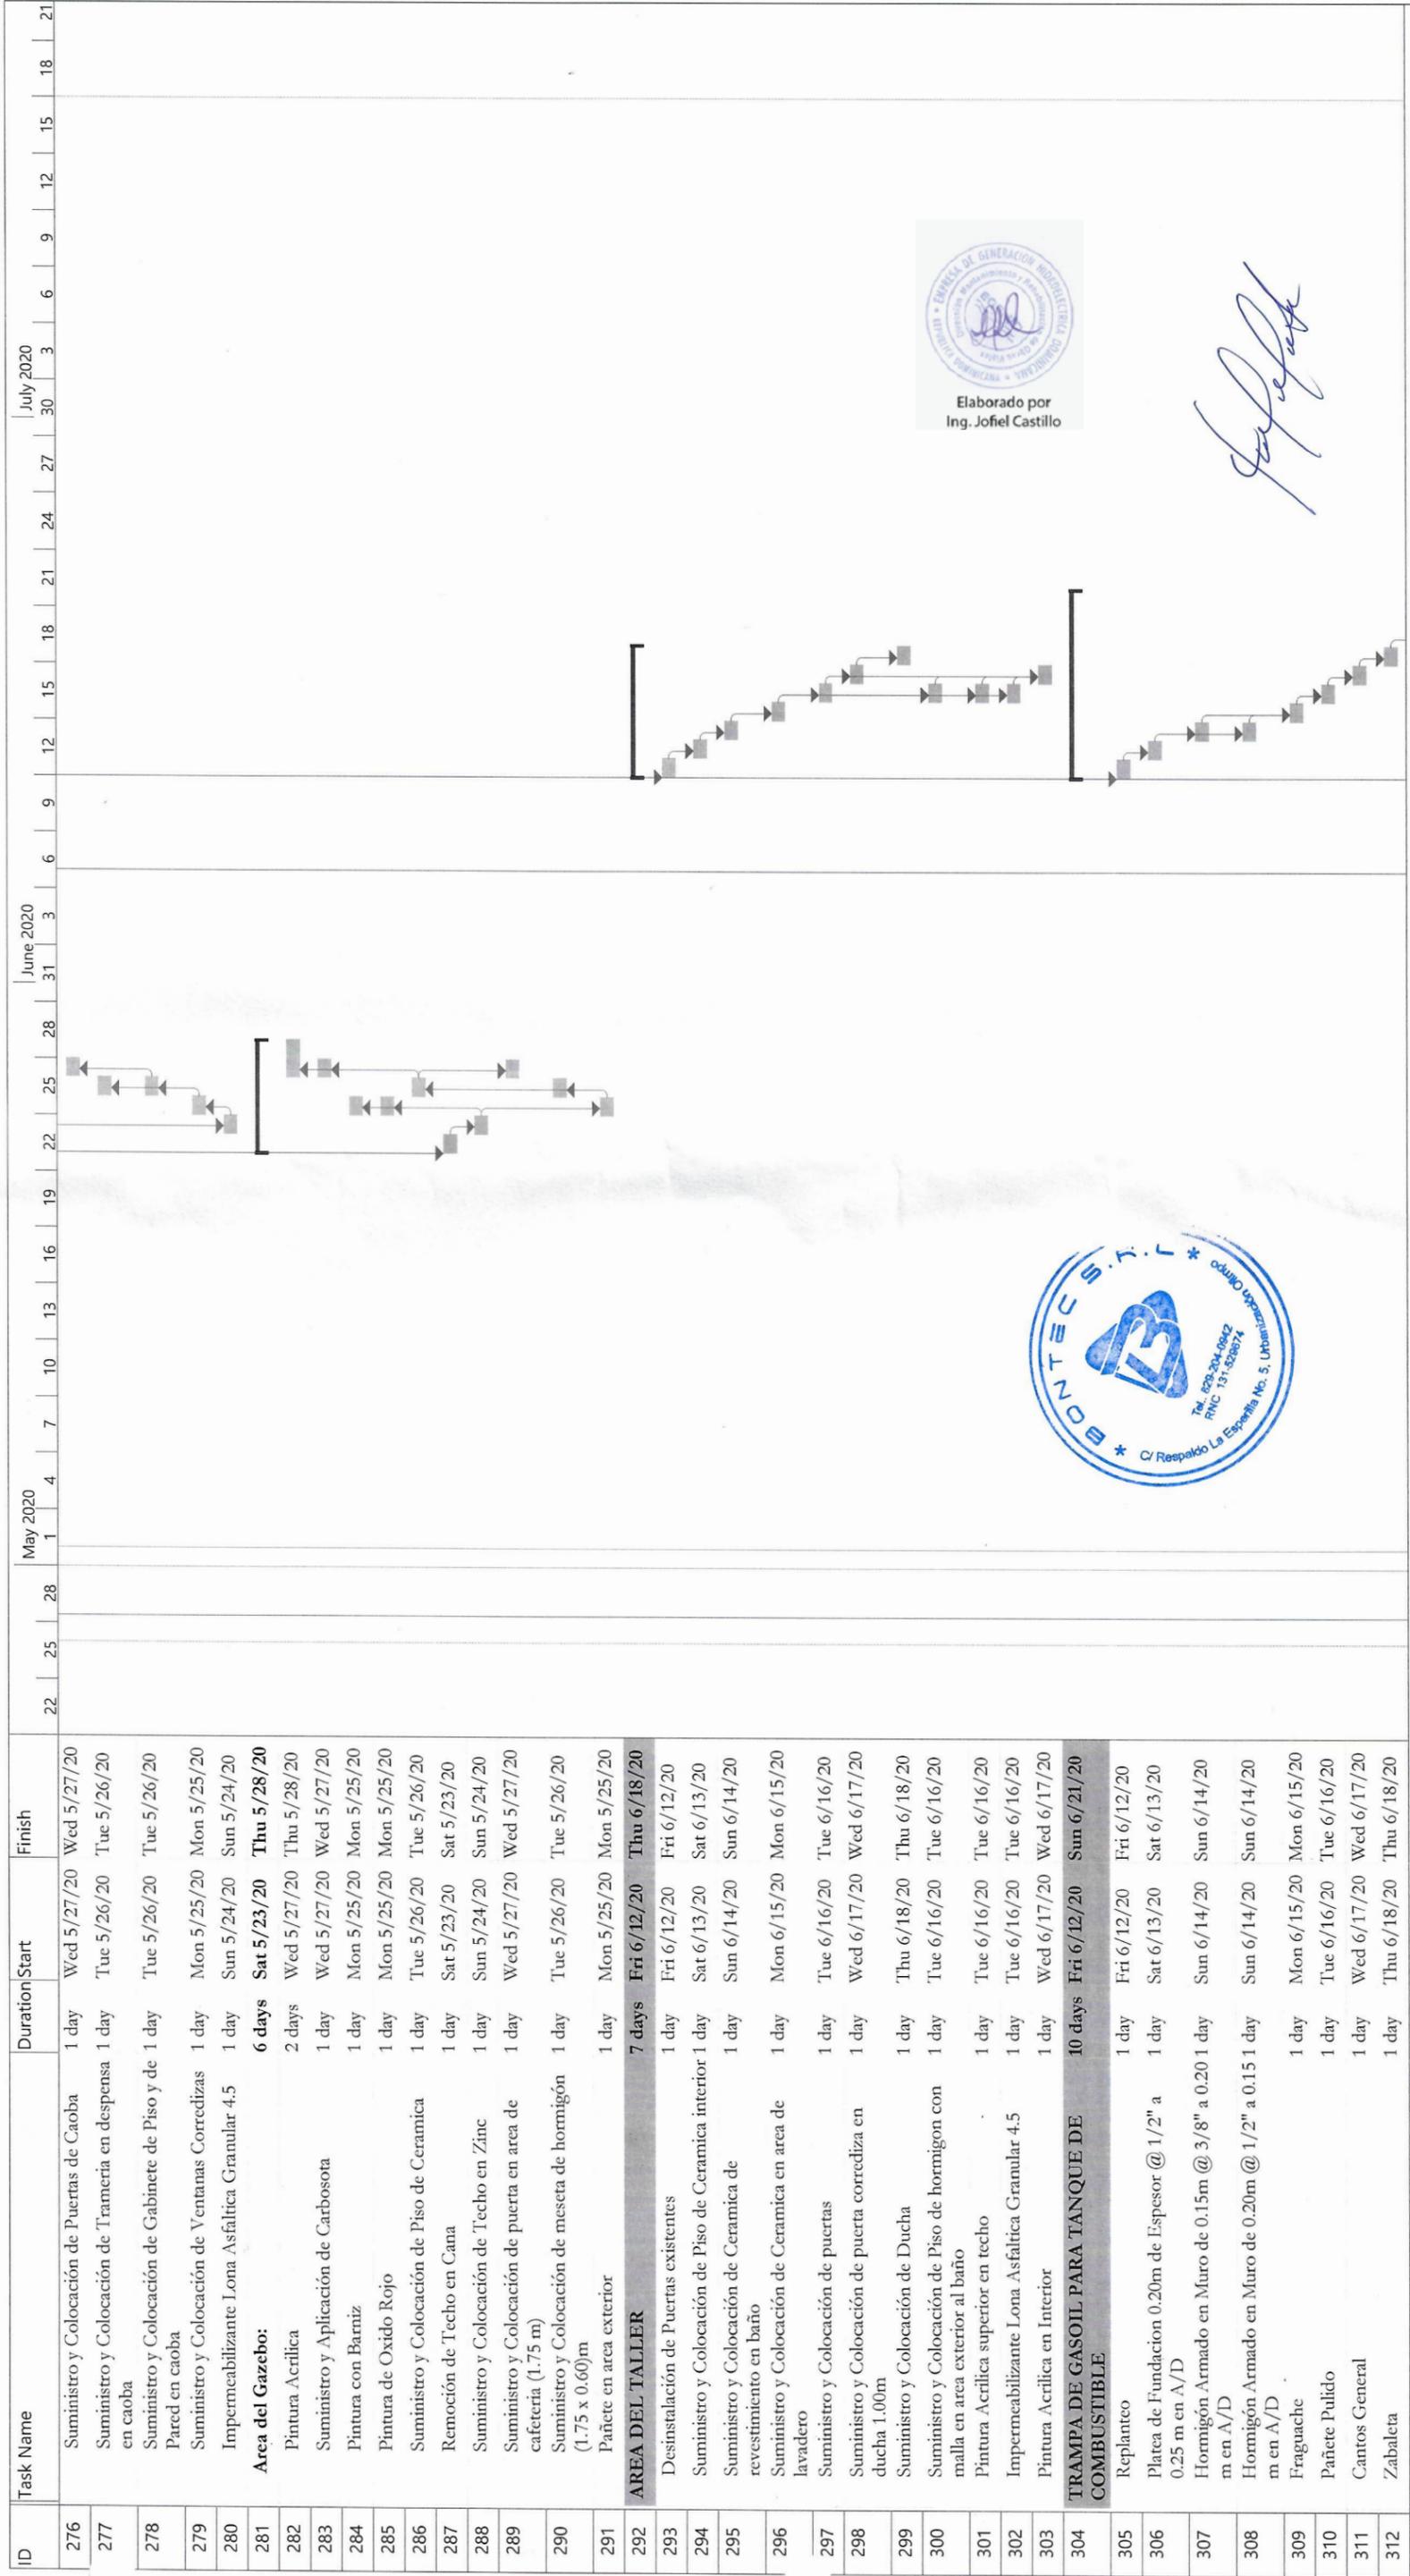


Jofiel Castillo

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
276	Suministro y Colocación de Puertas de Caoba	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20
277	Suministro y Colocación de Trameria en despensa en caoba	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20
278	Suministro y Colocación de Gabinete de Piso y de Pared en caoba	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20
279	Suministro y Colocación de Ventanas Corredizas	1 day	Mon 5/25/20	Mon 5/25/20
280	Impermeabilizante Lona Asfáltica Granular 4.5	1 day	Sun 5/24/20	Sun 5/24/20
281	Area del Gazebo:	6 days	Sat 5/23/20	Thu 5/28/20
282	Pintura Acrilica	2 days	Wed 5/27/20	Thu 5/28/20
283	Suministro y Aplicación de Carbosota	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20
284	Pintura con Barniz	1 day	Mon 5/25/20	Mon 5/25/20
285	Pintura de Oxido Rojo	1 day	Mon 5/25/20	Mon 5/25/20
286	Suministro y Colocación de Piso de Ceramica	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20
287	Remoción de Techo en Cana	1 day	Sat 5/23/20	Sat 5/23/20
288	Suministro y Colocación de Techo en Zinc	1 day	Sun 5/24/20	Sun 5/24/20
289	Suministro y Colocación de puerta en area de cafeteria (1.75 m)	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20
290	Suministro y Colocación de meseta de hormigon (1.75 x 0.60)m	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20
291	Pañete en area exterior	1 day	Mon 5/25/20	Mon 5/25/20
292	AREA DEL TALLER	7 days	Fri 6/12/20	Thu 6/18/20
293	Desinstalación de Puertas existentes	1 day	Fri 6/12/20	Fri 6/12/20
294	Suministro y Colocación de Piso de Ceramica interior	1 day	Sat 6/13/20	Sat 6/13/20
295	Suministro y Colocación de Ceramica de revestimiento en baño	1 day	Sun 6/14/20	Sun 6/14/20
296	Suministro y Colocación de Ceramica en area de lavadero	1 day	Mon 6/15/20	Mon 6/15/20
297	Suministro y Colocación de puertas	1 day	Tue 6/16/20	Tue 6/16/20
298	Suministro y Colocación de puerta corrediza en ducha 1.00m	1 day	Wed 6/17/20	Wed 6/17/20
299	Suministro y Colocación de Ducha	1 day	Thu 6/18/20	Thu 6/18/20
300	Suministro y Colocación de Piso de hormigon con malla en area exterior al baño	1 day	Tue 6/16/20	Tue 6/16/20
301	Pintura Acrilica superior en techo	1 day	Tue 6/16/20	Tue 6/16/20
302	Impermeabilizante Lona Asfáltica Granular 4.5	1 day	Tue 6/16/20	Tue 6/16/20
303	Pintura Acrilica en Interior	1 day	Wed 6/17/20	Wed 6/17/20
304	TRAMPA DE GASOIL PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE	10 days	Fri 6/12/20	Sun 6/21/20
305	Replanteo	1 day	Fri 6/12/20	Fri 6/12/20
306	Plataca de Fundacion 0.20m de Espesor @ 1/2" a 0.25 m en A/D	1 day	Sat 6/13/20	Sat 6/13/20
307	Hormigon Armado en Muro de 0.15m @ 3/8" a 0.20 m en A/D	1 day	Sun 6/14/20	Sun 6/14/20
308	Hormigon Armado en Muro de 0.20m @ 1/2" a 0.15 m en A/D	1 day	Sun 6/14/20	Sun 6/14/20
309	Fraguache	1 day	Mon 6/15/20	Mon 6/15/20
310	Pañete Pulido	1 day	Tue 6/16/20	Tue 6/16/20
311	Cantos General	1 day	Wed 6/17/20	Wed 6/17/20
312	Zabaleta	1 day	Thu 6/18/20	Thu 6/18/20

Nombre: Complejo Jimenoa
 Inicio: Mon 4/27/20
 Terminación: Fri 7/17/20

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
352	Suministro y Colocación de Portapapeles, dispensador de Jabón Líquido, Dispensador de Suministro e Instalación de Espejos para Baño	1 day	Thu 6/18/20	Thu 6/18/20
353	REHABILITACION PISCINA	38 days	Sun 6/7/20	Tue 7/14/20
354	Demolición General Area de Piscina	3 days	Sun 6/7/20	Tue 6/9/20
355	Bote General	1 day	Tue 6/30/20	Tue 6/30/20
356	Piso y Muros de Hormigón Doblemente Armado Ø1/2" a 0.20m en A/D	10 days	Wed 6/10/20	Fri 6/19/20
357	Suministro y Colocación de mosaico para Revestimiento Muros y Piso interior en Piscina	10 days	Sat 6/20/20	Mon 6/29/20
358	Suministro y Colocación de Piso Exterior em Coralim	10 days	Sun 7/5/20	Tue 7/14/20
359	Tuberías y Piezas en Area de Carga y Descarga	25 days	Wed 6/10/20	Sat 7/4/20
360	Suministro e Instalación de Bomba de 1.5 HP y Valvula Selectora de 6 posiciones y filtro de 32	1 day	Sun 7/5/20	Sun 7/5/20
361	Suministro e Instalación de Desague de Piso	1 day	Sun 7/5/20	Sun 7/5/20
362	Suministro e Instalación de Skincer	1 day	Sun 7/5/20	Sun 7/5/20
363	Suministro e Instalación de Jet	1 day	Sat 6/20/20	Sat 6/20/20
364	Suministro e Instalación de Luces	1 day	Sat 6/20/20	Sat 6/20/20
365	Pozo Filtrante de 200 pies	1 day	Sun 7/5/20	Sun 7/5/20
366	ALCANTARILLA TUBULAR DE 42"	15 days	Tue 4/28/20	Tue 5/12/20
367	Replanteo	1 day	Tue 4/28/20	Tue 4/28/20
368	Excavación	10 days	Wed 4/29/20	Fri 5/8/20
369	Asiento de Arena	10 days	Fri 5/1/20	Sun 5/10/20
370	Suministro, Colocación y Transporte de Alcantarillas de 42"	10 days	Fri 5/1/20	Sun 5/10/20
371	Relleno de reposición	10 days	Sat 5/2/20	Mon 5/11/20
372	Bote	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20
373	GASTOS INDIRECTOS	82 days?	Mon 4/27/20	Fri 7/17/20
374	Dirección Técnica	82 days?	Mon 4/27/20	Fri 7/17/20
375	Gastos Administrativos	82 days?	Mon 4/27/20	Fri 7/17/20
376	Seguro y Fianzas	82 days?	Mon 4/27/20	Fri 7/17/20
377	Liquidación de Obreros	82 days?	Mon 4/27/20	Fri 7/17/20
378	Imprevistos	82 days?	Mon 4/27/20	Fri 7/17/20
379	18% ITBIS A Dirección Técnica	82 days?	Mon 4/27/20	Fri 7/17/20
380				

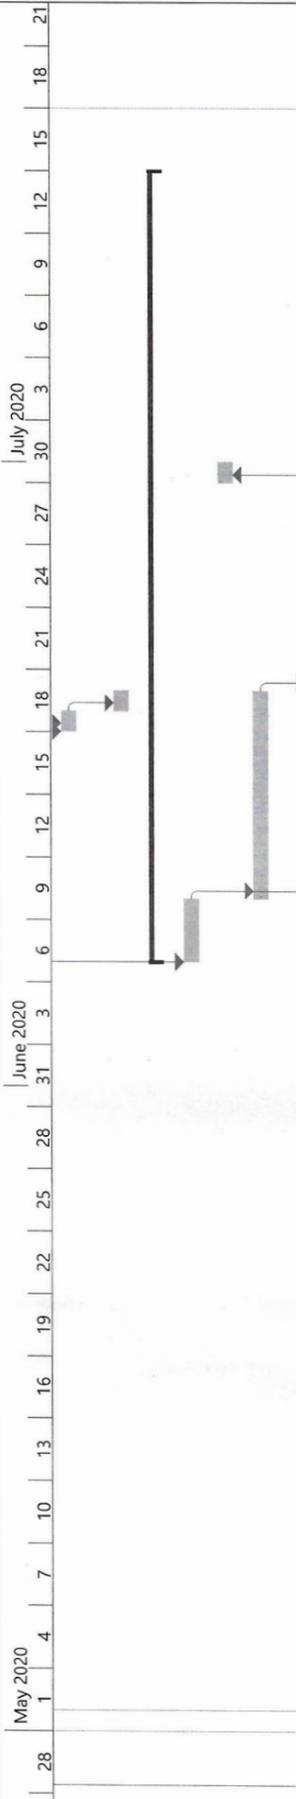

Elaborado por
Ing. Joffel Castillo

<p>Nombre: Complejo Jimenoa Inicio: Mon 4/27/20 Terminación: Fri 7/17/20</p>	<p>Task</p> <p>Split</p> <p>Milestone</p> <p>Summary</p>	<p>Project Summary</p> <p>Inactive Task</p> <p>Inactive Milestone</p> <p>Inactive Summary</p>	<p>Manual Task</p> <p>Duration-only</p> <p>Manual Summary Rollup</p> <p>Manual Summary</p>	<p>Start-only</p> <p>Finish-only</p> <p>External Tasks</p> <p>External Milestone</p>	<p>Deadline</p> <p>Progress</p> <p>Manual Progress</p>
--	--	---	--	--	--
