


ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	T	W	T	W	T	F	S	Mar 22, '20	S	M	T	W	T	F	S	Mar 29, '20	S	M	T	W	T	F	S	Apr 5, '20	S	M		
24	✦	Suministro y Colocación de Piezas Especiales para empalme varios en Hg y Pvc.	2 days	Wed 5/13/20	Thu 5/14/20	15																													
25	✦	Perforación de (1) Pozo con maquina de rotación para abastecimiento de agua en diametro de 8 pulgs. Para ser encamisado en tubería de hierro negro de 6 pulgs. Con un espesor de 1/4", incluye	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	16																													
26	✦	Suministro y Colocación Valvula de Ø 2" en Hg.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																													
27	✦	Suministro y Colocación de Valvula de Ø 3" en Hg	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																													
28	✦	Suministro e Instalación de Bomba Sumergible monofásica de 3HP, Incluye Bomba Sumergible con su caja de control, tubería de 1de presión, alambre de vinil 10/3, tubos eléctricos de 3/4", alambre eléctrico No. 8, tapa de seguridad para pozo, cable de acero	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																													
29	✦	Suministro Switch de seguridad de 50 amp. , incluye alambrado desde trasformador hasta Bomba.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																													
30	✦	Mano de Obra Switch de seguridad de 50 amp. Incluye alambrado desde transformador hasta la	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	24																													
31	✦	Suministro de Postes de Luz de 35 DAN	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	25																													
32	✦	Instalación de Postes de 35 DAN, incluye hincado	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	25																													
33	✦	Suministro e Instalación Herrajes Postes de Luz de 35	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	25																													
34	✦	Suministro Transformador de 15 KVA incluye instalación.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	33																													
35	✦	Suministro e Instalación de Cutao y Pararrayos.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	33																													



Proyecto: Vista hermosa, la plat
Fecha: Wed 3/18/20



ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	T	W	T	F	S	Mar 22, '20	S	M	T	W	T	F	S	Mar 29, '20	S	M	T	W	T	F	S	Apr 5, '20	S	M
36	✈	Suministro de alambrado Triple AAA 1/0.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	33																									
37	✈	Instalación Tendido Eléctrico.	2 days	Fri 5/15/20	Mon 5/18/20	33																									
38	✈	Transporte Postes de Luz (Sunds.).	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	33																									
39	✈	Acera de Hormigón	2 days	Mon 5/18/20	Tue 5/19/20	35																									
40	✈	Construcción de Zaabaleta de Protección a Tubería Hg Paso del Tunel.	2 days	Mon 5/18/20	Tue 5/19/20	35																									
41	📄																														
42	📄																														
43	✈?	Caseta de Bombeo																													
44	✈	Replanteo y Nivelación.	1 day	Mon 5/4/20	Mon 5/4/20	10																									
45	✈	Plata de Fundación	2 days	Tue 5/5/20	Wed 5/6/20	44																									
46	✈	Dinteles	2 days	Thu 5/7/20	Fri 5/8/20	45																									
47	✈	Losa de Techo de Ø 3/8 " a 0.15m en AD doblemente armada.	3 days	Mon 5/11/20	Wed 5/13/20	46																									
48	✈	Blocks de 6" SNP	1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20	45																									
49	✈	Pañete en Muros	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	48																									
50	✈	Pañete en Techo.	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	48																									
51	✈	Piso de Hormigón Frotado.	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50																									
52	✈	Suministro y Colocación de Puerta Enrollable	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	51																									
53	✈	Pintura Acrilica en Muro.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	51																									
54	✈	Pintura Económica en Techo	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	51																									
55	✈	Salida de Luces Genitales	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50																									
56	✈	Interruptores Sencillos	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50																									
57	✈	Tomacorriente Doble 120V, Polarizado	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50																									
58	✈	Caja de Breakers de 2 a 4	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50																									
59	✈	Mano Obra de Electricidad	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50																									
60	✈	Tubería y Piezas	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50																									
61	✈	Limpieza Final	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	60																									
62	📄																														
63	✈?	Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en el Sector La Movimiento de Tierra.																													
64	✈?																														
65	✈	Construcción Terracería.	2 days	Tue 5/5/20	Wed 5/6/20	44																									



Proyecto: Vista hermosa, la plat Fecha: Wed 3/18/20	Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo	[Fecha límite	↓
	División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin]	Progreso	
	Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
90	★	Suministro y Colocación Tubería Ø 3" PVC SDR-26 para empalme de distribución.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	84	
91	★	Suministro y Colocación de Tubería de 1/2" acometidas.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	84	
92	★	Suministro e Instalación de Bomba Sumergible monofásica de 3 HP, incluye Bomba Sumergible con su caja de control, tubería de 1" de Presión, alambre eléctrico No. 8, tapa de seguridad para pozo, sogas de nylon y demás accesorios e instalación de	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
93	★	Suministro Switch de seguridad de 50 amp. Incluye alambrado desde	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
94	★	Transformador hasta Bomba. Mano Obra Switch de seguridad de 50 amp. Incluye alambrado desde	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
95	★	transformador hasta Bomba. Suministro de Postes de 35 Df1	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
96	★	Instalación Postes de Luz de 35 DAN, incluye hincado.	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
97	★	Suministro e Instalación Herrajes Postes de Luz de 35	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
98	★	Suministro Transformador de 15 KVA incluye instalación.	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
99	★	Suministro e Instalación Cutao y Pararrayos.	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
100	★	Suministro Alambrado Triple AAA 1/0.	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
101	★	Instalación Tendido Eléctrico.	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	100	
102	★	Transporte Postes de Luz (5Uc1	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	100	
103	★	Suministro y Colocación de Alcantarilla de 42" clase 3, (incluye movimiento de	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	91	
104	★						
105	?	Caseta de Bombeo					
106	★	Replanteo y Nivelación.	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	44	
107	★	Plataea de Fundación	1 day	Wed 5/6/20	Wed 5/6/20	106	




Proyecto: Vista hermosa, la plat
 Fecha: Wed 3/18/20

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha limite
Division	Tarea inactiva	solo duracion	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	T	W	T	W	T	F	S	Mar 22, '20	S	M	T	W	T	F	S	Mar 29, '20	S	M	T	W	T	F	S	Apr 5, '20	S	M	
108	✓	Dinteles	1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20	107																												
109	✓	Losa.	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	108																												
110	✓	Blocks de 6" SNP	1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20	107																												
111	✓	Pañete en Muros	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	110																												
112	✓	Pañete en Techo.	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	110																												
113	✓	Piso de Hormigón Pulido a col.	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																												
114	✓	Suministro y Colocación de Puerta Enrollable	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	113																												
115	✓	Pintura Acrilica en Muro.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	113																												
116	✓	Pintura Económica en Techo	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	113																												
117	✓	Salida de Luces Genitales	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																												
118	✓	Interruptores Sencillos	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																												
119	✓	Tomacorriente Doble 120V, Polarizado	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																												
120	✓	Caja de Breakers de 2 a 4	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																												
121	✓	Mano Obra de Electricidad	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																												
122	✓	Tubería y Piezas	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	120																												
123	✓	Limpieza Final	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	122																												



royecto: Vista hermosa, la plat	Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha limite
Fecha: Wed 3/18/20	División	Tarea inactiva	solo duración	Progreso
	Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Progreso manual
	Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	

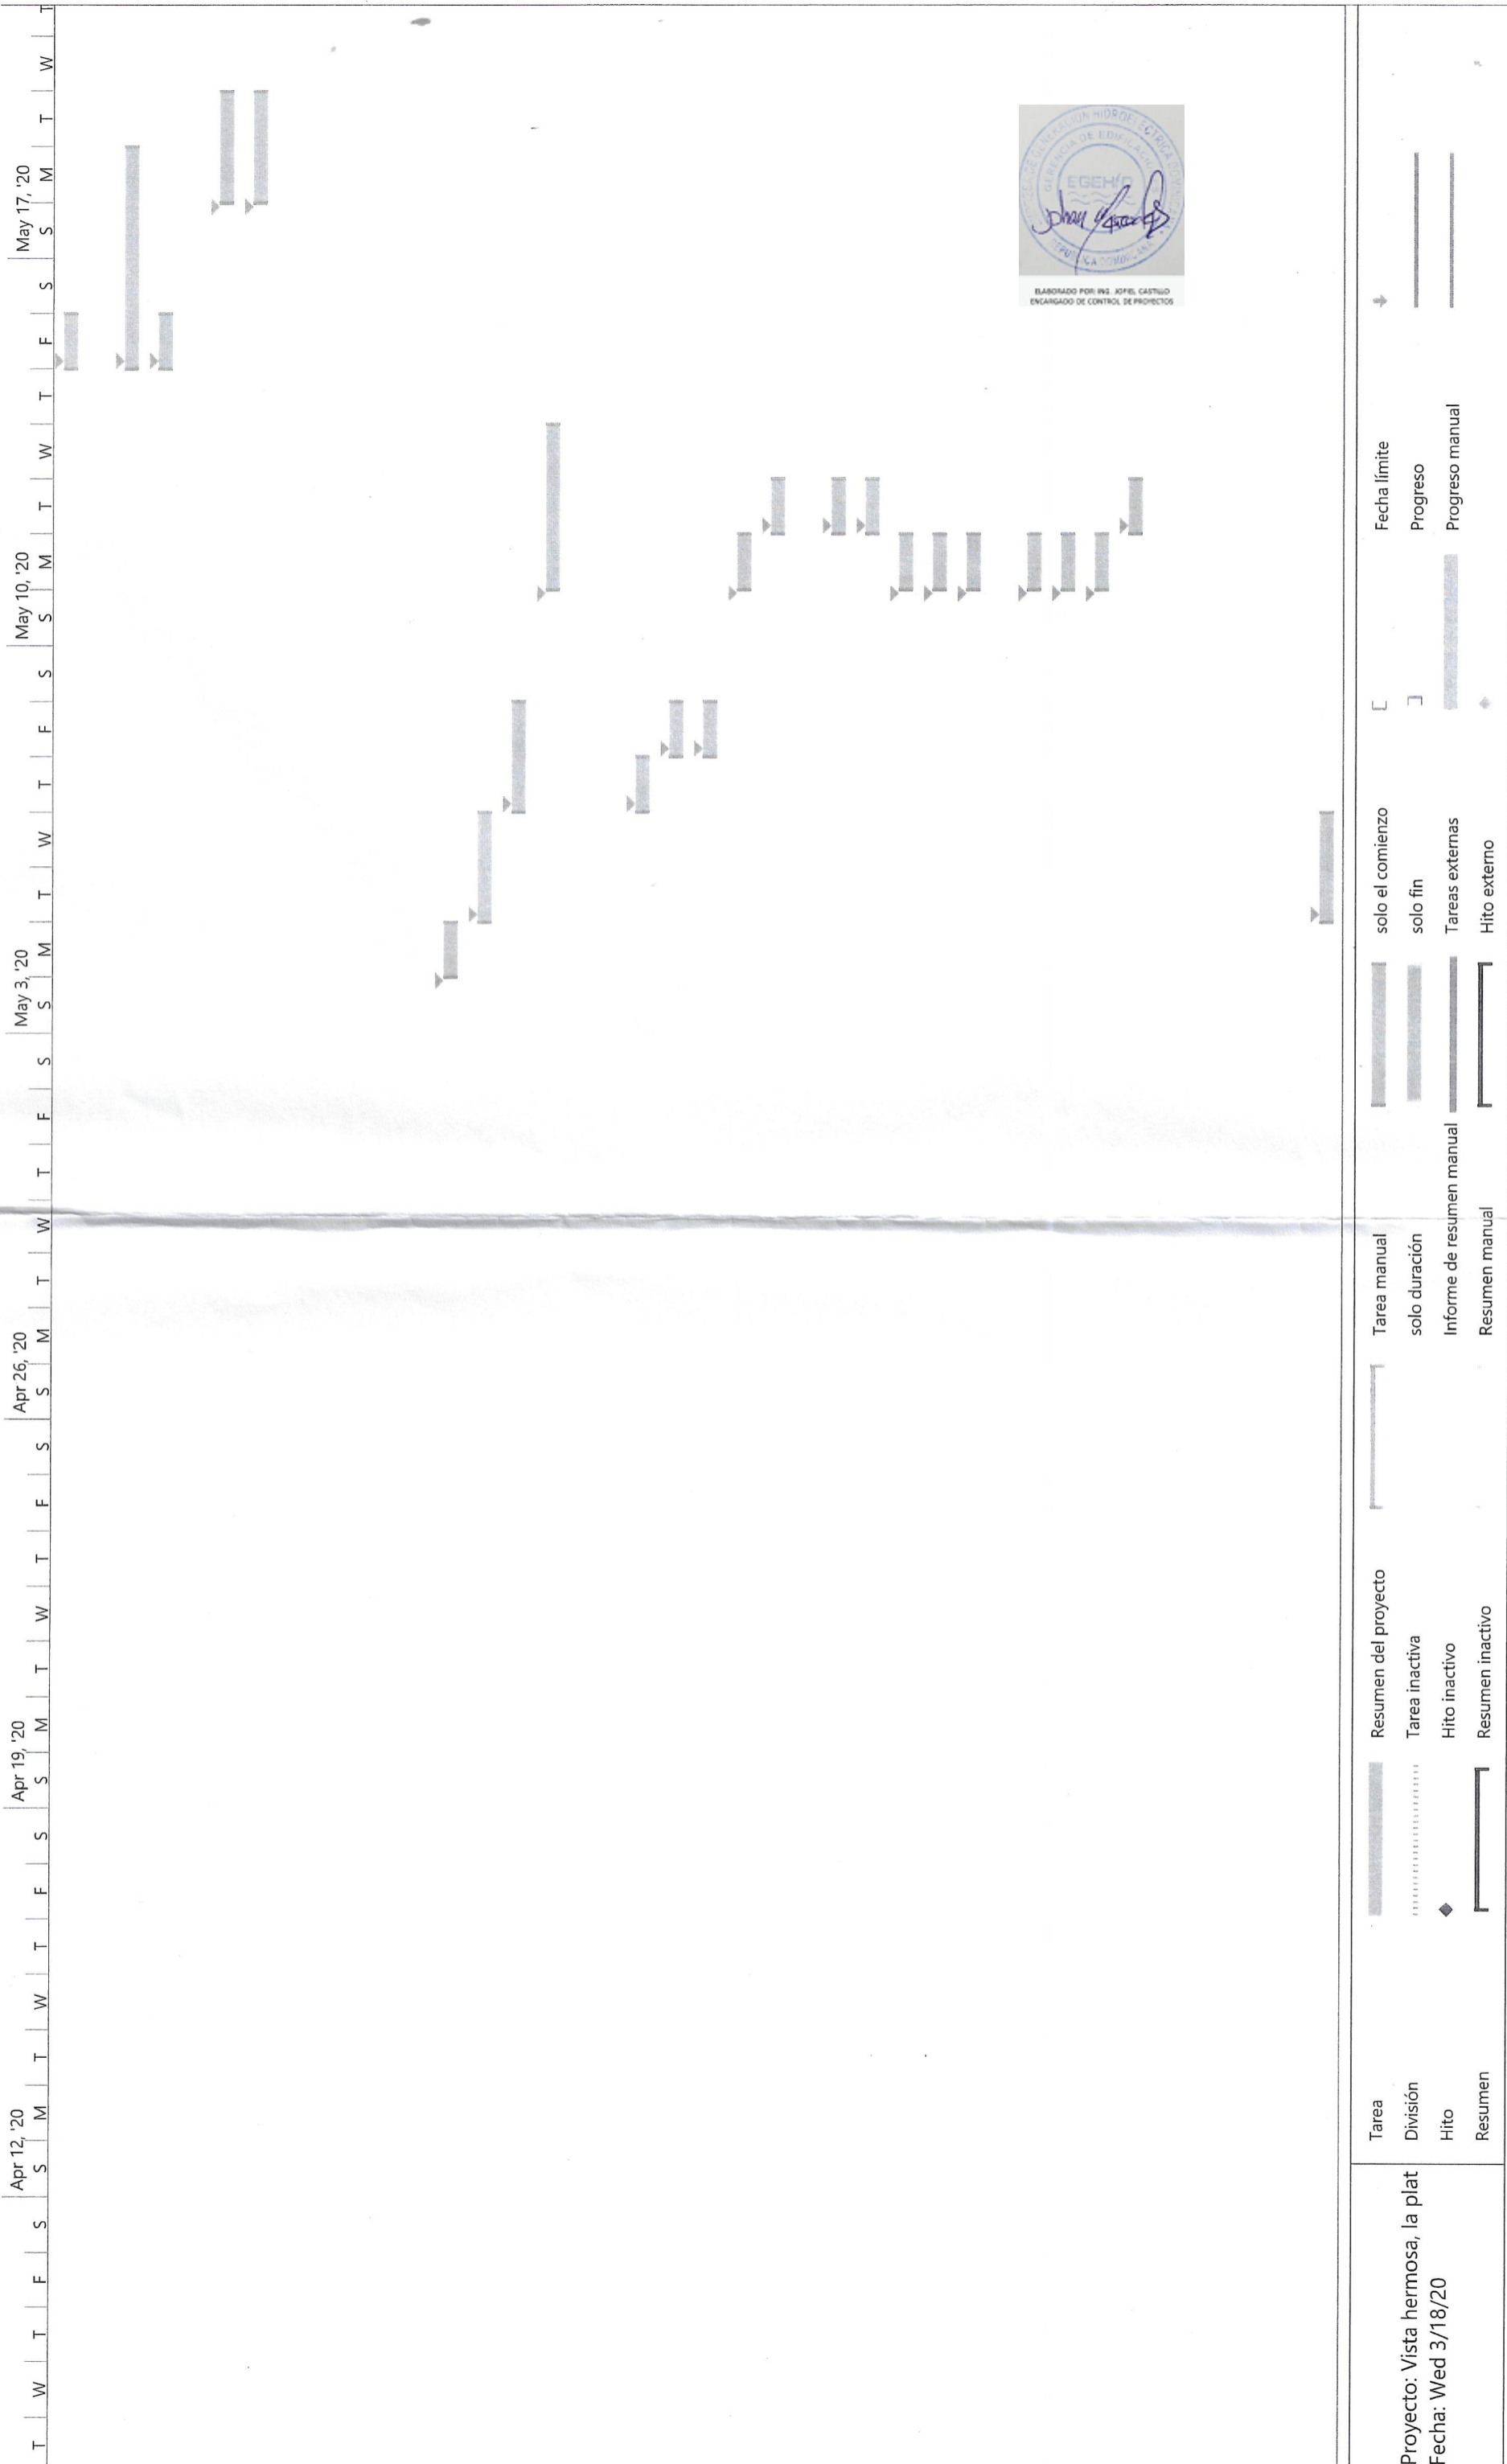

Proyecto: Vista hermosa, la plat
 Fecha: Wed 3/18/20


Tarea
 División
 Hito
 Resumen

Resumen del proyecto
 Tarea inactiva
 Hito inactivo
 Resumen inactivo

Tarea manual
 solo duracion
 Informe de resumen manual
 Resumen manual


solo el comienzo
 solo fin
 Tareas externas
 Hito externo

Fecha límite
 Progreso
 Progreso manual

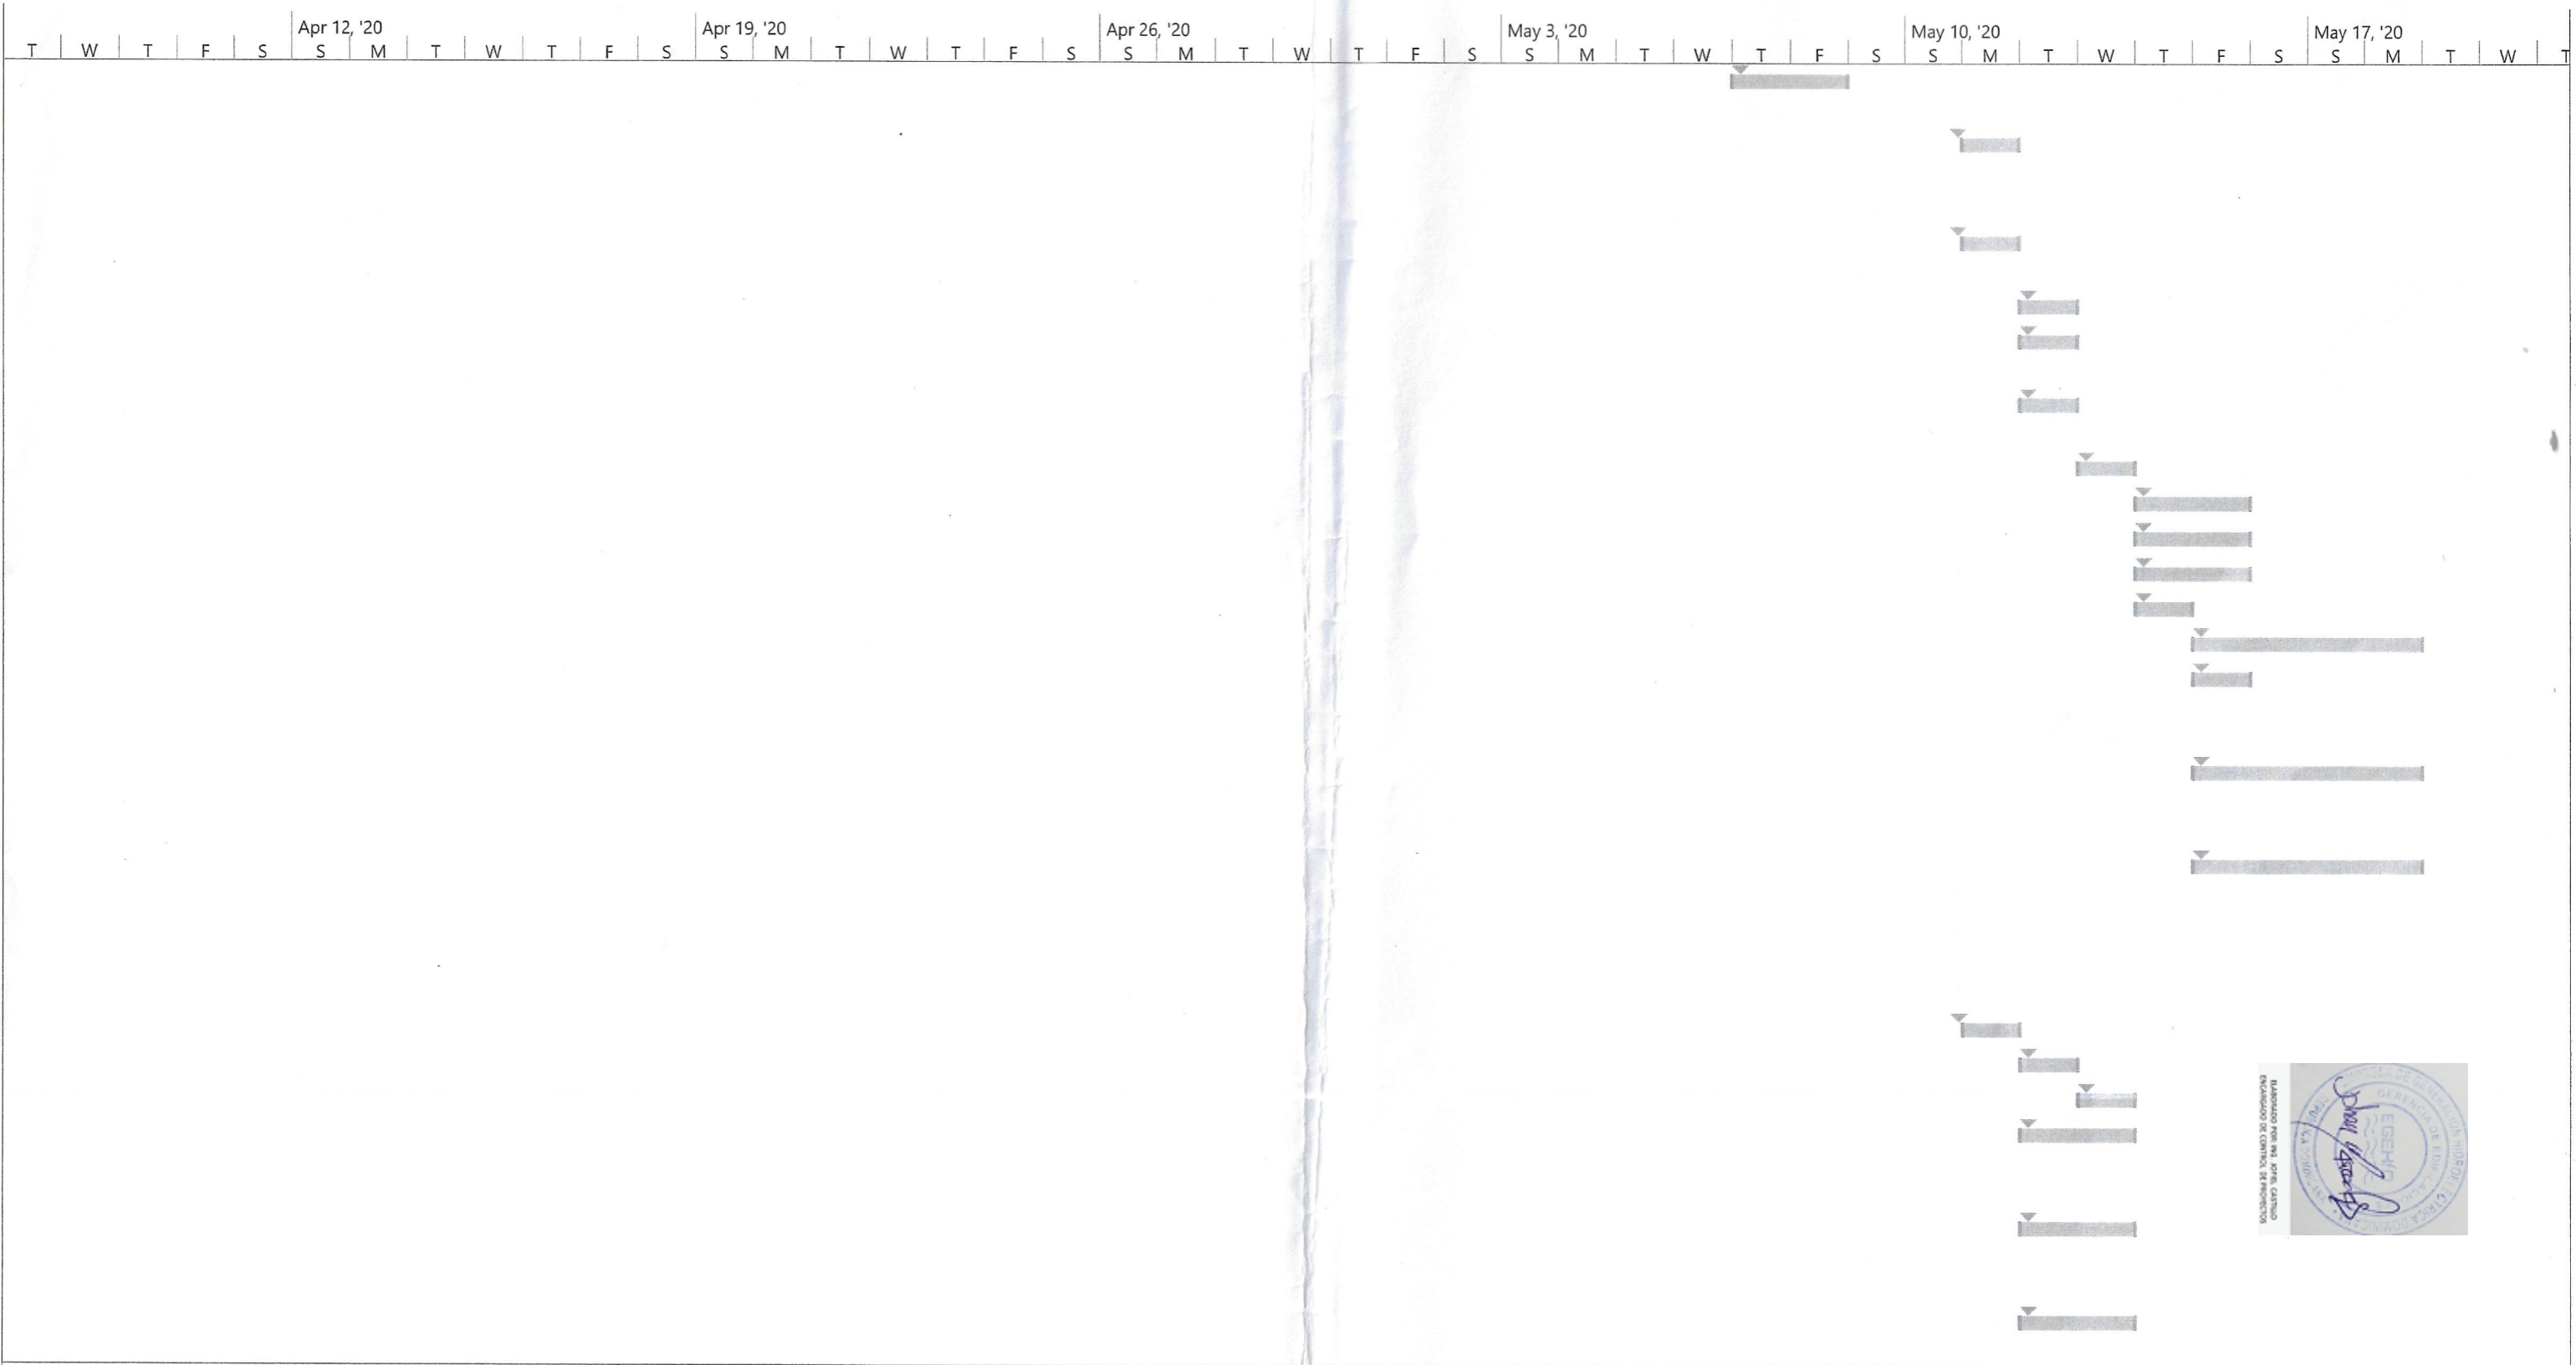


Proyecto: Vista hermosa, la plat
 Fecha: Wed 3/18/20

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

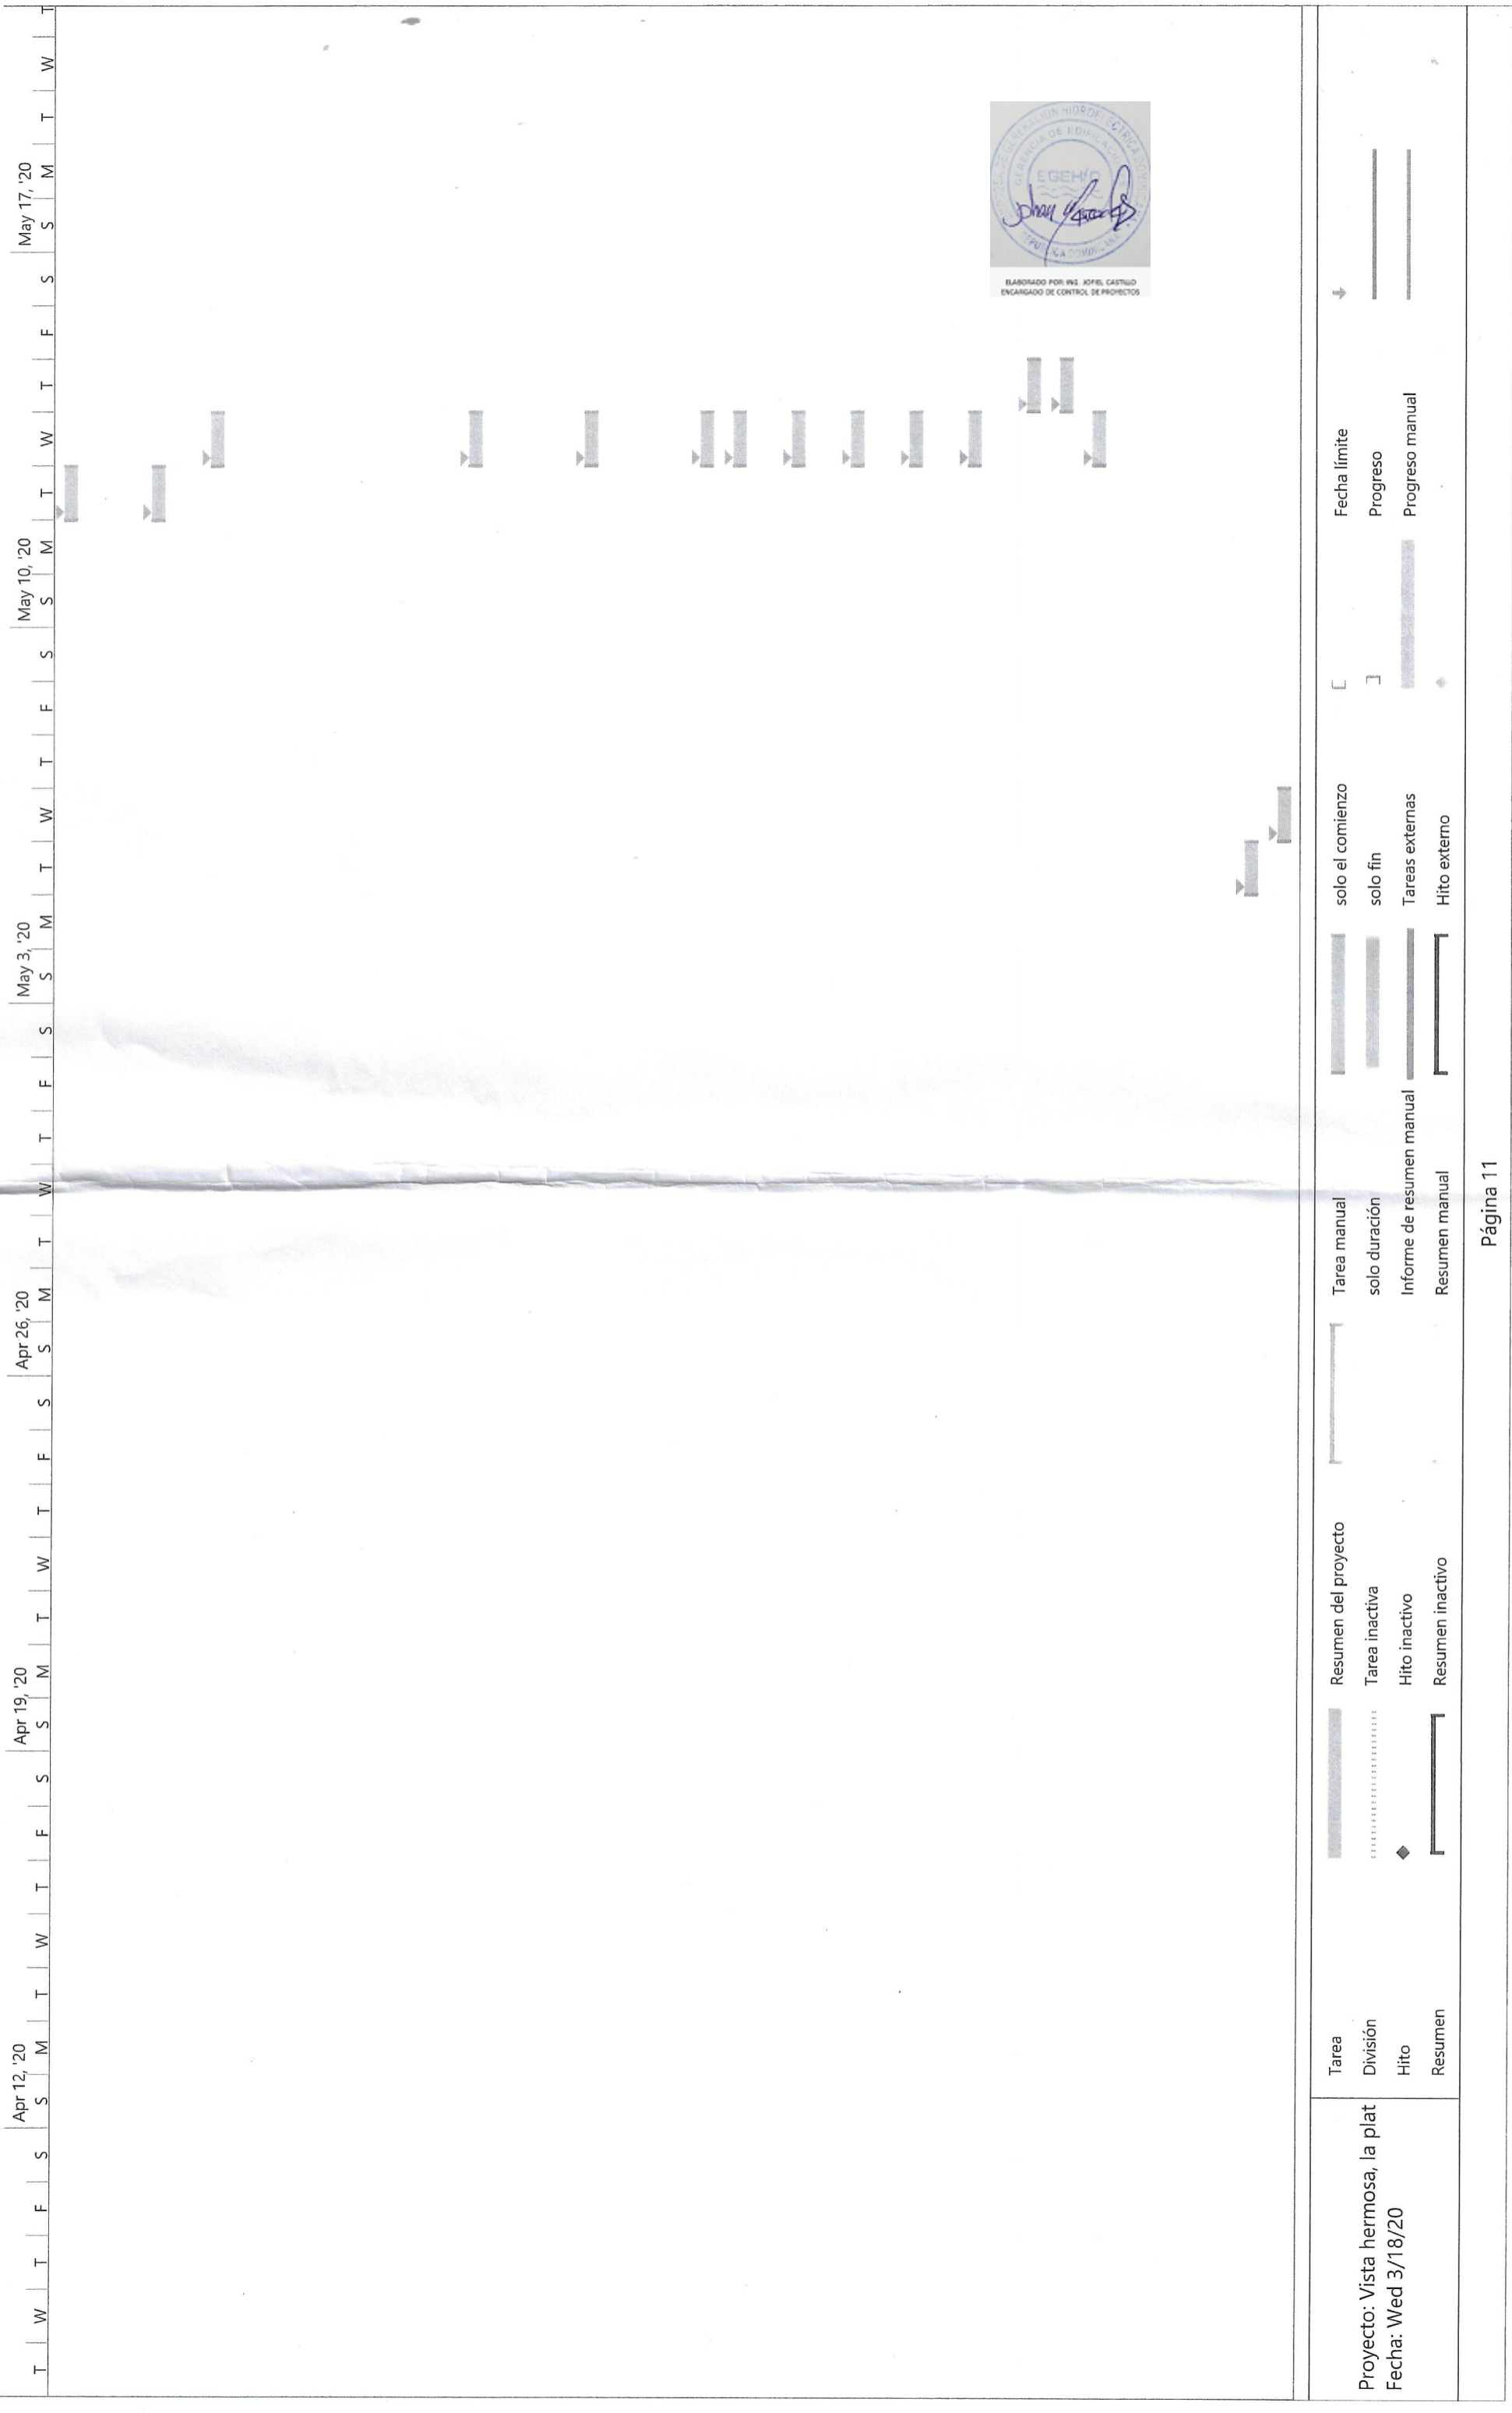

Proyecto: Vista hermosa, la plat
 Fecha: Wed 3/18/20

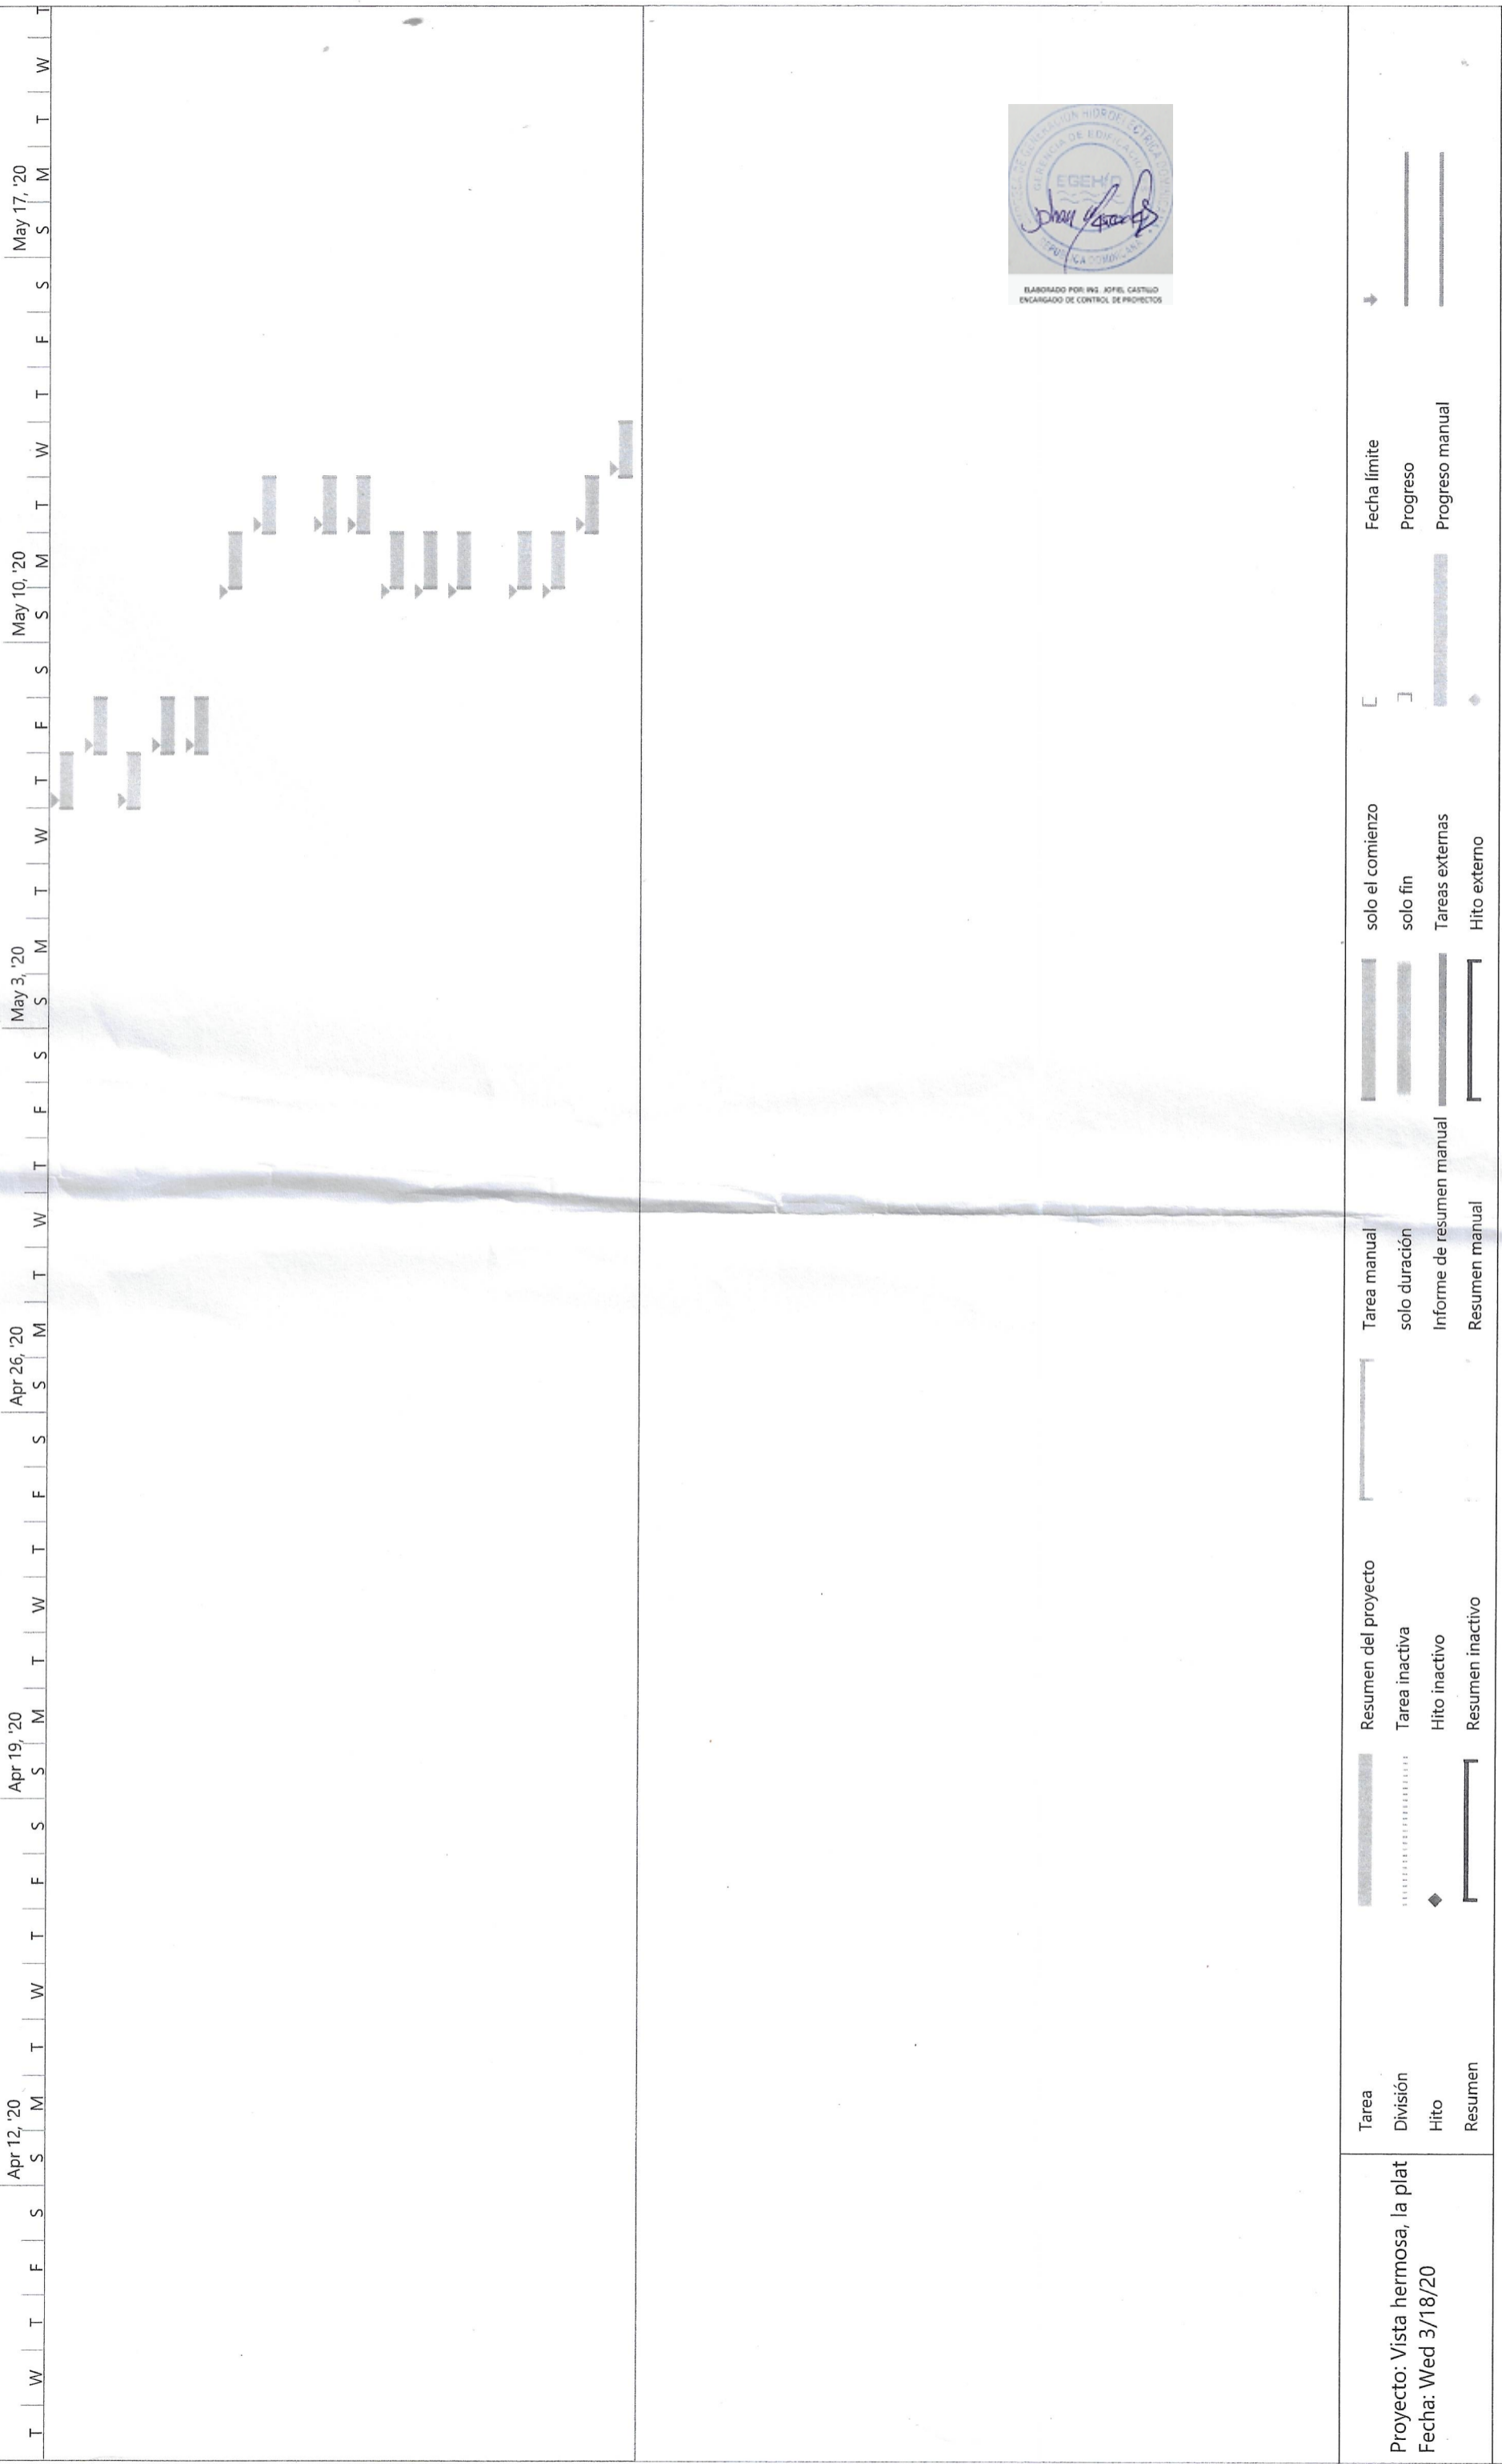

Proyecto: Vista hermosa, la plat
Fecha: Wed 3/18/20

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	
