


**CRONOGRAMA ACUEDUCTO MONTERIA
EGEHID**

ID	Task Name	Task Mode	Duration	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May
1	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO, ESTACION DE RELEVO, LINEA DE IMPULSION, BANI, PERAVIA.	1	132 days											
2	GENERALES	2	59 days											
3	PARTIDAS GENERALES	3	7 days											
4	CAMINOS DE ACCESO	4	25 days											
5	MANEJO DEL AGUA EN SITIO DE OBRA DE TOMA	5	45 days											
6	OBRA DE TOMA Y CARCAMO BOMBEO	6	87 days											
7	MOV. TIERRA EN OBRA DE TOMA Y CARCAMO DE BOMBEO	7	7 days											
8	HORMIGON INDUSTRIAL 210 EN CANAL, DESARENADOR Y CASETA DE BOMBEO.	8	60 days											
9	CANAL DE ADUCCION	9	30 days											
10	DESARENADOR	10	20 days											
11	CARCAMO DE BOMBEO	11	25 days											
12	CASETA DE BOMBEO	12	109 days											
13	MOV. TIERRA EN CASETA DE BOMBEO	13	3 days											
14	HORMIGON ARMADO EN CASETA DE BOMBEO	14	6 days											
15	MUROS EN CASETA BOMBEO	15	6 days											

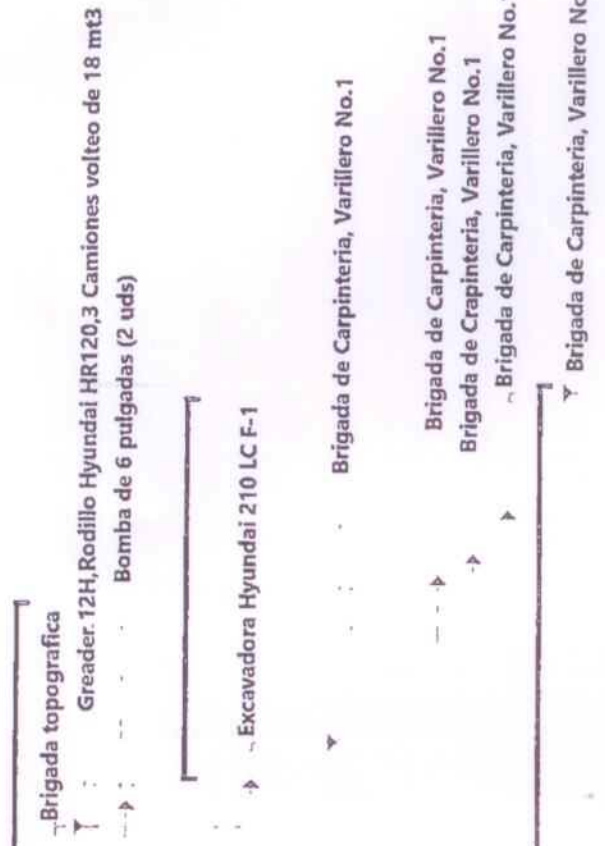

Task	Inactive Summary	Manual Task	Duration-only	Manual Summary Rollup	Manual Summary	Start-only	Finish-only	External Tasks
Split								External Milestone
Milestone								Deadline
Summary								Progress
Project Summary								Manual Progress
Inactive Task								
Inactive Milestone								

Project: BANI PERAVIA EGEHID
Date: Fri 7/26/19

**CRONOGRAMA ACUEDUCTO MONTERIA
EGEHID**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June
16	0%	TERMINACION DE TECHO EN CASETA DE BOMBEO	2 days												
17	0%	PUERTAS Y VENTANAS	7 days												
18	0%	ELECTRICIDAD EN CASETA	5 days												
19	0%	TANQUE IGUANA ABAJO TANQUE 80 days	80 days												
20	0%	NIVELACION Y REPLANTEO	5 days												
21	0%	MOV. DE TIERRA	45 days												
22	0%	CANALETA DE DRENAJE	20 days												
23	0%	CAJA DE VALVULAS	10 days												
24	0%	LINEA MATRIZ IGUANA ABAJO	45 days												
25	0%	VERJA PERIMETRAL TANQUE 2	30 days												
26	0%	TANQUE 2 LOS JOBITOS	82 days												
27	0%	MOV. DE TIERRA TANQUE LOS JOBITOS 2	15 days												
28	0%	H. ARMADO TANQUE NO.2 LOS JOBITOS	30 days												
29	0%	CANALETA DE DRENAJE	10 days												
30	0%	CAJA DE DESAGUE	7 days												
31	0%	CAJA DE VALVULA DE SALIDA	15 days												
32	0%	TUBERIA MATRIZ AC. LOS JOBITOS-BUENA VISTA-ARROYO	124 days												
33	0%	SALADO	100 days												



Task	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	Duration-only	Deadline
Summary	Manual Summary Rollup	Progress
Project Summary	Manual Summary	Manual Progress
Inactive Task	Start-only	
Inactive Milestone	Finish-only	

Project: BANI PERAVIA EGEHID
Date: Fri 7/26/19

**CRONOGRAMA ACUEDUCTO MONTERIA
EGEHID**

ID	Task Mode	Task Name	Duration	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May
34	☑	ANCLAJE DE TUBERIA	15 days											
35	☑	ALIMENTACION DE RESERVORIO	7 days											
36	☑	EQUIPO DE BOMBEO	25 days											
37	☑	VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES	25 days											
38	☑	CASETA DE CLORACION	20 days											
39	☑	SISTEMA DE CLORACION	20 days											
40	☑	LINEA ELETTRICA DE MEDIA TENSION	40 days											
41	☑	VERJA PERIMETRAL TANQUE 1	40 days											
42	☑	GASTOS INDIRECTOS	132 days											

Brigada de Carpinteria

Brigada Plomeria 1

Brigada Plomeria 1

Brigada Plomeria 2

Brigada de Albanileria No.3

Sub Contratista Equipos Cloracion

Sub Contratista Electrico Consultores del Caribe

Brigada de Albanileria No.3



Task	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	Duration-only	Deadline
Summary	Manual Summary Rollup	Progress
Project Summary	Manual Summary	Manual Progress
Inactive Task	Start-only	
Inactive Milestone	Finish-only	

Project: BANI PERAVIA EGEHID
Date: Fri 7/26/19
