



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN HIDROELÉCTRICA LAS PLACETAS.
PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

EJECUCION DE LA FASE I
CORRESPONDIENTE A LA CONTINUIDAD ESTUDIOS Y DISEÑO A NIVELES
BASICOS PARA OPTIMIZAR EL DISEÑO DE PRE-FACTIBILIDAD APROBADO
(2019)

INFORME DE LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA EL PERIODO

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

Contrato S/N de fecha 14/julio/2005

Contratista: Consorcio Andrade Gutiérrez-Ocecon.

1.-Descripción y Objetivos del Proyecto

El Proyecto consiste en la construcción de tres (3) presas en hormigón, localizadas en Mata Grande, el Higüero y los Limones; 2 casas de máquinas subterráneas las cuales pueden operar independiente una de la otra, con una capacidad instalada total de aproximadamente 300 Mw, las Unidades generaran en hora pico (diariamente entre las 18:00 y las 22:00 horas).

El objetivo primordial de la construcción de este Proyecto es incrementar el parque energético nacional utilizando energía limpia y renovable, para así reducir los costos nacionales de generación e ir reemplazando las plantas térmicas que tienen un alto costo de operación, el Estado tiene que especializar recursos del presupuesto para pagos del subsidio de Tarifa Eléctrica los cuales depende directamente de los costos del petróleo a nivel internacional

Otro beneficio agregado a la construcción del Proyecto está la mejora en los acueductos de Bao, Moca y Santiago debido que los embalses que abastecen estos acueductos tendran un mayor volumen de regulación.

2.- Estado Actual:

El 24 de abril de 2021, se da formal inicio a los estudios y diseños a niveles básicos, a los fines de optimizar el diseño de prefactibilidad presentado por el Contratista en el 2019, considerando incorporar el recurso hídrico de la cuenca alta del Rio Yaqué del Norte, para que el Proyecto concebido con este arreglo pueda aumentar la capacidad instalada hasta 300MW y una generación



Líder en Energía Limpia

1

de energía anual de 560GWh, aumentando así su relación beneficio/costo con el cual se haría más rentable el Proyecto, denominándolo como la Central Hidroeléctrica más importante del País y del Caribe. Según consta en el Acta de Acuerdo Estudio de Pre-Factibilidad y Diseño Básico Consolidado, firmadas por las Partes en fecha 16 de abril de 2021.

El Contratista ha emplazado en el sitio de obra equipos y personal para iniciar con los sondeos complementarios requeridos como actividades a ejecutar para desarrollar el Diseño Básico Consolidado y posterior presentación de la Oferta Técnica Económica de la construcción en un plazo no mayor de cuatro meses.

El 25 de abril de 2021 la Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico recibe del Contratista cuatro (4) reclamaciones las cuales fueron analizadas y evaluadas por la EGEHID, determinando que las reclamaciones sometidas comprenden deudas a El Contratista de trabajos ejecutados, aprobados y auditados por EGEHID y montos reclamados por gastos adicionales a consecuencia de la paralización de obra, montos estos que no presentaban documentos justificativos del gasto.

Se solicita al Contratista el sometimiento de los sustentos de las Reclamaciones para un mejor entendimiento de los montos reclamados. Con la documentación soporte remitidas, Las Partes realizaron varias reuniones de entendimiento y conciliación de los montos reclamados que son elegibles y se le remite un borrador de Acta de acuerdo el 18 de junio de 2021, con los análisis de los montos reclamados elegibles debidamente sustentados.

El 23 de junio de 2021, El Contratista presenta a la Dirección DDH, el ingeniero residente de obra, que estará a cargo del enlace Contratista-EGEHID, de los estudios que se están realizando y cualquier otro trabajo a ejecutar en obra.

EGEHID sometió al Ministerio de Medio Ambiente la actualización de la Licencia Ambiental del Proyecto Las Placetas.

Se continúa trabajando en los estudios e investigaciones requeridas para la elaboración del Diseño Básico Consolidado.

3.- Costo estimado del Proyecto:




Contratista	Consorcio Andrade Gutiérrez-OCECON
Avance General	Retomado los trabajos previstos en la Fase I, en fecha 24/04/2021, para integrar al Proyecto de Pre-Factibilidad (2019) los aportes de la cuenca alta del río Yaqué del Norte.
Monto Original del Financiamiento en Firme del Proyecto USD (contrato del 14/07/2005) (monto a ser actualizado con la Oferta Técnica económica de construcción)	285,000,000.00
Monto Desembolsado a la Fecha USD (hasta Add.5)	71,918,931.09
Monto amortizado a la fecha	35,000,000.00
Montos pagados de Consultoría y Supervisión a través contrato construcción (Incluido en monto amortizado)	36,918,931.09



4.-Informe fotográfico



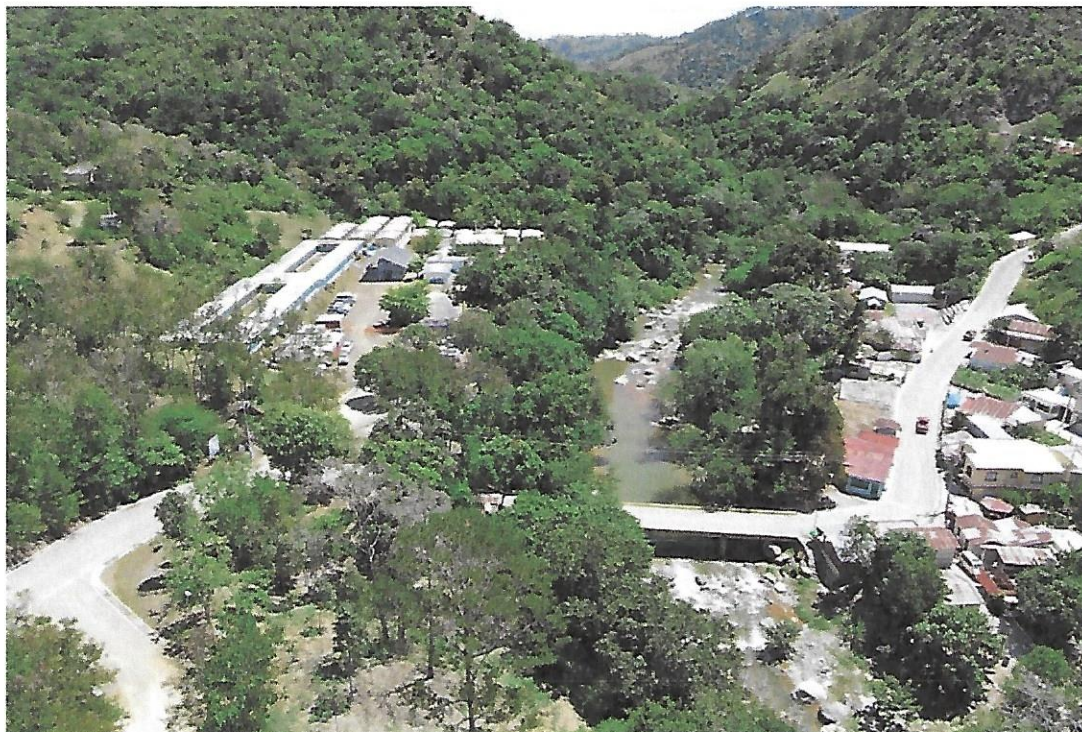

Líder en Energía Limpia

4



Líder en Energía Limpia

5
