



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
Enero de 2021.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

64.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BATEY, LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	3
---	---





ENCARGADO POR ING. EGYE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

EGEH



D

**64.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BATEY, LAS ZANJAS,
PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO


Fecha de firma del contrato	26 de Septiembre de 2019
Monto del contrato	RD\$ 3,177,187.30
Monto del avance (20%)	RD\$ 635,437.46
Fecha de inicio de los trabajos	13 de Febrero de 2020
% Avance estimado hasta la fecha	20.54%
Contratista	TRENT S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se trabaja en el vaciado de la torta para la construcción de los escalones en la glorieta y en la terminación de jardineras.



Vaciado de torta escalones en glorieta, Parque en el Batey.

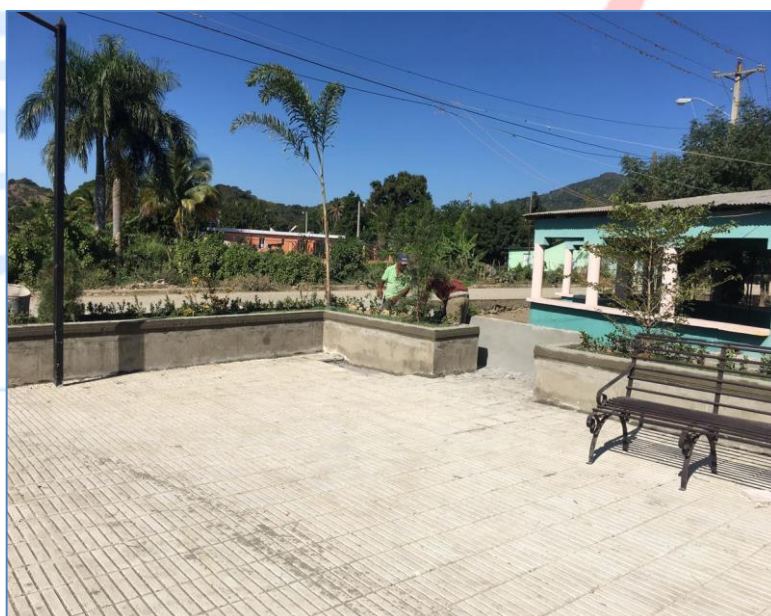

Terminación de jardineras, Parque en el Batey.
