

Project Sch. ID: 2023-00526-06

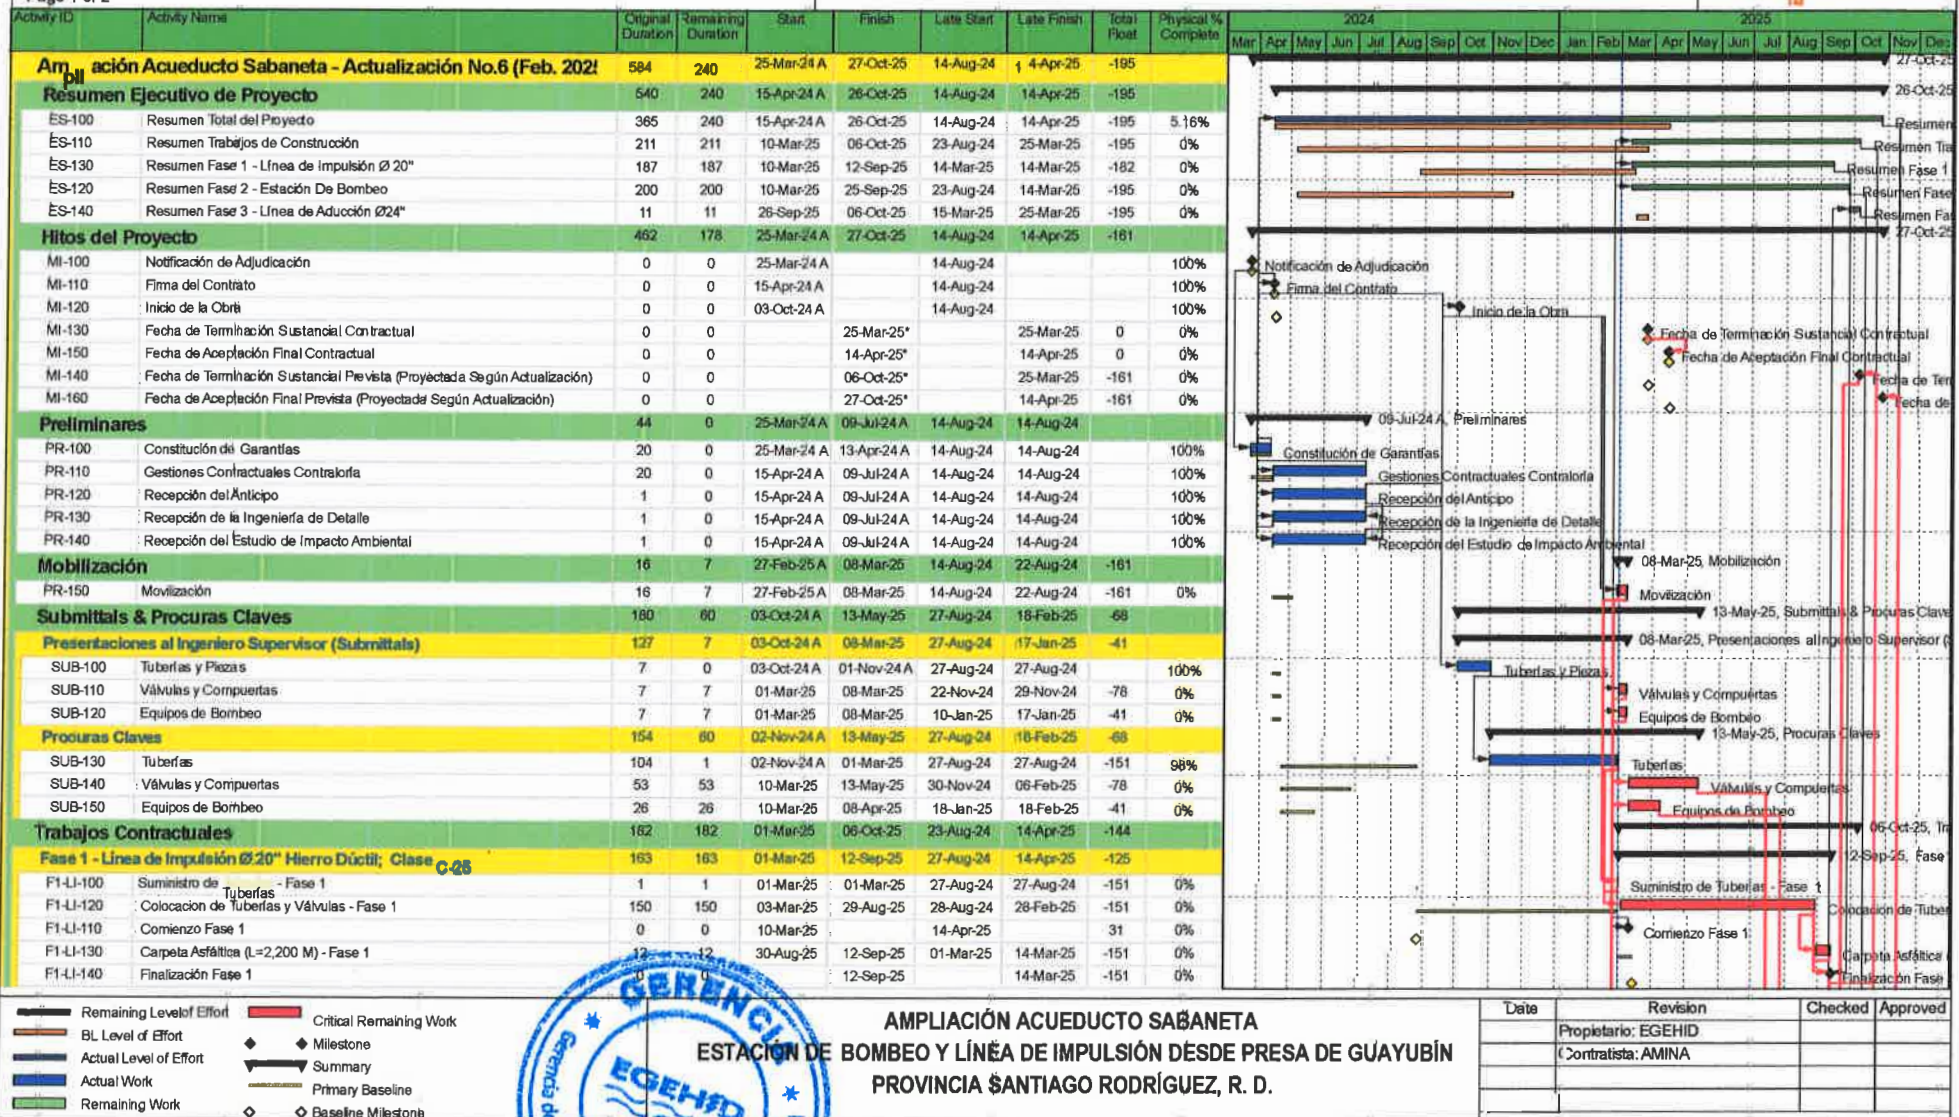
Project Sch. Name: Ampliación Acueducto Sabaneta - Actualización No.6 (Feb. 2025)

Start Date: 25-Mar-24 * Finish Date: 27-Oct-25 * Data Date: 28-Feb-25

Contrato No.: 73/2024 * Proyecto No.: 23-00526 * Licitación No.: EGEHID-CCC-LPN-2023-0043

Page 1 of 2

Schedule Type: Schedule Update

ACTUALIZACION NO.6 DEL CRONOGRAMA**ACTUALIZADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025**

Project Sch. ID: 2023-00526-06

Project Sch. Name: Ampliación Acueducto Sabaneta - Actualización No.6 (Feb. 2025)

Start Date: 25-Mar-24 * Finish Date: 27-Oct-25 * Data Date: 28-Feb-25

Contract No.: 73/2024 * Proyecto No.: 23-00526 * Licitación No.: EGEHID-CCC-LPN-2023-0043

Page 2 of 2

Schedule Type: Schedule Update

ACTUALIZACION NO.6 DEL CRONOGRAMA

ACTUALIZADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025



Activity ID	Activity Name	Original Duration	Remaining Duration	Start	Finish	Late Start	Late Finish	Total Float	Physical % Complete	2024												2025											
										Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
Fase 2 - Estación De Bombeo		166	166	10-Mar-25	25-Sep-25	23-Aug-24	20-Mar-25	-156																									
F2-EB-100	Comienzo Fase 2	0	0	10-Mar-25		23-Aug-24		-161	0%																								
F2-EB-220	Finalización Fase 2	0	0		25-Sep-25		14-Mar-25	-161	0%																								
Construcción Estación De Bombeo (Cisterna 3.500 m3 y Caseta)		123	123	10-Mar-25	09-Sep-25	23-Aug-24	20-Mar-25	-143																									
F2-EB-110	Hormigón Armado PC = 280 Kg/cm2 (Industrial) - Fase 2	118	118	10-Mar-25	29-Jul-25	23-Aug-24	15-Jan-25	-161	0%																								
F2-EB-120	Inicio Muro de Block - Fase 2	31	31	25-Jun-25	30-Jul-25	04-Jan-25	11-Feb-25	-140	0%																								
F2-EB-130	Electrificación y Equipamiento - Fase 2	63	63	27-Jun-25	09-Sep-25	07-Jan-25	20-Mar-25	-143	0%																								
F2-EB-140	Electrificación Primaria - Fase 2	16	16	27-Jun-25	15-Jul-25	07-Jan-25	25-Jan-25	-141	0%																								
F2-EB-150	Electrificación Secundaria - Fase 2	20	20	18-Jul-25	09-Aug-25	27-Jan-25	18-Feb-25	-143	0%																								
F2-EB-160	Instalaciones Hidrosanitarias - Fase 2	20	20	30-Jul-25	22-Aug-25	07-Feb-25	03-Mar-25	-143	0%																								
F2-EB-190	Suministro e Instalación de Equipo De Bombeo - Fase 2	25	25	11-Aug-25	09-Sep-25	19-Feb-25	20-Mar-25	-143	0%																								
F2-EB-200	Instalaciones Eléctricas - Fase 2	10	10	11-Aug-25	22-Aug-25	19-Feb-25	03-Mar-25	-143	0%																								
F2-EB-210	Instalaciones Especiales - Fase 2	10	10	23-Aug-25	03-Sep-25	04-Mar-25	14-Mar-25	-143	0%																								
Verja Perimetral y Caseta de Vigilante		48	48	30-Jul-25	25-Sep-25	16-Jan-25	14-Mar-25	-161																									
F2-EB-170	Verja Perimetral en Bloques Viciados L=68.80 m - Fase 2	42	42	30-Jul-25	17-Sep-25	16-Jan-25	07-Mar-25	-161	0%																								
F2-EB-180	Garita De Vigilante - Fase 2	48	48	30-Jul-25	25-Sep-25	16-Jan-25	14-Mar-25	-161	0%																								
Fase 3 - Línea de Aducción Ø24" Acero (Sch-20)		9	9	26-Sep-25	06-Oct-25	15-Mar-25	25-Mar-25	-161																									
F3-LA-100	Comienzo Fase 3	0	0	26-Sep-25		15-Mar-25		-161	0%																								
F3-LA-110	Suministro de Tuberías - Fase 3	9	9	26-Sep-25	06-Oct-25	15-Mar-25	25-Mar-25	-161	0%																								
F3-LA-120	Colocación de Tuberías y Válvulas - Fase 3	9	9	26-Sep-25	06-Oct-25	15-Mar-25	25-Mar-25	-161	0%																								
F3-LA-130	Finalización Fase 3	0	0		06-Oct-25		25-Mar-25	-161	0%																								
Cierre de Proyecto		20	20	06-Oct-25	26-Oct-25	25-Mar-25	14-Apr-25	-195																									
CP-100	FIN DE TRABAJOS CONTRACTUALES	0	0		06-Oct-25		25-Mar-25	-161	0%																								
CP-110	Documentos de Cierre	20	20	07-Oct-25	26-Oct-25	26-Mar-25	14-Apr-25	-195	0%																								
CP-120	Imprevistos del Contratista	20	20	07-Oct-25	26-Oct-25	26-Mar-25	14-Apr-25	-195	0%																								
CP-130	Imprevistos Contractuales	20	20	07-Oct-25	26-Oct-25	26-Mar-25	14-Apr-25	-195	0%																								
CP-140	FIN DE OBRA	0	0		26-Oct-25		14-Apr-25	-195	0%																								



AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SABANETA
ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE PRESA DE GUAYUBÍN
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, R. D.

Remaining Level of Effort	Critical Remaining Work
BL Level of Effort	Milestone
Actual Level of Effort	Summary
Actual Work	Primary Base line
Remaining Work	Baseline Milestone

Date	Revision	Checked	Approved
	Propietario: EGEHID		
	Contratista: AMINA		

W
