




Remaining Level of Effort Actual Work Critical Remaining ...
Actual Level of Effort Remaining Work Milestone



Activity ID	Activity Name	Start	Finish	At Completion Duration	Variances - BL Project Finish Date	Units % Complete	2025	2026
							Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec	
518	Bocatoma - Compuerta ataguia tipo deslizante	14-Jun-26	18-Jun-26	5d	-112d	0%		
518	Puesta en marcha	14-Jun-26	18-Jun-26	5d	-112d	0%		
552	Caseta de Operación	04-Apr-26	13-Jun-26	68d	-112d	0%		
552	Instalación dos unidades hidráulicas (Caseta de Operación)	04-Apr-26	24-Apr-26	20d	-112d	0%		
553	Instalación de generador de emergencia 150 kVA	12-Apr-26	02-May-26	20d	-112d	0%		
555	Canalización y cables	18-Apr-26	13-May-26	25d	-112d	0%		
556	Finalización de la malla y sistema de puesta a tierra Presa	07-May-26	21-May-26	15d	-112d	0%		
557	Unidad de Control Lógico (PLC) - Instalación	22-May-26	06-Jun-26	15d	-112d	0%		
558	Unidad hidráulica - Puesta en marcha	07-Jun-26	13-Jun-26	7d	-112d	0%		
	Vertedero (Bloques 5-6-7-8)	15-Aug-25	03-Apr-26	223d	-112d	0%		
	Compuerta No.1	15-Aug-25	27-Nov-25	102d	-112d	0%		
530	Montaje de piezas fijas para compuerta Abatible No. 1 y compuerta atagi	15-Aug-25	30-Sep-25	45d	-122d	0%		
531	Montaje de compuerta Radial No. 1 y servomotores	01-Oct-25	27-Nov-25	57d	-112d	0%		
	Compuerta No.2	28-Nov-25	28-Jan-26	57d	-112d	0%		
535	Montaje de compuerta No. 2 y servomotores	28-Nov-25	28-Jan-26	57d	-112d	0%		
	Compuerta No.3	29-Jan-26	03-Apr-26	64d	-112d	0%		
539	Montaje de compuerta No. 3 y servomotores	29-Jan-26	27-Mar-26	57d	-112d	0%		
540	Puesta en marcha de compuerta No. 3 (con sistema oleohidráulico temp	28-Mar-26	03-Apr-26	7d	-112d	0%		
	DESMOVILIZACIÓN	07-Aug-26	07-Oct-26	60d	-112d	0%		
611	Desmovilización del Contratista	07-Aug-26	21-Sep-26	45d	-112d	0%		
612	Acondicionamientos del sitio (Campamentos y areas industriales)	07-Aug-26	07-Oct-26	60d	-112d	0%		

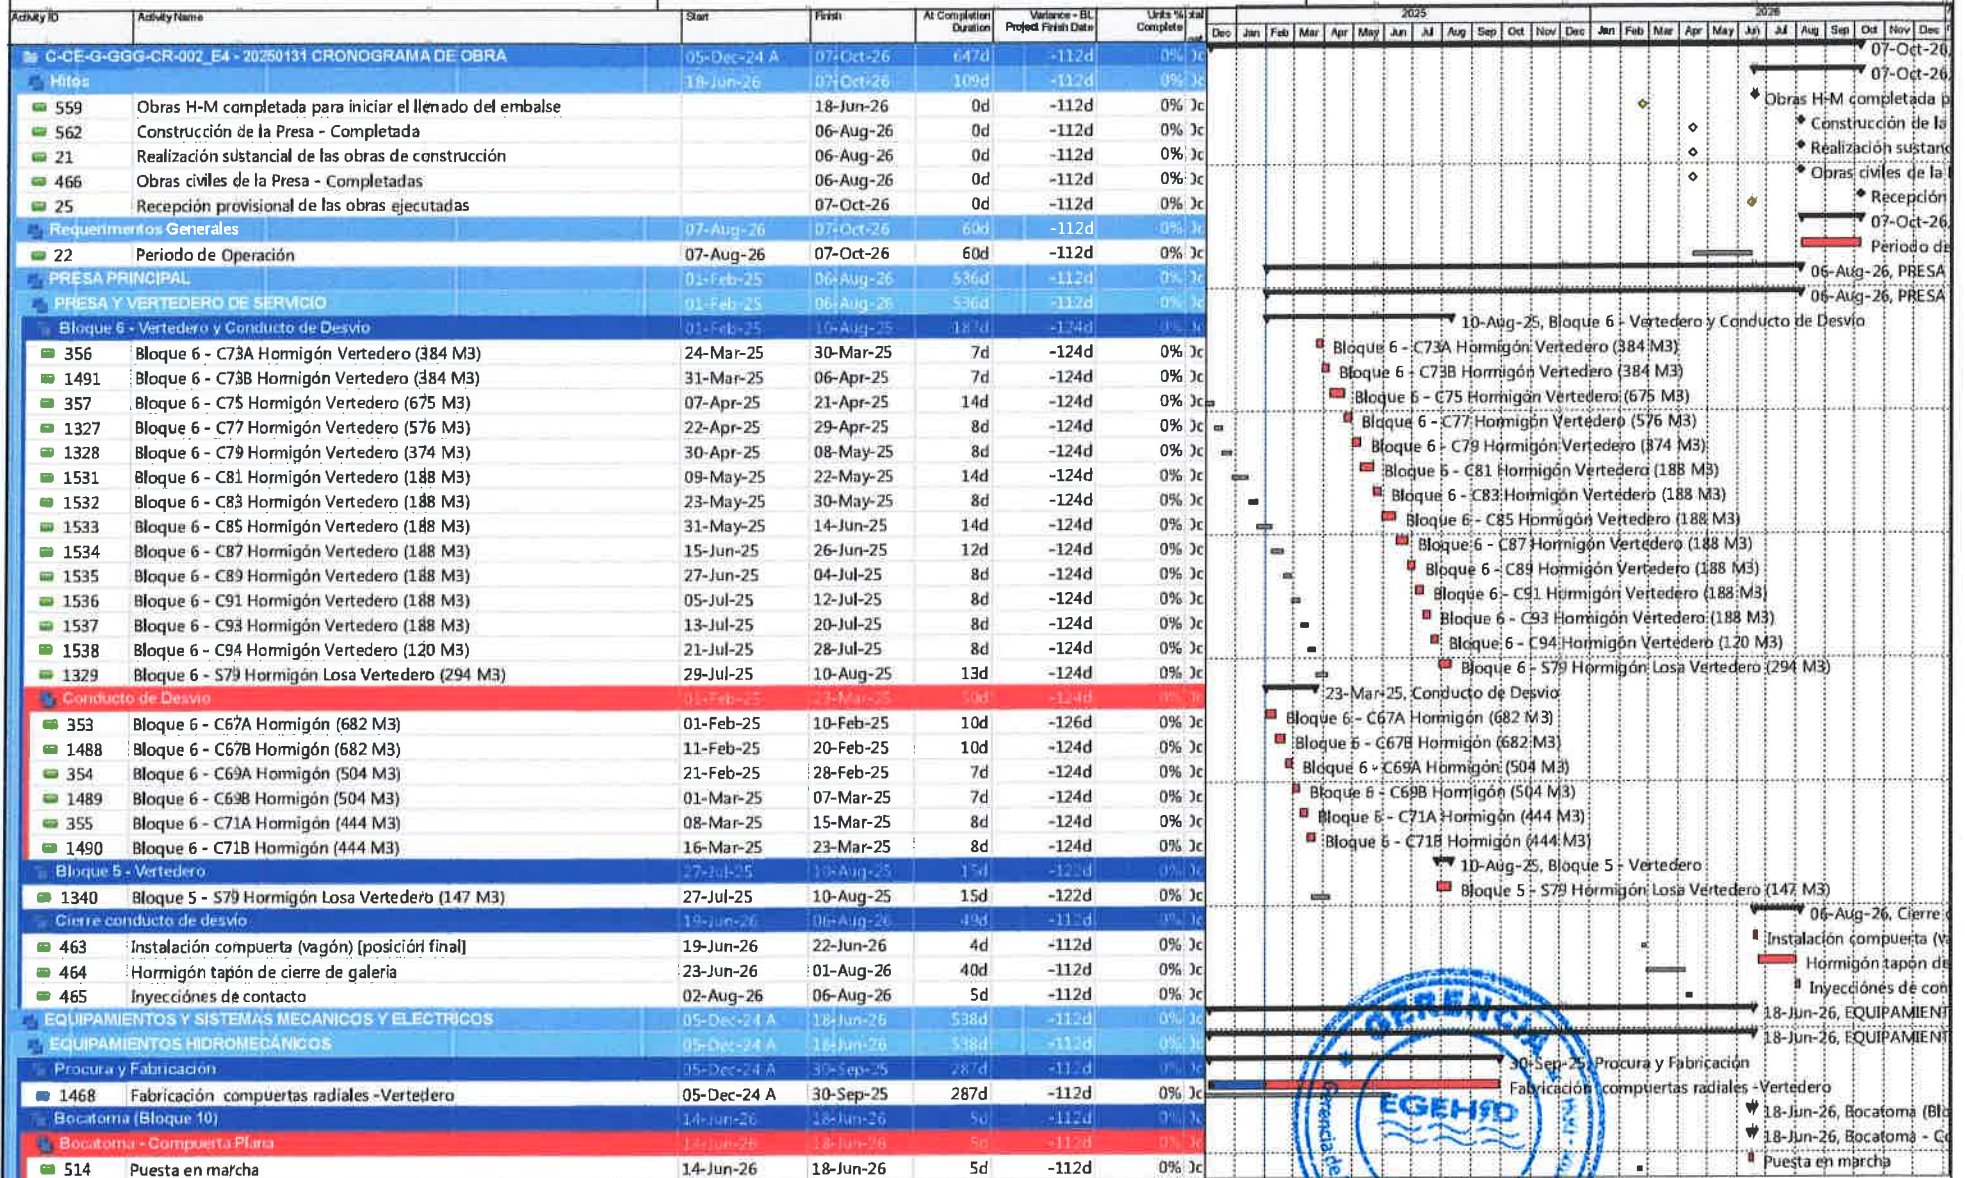
