




Remaining Level of Effort Actual Work Critical Remaining ...
Actual Level of Effort Remaining Work Milestone



Activity ID	Activity Name	Start	Finish	At Completion Duration	Variance - BL Project Finish Date	Units % Complete	2025												2026											
							Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov
Bocatoma - Compuerta atagua tipo deslizante																														
518	Puesta en marcha	14-Jun-26	18-Jun-26	5d	-112d	0%																								
Caseta de Operación																														
552	Instalación dos unidades hidráulicas (Caseta de Operación)	04-Apr-26	24-Apr-26	20d	-112d	0%																								
553	Instalación de generador de emergencia 150 kVA	12-Apr-26	02-May-26	20d	-112d	0%																								
555	Canalización y cables	18-Apr-26	13-May-26	25d	-112d	0%																								
556	Finalización de la malla y sistema de puesta a tierra Presa	07-May-26	21-May-26	15d	-112d	0%																								
557	Unidad de Control Lógico (PLC) - Instalación	22-May-26	06-Jun-26	15d	-112d	0%																								
558	Unidad hidráulica - Puesta en marcha	07-Jun-26	13-Jun-26	7d	-112d	0%																								
Vertedero (Bloques 5-6-7-8)																														
Compuerta No.1																														
530	Montaje de piezas fijas para compuerta Abatible No. 1 y compuerta atagi	15-Aug-25	30-Sep-25	45d	-122d	0%																								
531	Montaje de compuerta Radial No. 1 y servomotores	01-Oct-25	27-Nov-25	57d	-112d	0%																								
Compuerta No.2																														
535	Montaje de compuerta No. 2 y servomotores	28-Nov-25	28-Jan-26	57d	-112d	0%																								
Compuerta No.3																														
539	Montaje de compuerta No. 3 y servomotores	29-Jan-26	27-Mar-26	57d	-112d	0%																								
540	Puesta en marcha de compuerta No. 3 (con sistema oleohidráulico temp	28-Mar-26	03-Apr-26	7d	-112d	0%																								
DESMOVLIZACIÓN																														
611	Desmovilización del Contratista	07-Aug-26	21-Sep-26	45d	-112d	0%																								
612	Acondicionamientos del sitio (Campamentos y areas industriales)	07-Aug-26	07-Oct-26	60d	-112d	0%																								

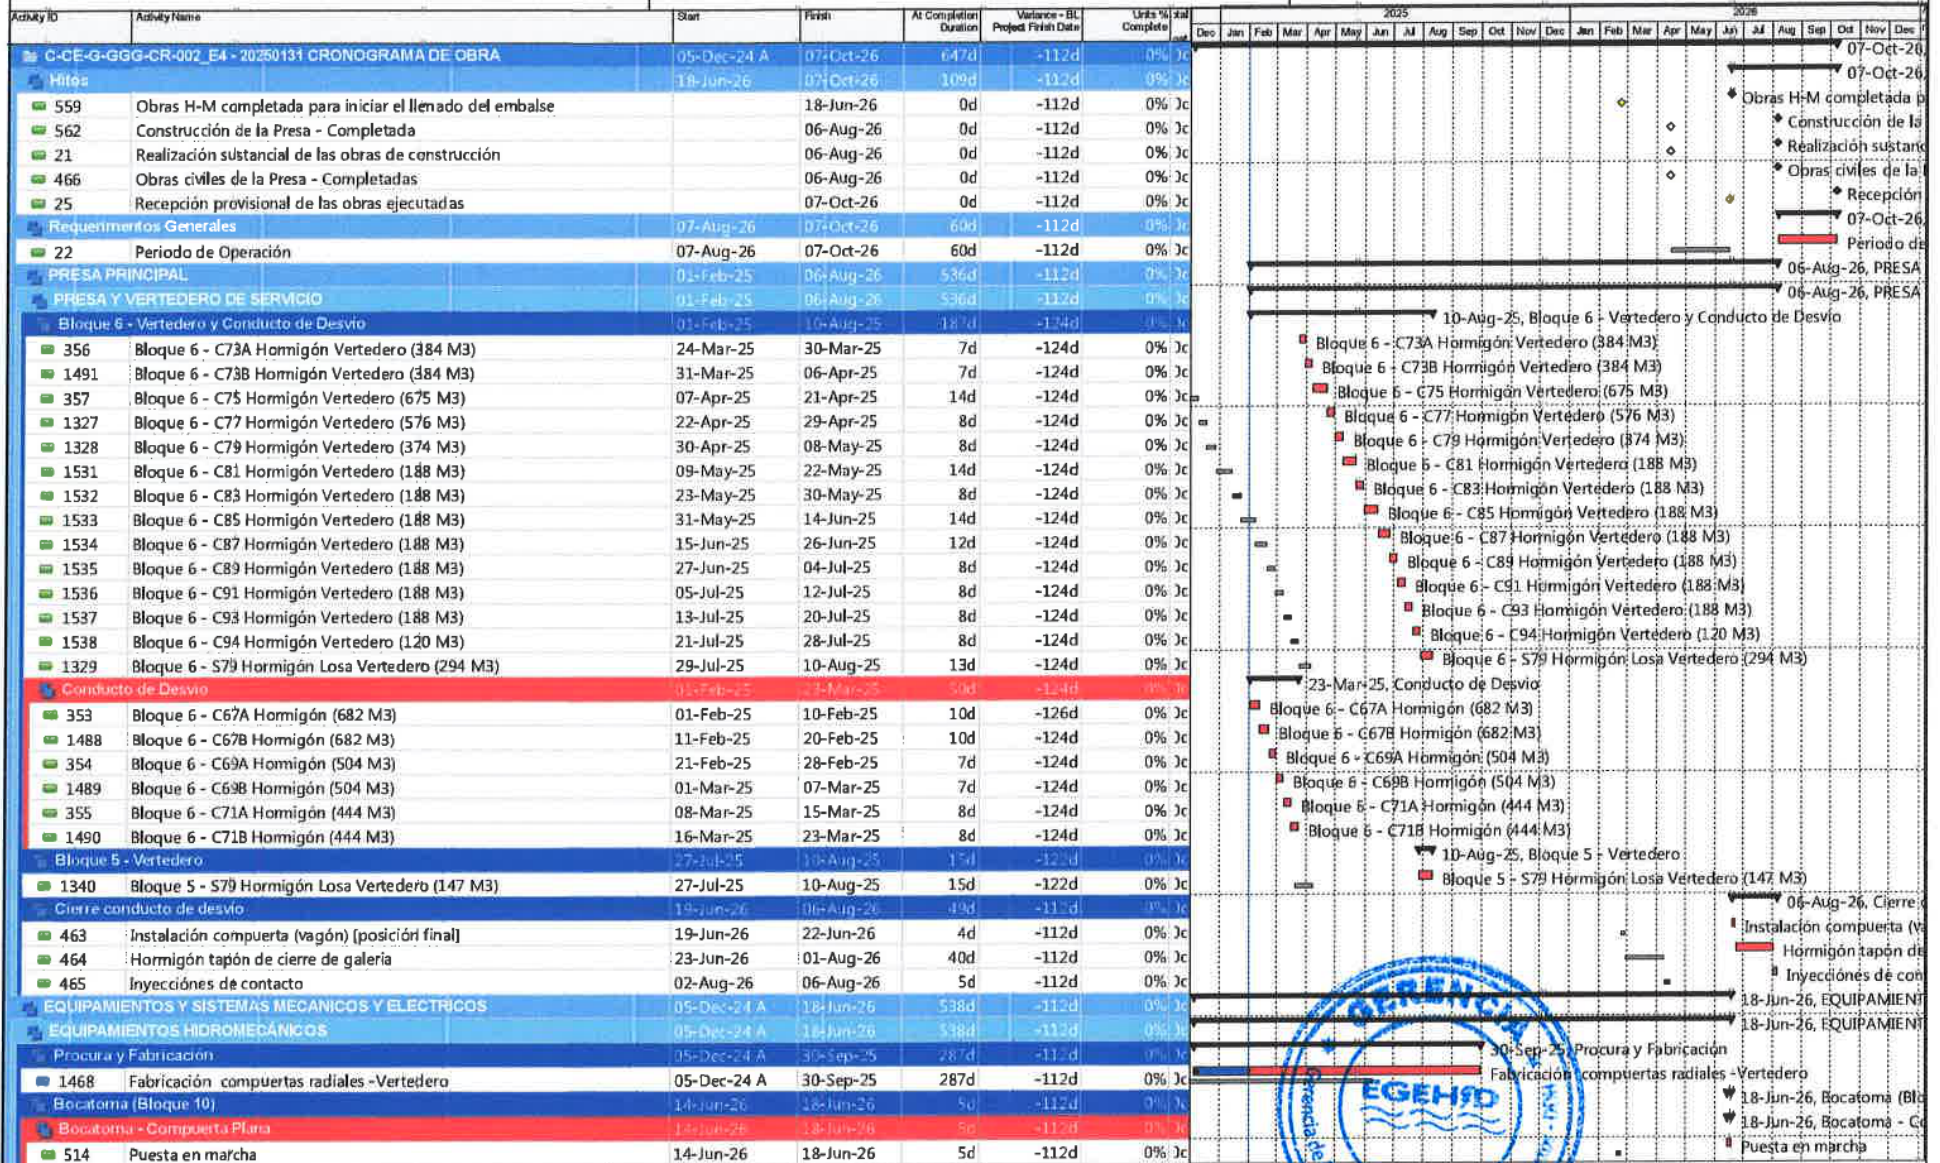
