



Id	Mod. de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	20 oct '24		27 oct '24			3 nov '24			10 nov '24			17 nov '24		
						S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J
1	★?	CANCHA																	
2	★	Nivelación general del terreno	1 día	lun 28/10/24	lun 28/10/24														
3	★	Replanteo	1 día	mar 26/11/24	mar 26/11/24														
4	★	Campamento	1 día	mar 26/11/24	mar 26/11/24														
5	★	Corte de material	10 días	mar 29/10/24	lun 11/11/24														
6	★	Relleno Compensado	10 días	mar 12/11/24	lun 25/11/24														
7	★	Bote de material	9 días	mié 30/10/24	lun 11/11/24														
8	★	Excavación Zapata de Muros	5 días	mié 27/11/24	mar 3/12/24														
9	★	Relleno de Reposición	3 días	mar 10/12/24	jue 12/12/24														
10	★	Hormigón en Zapata de Muros	2 días	mié 4/12/24	jue 5/12/24														
11	★	Hormigón frotado con malla eléct.	6 días	lun 16/12/24	lun 23/12/24														
12	★	Muros de 0.15 m	2 días	vie 6/12/24	lun 9/12/24														
13	★	Pañete	2 días	mar 10/12/24	mié 11/12/24														
14	★	Cantos	2 días	mar 10/12/24	mié 11/12/24														
15	★	Pintura en Piso	2 días	lun 13/1/25	mar 14/1/25														
16	★	Pintura en muro	1 día	lun 13/1/25	lun 13/1/25														
17	★	Tablero Inc. Canasto y malla	1 día	lun 20/1/25	lun 20/1/25														
18	★	Lámparas de 1000 watt	1 día	sáb 14/12/24	sáb 14/12/24														
19	★	Poste deluz dd 30 pies	1 día	sáb 14/12/24	sáb 14/12/24														
20	★	Coloc. de postes, incluye Excav. y horm.	2 días	jue 12/12/24	vie 13/12/24														
21	★	Rampa de entrada	2 días	mar 21/1/25	mié 22/1/25														
22	★	Plantas Ornamentales , Grama, Grava, et	2 días	mié 22/1/25	jue 23/1/25														
23	★	Conexión a CDEEE	1 día	lun 27/1/25	lun 27/1/25														

Proyecto: Proyecto1-FRANCISC
 Fecha: mar 22/10/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

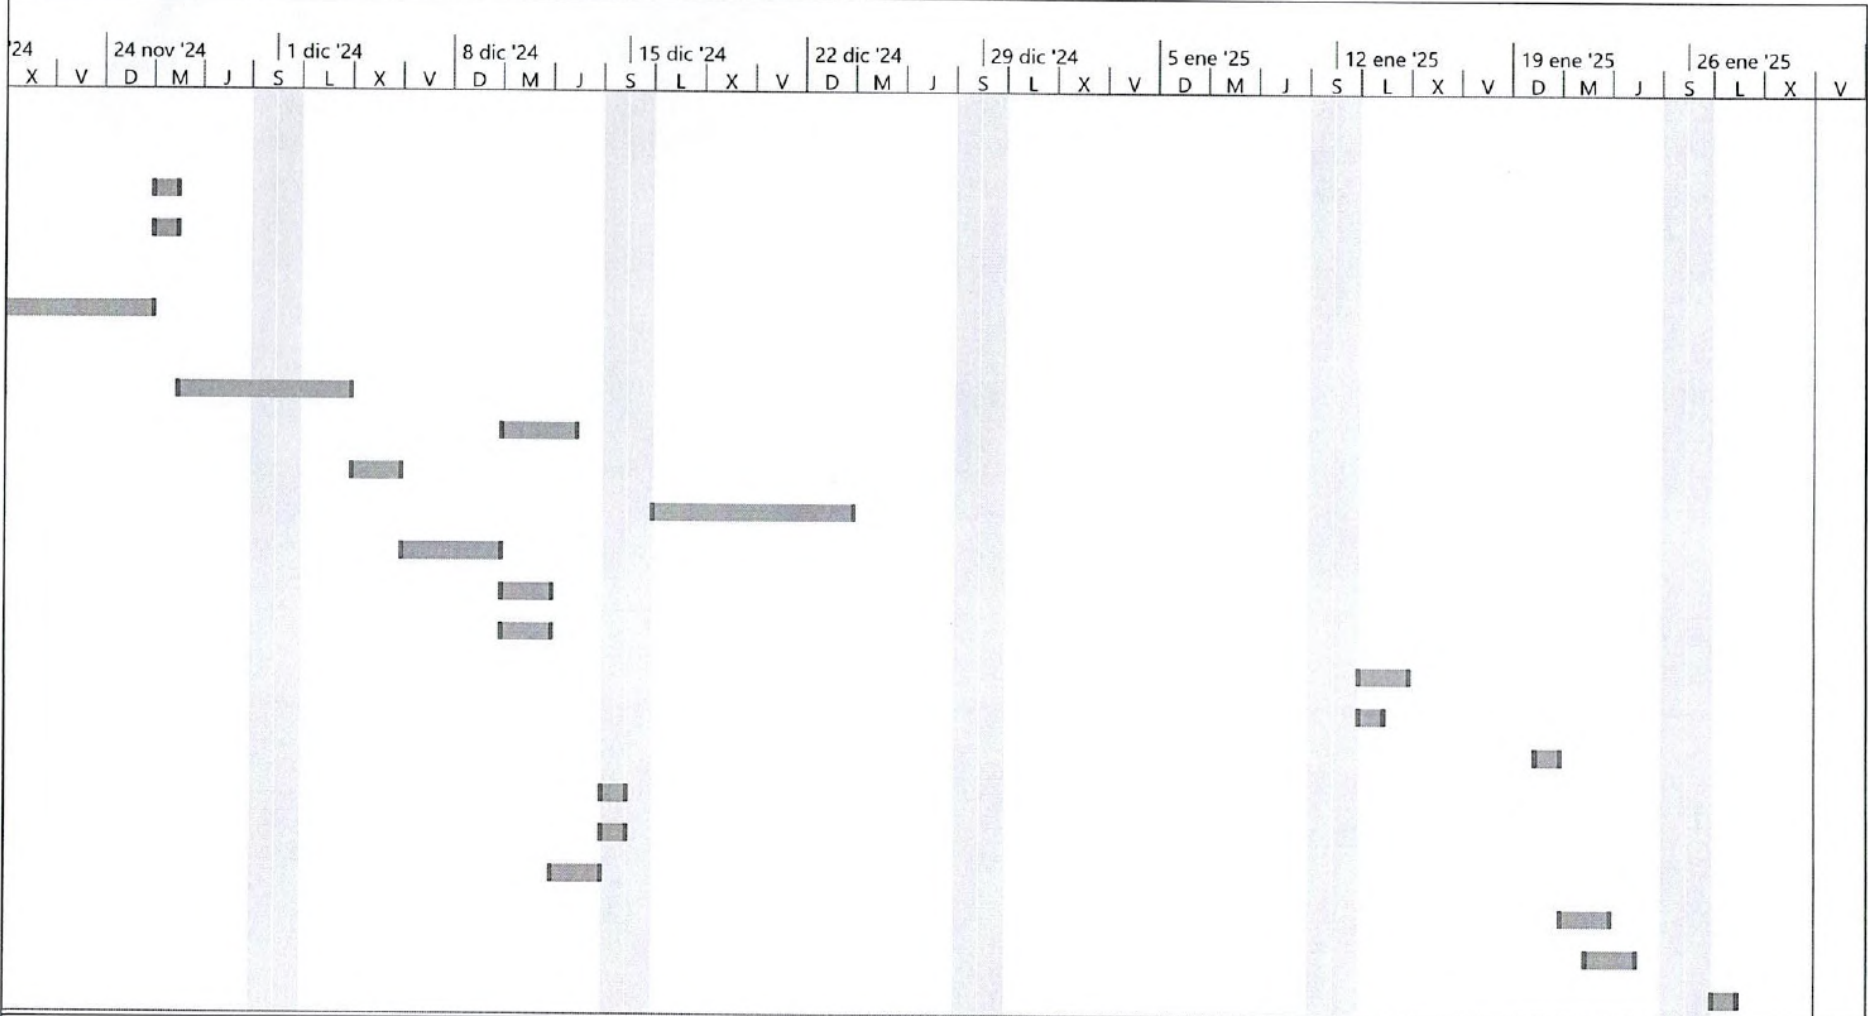


Proyecto: Proyecto1-FRANCISC Fecha: mar 22/10/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

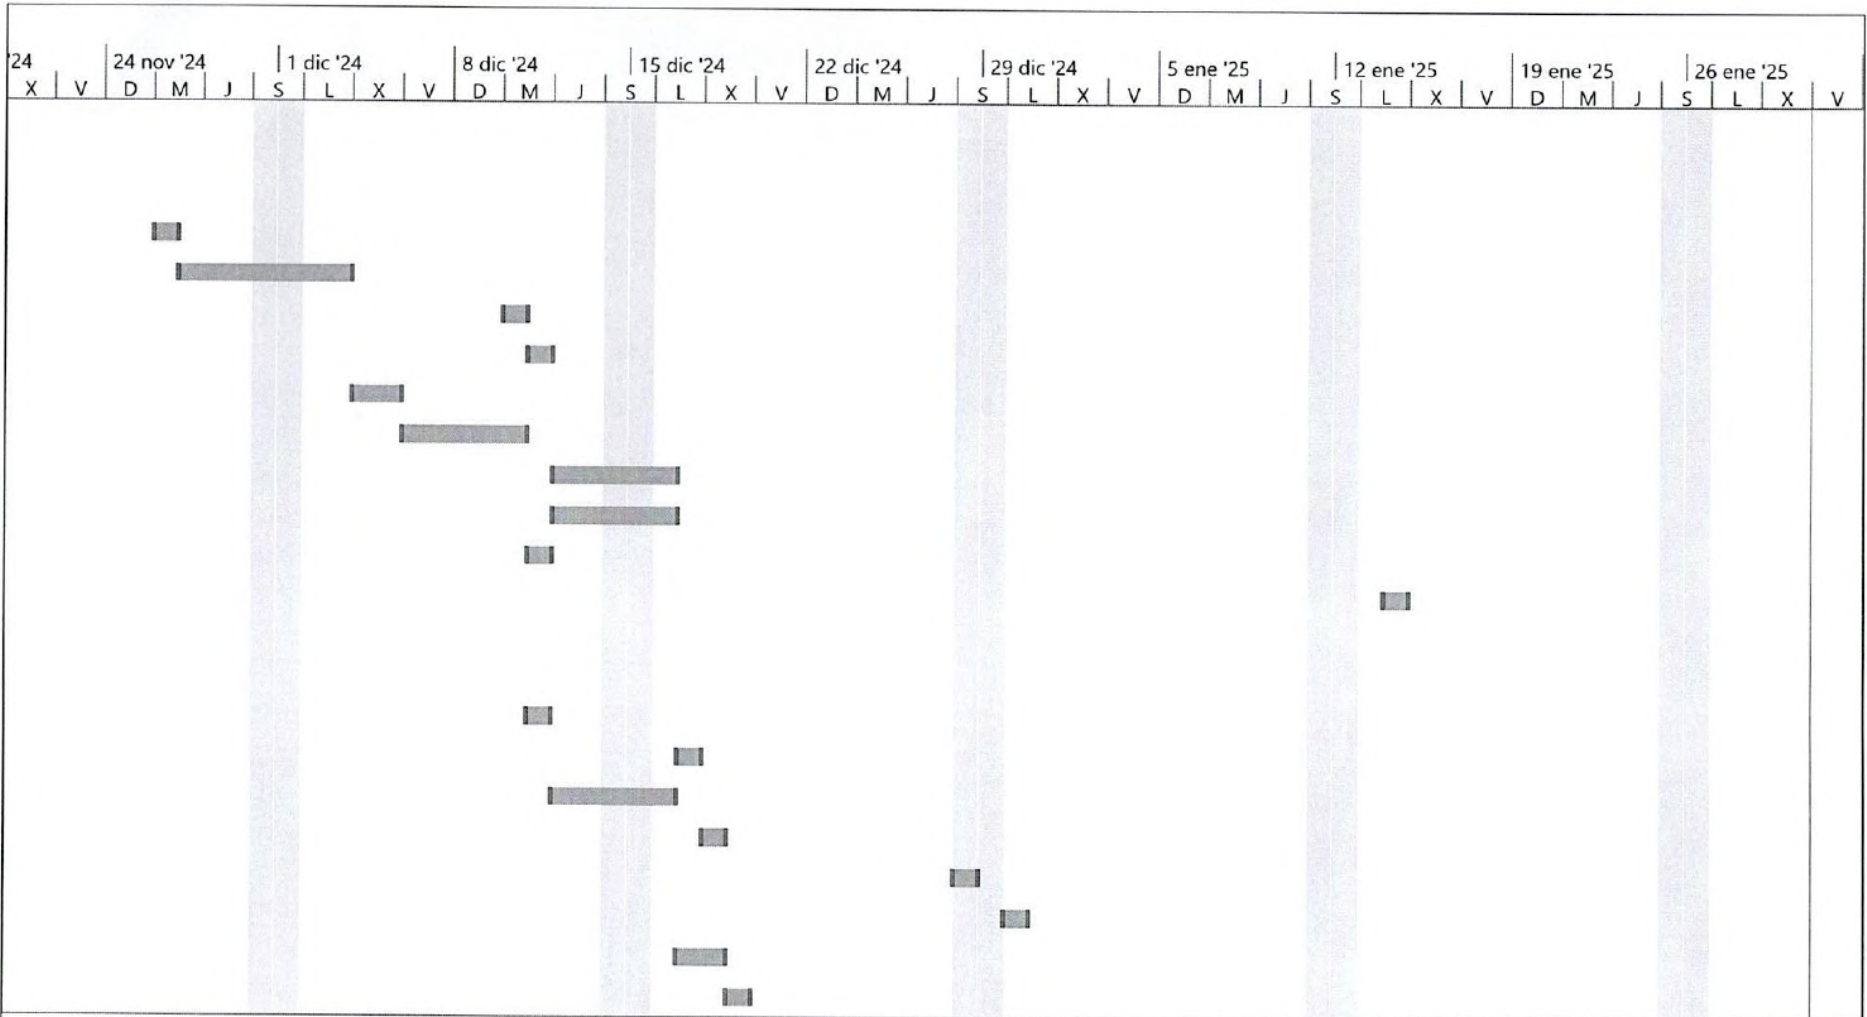

Proyecto: Proyecto1-FRANCISC Fecha: mar 22/10/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

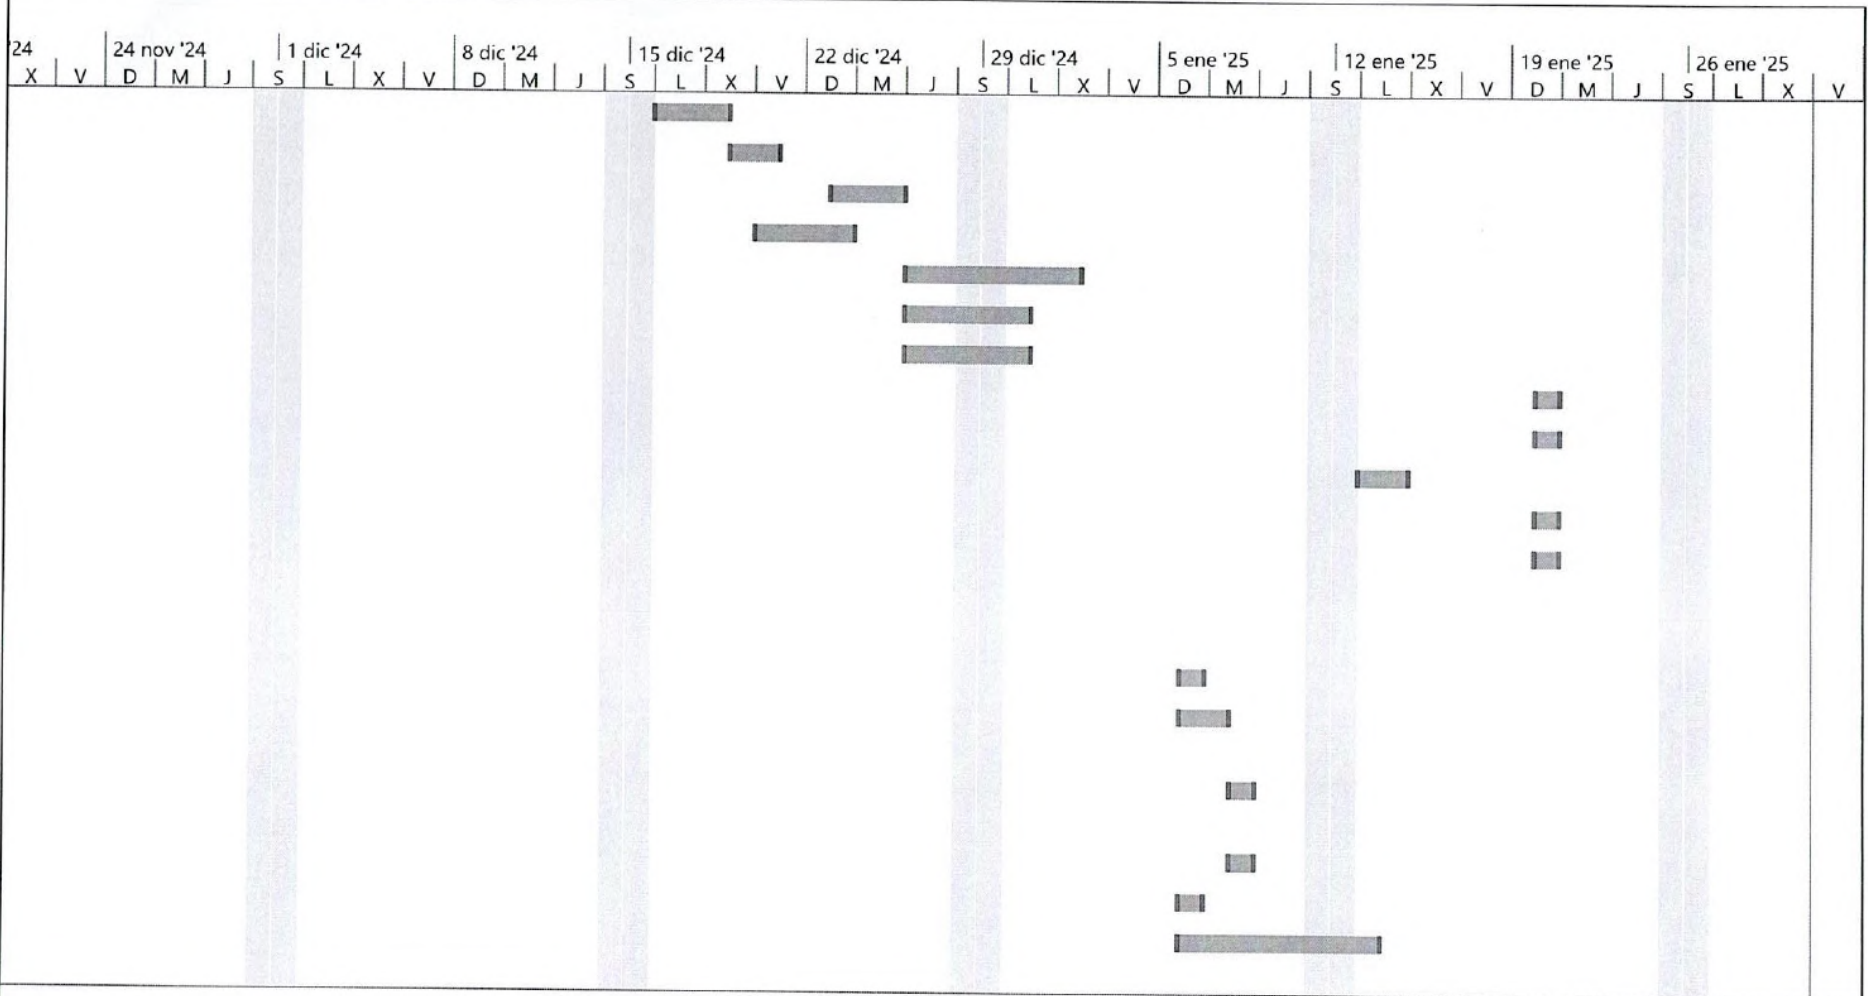

Proyecto: Proyecto1-FRANCISC Fecha: mar 22/10/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

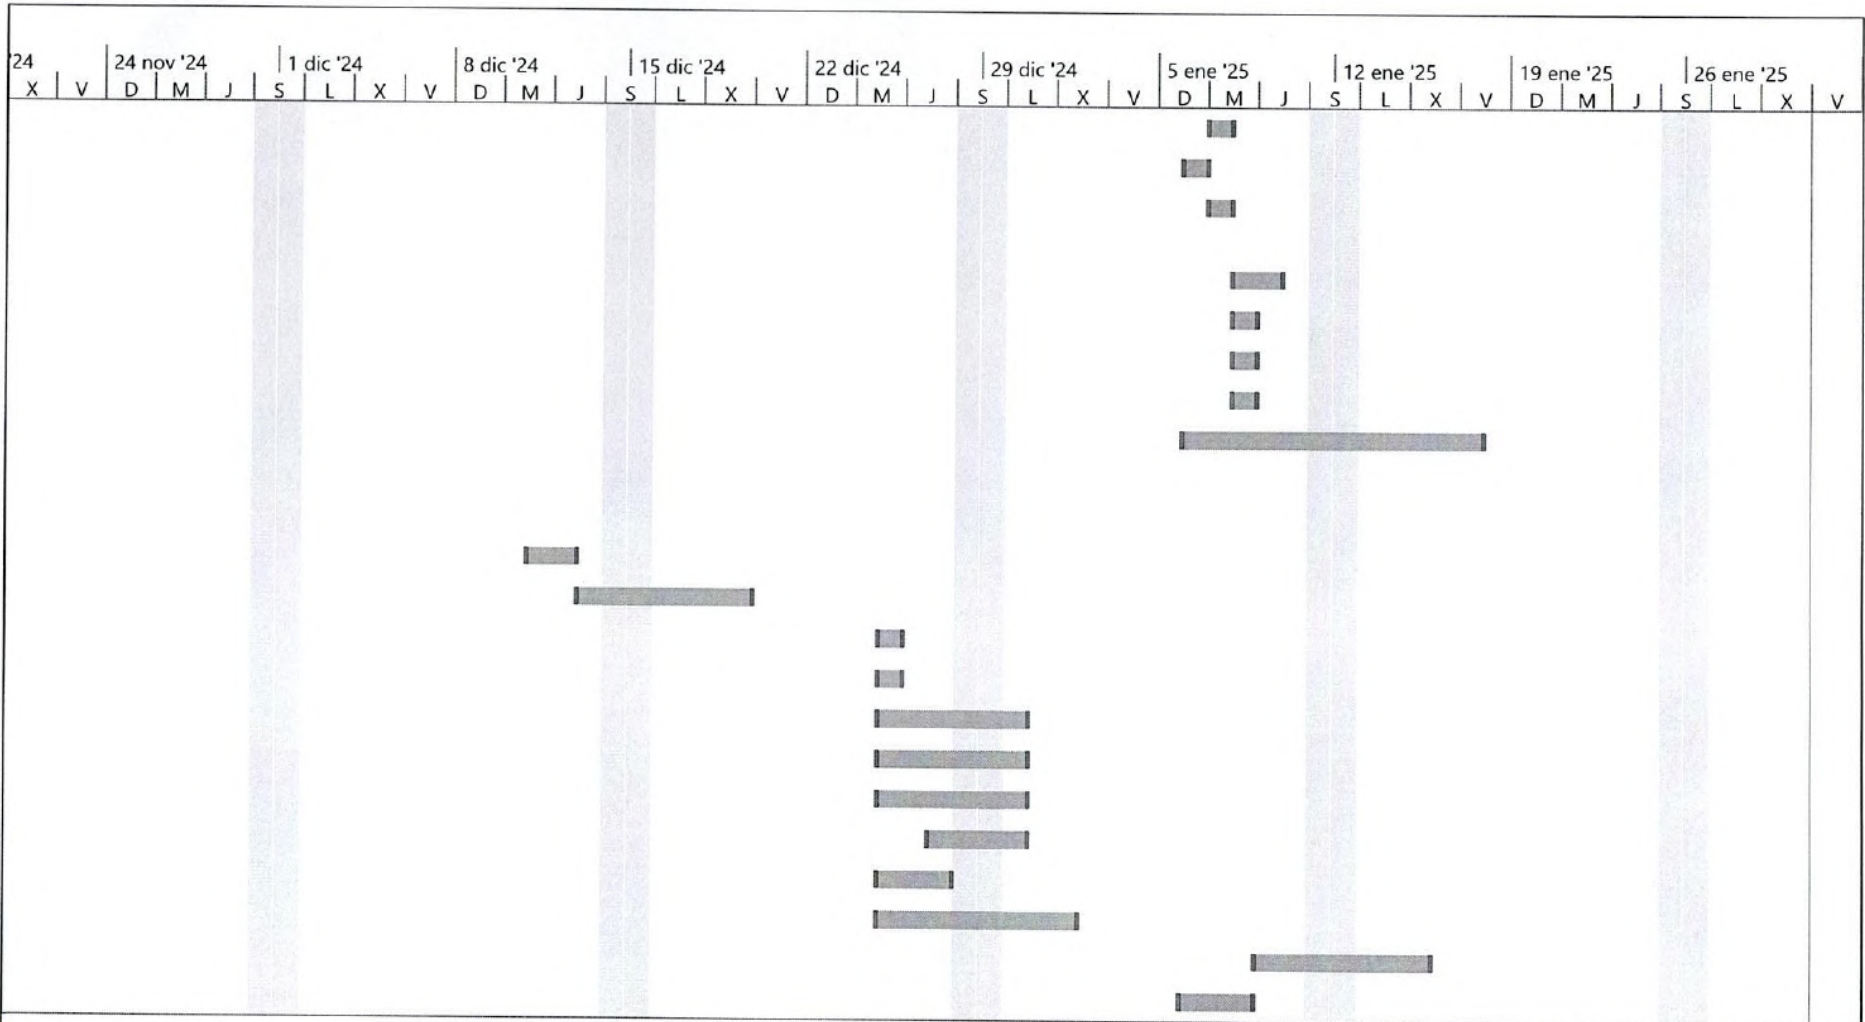

Proyecto: Proyecto1-FRANCISC Fecha: mar 22/10/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

15 de mayo 2023
Azua, R.D

ACTA DE INICIO

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), hace formal el inicio de la obra: **CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA AMIAMA GOMEZ, MUNICIPIO AMIAMA GOMEZ, PROVINCIA AZUA, Contrato No.174/2021**, la cual será realizada por **ARQ. FRANCIS PAULA JAQUEZ**, y cuyo plazo de ejecución según el contrato, en su cláusula 7, es de once (11) meses a partir de la firma de esta acta.

Dichos trabajos se iniciarán el **lunes 15 del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023)**.

Por EGEHID:

Ing. Mirna Alexandra Ramirez Peña
Dirección Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles

Por el Contratista:



Arq. Francis Paula Jáquez
Codia No.36138
