


■ Remaining Level of Effort
 ■ Actual Work
 ■ Critical Remaining ...
■ Actual Level of Effort
 ■ Remaining Work
 ◆ Milestone





Remaining Level of Effort
 Actual Work
 Critical Remaining ...
 Actual Level of Effort
 Remaining Work
 ◆ Milestone

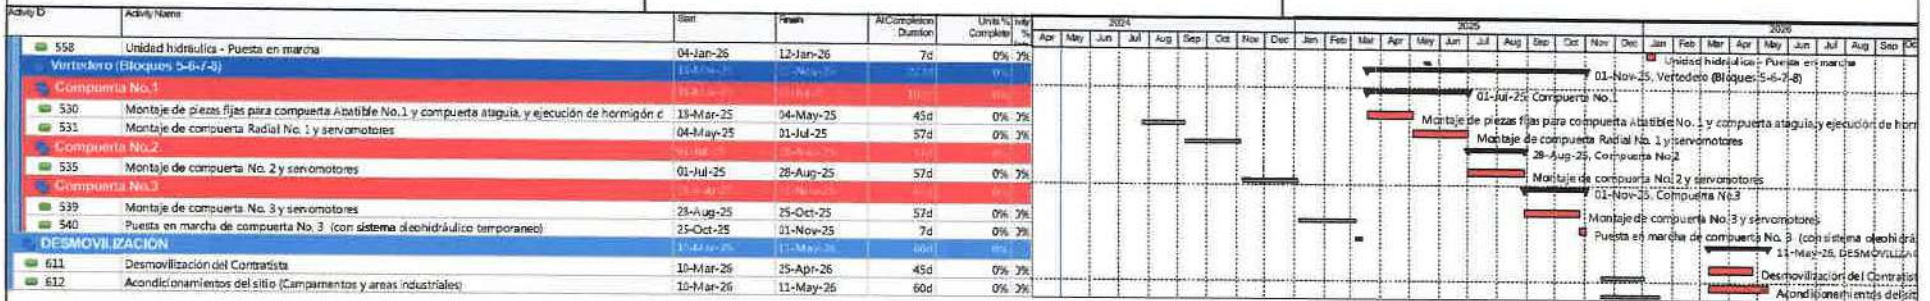


Activity ID	Activity Name	Start	Finish	At Completion Duration	Units % Complete	2024												2025												2026														
						Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
HITOS 273 Desvío del Río Guayubín hacia el Canal Provisional - Completado 425 Desvío Del Río Guayubín hacia Canal Reconstruido 295 Excavación Fase 2 - Completada 390 - Obras civiles Bloque 4 completado 275 Construcción de la presa completada hasta el. +71.0m 370 - Obras civiles Bloque 3 completado 335 - Obras civiles Bloque 2 completado 321 - Obras civiles Bloque 1 completado 451 - Obras civiles Bloque 8 completado 399 - Obras civiles Bloque 1 Losa Aproximación completado 405 - Obras civiles Bloque 5 completado 438 - Obras civiles Bloque 6 completado 279 2do Desvío del Río Guayubín hacia el Conducto de Desvío - Completado 445 - Obras civiles Bloque 7 completado 1481 - Obras civiles Bloque 11 completado 1480 - Obras civiles Bloque 10 completado 1482 - Obras civiles Bloque 13 y 14 completado 1479 - Obras civiles Bloque 19 completado 559 Obras H-M completada para iniciar el llenado del embalse 461 Inicio llenado controlado del Embalse 561 Instalaciones H-M completadas 562 Construcción de la Presa - Completada 21 Realización sustancial de las obras de construcción 466 Obras civiles de la Presa - Completadas 195 - Aprobación de los Planos "Como Construido" y Informe de mantenimiento de las obras 25 Recepción provisional de las obras ejecutadas																																												
FECHAS DE CONTRATO 14 Cierre de licitación 15 Evaluación de las Propuestas y Adjudicación 16 Adjudicación de Contrato 17 Fecha de la firma del Contrato 18 Acta de Inicio de los trabajos																																												
ACTIVIDADES DE IMPACTO 3 Impacto COVID-19 5 Instrucción EGEHD / Supervisión - Nuevo Arreglo General de la Presa & Dique de Cierre (cartas GIOE-C 4 Liberación de los terrenos (EI-DO-CERCONS-058-2020) 8 Paralización actividades de construcción (GIOE-CERCONS-021-2020) 6 Dique de Cierre - Coeficientes Sísmicos - Espectros horizontales y verticales. 7 Emisión Licencia Ambiental 9 Removilitación del Personal Directo e Indirecto 10 Removilitación de Equipos Mayores y Menores del Consorcio 11 Movilización de Equipos de los Subcontratistas 12 Impacto Disponibilidad de Explosivos debido a Transporte Marítimo																																												
Requerimientos Generales 20 Duración de las obras de construcción 23 Llenado controlado del embalse 24 Entrenamiento del personal de operación de EGEHD 22 Período de Operación																																												
MOVILIZACIÓN Y ACTIVIDADES PRELIMINARES 195 Definición y entrega al Contratista de las áreas de construcción y campamentos 198 Movilización Equipos de nivelación, compactación, vibración... 196 Movilización del personal del Contratista 197 Movilización de Equipos de levantamiento y manejo de materiales 200 Gestión Autorización Fuerzas Armadas para Construcción Polvorn e Inicio de Voladuras 199 Movilización Subcontratista perforación y voladura rocas																																												
CAMPAMENTOS E INSTALACIONES Campamentos 207 Despeje y desratado sitios para Campamentos 206 Diseño de detalle de los Campamentos																																												

█ Remaining Level of Effort
 █ Actual Work
 █ Critical Remaining ...
█ Actual Level of Effort
 █ Remaining Work
 ◆ Milestone



K

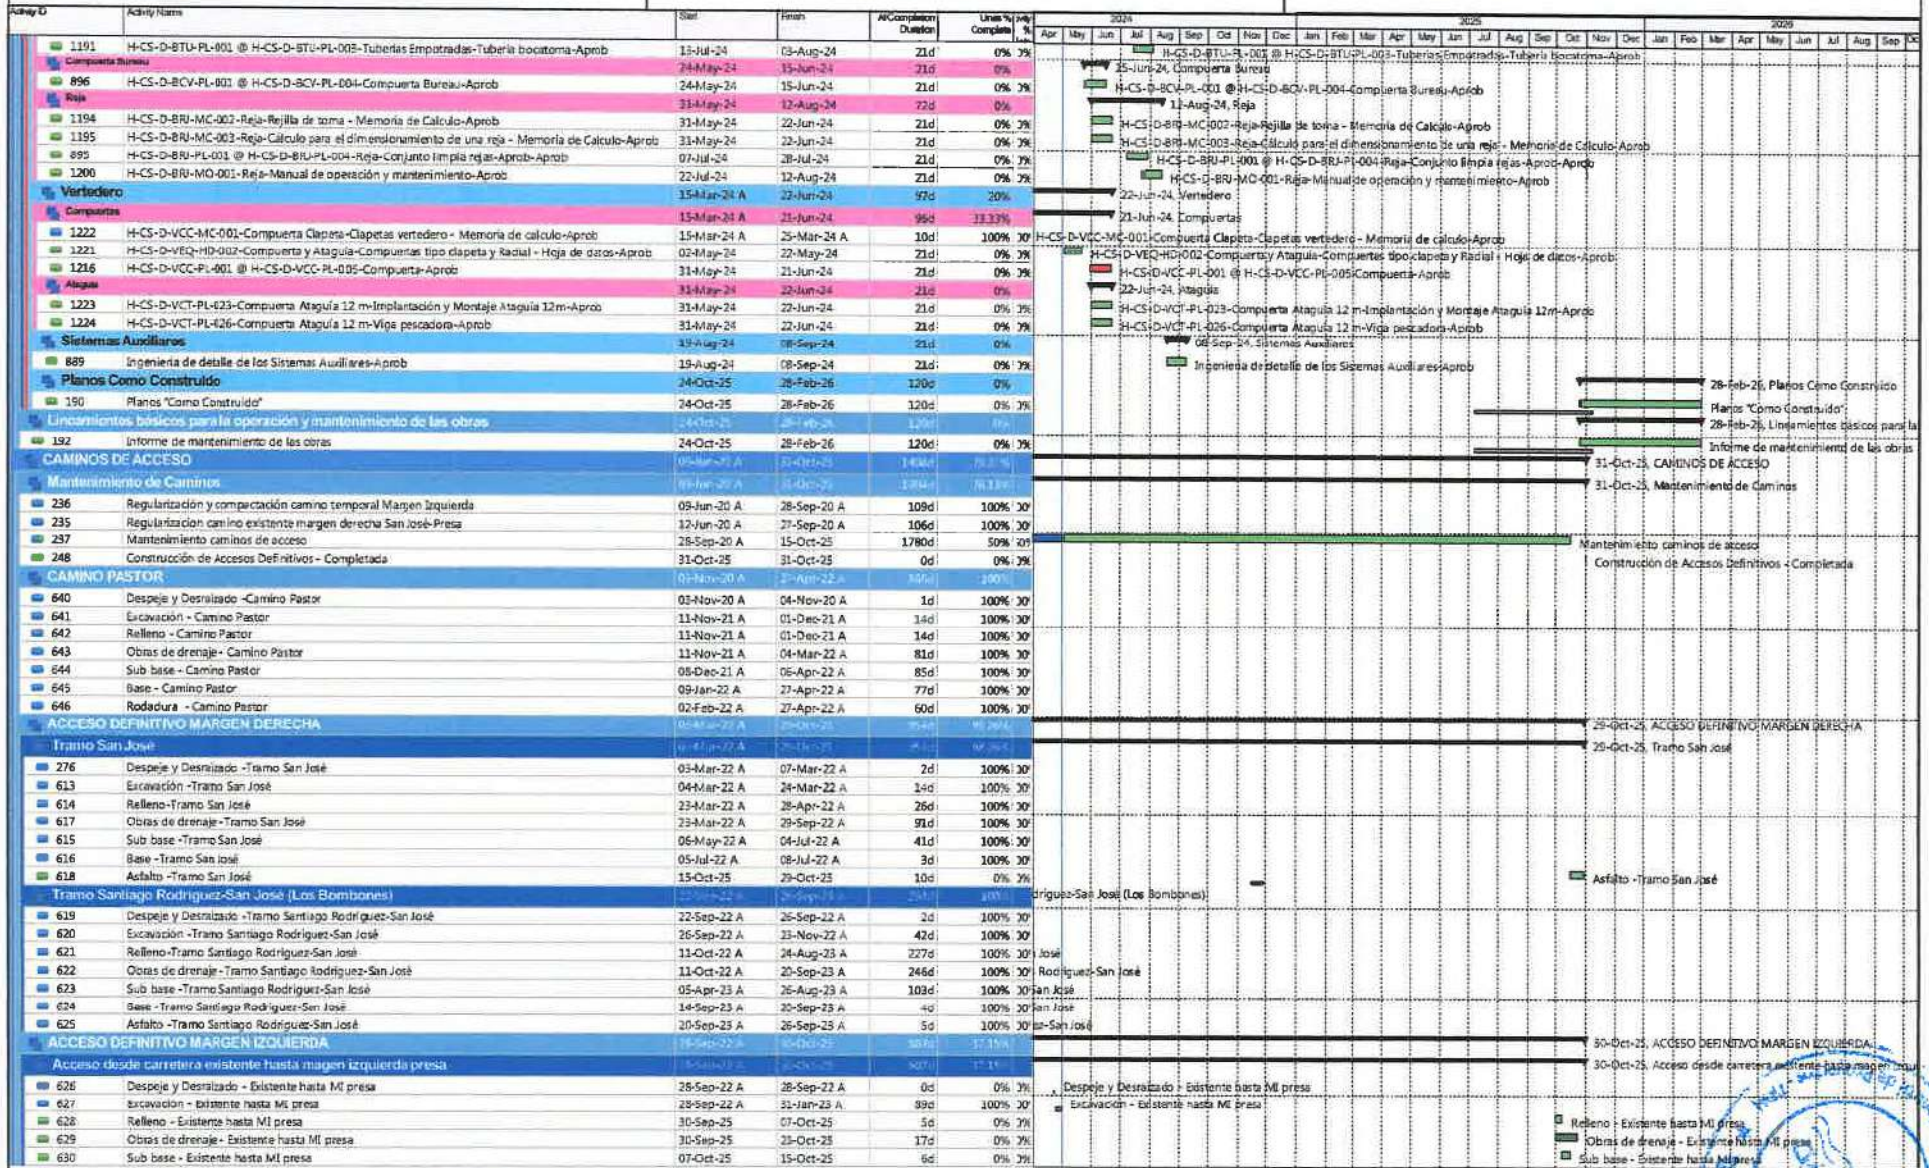


Remaining Level of Effort Actual Work Critical Remaining ...
 Actual Level of Effort Remaining Work Milestone





Remaining Level of Effort Actual Work Critical Remaining ...
 Actual Level of Effort Remaining Work Milestone



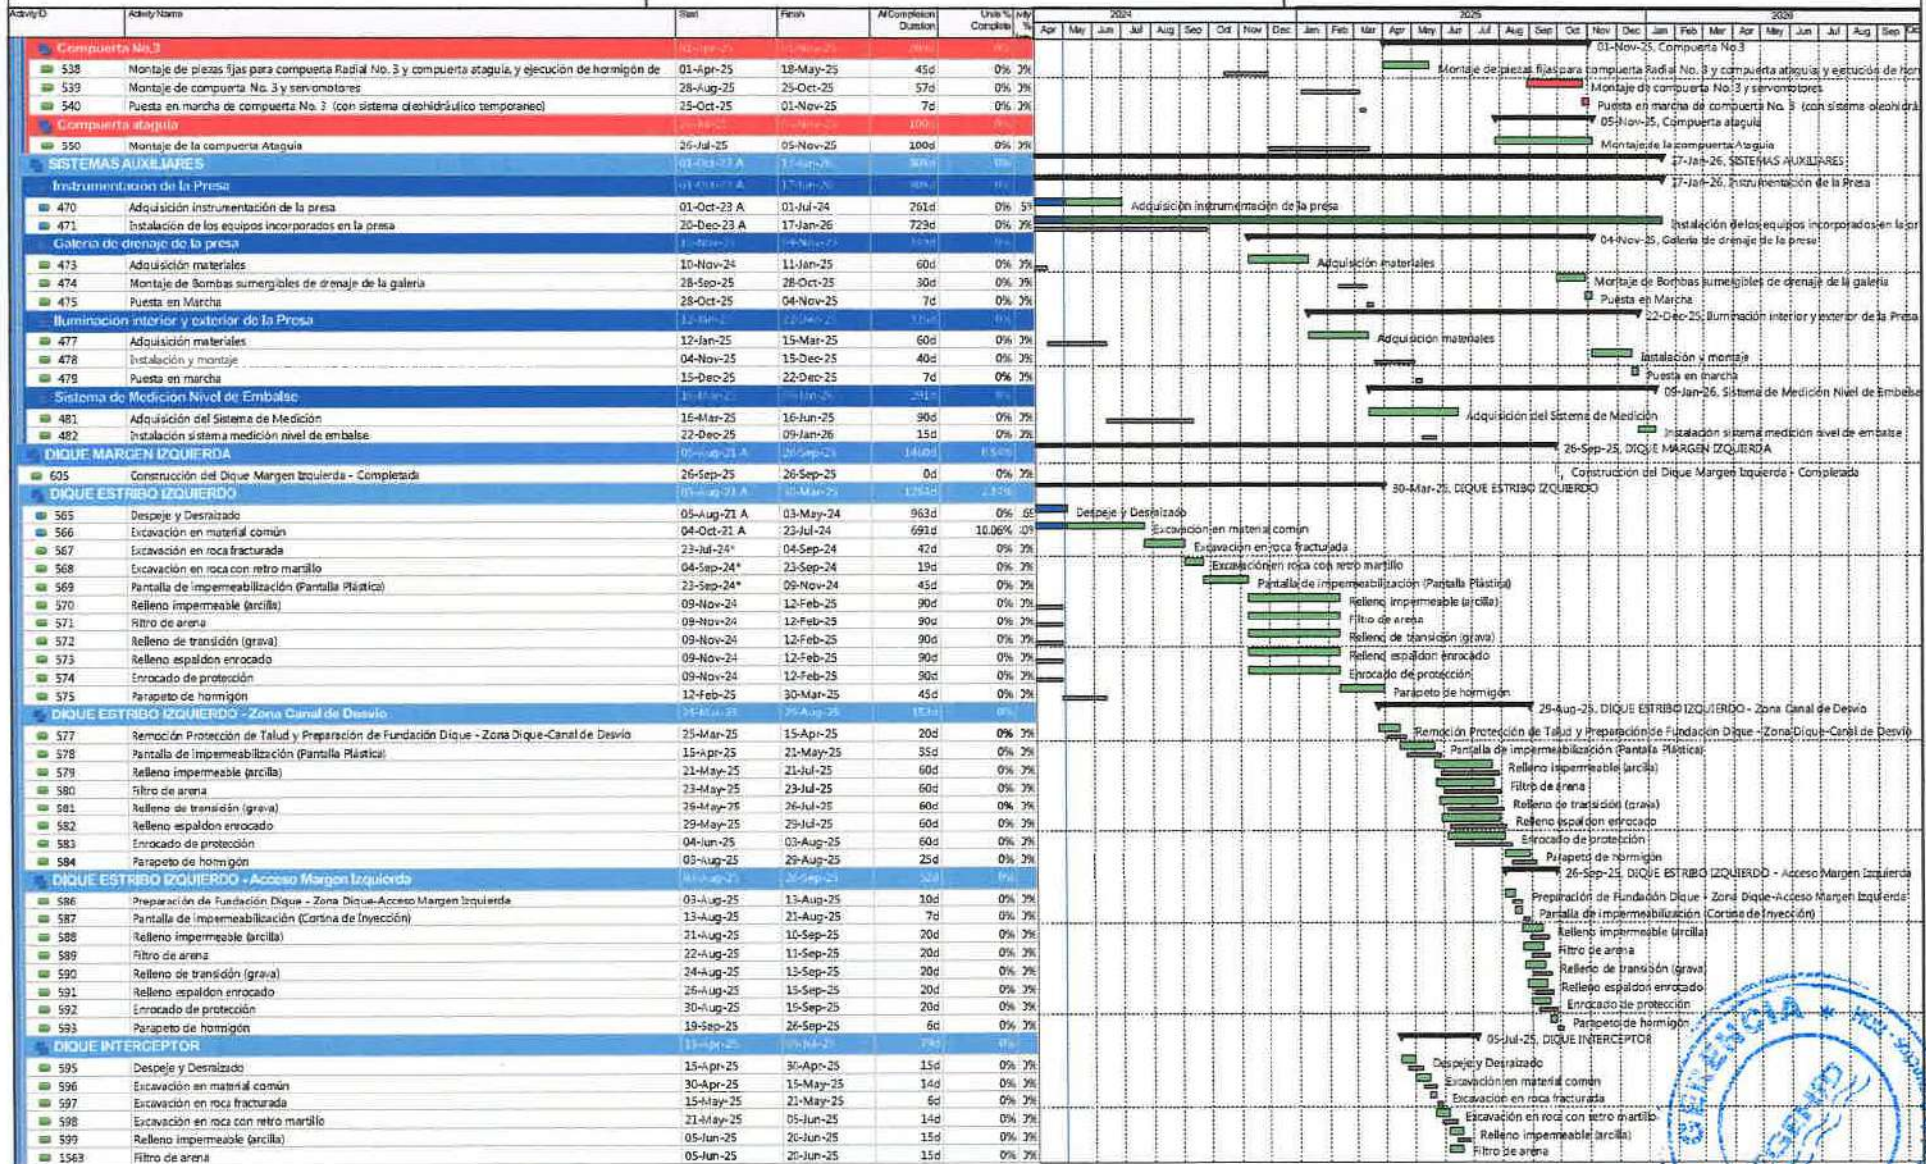

Remaining Level of Effort Actual Work Critical Remaining ...
Actual Level of Effort Remaining Work Milestone



