

Project Sch. ID: 2023-00526-06

Project Sch. Name: Ampliación Acueducto Sabaneta - Actualización No.6 (Feb. 2025)

Start Date: 25-Mar-24 * Finish Date: 27-Oct-25 * Data Date: 28-Feb-25

Contrato No.: 73/2024 * Proyecto No.: 23-00526 * Licitación No.: EGEHID-CCC-LPN-2023-0043

Page 1 of 2


Schedule Type: Schedule Update

ACTUALIZACION NO.6 DEL CRONOGRAMA

ACTUALIZADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025



Activity ID		Activity Name	Original Duration	Remaining Duration	Start	Finish	Late Start	Late Finish	Total Float	Physical % Complete	2024												2025											
											Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
Ampliación Acueducto Sabaneta - Actualización No.6 (Feb. 2021)			584	240	25-Mar-24 A	27-Oct-25	14-Aug-24	14-Apr-25	-195																									
Resumen Ejecutivo de Proyecto			540	240	15-Apr-24 A	26-Oct-25	14-Aug-24	14-Apr-25	-195																									
ES-100	Resumen Total del Proyecto	365	240	15-Apr-24 A	26-Oct-25	14-Aug-24	14-Apr-25	-195	5.16%																									
ES-110	Resumen Trabajos de Construcción	211	211	10-Mar-25	06-Oct-25	23-Aug-24	25-Mar-25	-195	0%																									
ES-130	Resumen Fase 1 - Línea de Impulsión Ø 20"	187	187	10-Mar-25	12-Sep-25	14-Mar-25	14-Mar-25	-182	0%																									
ES-120	Resumen Fase 2 - Estación De Bombeo	200	200	10-Mar-25	25-Sep-25	23-Aug-24	14-Mar-25	-195	0%																									
ES-140	Resumen Fase 3 - Línea de Aducción Ø24"	11	11	26-Sep-25	06-Oct-25	15-Mar-25	25-Mar-25	-195	0%																									
Hitos del Proyecto			462	178	25-Mar-24 A	27-Oct-25	14-Aug-24	14-Apr-25	-181																									
MI-100	Notificación de Adjudicación	0	0	25-Mar-24 A		14-Aug-24			100%																									
MI-110	Firma del Contrato	0	0	15-Apr-24 A		14-Aug-24			100%																									
MI-120	Inicio de la Obra	0	0	03-Oct-24 A		14-Aug-24			100%																									
MI-130	Fecha de Terminación Sustancial Contractual	0	0		25-Mar-25*		25-Mar-25	0	0%																									
MI-150	Fecha de Aceptación Final Contractual	0	0		14-Apr-25*		14-Apr-25	0	0%																									
MI-140	Fecha de Terminación Sustancial Prevista (Proyectada Según Actualización)	0	0		06-Oct-25*		25-Mar-25	-161	0%																									
MI-160	Fecha de Aceptación Final Prevista (Proyectada Según Actualización)	0	0		27-Oct-25*		14-Apr-25	-161	0%																									
Preliminares			44	0	25-Mar-24 A	09-Jul-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24																										
PR-100	Constitución de Garantías	20	0	25-Mar-24 A	13-Apr-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%																									
PR-110	Gestiones Contractuales Contraloría	20	0	15-Apr-24 A	09-Jul-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%																									
PR-120	Recepción del Anticipo	1	0	15-Apr-24 A	09-Jul-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%																									
PR-130	Recepción de la Ingeniería de Detalle	1	0	15-Apr-24 A	09-Jul-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%																									
PR-140	Recepción del Estudio de Impacto Ambiental	1	0	15-Apr-24 A	09-Jul-24 A	14-Aug-24	14-Aug-24		100%																									
Mobilización			16	7	27-Feb-25 A	08-Mar-25	14-Aug-24	22-Aug-24	-161																									
PR-150	Mobilización	16	7	27-Feb-25 A	08-Mar-25	14-Aug-24	22-Aug-24	-161	0%																									
Submittals & Procuras Claves			180	60	03-Oct-24 A	13-May-25	27-Aug-24	18-Feb-25	-68																									
Presentaciones al Ingeniero Supervisor (Submittals)			127	7	03-Oct-24 A	08-Mar-25	27-Aug-24	17-Jan-25	-41																									
SUB-100	Tuberías y Piezas	7	0	03-Oct-24 A	01-Nov-24 A	27-Aug-24	27-Aug-24		100%																									
SUB-110	Válvulas y Compuertas	7	7	01-Mar-25	08-Mar-25	22-Nov-24	29-Nov-24	-78	0%																									
SUB-120	Equipos de Bombeo	7	7	01-Mar-25	08-Mar-25	10-Jan-25	17-Jan-25	-41	0%																									
Procuras Claves			154	60	02-Nov-24 A	13-May-25	27-Aug-24	18-Feb-25	-68																									
SUB-130	Tuberías	104	1	02-Nov-24 A	01-Mar-25	27-Aug-24	27-Aug-24	-151	98%																									
SUB-140	Válvulas y Compuertas	53	53	10-Mar-25	13-May-25	30-Nov-24	08-Feb-25	-78	0%																									
SUB-150	Equipos de Bombeo	26	26	10-Mar-25	08-Apr-25	18-Jan-25	18-Feb-25	-41	0%																									
Trabajos Contractuales			162	182	01-Mar-25	06-Oct-25	23-Aug-24	14-Apr-25	-144																									
Fase 1 - Línea de Impulsión Ø20" Hierro Dúctil; Clase C-25			163	163	01-Mar-25	12-Sep-25	27-Aug-24	14-Apr-25	-125																									
F1-LI-100	Suministro de Tuberías - Fase 1	1	1	01-Mar-25	01-Mar-25	27-Aug-24	27-Aug-24	-151	0%																									
F1-LI-120	Colocación de Tuberías y Válvulas - Fase 1	150	150	03-Mar-25	29-Aug-25	28-Aug-24	28-Feb-25	-151	0%																									
F1-LI-110	Comienzo Fase 1	0	0	10-Mar-25		14-Apr-25		31	0%																									
F1-LI-130	Carpeta Asfáltica (L=2,200 M) - Fase 1	12	12	30-Aug-25	12-Sep-25	01-Mar-25	14-Mar-25	-151	0%																									
F1-LI-140	Finalización Fase 1	0	0		12-Sep-25		14-Mar-25	-151	0%																									

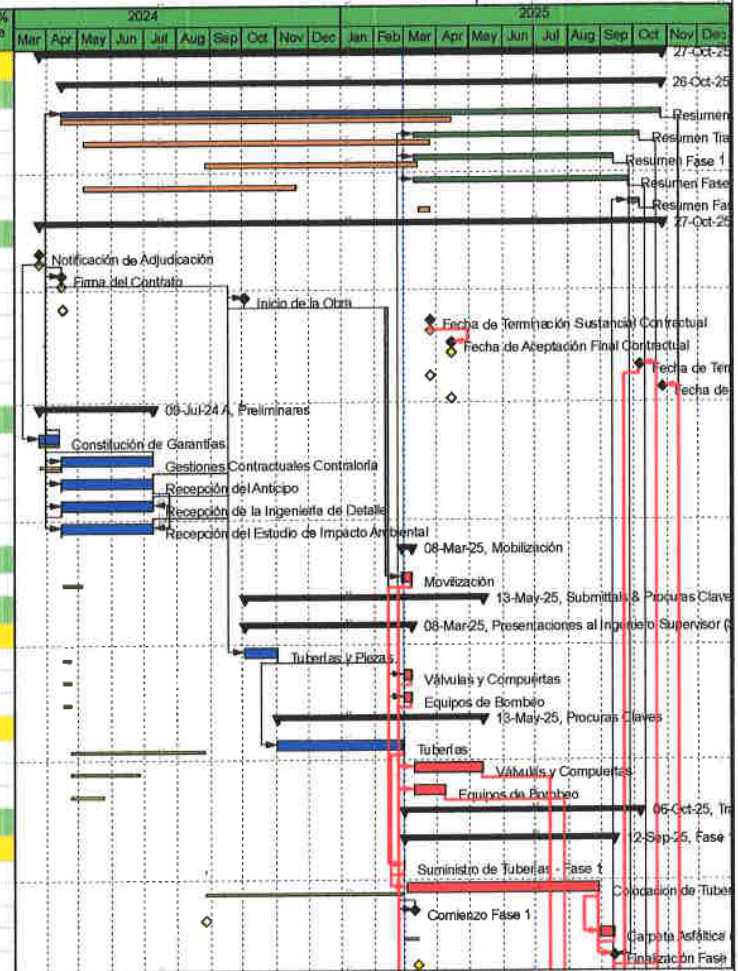

- Remaining Level of Effort
- BL Level of Effort
- Actual Level of Effort
- Actual Work
- Remaining Work
- Critical Remaining Work
- Milestone
- Summary
- Primary Baseline
- Baseline Milestone



AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SABANETA
ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE PRESA DE GUAYUBÍN
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, R. D.

Date	Revisión	Checked	Approved
	Propietario: EGEHID		
	Contratista: AMINA		

Project Sch. ID: 2023-00526-06

Project Sch. Name: Ampliación Acueducto Sabaneta - Actualización No.6 (Feb. 2025)

Start Date: 25-Mar-24 * Finish Date: 27-Oct-25 * Data Date: 28-Feb-25

Contracto No.: 73/2024 * Proyecto No.: 23-00526 * Licitación No.: EGEHID-CCC-LPN-2023-0043

Page 2 of 2

Schedule Type: Schedule Update

ACTUALIZACIÓN NO.6 DEL CRONOGRAMA

ACTUALIZADO AL 28 DE FEBRERO DE 2025



Activity ID	Activity Name	Original Duration	Remaining Duration	Start	Finish	Late Start	Late Finish	Total Float	Physical % Complete	2024												2025											
										Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
Fase 2 - Estación De Bombeo		166	166	10-Mar-25	25-Sep-25	23-Aug-24	20-Mar-25	-156																									
F2-EB-100	Comienzo Fase 2	0	0	10-Mar-25		23-Aug-24		-161	0%																								
F2-EB-220	Finalización Fase 2	0	0		25-Sep-25		14-Mar-25	-161	0%																								
Construcción Estación De Bombeo (Cisterna 3.500 m3 y Caseta)		153	153	10-Mar-25	09-Sep-25	25-Aug-24	20-Mar-25	-143																									
F2-EB-110	Hormigón Armado FC = 280 Kg/cm2 (Industrial) - Fase 2	118	118	10-Mar-25	29-Jul-25	23-Aug-24	15-Jan-25	-161	0%																								
F2-EB-120	Inicio Muro de Block - Fase 2	31	31	25-Jun-25	30-Jul-25	04-Jan-25	11-Feb-25	-140	0%																								
F2-EB-130	Electrificación y Equipamiento - Fase 2	63	63	27-Jun-25	09-Sep-25	07-Jan-25	20-Mar-25	-143	0%																								
F2-EB-140	Electrificación Primaria - Fase 2	16	16	27-Jun-25	15-Jul-25	07-Jan-25	25-Jan-25	-141	0%																								
F2-EB-150	Electrificación Secundaria - Fase 2	20	20	18-Jul-25	09-Aug-25	27-Jan-25	18-Feb-25	-143	0%																								
F2-EB-160	Instalaciones Hidrosanitarias - Fase 2	20	20	30-Jul-25	22-Aug-25	07-Feb-25	03-Mar-25	-143	0%																								
F2-EB-190	Suministro e Instalación de Equipo De Bombeo - Fase 2	25	25	11-Aug-25	09-Sep-25	19-Feb-25	20-Mar-25	-143	0%																								
F2-EB-200	Instalaciones Eléctricas - Fase 2	10	10	11-Aug-25	22-Aug-25	19-Feb-25	03-Mar-25	-143	0%																								
F2-EB-210	Instalaciones Especiales - Fase 2	10	10	23-Aug-25	03-Sep-25	04-Mar-25	14-Mar-25	-143	0%																								
Verja Perimetral y Caseta de Vigilante		48	48	30-Jul-25	25-Sep-25	16-Jan-25	14-Mar-25	-161																									
F2-EB-170	Verja Perimetral en Bloques Violados L=68.80 m - Fase 2	42	42	30-Jul-25	17-Sep-25	16-Jan-25	07-Mar-25	-161	0%																								
F2-EB-180	Garita De Vigilante - Fase 2	48	48	30-Jul-25	25-Sep-25	16-Jan-25	14-Mar-25	-161	0%																								
Fase 3 - Línea de Aducción Ø34" Acero (Sch-20)		9	9	26-Sep-25	06-Oct-25	15-Mar-25	25-Mar-25	-161																									
F3-LA-100	Comienzo Fase 3	0	0	26-Sep-25		15-Mar-25		-161	0%																								
F3-LA-110	Suministro de Tuberías - Fase 3	9	9	26-Sep-25	06-Oct-25	15-Mar-25	25-Mar-25	-161	0%																								
F3-LA-120	Colocación de Tuberías y Válvulas - Fase 3	9	9	26-Sep-25	06-Oct-25	15-Mar-25	25-Mar-25	-161	0%																								
F3-LA-130	Finalización Fase 3	0	0		06-Oct-25		25-Mar-25	-161	0%																								
Cierre de Proyecto		20	20	06-Oct-25	26-Oct-25	25-Mar-25	14-Apr-25	-195																									
CP-100	FIN DE TRABAJOS CONTRACTUALES	0	0		06-Oct-25		25-Mar-25	-161	0%																								
CP-110	Documentos de Cierre	20	20	07-Oct-25	26-Oct-25	26-Mar-25	14-Apr-25	-195	0%																								
CP-120	Imprevistos del Contratista	20	20	07-Oct-25	26-Oct-25	26-Mar-25	14-Apr-25	-195	0%																								
CP-130	Imprevistos Contractuales	20	20	07-Oct-25	26-Oct-25	26-Mar-25	14-Apr-25	-195	0%																								
CP-140	FIN DE OBRA	0	0		26-Oct-25		14-Apr-25	-195	0%																								



AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SABANETA
ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE PRESA DE GUAYUBÍN
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ, R. D.

- Remaining Level of Effort
- BL Level of Effort
- Actual Level of Effort
- Actual Work
- Remaining Work
- Critical Remaining Work
- Milestone
- Summary
- Primary Baseline
- Baseline Milestone

Date	Revision	Checked	Approved
	Propietario: EGEHID		
	Contratista: AMINA		
