






TASK filter: Critical.

TASK filter: Critical.

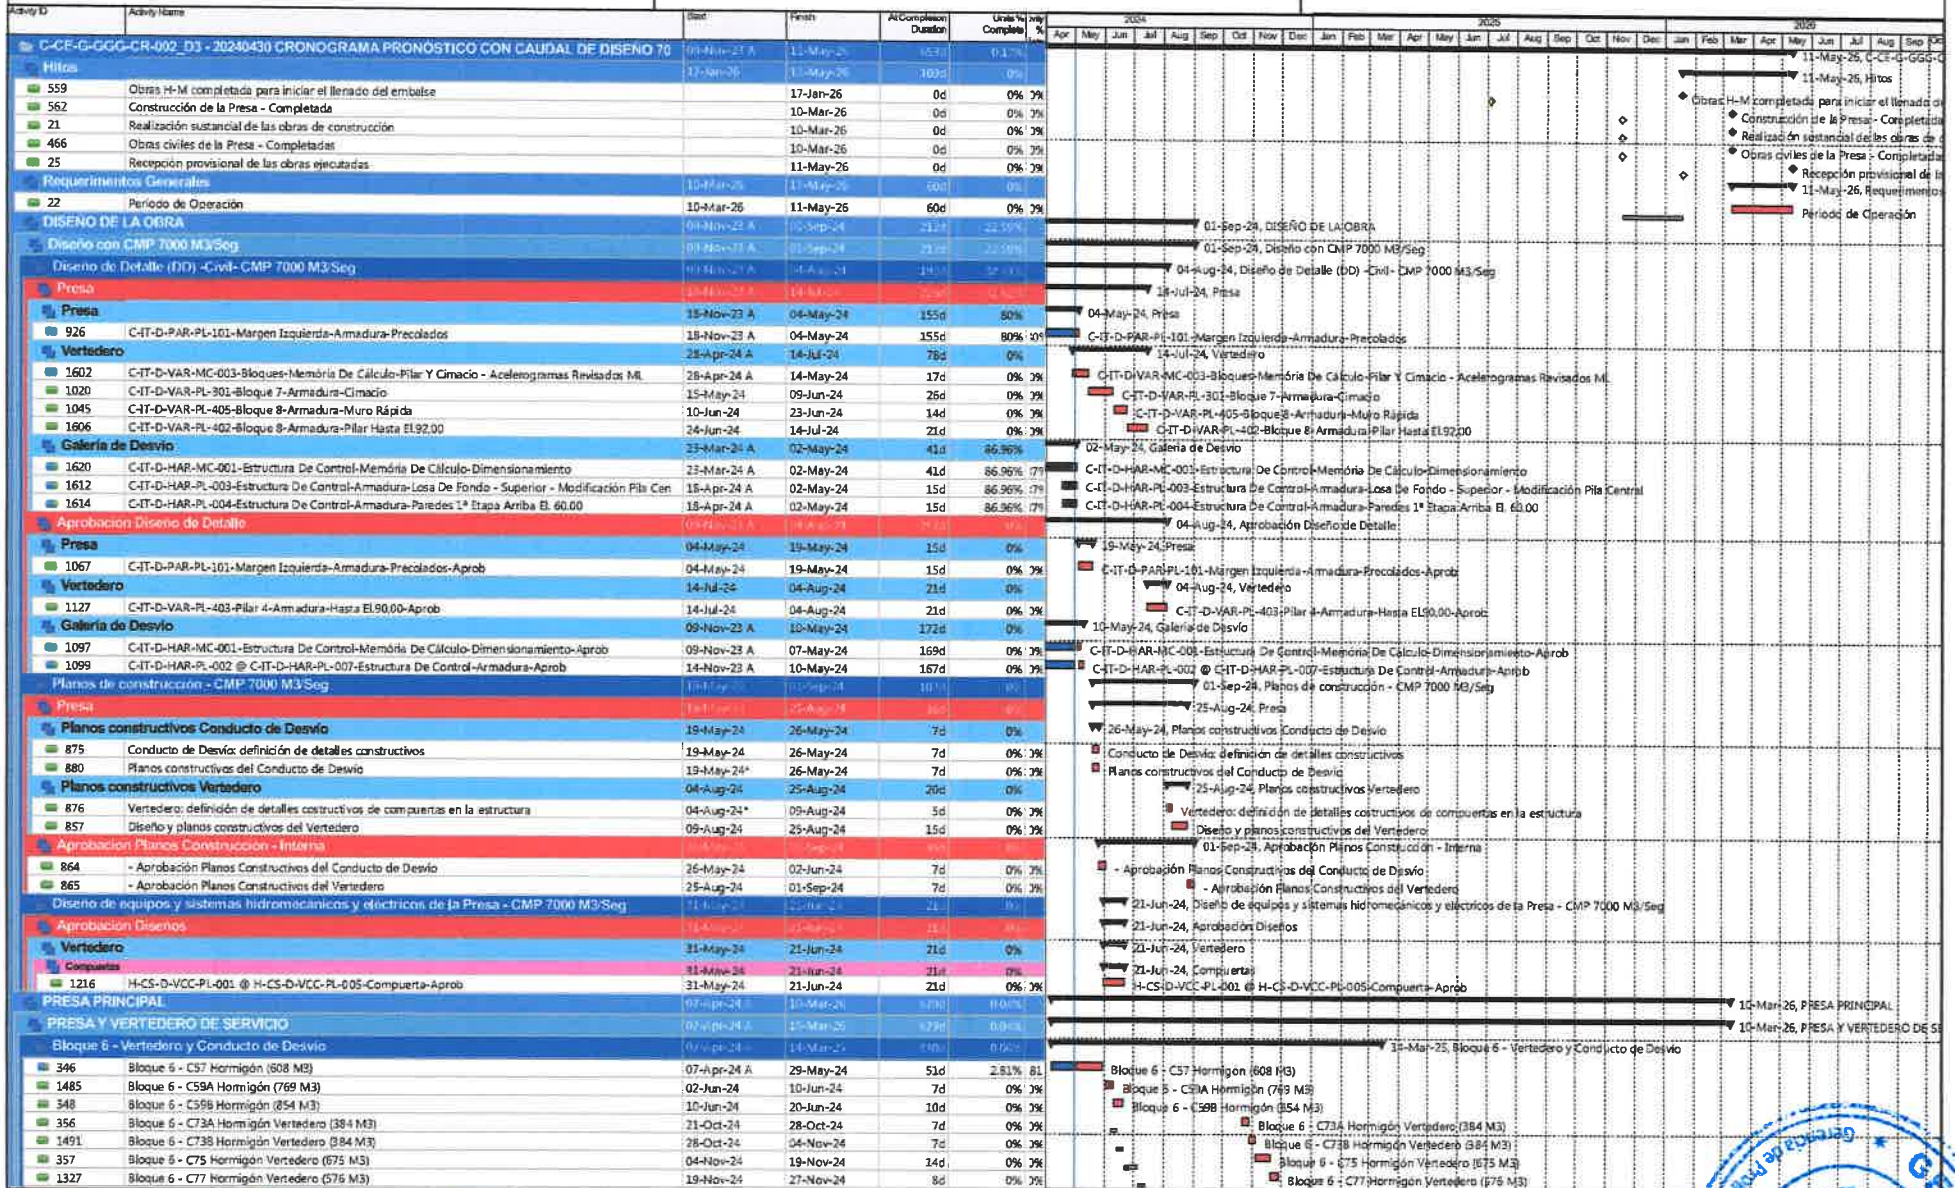

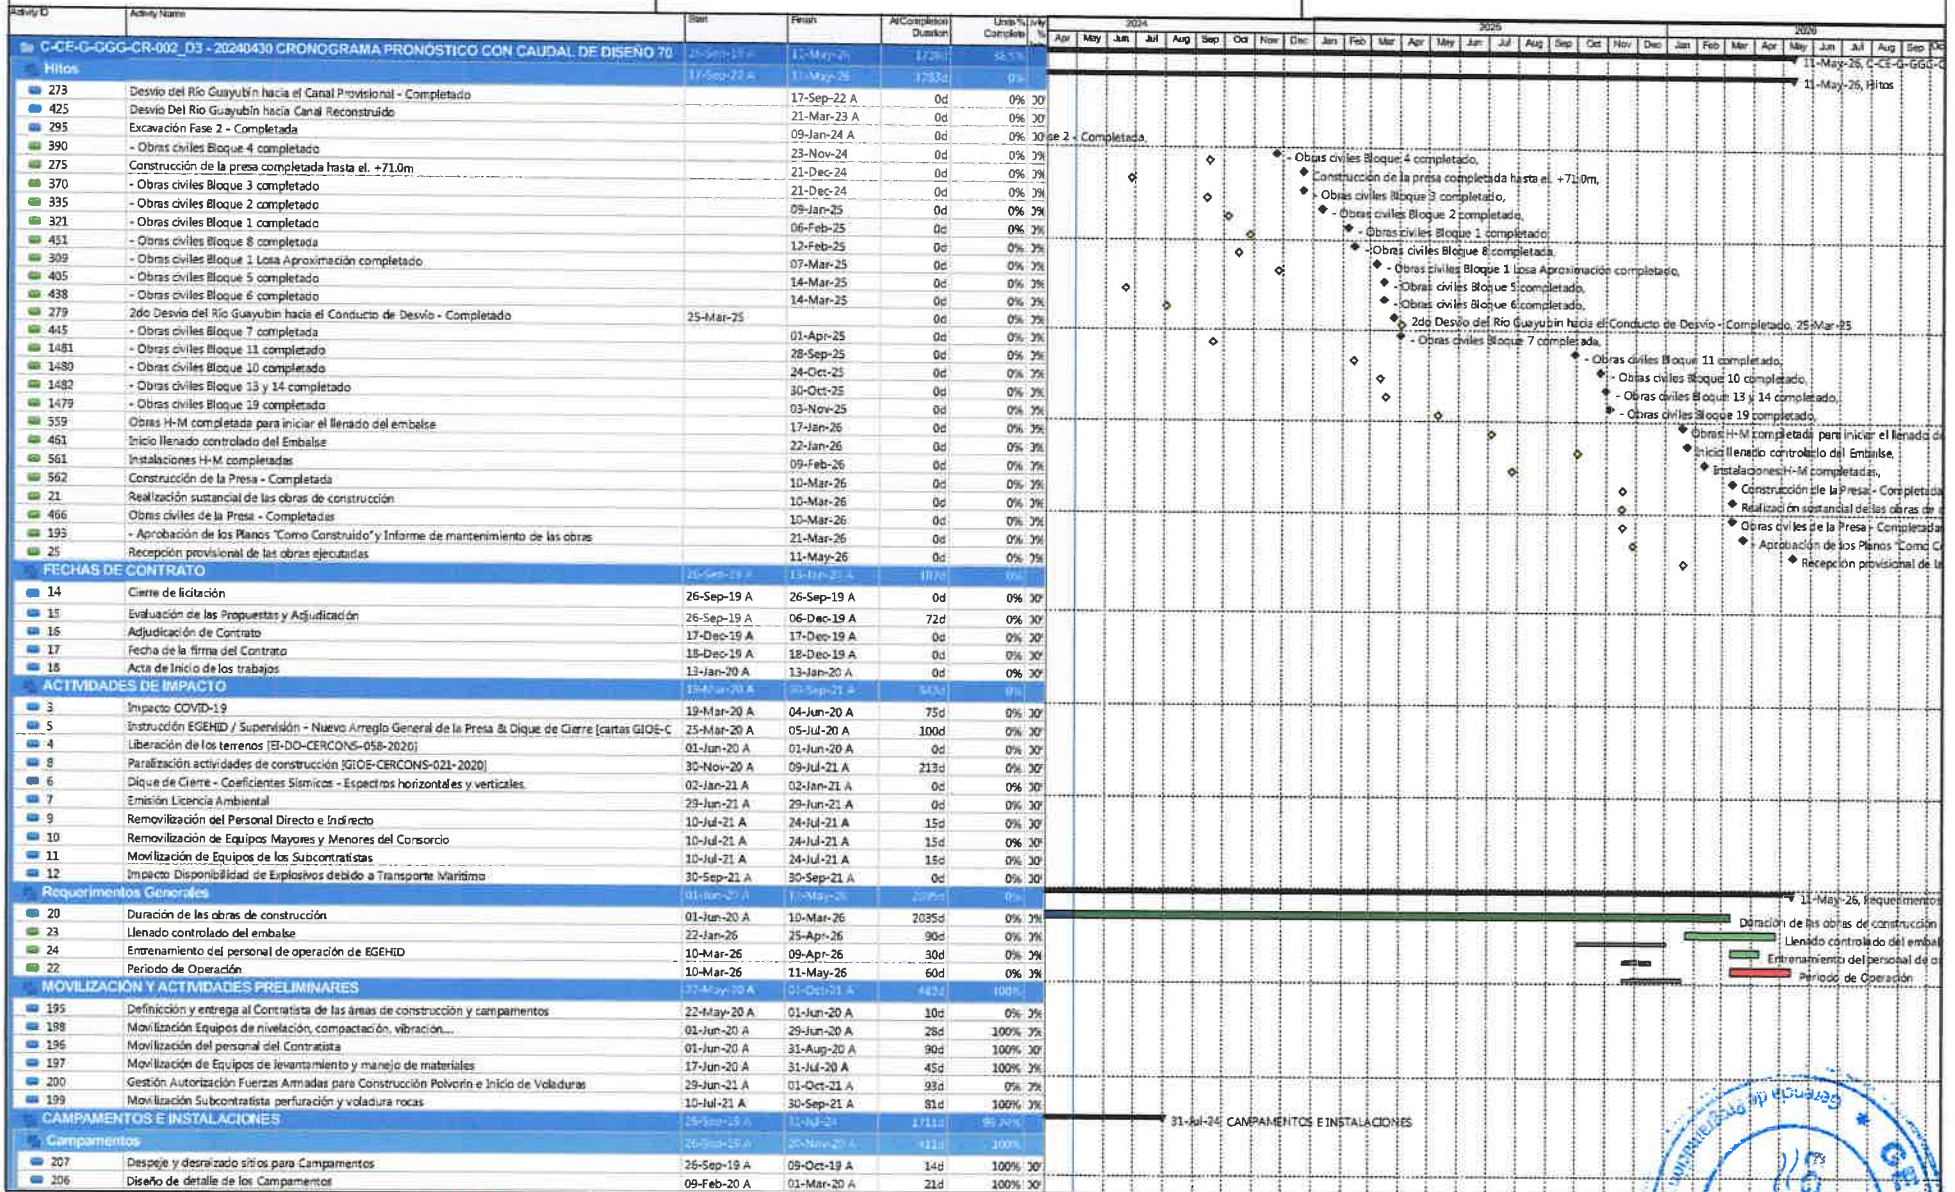

■ Remaining Level of Effort
 ■ Actual Work
 ■ Critical Remaining ...
 ■ Actual Level of Effort
 ■ Remaining Work
 ◆ Milestone



TASK filter: All Activities




TASK filter: All Activities



TASK filter: All Activities


Activity ID	Activity Name	Start	Finish	AI/Completion Duration	Units/Complete	%	2024	2025	2026
974	C-IT-D-FAR-PL-004-Estructura De Control-Armadura-Muro Izquierdo	21-Jul-24	27-Jul-24	7d	0%	0%			
979	C-IT-D-FAR-MC-001-Estructura De Control-Armadura-Canal	27-Jul-24	10-Aug-24	15d	0%	0%			
975	C-IT-D-FAR-PL-005-Estructura De Control-Armadura-Muro Derecho	28-Jul-24	03-Aug-24	7d	0%	0%			
976	C-IT-D-FAR-PL-006-Estructura De Control-Armadura-Sala Compuetas	04-Aug-24	10-Aug-24	7d	0%	0%			
977	C-IT-D-FAR-PL-007-Estructura De Control-Armadura-Entre EL82.30 Y EL95.80	11-Aug-24	12-Oct-24	63d	0%	0%			
978	C-IT-D-FAR-PL-008-Estructura De Control-Armadura-Polipasto	13-Oct-24	02-Nov-24	21d	0%	0%			
971	C-IT-D-FGE-MD-001-Manual De Operación	03-Nov-24	20-Nov-24	18d	0%	0%			
Galería de Desvío		16-Sep-23 A	19-May-24	221d	84.65%				
981	C-IT-D-HAR-MC-001-Estructura De Control-Memoria De Cálculo-Dimensionamiento	16-Sep-23 A	09-Nov-23 A	42d	100%	30%			
980	C-IT-D-HB-PL-004-Planta Y Secciones	01-Oct-23 A	14-Nov-23 A	35d	100%	30%			
992	C-IT-D-HB-PL-001-Estructura De Control-Geometría-1ª Etapa	01-Oct-23 A	14-Nov-23 A	35d	100%	30%			
1619	Revisión Acelerogramas Hasta Entrega por Ing. María Laporte	10-Oct-23 A	21-Feb-24 A	113d	0%	30%			
983	C-IT-D-HAR-PL-001-Estructura De Control-Armadura-Losa De Fondo - Inferior	14-Nov-23 A	18-Nov-23 A	4d	100%	30%			
982	C-IT-D-HAR-PL-003-Estructura De Control-Armadura-Losa De Fondo - Superior	20-Nov-23 A	02-Dec-23 A	10d	100%	30%			
984	C-IT-D-HB-PL-003-Estructura De Control-Geometría-Precolados	01-Dec-23 A	16-Dec-23 A	12d	100%	30%			
993	C-IT-D-HAR-PL-004-Estructura De Control-Armadura-Pared Izquierda	12-Dec-23 A	21-Dec-23 A	6d	100%	30%			
994	C-IT-D-HAR-PL-005-Estructura De Control-Armadura-Pared Central	12-Dec-23 A	21-Dec-23 A	6d	100%	30%			
995	C-IT-D-HAR-PL-006-Estructura De Control-Armadura-Pared Derecha	12-Dec-23 A	21-Dec-23 A	6d	100%	30%			
996	C-IT-D-HAR-PL-007-Estructura De Control-Armadura-Losa Del Techo	12-Dec-23 A	21-Dec-23 A	6d	100%	30%			
1618	C-IT-D-HB-PL-001-Estructura De Control-Geometría-1ª Etapa - Modificación Pila Central	22-Feb-24 A	23-Mar-24 A	30d	0%	30%			
1611	C-IT-D-HAR-PL-001-Estructura De Control-Armadura-Losa De Fondo - Inferior - Modificación Pila Central	23-Mar-24 A	20-Apr-24 A	28d	100%	30%			
1620	C-IT-D-HAR-MC-001-Estructura De Control-Memoria De Cálculo-Dimensionamiento	23-Mar-24 A	02-May-24	41d	86.96%	7%			
1612	C-IT-D-HAR-PL-003-Estructura De Control-Armadura-Losa De Fondo - Superior - Modificación Pila Central	18-Apr-24 A	02-May-24	15d	86.96%	7%			
1617	C-IT-D-HAR-PL-007-Estructura De Control-Armadura-Losa Del Techo - Modificación Pila Central	18-Apr-24 A	27-Apr-24 A	9d	100%	30%			
1614	C-IT-D-HAR-PL-004-Estructura De Control-Armadura-Paredes 1ª Etapa Arriba EL 60.00	18-Apr-24 A	02-May-24	15d	86.96%	7%			
1613	C-IT-D-HB-PL-003-Estructura De Control-Geometría-Precolados - Modificación Pila Central	03-May-24	14-May-24	12d	0%	3%			
985	C-IT-D-HOT-PL-001-Tapon-Planta Y Detalles	15-May-24	19-May-24	5d	0%	3%			
Dique		13-Apr-23 A	11-Aug-24	161d	30%	0%			
792	C-IT-D-DGE-PL-003-Arreglo General-Plantas Y Secciones	13-Apr-23 A	31-May-24	36d	30%	0%			
765	C-IT-D-DGT-PL-002-Pantalla Plástica-Planta, Sección Y Detalles	01-May-24	31-May-24	31d	0%	0%			
766	C-IT-D-DGT-PL-003-Pantalla De Inyecciones-Planta, Sección Y Detalles	01-May-24	31-May-24	31d	0%	0%			
780	C-IT-D-DGE-PL-001-Modelo Tridimensional	01-May-24	31-May-24	31d	0%	0%			
793	C-IT-D-DGE-PL-005-Etapas De Construcción-Plantas Y Secciones	01-May-24*	31-May-24	31d	0%	0%			
997	C-IT-D-DGX-PL-001-Excavación Común-Planta Y Secciones	01-May-24*	31-May-24	31d	0%	0%			
1004	C-IT-D-DGE-PL-004-Arreglo General-Plantas Y Secciones-Dique Interceptor	01-May-24*	31-May-24	31d	0%	0%			
998	C-IT-D-DGT-PL-001-Materiales De Construcción-Fajas Granulométricas	01-Jun-24*	06-Jul-24	36d	0%	0%			
999	C-IT-D-DGE-PL-006-Dique De Cierre-Planta, Secciones Y Detalles	01-Jun-24*	06-Jul-24	36d	0%	0%			
1000	C-IT-D-DIN-PL-001-Instrumentación-Planta, Secciones Y Detalles	01-Jun-24*	06-Jul-24	36d	0%	0%			
1001	C-IT-D-DIN-ME-001-Instrumentación-Manual De Instrumentación	01-Jun-24*	06-Jul-24	36d	0%	0%			
1002	C-IT-D-DGE-PL-007-Drenaje Superficial-Planta, Secciones Y Detalles	01-Jun-24*	06-Jul-24	36d	0%	0%			
1003	C-IT-D-DGT-MC-001-Dique De Cierre-Análisis De Estabilidad-Memoria De Cálculo	07-Jul-24*	11-Aug-24	36d	0%	0%			
1005	C-IT-D-DGT-IT-001-Evaluación De Resultados De Laboratorio-Informe Técnico	07-Jul-24*	11-Aug-24	36d	0%	0%			
1006	C-IT-D-DGE-EP-001-Teraplén De Prueba Aplicación De Material Fino-Programa De Trabajo Y Especificaciones	07-Jul-24*	11-Aug-24	36d	0%	0%			
1007	C-IT-D-DGE-EP-002-Teraplén De Prueba Material De Enrocado-Programa De Trabajo Y Especificaciones	07-Jul-24*	11-Aug-24	36d	0%	0%			
Aprobación Diseño de Detalle		14-Nov-23 A	10-Feb-25	43d	27.42%				
Presas		14-Nov-23 A	10-Feb-25	43d	27.42%				
1052	C-IT-D-PBH-PL-102-Margen Izquierda-Geometría-1ª Etapa-Planta-Aprob	14-Nov-23 A	26-Dec-23 A	39d	100%	30%			
1060	C-IT-D-PBH-PL-103-Margen Izquierda-Geometría-Precolados-Aprob	30-Nov-23 A	13-Dec-23 A	13d	100%	30%			
1055	C-IT-D-GEH-PL-001-Etapas De Construcción-Plantas Y Secciones-Aprob	10-Jan-24 A	15-Feb-24 A	34d	0%	30%			
1063	C-IT-D-PGT-PL-006-Pantalla De Impermeabilización-Planta, Corte Y Detalle-Aprob	08-Feb-24 A	22-May-24	102d	44.44%	4%			
1064	C-IT-D-PGT-PL-007-Pantalla De Drenaje-Planta, Corte Y Detalle-Aprob	08-Feb-24 A	18-Apr-24 A	68d	100%	30%			
1058	C-IT-D-GIN-PL-001-Instrumentación-Planta Y Secciones-Aprob	09-Feb-24 A	11-Apr-24 A	61d	100%	30%			
1056	C-IT-D-PGE-PL-003-Galería De Drenaje-Disposición General-Aprob	09-Apr-24 A	18-Apr-24 A	6d	100%	30%			
1053	C-IT-D-PDI-PL-001-Galería De Drenaje-Arreglo General-Aprob	10-Apr-24 A	18-Apr-24 A	7d	100%	30%			
1066	C-IT-D-PBH-PL-202-Margen Derecha-Geometría-Precolados-Aprob	27-Apr-24 A	05-May-24	8d	0%	0%			
1051	C-IT-D-GEH-PL-002-Arreglo General-Planta-Aprob	02-May-24	16-May-24	15d	0%	0%			
1054	C-IT-D-PGE-PL-004-Modelo Tridimensional-Aprob	02-May-24	16-May-24	15d	0%	0%			
1059	C-IT-D-PES-PL-101-Margen Izquierda-Armadura-Galería De Drenaje-Aprob	04-May-24	25-May-24	21d	0%	0%			
1067	C-IT-D-PAR-PL-101-Margen Izquierda-Armadura-Precolados-Aprob	04-May-24	19-May-24	15d	0%	0%			
1068	C-IT-D-PAR-PL-201-Margen Derecha-Armadura-Precolados-Aprob	04-May-24	19-May-24	15d	0%	0%			
1057	C-IT-D-PIN-MD-001-Instrumentación-Manual De Operación Y Registro-Aprob	12-May-24	02-Jun-24	21d	0%	0%			
1026	C-IT-D-PPM-PL-101-Margen Derecha Piezas Metálicas-Escalera Externa-Aprob	16-May-24	30-May-24	15d	0%	0%			

Remaining Level of Effort Actual Work Critical Remaining ...
Actual Level of Effort Remaining Work Milestone

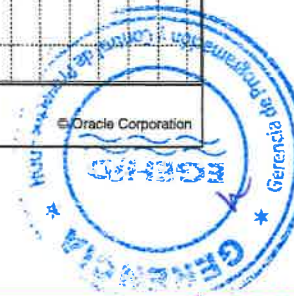


Activity ID	Activity Name	Start	Finish	% Completion	Duration	Units % Complete	2024	2025	2026
1065	C-IT-D-PES-PL-201-Margen Derecha-Armadura-Galería De Drenaje-Aprob	27-May-24	12-Jun-24	15d	0%	3%			
1070	C-IT-D-PPM-PL-101-Margen Izquierda-Piezas Metálicas-Escuela Externa-Aprob	30-May-24	14-Jun-24	15d	0%	3%			
1074	C-IT-D-PAR-PL-202-Margen Derecha-Armadura-Cresta-Aprob	11-Jun-24	02-Jul-24	21d	0%	3%			
1062	C-IT-D-PAR-PL-103-Margen Izquierda-Armadura-Cresta-Aprob	08-Jul-24	29-Jul-24	21d	0%	3%			
1069	C-IT-D-GHE-PL-002-Losa Protección Aguas Abajo-Geometría-Aprob	25-Jul-24	08-Aug-24	15d	0%	3%			
1061	C-IT-D-PBH-PL-201-Margen Derecha-Geometría-1ª Etapa-Aprob	26-Jul-24	15-Aug-24	21d	0%	3%			
1071	C-IT-D-GAR-PL-001-Losa Protección Aguas Abajo-Armadura-Trecho 1-Aprob	27-Dec-24	19-Jan-25	21d	0%	3%			
1073	C-IT-D-GAR-PL-003-Losa Protección Aguas Abajo-Armadura-Trecho 3-Aprob	08-Jan-25	30-Jan-25	21d	0%	3%			
1072	C-IT-D-GAR-PL-002-Losa Protección Aguas Abajo-Armadura-Trecho 2-Aprob	18-Jan-25	10-Feb-25	21d	0%	3%			
Vertedero		14-Nov-23 A	30-Nov-24	367d	8%				
1110	C-IT-D-VEH-PL-003-Bloques-Geometría-Precolados-Aprob	14-Nov-23 A	19-Apr-24 A	146d	100%	30%			
1106	C-IT-D-VAR-MC-001 @ C-IT-D-VAR-MC-004 Bloques-Memoria De Cálculo-Dimensionamiento-Aprob	15-Nov-23 A	26-Mar-24 A	127d	100%	30%			
1112	C-IT-D-VES-PL-005-Bloque 6-Armadura-Galería De Drenaje-Aprob	15-Nov-23 A	19-Apr-24 A	147d	0%	3%			
1113	C-IT-D-VES-PL-006-Bloque 7-Armadura-Galería De Drenaje-Aprob	15-Nov-23 A	19-Apr-24 A	142d	0%	3%			
1114	C-IT-D-VES-PL-007-Bloque 8-Armadura-Galería De Drenaje-Aprob	18-Nov-23 A	05-May-24	158d	0%	3%			
1115	C-IT-D-VAR-PL-001-Bloques-Armadura-Precolados-Aprob	18-Nov-23 A	22-May-24	175d	0%	3%			
1102	C-IT-D-VGE-PL-005-Geometría-Plantas Y Secciones-Aprob	17-Apr-24 A	22-May-24	35d	0%	3%			
1103	C-IT-D-VGE-PL-001-Bloques-Disposición General-Geal-Aprob	02-May-24	22-May-24	21d	0%	3%			
1104	C-IT-D-VEH-PL-004-Bloques-Geometría-Hasta El 90.00-Aprob	02-May-24	22-May-24	21d	0%	3%			
1121	C-IT-D-VEH-PL-010 @ C-IT-D-VEH-PL-012 - Puente-Geometría-Tablero-Apoyos-Precolados-Aprob	02-May-24	22-May-24	21d	0%	3%			
1108	C-IT-D-VAR-PL-101 @ C-IT-D-VAR-PL-012-Bloques 5,7,8-Armadura-Ogiva - Inferior-Aprob	09-Jun-24	30-Jun-24	21d	0%	3%			
1107	C-IT-D-VEH-PL-006-Bloque 2 Hasta 6-Geometría-2ª Etapa-Aprob	19-Jun-24	09-Jul-24	21d	0%	3%			
1111	C-IT-D-VEH-PL-005-Bloques-Geometría-Ariba El 90.00-Aprob	26-Jun-24	16-Jul-24	21d	0%	3%			
1123	C-IT-D-VAR-PL-203-Pilar 2 Y 3-Armadura-Hasta El 90.00-Aprob	30-Jun-24	21-Jul-24	21d	0%	3%			
1124	C-IT-D-VAR-PL-103-Pilar 1-Armadura-Hasta El 90.00-Aprob	07-Jul-24	28-Jul-24	21d	0%	3%			
1120	C-IT-D-VEH-PL-004-Bloques-Geometría-Casetas Centrales Hidrodinámicas-Aprob	08-Jul-24	29-Jul-24	21d	0%	3%			
1127	C-IT-D-VAR-PL-403-Pilar 4-Armadura-Hasta El 90.00-Aprob	14-Jul-24	04-Aug-24	21d	0%	3%			
1105	C-IT-D-VEH-PL-011 @ C-IT-D-VEH-PL-013 - Puente-Geometría-Aprob	07-Aug-24	28-Aug-24	21d	0%	3%			
1132	C-IT-D-VAR-PL-031-Puente-Armadura-Tablero-Aprob	30-Aug-24	19-Sep-24	21d	0%	3%			
1134	C-IT-D-VAR-PL-032-Bloques-Armadura-Casetas Centrales Hidrodinámicas-Aprob	02-Sep-24	23-Sep-24	21d	0%	3%			
1129	C-IT-D-VAR-PL-205-Pilar 2 Y 3-Armadura-Viga Muñon-Aprob	29-Sep-24	20-Oct-24	21d	0%	3%			
1128	C-IT-D-VAR-PL-105-Pilar 1-Armadura-Viga Muñon-Aprob	06-Oct-24	27-Oct-24	21d	0%	3%			
1130	C-IT-D-VAR-PL-405-Pilar 4-Armadura-Viga Muñon-Aprob	06-Oct-24	27-Oct-24	21d	0%	3%			
1126	C-IT-D-VAR-PL-104-Pilar 1-Armadura-Ariba El 90.00-Aprob	13-Oct-24	03-Nov-24	21d	0%	3%			
1125	C-IT-D-VAR-PL-204-Pilar 2 Y 3-Armadura-Ariba El 90.00-Aprob	18-Oct-24	08-Nov-24	21d	0%	3%			
1133	C-IT-D-VAR-PL-404-Pilar 4-Armadura-Ariba El 90.00-Aprob	27-Oct-24	09-Nov-24	12d	0%	3%			
1122	C-IT-D-VAR-PL-030 @ C-IT-D-VAR-PL-031-Puente-Armadura-Precolados-Tablero-Aprob	09-Nov-24	30-Nov-24	21d	0%	3%			
Bocatoma		10-May-24	09-Jan-25	236d	0%				
1075	C-IT-D-BEH-PL-001-Estructura De Control-Geometría-1ª Etapa-Aprob	10-May-24	30-May-24	21d	0%	3%			
1076	C-IT-D-BGE-PL-001-Estructura De Control-Disposición General-Aprob	10-May-24	30-May-24	21d	0%	3%			
1077	C-IT-D-BAR-MC-001-Estructura De Control-Memoria De Cálculo-Dimensionamiento-Aprob	20-Jul-24	10-Aug-24	21d	0%	3%			
1078	C-IT-D-BEH-PL-002-Estructura De Control-Geometría-Precolados-Aprob	10-Aug-24	01-Sep-24	21d	0%	3%			
1080	C-IT-D-BAR-PL-002-Estructura De Control-Armadura-Losa De Fondo - Inferior-Aprob	10-Aug-24	01-Sep-24	21d	0%	3%			
1081	C-IT-D-BAR-PL-003-Estructura De Control-Armadura-Losa De Fondo - Superior-Aprob	17-Aug-24	07-Sep-24	21d	0%	3%			
1082	C-IT-D-BAR-PL-004-Estructura De Control-Armadura-Transición-Aprob	24-Aug-24	14-Sep-24	21d	0%	3%			
1083	C-IT-D-BAR-PL-005-Estructura De Control-Armadura-Galería Superior-Aprob	31-Aug-24	21-Sep-24	21d	0%	3%			
1079	C-IT-D-BAR-PL-001-Estructura De Control-Armadura-Galería De Drenaje-Aprob	01-Sep-24	22-Sep-24	21d	0%	3%			
1084	C-IT-D-BAR-PL-006-Estructura De Control-Armadura-Entre El 74.00 Y El 83.50-Aprob	07-Sep-24	29-Sep-24	21d	0%	3%			
1085	C-IT-D-BAR-PL-007-Estructura De Control-Armadura-Entre El 83.50 Y El 95.80-Aprob	07-Dec-24	29-Dec-24	21d	0%	3%			
1086	C-IT-D-BAR-PL-010-Estructura De Control-Armadura-Polipasto-Aprob	16-Dec-24	06-Jan-25	21d	0%	3%			
Descargador de Fondo		24-Jan-24 A	11-Dec-24	315d	11.11%				
1092	C-IT-D-FBH-PL-003-Estructura De Control-Geometría-Precolados-Aprob	24-Jan-24 A	31-Jan-24 A	6d	100%	30%			
1087	C-IT-D-UGE-PL-001-Cuenco Amortiguador-Geometría-Plantas Y Secciones-Aprob	02-May-24	22-May-24	21d	0%	3%			
1088	C-IT-D-UGT-PL-001-Cuenco Amortiguador-Escavaciones Y Tratamientos-Aprob	02-May-24	22-May-24	21d	0%	3%			
1090	C-IT-D-FBH-PL-003-Estructura De Control-Geometría-1ª Etapa-Aprob	24-May-24	14-Jun-24	21d	0%	3%			
1091	C-IT-D-FGE-PL-001-Estructura De Control-Disposición General-Aprob	24-May-24	14-Jun-24	21d	0%	3%			
1093	C-IT-D-FES-MC-001-Estructura De Control-Memoria De Cálculo-Dimensionamiento-Aprob	22-Jun-24	13-Jul-24	21d	0%	3%			
1094	C-IT-D-FES-PL-001-Estructura De Control-Armadura-Galería De Drenaje-Aprob	04-Jul-24	24-Jul-24	21d	0%	3%			
1095	C-IT-D-FAR-PL-002 @ C-IT-D-FAR-PL-003 - Estructura De Control-Armadura-Aprob	10-Aug-24	01-Sep-24	21d	0%	3%			
1089	C-IT-D-FGE-MO-001-Manual De Operación-Aprob	21-Nov-24	11-Dec-24	21d	0%	3%			
Galería de Desvío		09-Nov-23 A	10-Jun-24	207d	33.33%				
1097	C-IT-D-HAR-MC-001-Estructura De Control-Memoria De Cálculo-Dimensionamiento-Aprob	09-Nov-23 A	07-May-24	169d	0%	3%			


Remaining Level of Effort Actual Work Critical Remaining ...
Actual Level of Effort Remaining Work ◆ Milestone

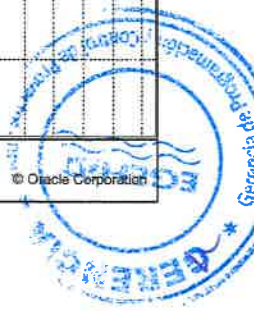

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	At Completion Duration	Units	Progress %	2024	2025	2026
1096	C-IT-D-HSH-PL-004-Planta Y Secciones-Aprob	14-Nov-23 A	19-Apr-24 A	149d	100%	30			
1099	C-IT-D-HAR-PL-002 @ C-IT-D-HAR-PL-007-Estructura De Control-Armadura-Aprob	14-Nov-23 A	10-May-24	167d	0%	7%			
1098	C-IT-D-HSH-PL-001-Estructura De Control-Geometría-1ª Etapa-Aprob	19-Nov-23 A	19-Apr-24 A	146d	100%	30			
1100	C-IT-D-HSH-PL-003-Estructura De Control-Geometría-Precolados	17-Dec-23 A	22-May-24	149d	0%	7%			
1101	C-IT-D-HOT-PL-001-Tapón-Planta Y Detalles-Aprob	19-May-24	10-Jun-24	21d	0%	7%			
Dique									
1135	C-IT-D-DGT-PL-002-Pantalla Plástica-Planta, Sección Y Detalles-Aprob	31-May-24	22-Jun-24	21d	0%	7%			
1136	C-IT-D-DGT-PL-003-Pantalla De Inyecciones-Planta, Sección Y Detalles-Aprob	31-May-24	22-Jun-24	21d	0%	7%			
1137	C-IT-D-DGE-PL-001 @ C-IT-D-DGE-PL-005 - Modelo 3D, Arreglo General, Etapas De Construcción-Aprob	31-May-24	22-Jun-24	21d	0%	7%			
1140	C-IT-D-DX-PL-001-Excavación Común-Planta Y Secciones-Aprob	31-May-24*	22-Jun-24	21d	0%	7%			
1141	C-IT-D-DGT-PL-001-Materiales De Construcción-Fajas Granulométricas-Aprob	06-Jul-24*	27-Jul-24	21d	0%	7%			
1142	C-IT-D-DGE-PL-006-Dique De Cierre-Planta, Secciones Y Detalles-Aprob	06-Jul-24*	27-Jul-24	21d	0%	7%			
1143	C-IT-D-DIN-PL-001-Instrumentación-Planta, Secciones Y Detalles-Aprob	06-Jul-24*	27-Jul-24	21d	0%	7%			
1144	C-IT-D-DIN-MO-001-Instrumentación-Manual De Instrumentación-Aprob	06-Jul-24*	27-Jul-24	21d	0%	7%			
1145	C-IT-D-DGE-PL-007-Drenaje Superficial-Planta, Secciones Y Detalles-Aprob	06-Jul-24*	27-Jul-24	21d	0%	7%			
1146	C-IT-D-DGT-MC-001-Dique De Cierre-Análisis De Estabilidad-Memoria De Cálculo-Aprob	11-Aug-24*	02-Sep-24	21d	0%	7%			
1148	C-IT-D-DGT-IT-001-Evaluación De Resultados De Laboratorio-Informe Técnico-Aprob	11-Aug-24*	02-Sep-24	21d	0%	7%			
1149	C-IT-D-DGE-EP-001 @ C-IT-D-DGE-EP-002- Programa De Trabajo Y Especificaciones Técnicas-Terraplen	11-Aug-24*	02-Sep-24	21d	0%	7%			
Planos de construcción - CMP 7000 M3/Seg									
Dique									
859	Planos constructivos de excavación del Dique	22-Jun-24	02-Jul-24	10d	0%	7%			
872	Diseño y planos constructivos del Dique	02-Sep-24*	12-Sep-24	10d	0%	7%			
878	Diseño y planos constructivos del Dique (pantalla impermeabilización)	02-Sep-24*	12-Sep-24	10d	0%	7%			
Presa									
Planos constructivos Conducto de Desvío									
875	Conducto de Desvío: definición de detalles constructivos	19-May-24	26-May-24	7d	0%	7%			
880	Planos constructivos del Conducto de Desvío	19-May-24*	26-May-24	7d	0%	7%			
Planos constructivos Vertedero									
876	Vertedero: definición de detalles constructivos de compuertas en la estructura	04-Aug-24*	09-Aug-24	5d	0%	7%			
857	Diseño y planos constructivos del Vertedero	09-Aug-24	25-Aug-24	15d	0%	7%			
Planos constructivos Obra de Toma y Descargador de Fondo									
1150	Diseño y planos constructivos Descargador de Fondo	01-Sep-24	04-Sep-24	3d	0%	7%			
858	Definición de los detalles constructivos y tensiones generadas en la estructura para los elementos hidro	22-Sep-24	30-Sep-24	7d	0%	7%			
877	Diseños y Planos Constructivos Bocanoma	30-Sep-24	05-Oct-24	5d	0%	7%			
Aprobación Planos Construcción - Interna									
864	- Aprobación Planos Constructivos del Conducto de Desvío	26-May-24	02-Jun-24	7d	0%	7%			
869	- Aprobación Diseño Constructivo de Excavación del Dique	02-Jul-24*	09-Jul-24	7d	0%	7%			
865	- Aprobación Planos Constructivos del Vertedero	25-Aug-24	01-Sep-24	7d	0%	7%			
870	- Aprobación Planos Constructivos de la Pantalla de Impermeabilización del Dique	12-Sep-24	19-Sep-24	7d	0%	7%			
879	- Aprobación Planos Constructivos del Dique	12-Sep-24	19-Sep-24	7d	0%	7%			
866	- Aprobación Planos Constructivos de la Obra de Toma y Descargador de Fondo	05-Oct-24	12-Oct-24	7d	0%	7%			
Diseño de equipos y sistemas hidromecánicos y eléctricos de la Presa - CMP 7000 M3/Seg									
Conducto de Desvío									
905	H-CS-D-HEQ-HD-001-Compuerta Vagón-Compuertas tipo vagón y deslizante - Hoja de datos	20-Jul-23 A	30-Jul-23 A	10d	100%	30			
1155	H-CS-D-HCV-MC-001-Compuerta Vagón-Ataguia - Memoria de Cálculo	17-May-24	26-May-24	10d	0%	7%			
1156	H-CS-D-HCV-PL-001-Compuerta Vagón-Partes fijas - Implantación	18-Jun-24	27-Jun-24	10d	0%	7%			
1151	H-CS-D-HCV-PL-002-Compuerta Vagón-Guías - Implantación y detalles de montaje	28-Jun-24	12-Jul-24	15d	0%	7%			
1153	H-CS-D-HCV-PL-003-Compuerta Vagón-Guías - Arreglo general	17-Jul-24	27-Jul-24	15d	0%	7%			
1152	H-CS-D-HCV-PL-004-Compuerta Vagón-Tablero - Arreglo general	28-Jul-24	11-Aug-24	15d	0%	7%			
1154	H-CS-D-HCV-PL-005-Compuerta Vagón-Partes fijas - Implantación	12-Aug-24	26-Aug-24	15d	0%	7%			
Descargador de Fondo									
Compuerta Vagón									
908	H-CS-D-FEQ-HD-001-Compuerta Vagón y Radial-Compuerta Vagón, Radial y Blindaje - Hoja de datos	20-Jul-23 A	30-Jul-23 A	10d	100%	30			
914	H-CS-D-FCV-MC-001-Compuerta Vagón-Compuerta descargador de fondo - Memoria de Cálculo	01-May-24	15-May-24	15d	0%	7%			
909	H-CS-D-FCV-PL-001-Compuerta Vagón-Partes Fijas - Implantación	16-May-24	30-May-24	15d	0%	7%			
912	H-CS-D-FCV-PL-002-Compuerta Vagón-Implantación guías	31-May-24	14-Jun-24	15d	0%	7%			
1169	H-CS-D-FCV-PL-003-Compuerta Vagón-Guías	15-Jun-24	29-Jun-24	15d	0%	7%			
1170	H-CS-D-FCV-MO-001-Compuerta Vagón-Manual de operación y mantenimiento	30-Jun-24	14-Jul-24	15d	0%	7%			
Compuerta radial (Taíctor)									
1171	H-CS-D-FEQ-HD-001-Compuerta Vagón y Radial-Compuerta Vagón, Radial y Blindaje - Hoja de datos	20-Jul-23 A	30-Jul-23 A	10d	100%	30			

Remaining Level of Effort Actual Work Critical Remaining ...
Actual Level of Effort Remaining Work Milestone



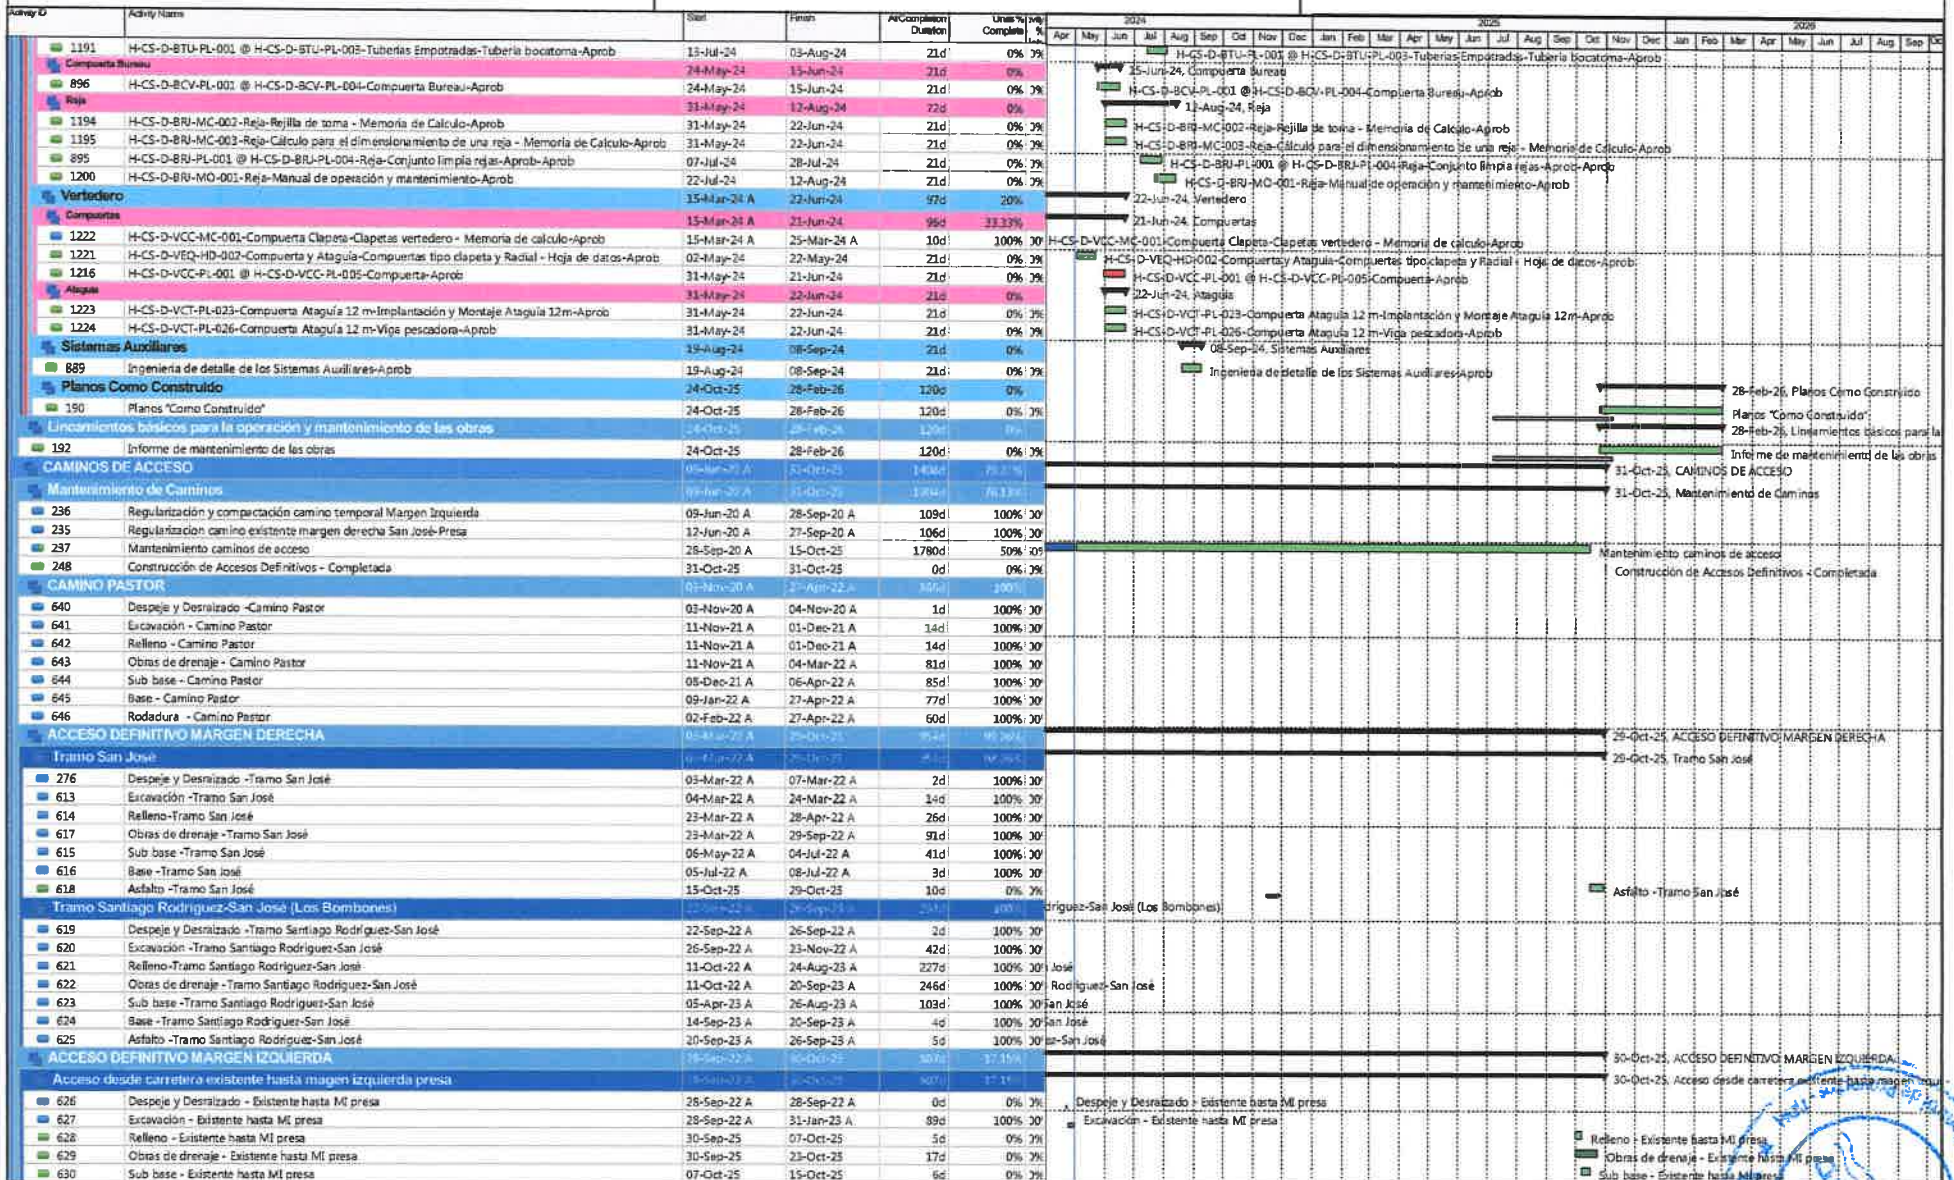


Remaining Level of Effort Actual Work Critical Remaining ...
Actual Level of Effort Remaining Work ◆ ◆ Milestone




Activity ID	Activity Name	Start	Finish	At Completion Duration	Units	Completion %	2024	2025	2026
631	Base - Existente hasta MI presa	15-Oct-25	23-Oct-25	6d	0%	7%			
632	Asfalto - Existente hasta MI presa	23-Oct-25	30-Oct-25	5d	0%	7%			
633	Despeje y Desplazado - Dique Interceptor	25-Sep-25	30-Sep-25	2d	0%	7%			
634	Excavación - Dique Interceptor	30-Sep-25	02-Oct-25	2d	0%	7%			
635	Relevo - Dique Interceptor	05-Oct-25	08-Oct-25	2d	0%	7%			
636	Obras de drenaje - Dique Interceptor	06-Oct-25	17-Oct-25	9d	0%	7%			
637	Sub base - Dique Interceptor	08-Oct-25	09-Oct-25	1d	0%	7%			
638	Base - Dique Interceptor	16-Oct-25	17-Oct-25	1d	0%	7%			
639	Asfalto - Dique Interceptor	28-Oct-25	30-Oct-25	2d	0%	7%			
OBRAS DE DESVIO									
Canal Provisional de Desvío									
251	Excavación / Relleno / Preparación Camino de servicio provisional	11-Oct-20 A	22-Feb-22 A	151d	100%	100%			
252	Despeje y desplazado del área de excavación - Etapa A	15-Oct-20 A	20-Oct-20 A	5d	100%	100%			
253	Excavación y Perfil de Talud - Canal de Desvío - Etapa A (18.700 m3)	21-Oct-20 A	10-Nov-20 A	20d	100%	100%			
254	Despeje y desplazado del área de excavación - Etapa B	11-Nov-20 A	26-Nov-20 A	15d	100%	100%			
255	Excavación y Perfil de Talud - Canal de Desvío - Etapa B (30.000 m3)	27-Nov-20 A	28-Sep-21 A	294d	100%	100%			
256	Bocatoma	02-Aug-21 A	15-Feb-22 A	189d	100%	100%			
258	Estructura de Disipación	01-Sep-21 A	22-Feb-22 A	157d	100%	100%			
257	Estabilización y protección de los taludes excavados & Revestimiento Losa del Canal	08-Sep-21 A	04-Feb-22 A	142d	100%	100%			
377	Alcantarilla tipo cajón	28-Sep-21 A	15-Feb-22 A	100d	100%	100%			
259	Relleno para contención del agua (aguas abajo canal de desvío)	28-Sep-21 A	22-Feb-22 A	141d	0%	0%			
260	Construcción Canal Provisional - Completado	16-Jan-22 A	22-Feb-22 A	38d	0%	0%			
Recuperación Canal de Desvío									
280	Resacas Canal de Desvío	01-Dec-22 A	20-Dec-22 A	19d	100%	100%			
708	Movilización Personal	05-Dec-22 A	18-Jan-23 A	35d	0%	0%			
659	Excavación y Conformación Canal (2500 m3)	12-Dec-22 A	29-Dec-22 A	13d	100%	100%			
678	Reparación Hormigón Lanzado	12-Dec-22 A	22-Dec-22 A	10d	100%	100%			
710	Desbroce	19-Dec-22 A	29-Dec-22 A	7d	100%	100%			
668	Excavación Taludes	21-Dec-22 A	06-Jan-23 A	7d	100%	100%			
718	Dentellón Debajo Rampa	06-Jan-23 A	11-Jan-23 A	5d	100%	100%			
729	Hormigón Lanzado Paredes Disipación, Rampa y Andajes	09-Jan-23 A	12-Jan-23 A	3d	100%	100%			
739	Excavación y Umpieza Área Badén	11-Jan-23 A	19-Jan-23 A	8d	100%	100%			
658	Hormigón Masivo Disipación, Rampa	12-Jan-23 A	04-Feb-23 A	23d	100%	100%			
740	Dentellón Transición Rampa-Losa	12-Jan-23 A	15-Jan-23 A	3d	100%	100%			
712	Losa Hormigón Disipación, Rampa	13-Jan-23 A	04-Feb-23 A	22d	100%	100%			
713	Hormigón Ciclopeo Paredes Disipación, Rampa	19-Jan-23 A	17-Feb-23 A	29d	100%	100%			
660	Badén Masivo y Tuberías Horm.	24-Jan-23 A	18-Feb-23 A	25d	100%	100%			
679	Losa y Dentellón Aguas Abajo Rampa con Andajes	25-Jan-23 A	31-Jan-23 A	6d	100%	100%			
717	Losa y Dentellón Aguas Abajo Badén	05-Feb-23 A	09-Feb-23 A	4d	100%	100%			
728	Remoción Acceso Margen Izquierda	05-Feb-23 A	05-Feb-23 A	1d	100%	100%			
715	Losa Aguas Abajo Badén	05-Feb-23 A	09-Feb-23 A	3d	0%	0%			
716	Enrocado de Protección Aguas Abajo Badén	06-Feb-23 A	18-Feb-23 A	12d	100%	100%			
711	Dentellón y Losa Aguas Arriba Badén	07-Feb-23 A	09-Feb-23 A	2d	100%	100%			
726	Hormigón Lanzado Paredes Badén	12-Feb-23 A	22-Feb-23 A	10d	100%	100%			
Ampliación Canal de Desvío									
1501	Excavación para Ampliación del Canal de Desvío	24-May-23 A	28-Jun-23 A	34d	100%	100%			
1502	Colocación de Pernos MI	18-Jun-23 A	25-Jun-23 A	12d	100%	100%			
1503	Losa de Hormigón MI	21-Jun-23 A	25-Jun-23 A	4d	100%	100%			
1505	Colocación de Pernos MD	21-Jun-23 A	29-Jun-23 A	8d	100%	100%			
1504	Hormigón Lanzado MI	26-Jun-23 A	08-Jul-23 A	12d	100%	100%			
1507	Losa de Hormigón MD	27-Jun-23 A	30-Jun-23 A	3d	100%	100%			
1506	Hormigón Lanzado MD	04-Jul-23 A	09-Jul-23 A	5d	100%	100%			
Destronque Área Inundación Ataguas									
Topografía									
650	Topografía Sector 4	14-Jul-22 A	15-Jul-22 A	4d	100%	100%			
647	Topografía Sector 1	14-Jul-22 A	19-Jul-22 A	5d	100%	100%			
648	Topografía Sector 2	20-Jul-22 A	30-Jul-22 A	10d	100%	100%			
649	Topografía Sector 3	29-Jul-22 A	03-Aug-22 A	5d	100%	100%			
Destronque Inicial									
651	Destronque Inicial Sector 1	14-Jul-22 A	30-Aug-22 A	46d	100%	100%			


Remaining Level of Effort Actual Work Critical Remaining ...
Actual Level of Effort Remaining Work ◆ Milestone



Oracle Corporation


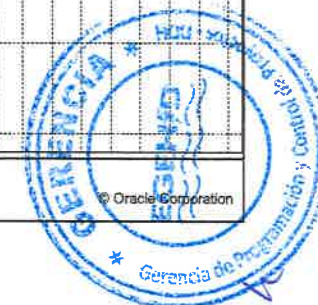



TASK filter: All Activities

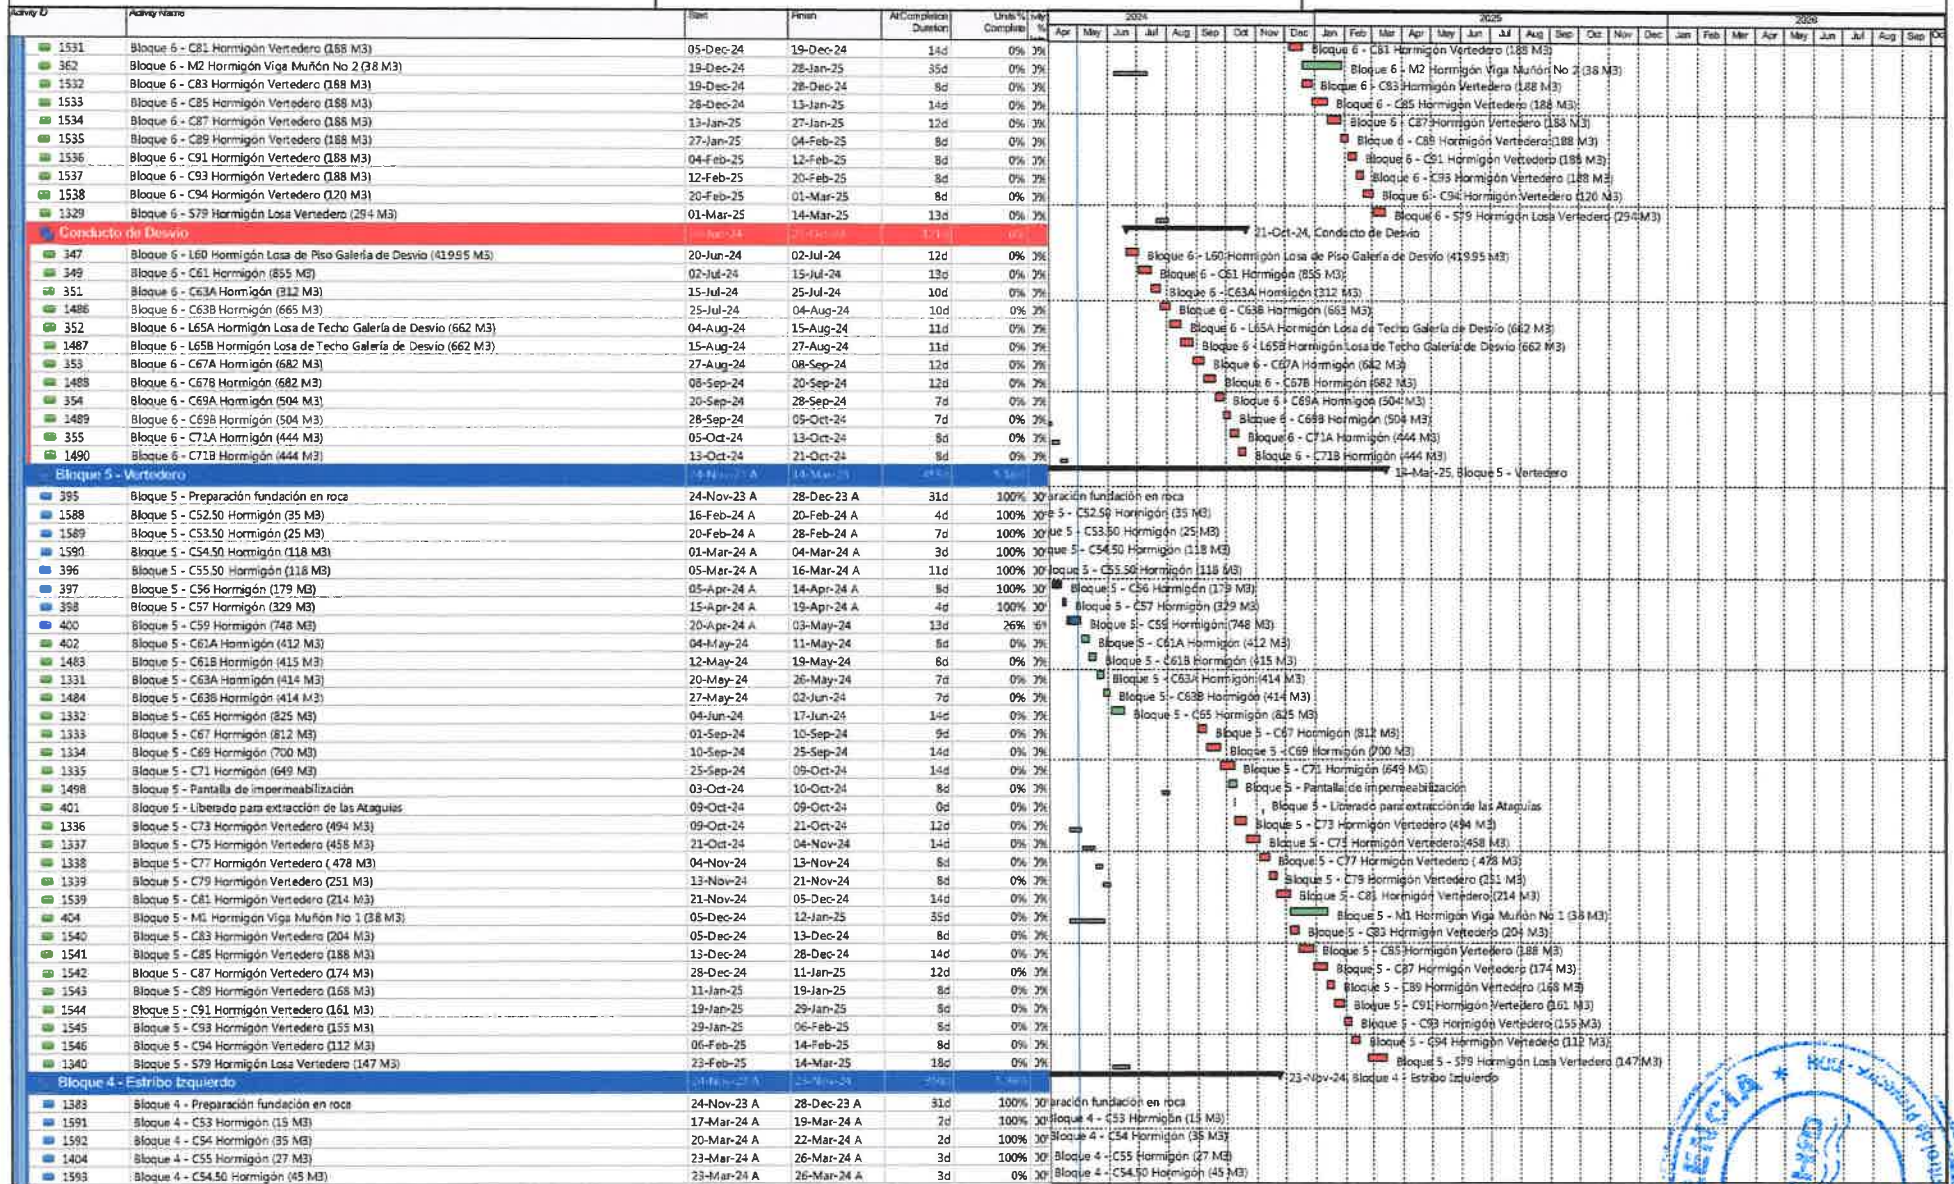

Remaining Level of Effort Actual Work Critical Remaining ...
Actual Level of Effort Remaining Work Milestone



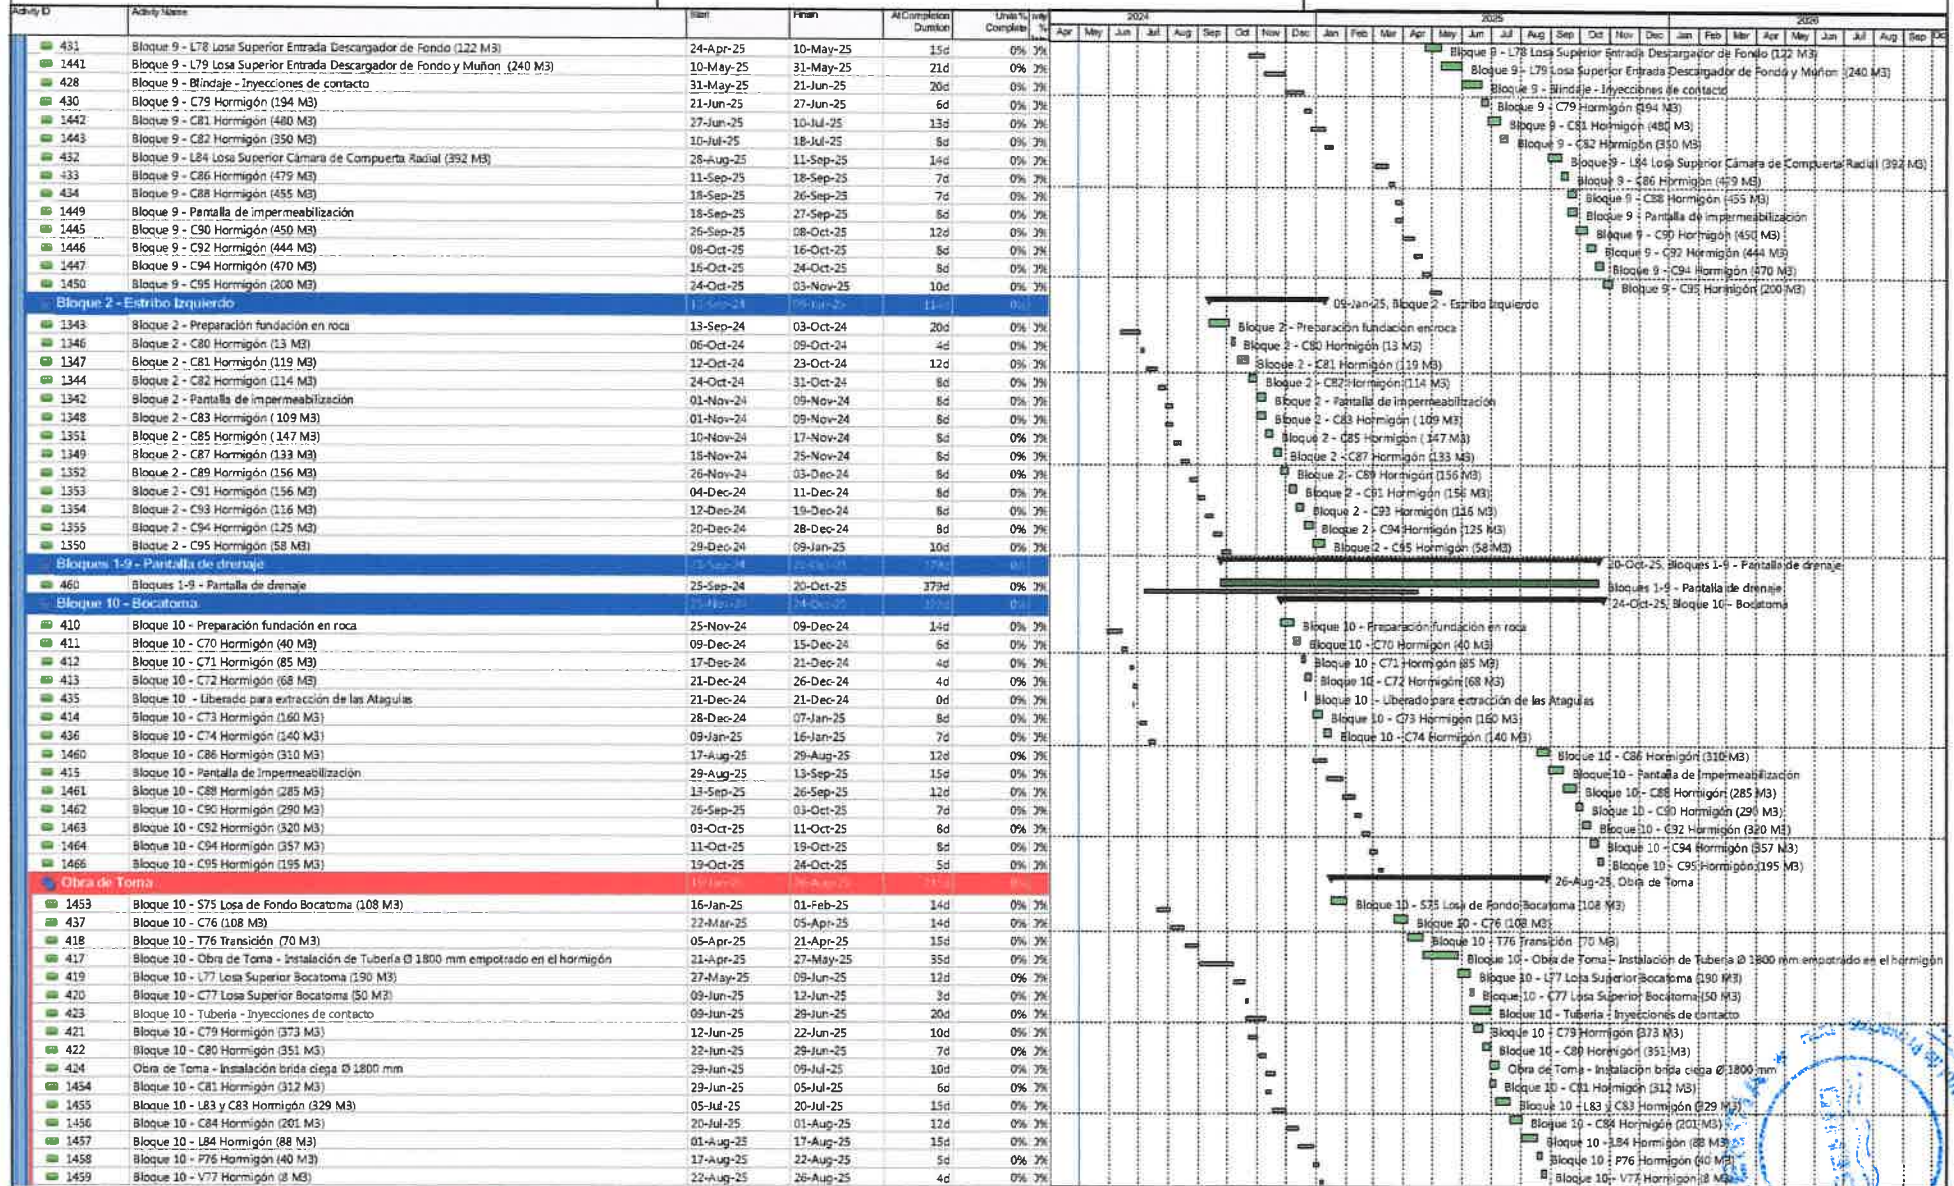


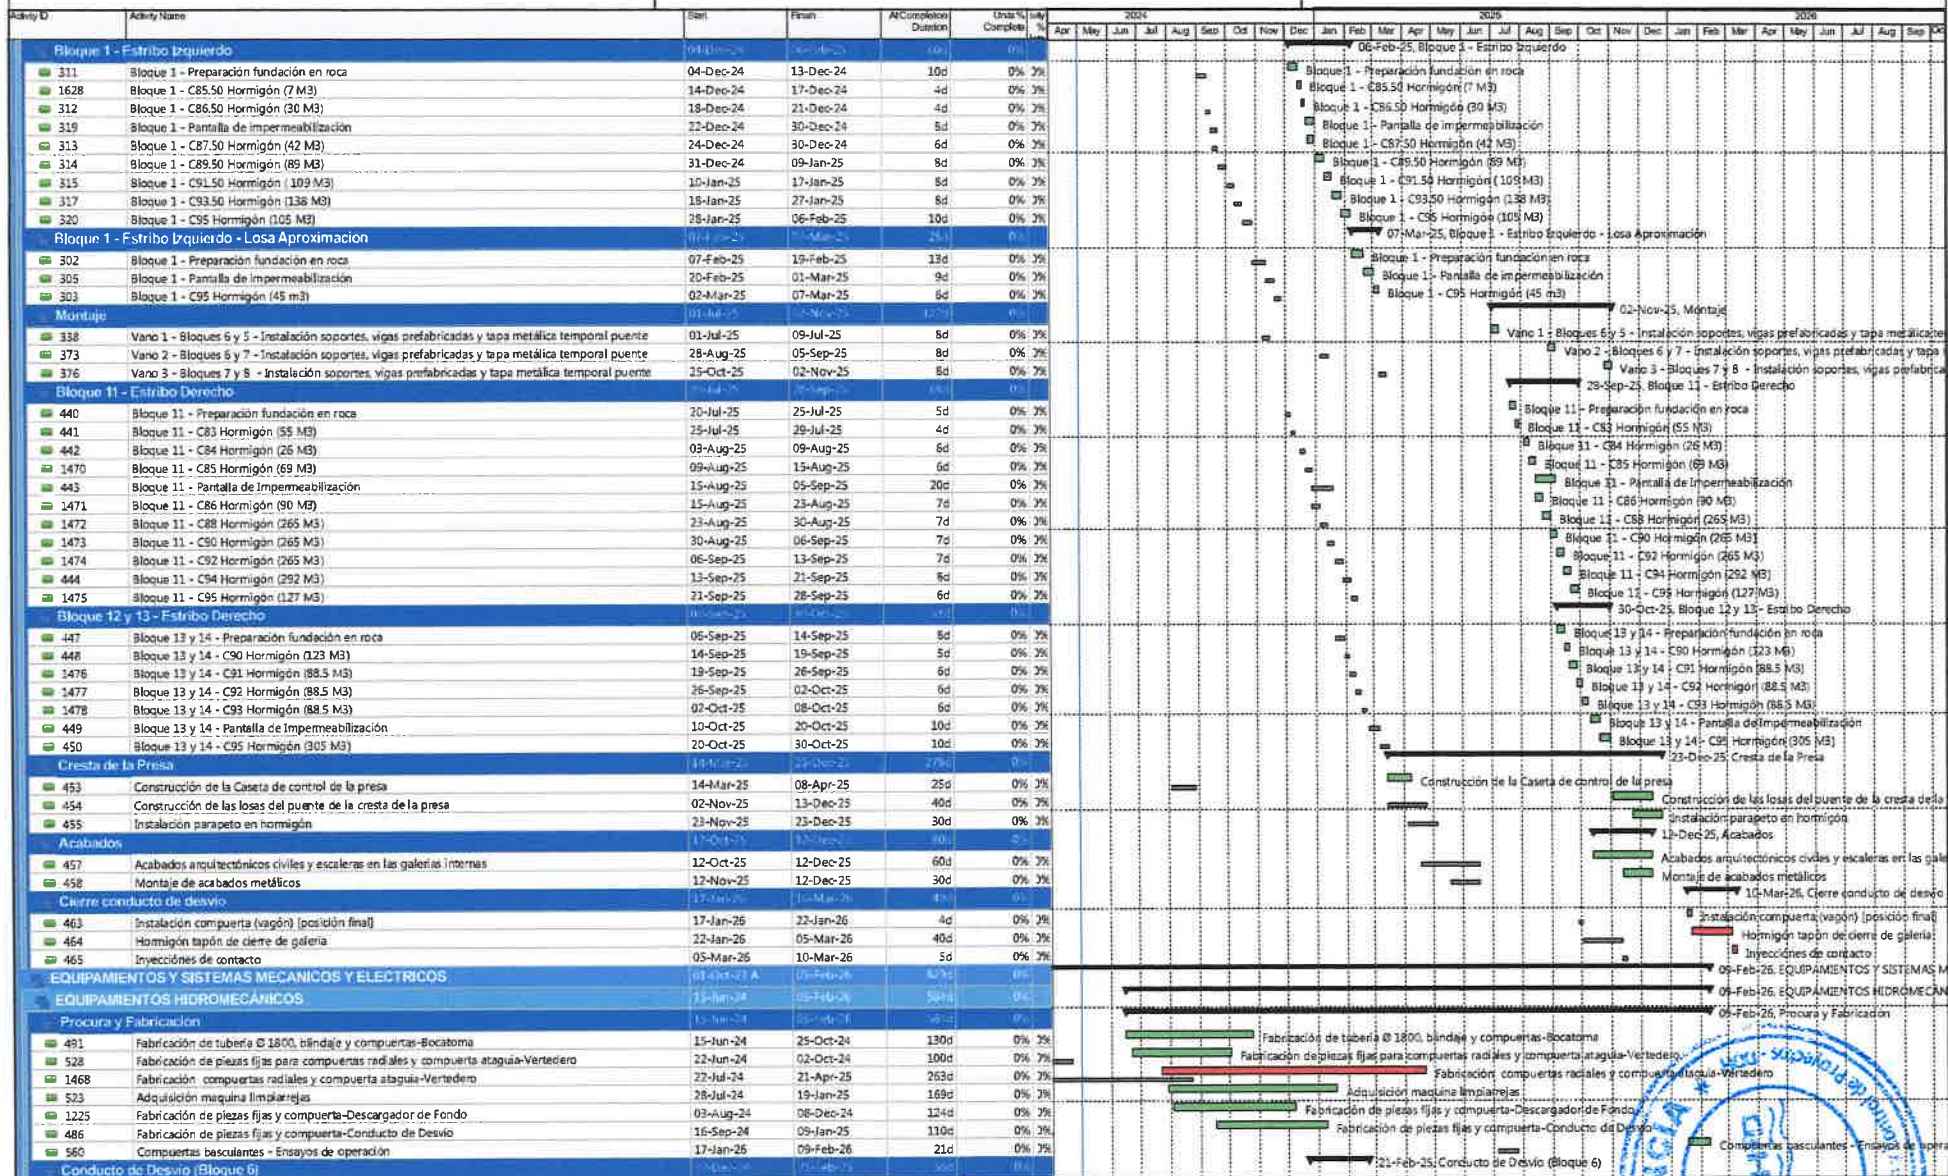

Remaining Level of Effort Actual Work Critical Remaining ...
Actual Level of Effort Remaining Work ◆ Milestone



© Oracle Corporation

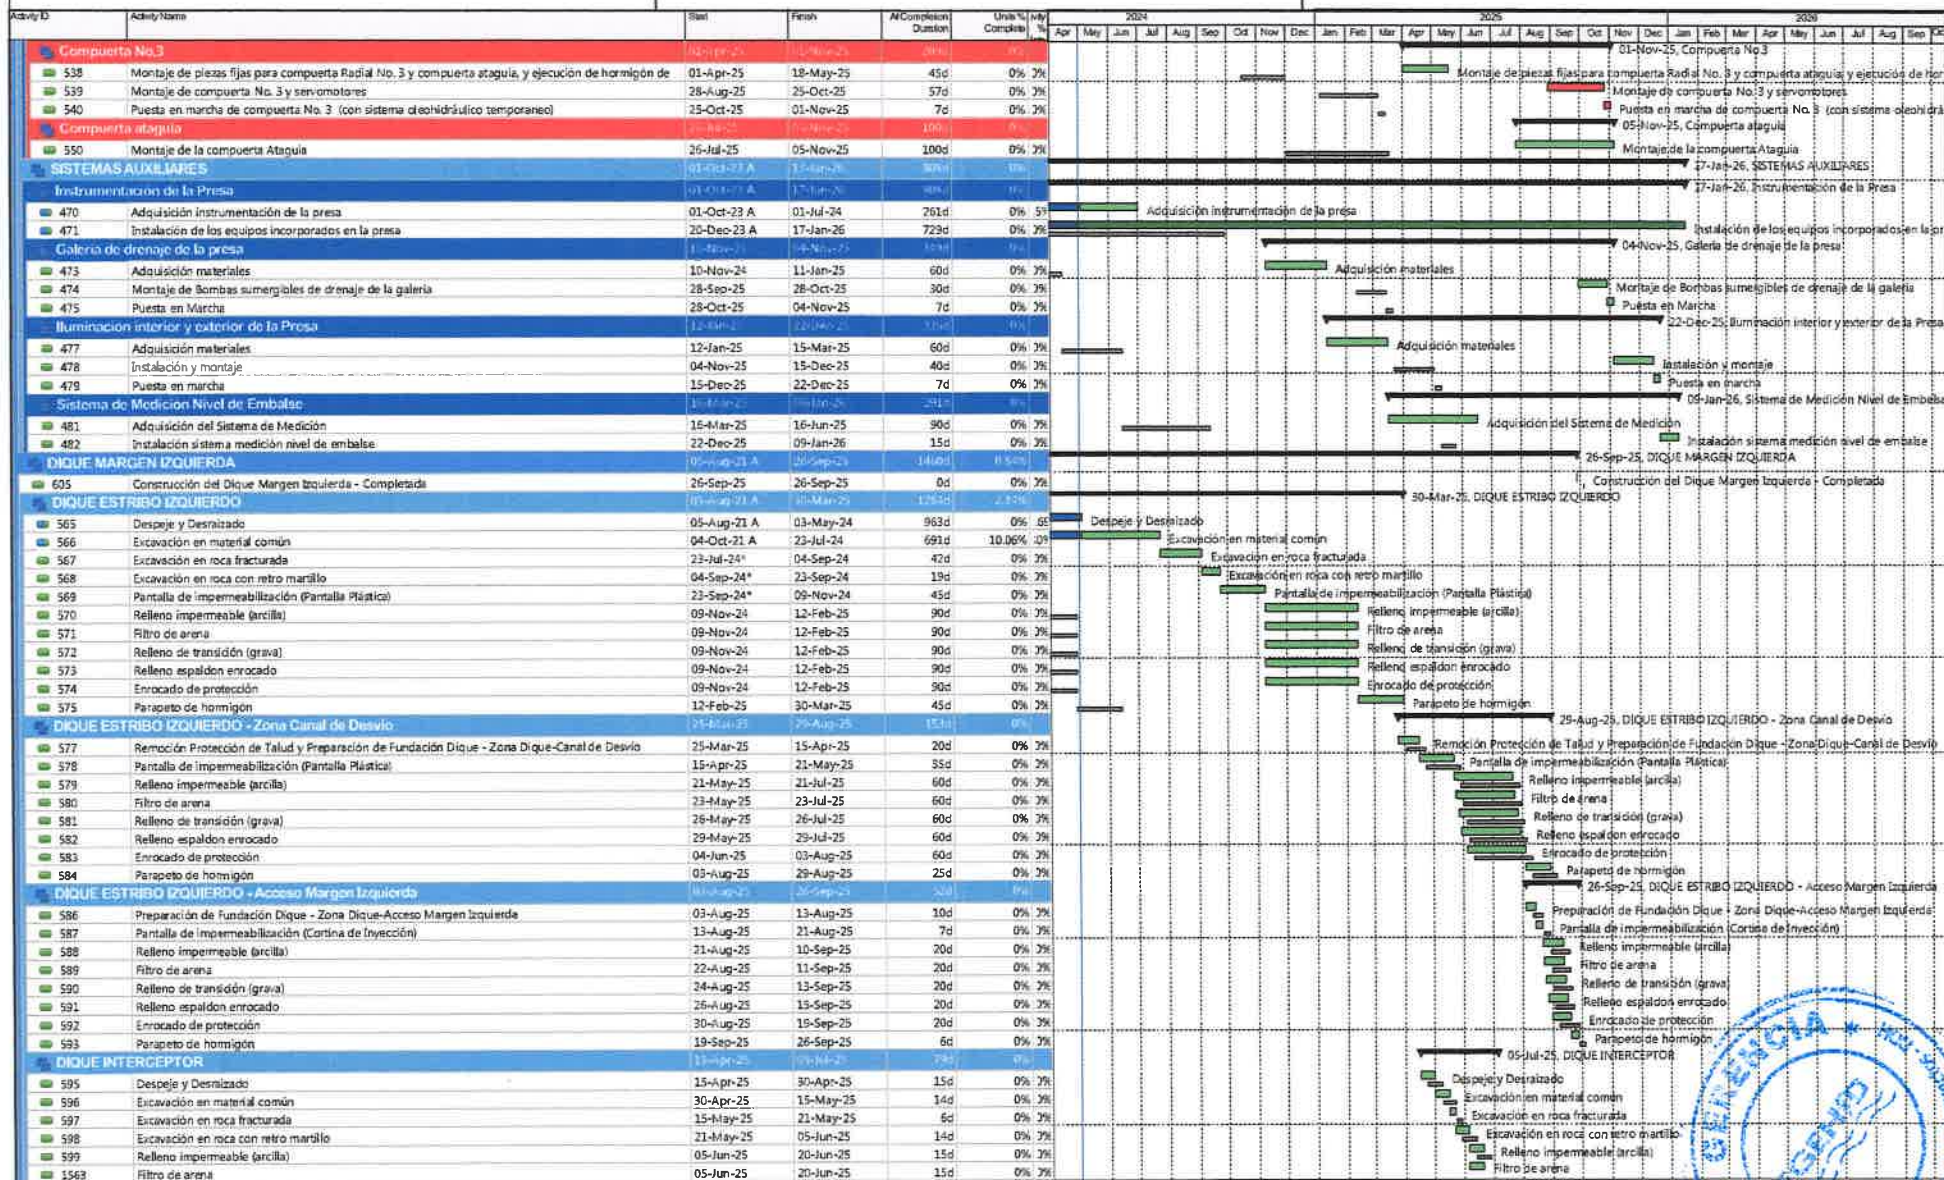

Remaining Level of Effort Actual Work Critical Remaining ...
Actual Level of Effort Remaining Work Milestone

