

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE**


OBRAS CIVILES

Enero de 2018.



ÍNDICE DE CONTENIDO

PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES.....	3
1.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.....	4
2.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE UN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE BATISTA, EL CERCADO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.....	7
3.0 PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.....	10
4.0 PROYECTO CONSTRUCCION CASETA DE GUARDIA EN EL SALTO DE CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA, R.D.	14
5.0 PROYECTO CONSTRUCCION CUARTEL MILITAR PRESA DE BAO, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.	17



PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES



**1.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS
EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	1 de Abril de 2016
Monto del contrato	RD\$ 38,239,097.44
Monto del avance (20%)	RD\$ 7,647,819.49
Fecha de inicio de los trabajos	12 de Mayo de 2016
Fecha de Fin del contrato	12 de febrero de 2017
% Avance estimado hasta la fecha	98.85%
Contratista	JRO INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficie, terminación de techos, pintura, glorieta y área general, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, colocación de geo membrana, verja perimetral, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se trabaja en la construcción de un pozo de captación con filtro, incluirá la instalación del equipamiento de una bomba sumergible, de tubería de impulsión, tanques de almacenamiento y red de tuberías de distribución. Inicio la colocación del asfaltado con la imprimación de la superficie de los caminos.

**DIRECCION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES
PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO
CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA**



Colocación del asfaltado, Relleno Sanitario Bohechío.

**2.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE UN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL
DISTRITO MUNICIPAL DE BATISTA, EL CERCADO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	05 de Julio de 2017
Monto del contrato	RD\$ 3,946,458.38
Monto del avance (20%)	RD\$ 789,291.67
Fecha de inicio de los trabajos	20 de Julio de 2016
Fecha de Fin del contrato	20 de Febrero de 2017
% Avance estimado hasta la fecha	96.34%
Contratista	CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, ventanas, puertas, terminación en pisos, revestimientos de pared, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, terminación de techo, terminación de cocina, pintura, verja de block, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se realizó la cubicación final, se está a la espera de la elaboración de la adenda para dar por terminado el proyecto.

**DIRECCION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES
PROYECTO CONSTRUCCION DE UN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE
BATISTA, EL CERCADO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.**



Vista general, Destacamento Batista



EGEHD

**3.0 PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO
DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	20 de Mayo de 2016
Monto del contrato	RD\$ 38,699,292.61
Monto del avance (20%)	RD\$ 7,739,858.52
Fecha de inicio de los trabajos	27 de Julio de 2017
Fecha de Fin del contrato	27 de Febrero de 2017
% Avance estimado hasta la fecha	29.15%
Contratista	CONSTRUCTORA YUNES, SRL.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

- Estación de bombeo, electrificación, suministro e instalación de electrobomba, suministro en instalación de generador eléctrico, línea de impulsión, suministro y colocación de tuberías, suministro y colocación de piezas especiales, planta de tratamiento, Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficie, casa de operador, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se trabaja en la colocación de perfiles metálicos para conformar la estructura del almacén.



Instalación de estructuras metálicas almacén, Acueducto Sabaneta



Construcción almacén, Acueducto Sabaneta.



**4.0 PROYECTO CONSTRUCCION CASETA DE GUARDIA EN EL SALTO DE
CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA, R.D.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de Septiembre de 2017
Monto del contrato	RD\$ 871,624.21
Monto del avance (20%)	RD\$ 174,324.84
Fecha de inicio de los trabajos	23 de Octubre de 2017
Fecha de Fin del contrato	23 de Febrero de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	70.11%
Contratista	SOCIEDAD SOCOMATRA S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:


- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, bloques calados, reinstalación de nave industrial en vigas de acero y techo de aluzinc, puertas, puertas enrollables, terminación en pisos, revestimientos de pared, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, pintura, escalera, entre otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se instalaron los gabinetes de cocina. Además, se colocó la cerámica de pared en el baño, así como los aparatos sanitarios.



Gabinetes de cocina instalados, Caseta de guardia en el Salto de Constanza.

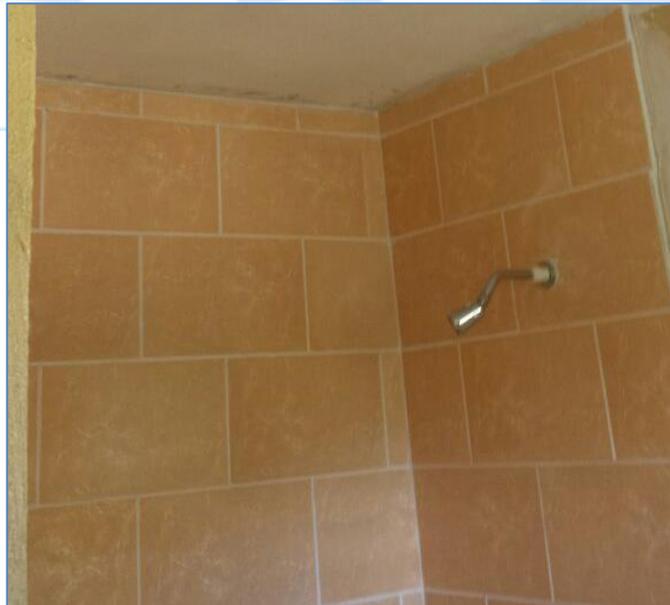

Cerámica de pared de baño colocadas, Caseta de guardia en el Salto de Constanza.

**5.0 PROYECTO CONSTRUCCION CUARTEL MILITAR PRESA DE BAO, PROVINCIA
SANTIAGO, R.D.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de Diciembre de 2017
Monto del contrato	RD\$ 997,447.84
Monto del avance (20%)	RD\$ 199,489.56
Fecha de inicio de los trabajos	22 de Enero de 2018
Fecha de Fin del contrato	16 de Marzo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	20%
Contratista	HU INGENIERIA AVANZADA, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, puertas y ventanas, pintura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, pisos y cerámicas, entro otros.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista de la obra, para iniciar los trabajos inmediatamente.
