

**INFORME DE  
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE  
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE  
OBRAS CIVILES**

**Abril 2018.**



## ÍNDICE DE CONTENIDO

PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES.....	4
1.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.....	5
2.0 PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.....	8
3.0 PROYECTO CONSTRUCCION CUARTEL MILITAR PRESA DE BAO, PROVINCIA SANTIAGO, R.D. ....	12
4.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 1, EN LA COMUNIDAD DE El Batey. ....	16
5.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 2, EN LA COMUNIDAD DE El Batey. ....	18
6.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 3, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.....	20
7.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 4, EN LA COMUNIDAD DE El Batey. ....	22
8.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 5, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.....	24
9.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 6, EN LA COMUNIDAD DE El Batey. ....	26
10.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 7, EN LA COMUNIDAD DE El Batey. ....	28
11.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 8, EN LA COMUNIDAD DE El Batey. ....	30

12.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 9, EN LA COMUDIDAD DE El Batey. ....	32
13.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 10, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo. ....	34
14.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 11, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo. ....	36
15.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 12, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo. ....	38
16.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 13, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo. ....	40
17.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 14, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo. ....	42
18.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 15, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.....	44
19.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 16, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.....	46
20.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 17, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.....	48
21.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 18, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.....	50
22.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 19, EN LA COMUDIDAD DE la Florida. ....	52

**PROYECTOS DE LA GERENCIA DE EDIFICACIONES**



**1.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS  
EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**



## **FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

<b>Fecha de firma del contrato</b>	1 de Abril de 2016
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 38,239,097.44
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 7,647,819.49
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	12 de Mayo de 2016
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	12 de Mayo de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	100%
<b>Contratista</b>	JRO INGENIERIA Y SERVICIOS, SRL.

## **DESCRIPCION DEL PROYECTO**

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficie, terminación de techos, pintura, glorieta y área general, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, colocación de geo membrana, verja perimetral, entre otros.

## **CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO**


El proyecto está terminando, se está procesando la cubicación final.

**DIRECCION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES  
PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLDOS EN ARROYO  
CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA**



Vista general, Relleno Sanitario Bohechío.

**2.0 PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO  
DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO


Fecha de firma del contrato	20 de Mayo de 2016
Monto del contrato	RD\$ 48,358,510.41
Monto del avance (20%)	RD\$ 7,739,858.52
Fecha de inicio de los trabajos	27 de Julio de 2017
Fecha de Fin del contrato	27 de Julio de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	35.20 %
Contratista	CONSTRUCTORA YUNES, SRL.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

- Estación de bombeo, electrificación, suministro e instalación de electrobomba, suministro en instalación de generador eléctrico, línea de impulsión, suministro y colocación de tuberías, suministro y colocación de piezas especiales, planta de tratamiento, Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficie, casa de operador, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO


Ya se colocaron las tuberías. Se trabaja en el encache de la canaleta. Además, se trabaja en la colocación de muros de bloques de la casa de máquinas.

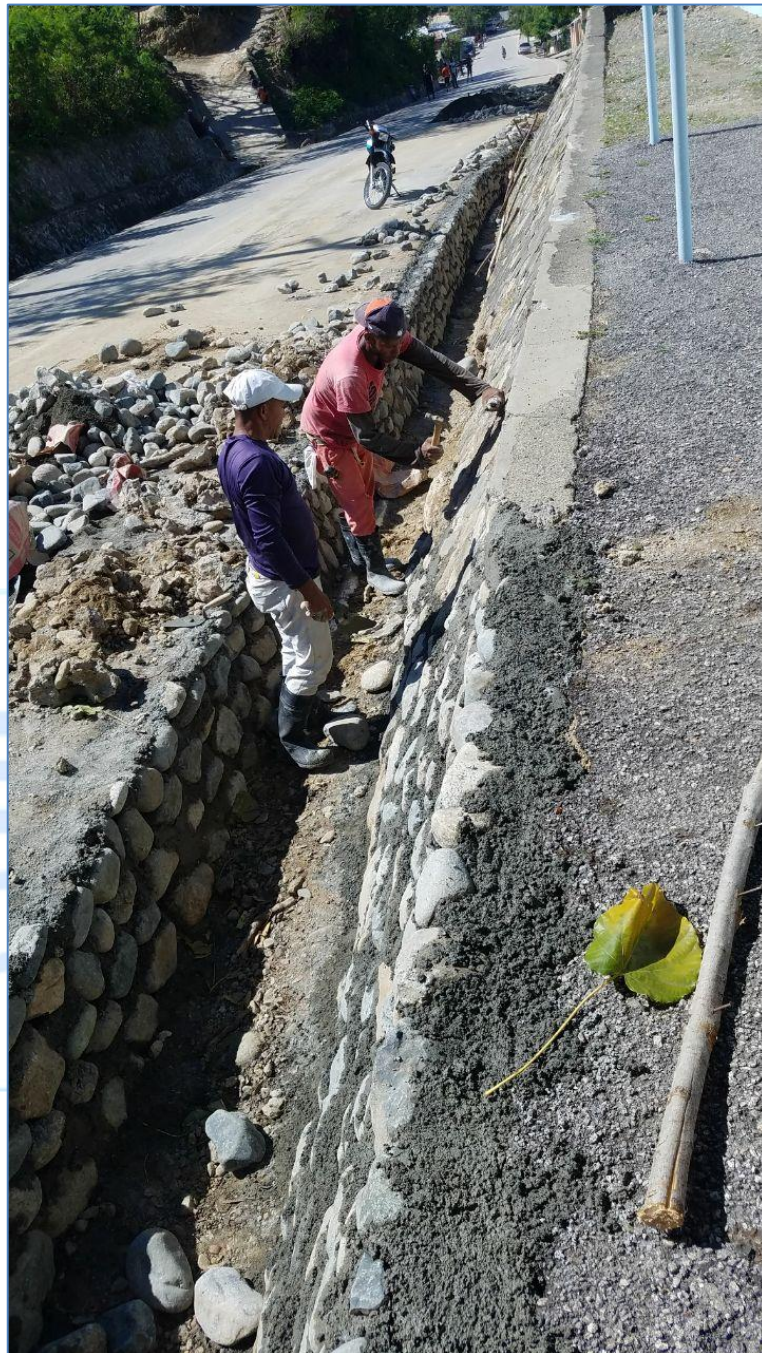

Colocación de encache en canaleta, Acueducto Sabaneta.



Colocación de bloques en casa de máquinas, Acueducto Sabaneta.



**3.0 PROYECTO CONSTRUCCION CUARTEL MILITAR PRESA DE BAO, PROVINCIA  
SANTIAGO, R.D.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de Diciembre de 2017
Monto del contrato	RD\$ 997,447.84
Monto del avance (20%)	RD\$ 199,489.56
Fecha de inicio de los trabajos	22 de Enero de 2018
Fecha de Fin del contrato	16 de Julio de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	58.13%
Contratista	HU INGENIERIA AVANZADA, S.R.L.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, puertas y ventanas, pintura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, pisos y cerámicas, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se está trabajando en la colocación de malla ciclónica de la verja perimetral. Se instaló el tinaco. Además, se instaló la meseta de cocina y se colocaron los pisos.



Instalación de tinaco, Cuartel Militar Bao.



Colocación de meseta de cocina, Cuartel Militar Bao.



Colocación de malla en verja perimetral, Cuartel Militar Bao.



Pisos de cerámica colocados, Cuartel Militar Bao.

**4.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.  
LOTE No. 1, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**

## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,884,525.37
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,576,905.07
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	13 Viviendas de (3) habitaciones y 2 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Ing. Junior Alberto Díaz Ramírez.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO


Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**5.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.  
LOTE No. 2, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,884,525.37
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,576,905.07
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	13 Viviendas de (3) habitaciones y 2 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Ing. Juan Isidro Figuereo Acosta.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO


Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**6.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.  
LOTE No. 3, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,793,572.49
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,558,714.49
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	11 Viviendas de (3) habitaciones y 4 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Arq. Rosa Ángela Mateo Valdez.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**7.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**LOTE No. 4, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,520,713.85
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,504,142.77
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	5 Viviendas de (3) habitaciones y 10 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Ing. Ynmaculada Ogando Jimenez de Valdez.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**8.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**LOTE No. 5, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,884,525.37
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,576,905.07
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	13 Viviendas de (3) habitaciones y 2 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Ing. Abner Báez Reyes.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:


- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**9.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**LOTE No. 6, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,566,190.29
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,513,238.06
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	6 Viviendas de (3) habitaciones y 9 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Arq. Luisa García Hidalgo de Cedeño.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**10.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.  
LOTE No. 7, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,566,190.29
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,513,238.06
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	6 Viviendas de (3) habitaciones y 9 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Ing. José Domingo García Martínez.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**11.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.  
LOTE No. 8, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,839,048.93
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,567,809.79
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	12 Viviendas de (3) habitaciones y 3 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Ing. María Dolores Leocadio.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:


- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**12.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**LOTE No. 9, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,702,619.61
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,540,523.92
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	9 Viviendas de (3) habitaciones y 6 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Ing. Carlos Andiolix Ramírez Valenzuela.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**13.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**LOTE No. 10, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,884,525.37
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,576,905.74
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	13 Viviendas de (3) habitaciones y 2 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Juan Antonio Marichal Carvajal.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**14.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**LOTE No. 11, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,930,001.81
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,586,000.36
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	14 Viviendas de (3) habitaciones y 1 Vivienda de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Ing. Erick Salvador Cuevas González.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**15.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**LOTE No. 12, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,839,048.93
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,567,809.78
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	12 Viviendas de (3) habitaciones y 3 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Ing. Ingrid Joselyn Aracena de la Cruz.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**16.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**LOTE No. 13, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,884,525.37
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,576,905.74
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	13 Viviendas de (3) habitaciones y 2 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	ISARAB DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**17.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**LOTE No. 14, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,930,001.81
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,586,000.36
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	14 Viviendas de (3) habitaciones y 1 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Ing. José Manuel Peguero Martínez.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**18.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**LOTE No. 15, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,702,619.61
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,540,523.92
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	9 Viviendas de (3) habitaciones y 6 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Arq. Descartes Batista Félix.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**19.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**LOTE No. 16, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,657,143.17
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,531,428.63
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	8 Viviendas de (3) habitaciones y 7 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Ing. Guillermo Rodríguez de Jesús.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:


- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**20.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**LOTE No. 17, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,748,096.05
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,549,619.21
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	10 Viviendas de (3) habitaciones y 5 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Arq. José Mora Rodríguez.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:


- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**21.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**LOTE No. 18, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,748,096.05
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,549,619.21
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	10 Viviendas de (3) habitaciones y 5 Viviendas de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Ing. Lirio Lebrón Pérez.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.

**22.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),  
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL  
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**LOTE No. 19, EN LA COMUDIDAD DE la Florida.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	10 de Abril de 2018
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 7,884,525.37
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 1,576,905.07
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	1 de mayo de 2018
<b>Fecha de Fin del contrato</b>	1 de noviembre de 2018
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Cantidad de Viviendas</b>	14 Viviendas de (3) habitaciones y 1 Vivienda de (2) Habitaciones.
<b>Contratista</b>	Ing. Alexander Manzueta Diaz.

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, muros de bloques, terminación de superficies, terminación de techos, terminación de pisos, revestimientos, instalaciones eléctricas y sanitarias, terminaciones de cocina, puertas y ventanas, pintura, entre otros.

## CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se posesionó al contratista. Ya se inició la compra de materiales para iniciar los trabajos del proyecto.
