


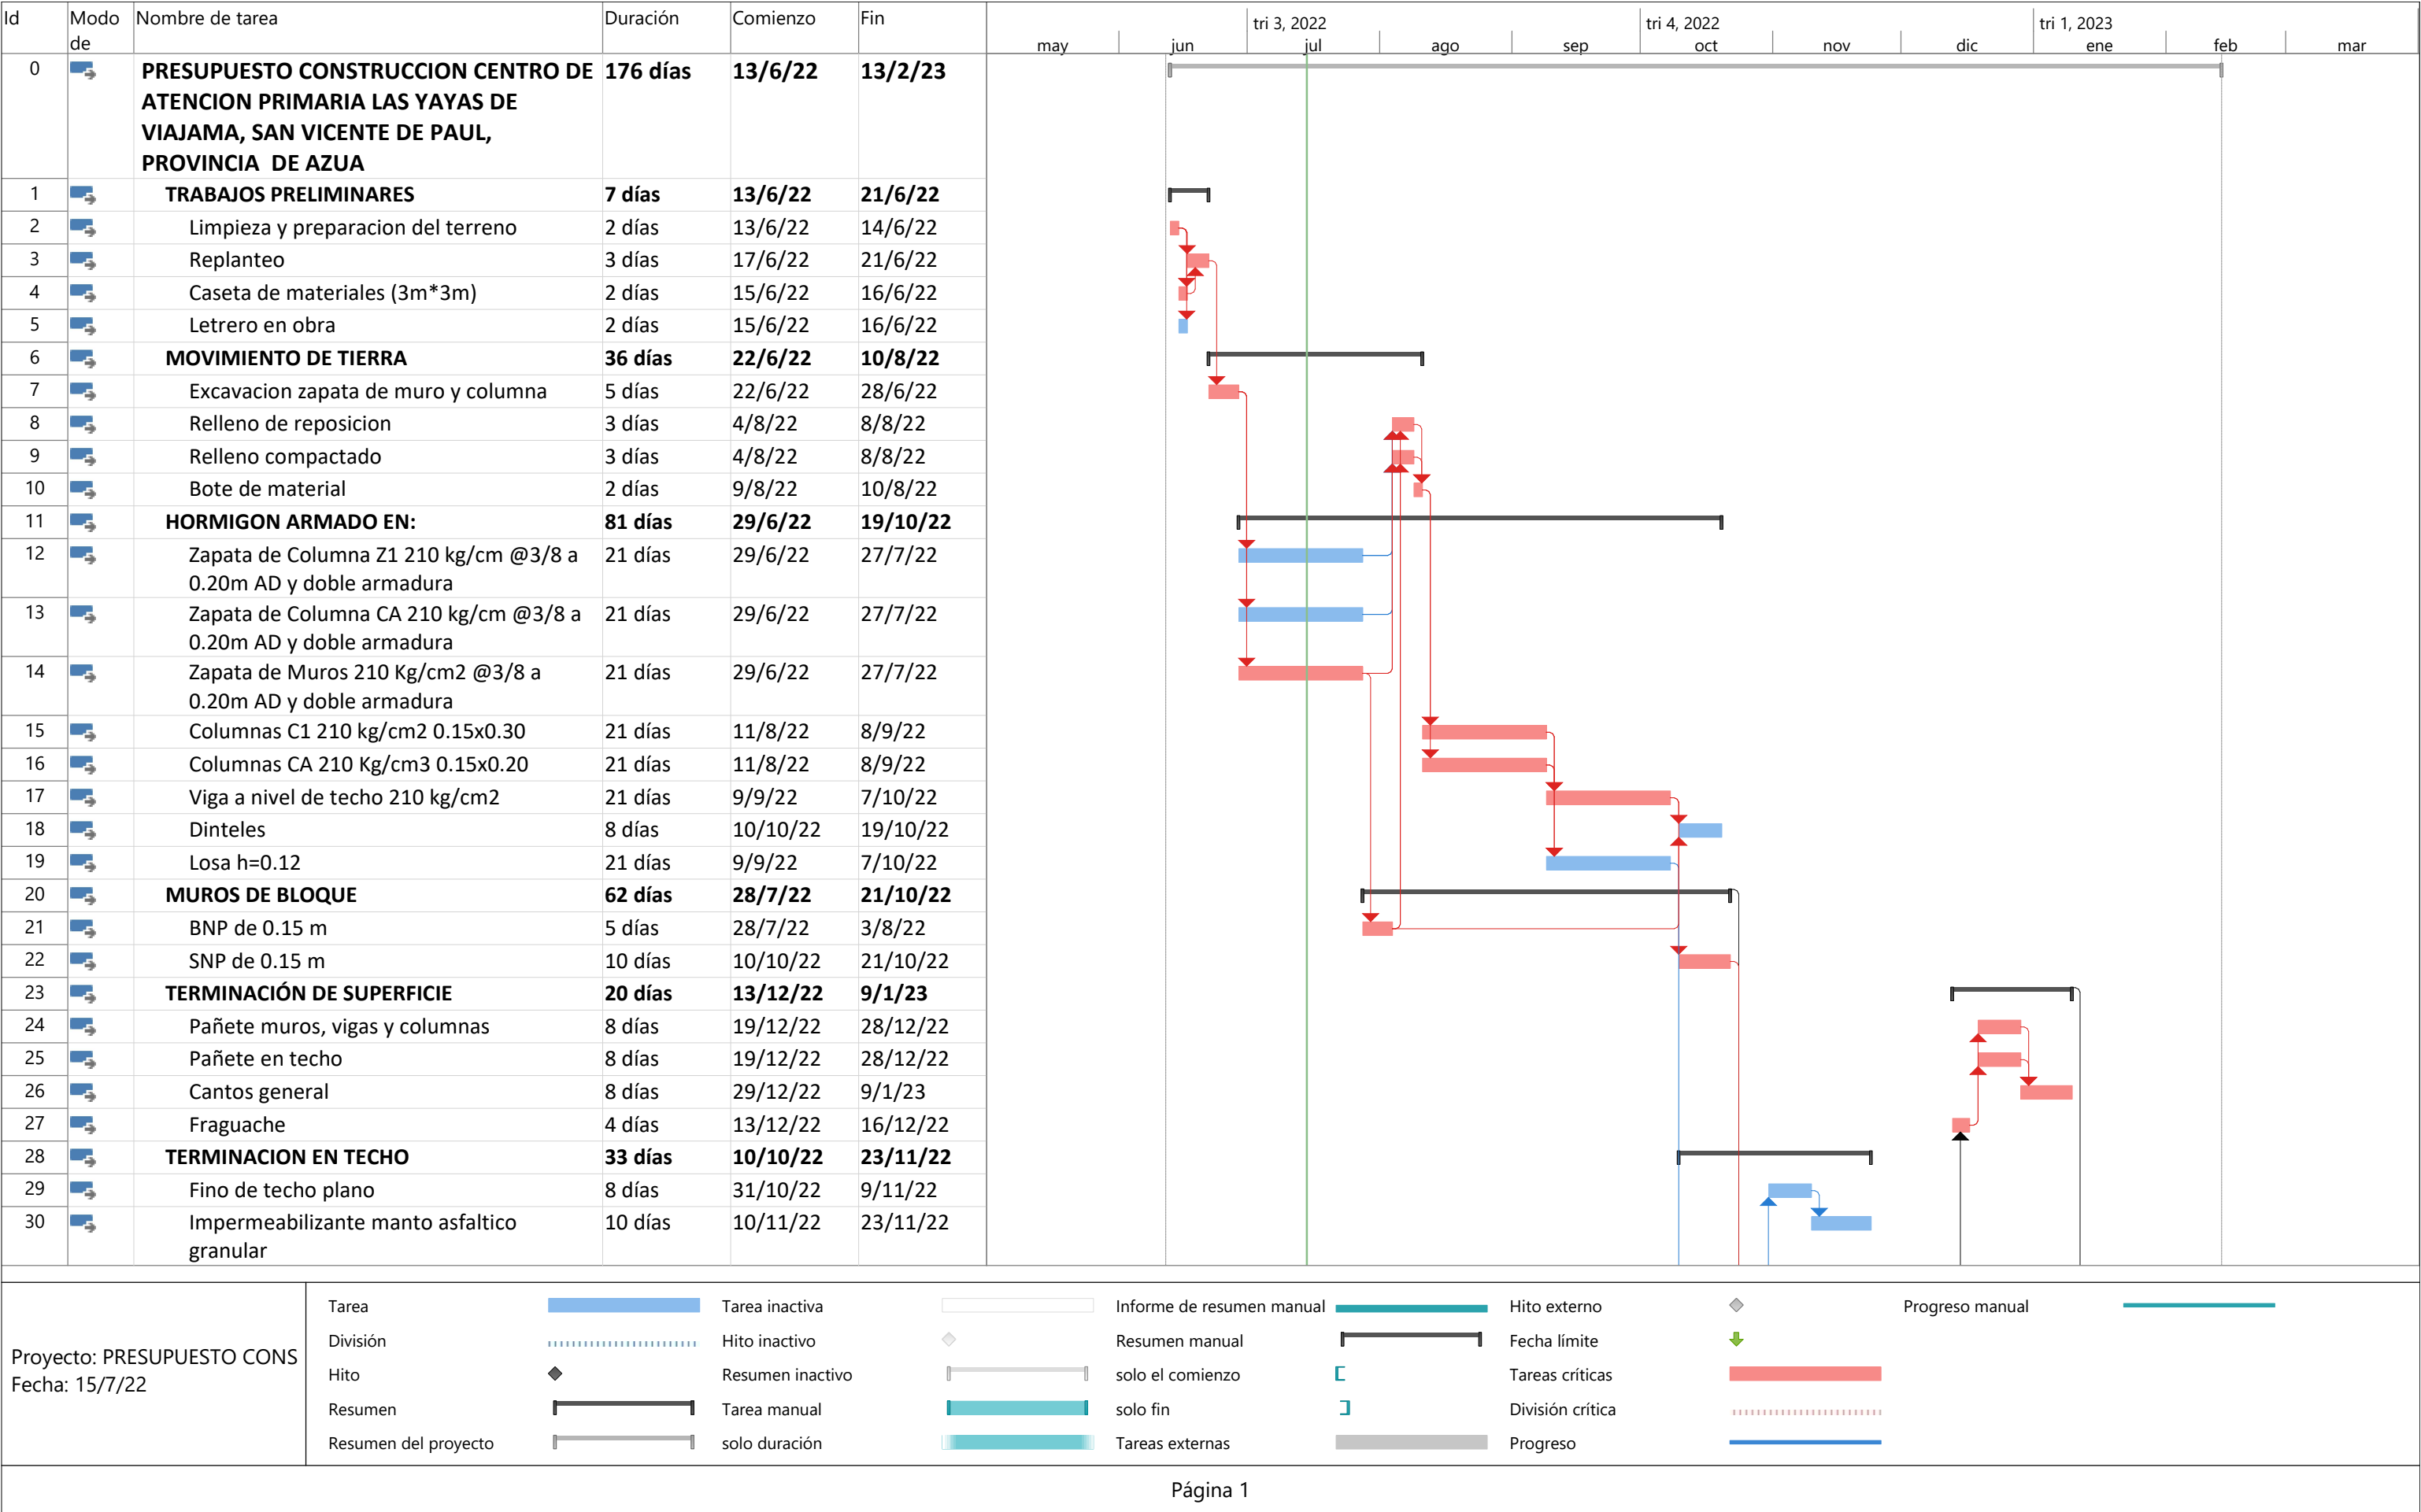

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin												
						may	jun	tri 3, 2022 jul	ago	sep	tri 4, 2022 oct	nov	dic	tri 1, 2023 ene	feb	mar	
31		Desague de techo de 3"	5 días	24/10/22	28/10/22												
32		Zabaletas	5 días	17/10/22	21/10/22												
33		Antepecho	5 días	10/10/22	14/10/22												
34		PORTAJE	8 días	31/1/23	9/2/23												
35		Puertas principales en pino tratado	2 días	31/1/23	1/2/23												
36		Puertas apaneladas Ever Door Caoba	1 día	2/2/23	2/2/23												
37		Puertes apaneladas Ever Door Blanca	1 día	3/2/23	3/2/23												
38		Ventana corrediza de cristal P65	2 días	6/2/23	7/2/23												
39		Puerta en closet en pino tratado	2 días	8/2/23	9/2/23												
40		Gabinete en piso de pino tratado	2 días	2/2/23	3/2/23												
41		Gabinete en pared de pino tratado	2 días	6/2/23	7/2/23												
42		Meseta de granito natural	2 días	31/1/23	1/2/23												
43		Mueble en meseta pino tratado	2 días	2/2/23	3/2/23												
44		PINTURA	15 días	10/1/23	30/1/23												
45		Pintura en techo	5 días	10/1/23	16/1/23												
46		Pintura interior semigloss muros, vigas y columnas	5 días	17/1/23	23/1/23												
47		Pintura exterior acrílica muros, vigas y columnas	5 días	24/1/23	30/1/23												
48		INSTALACIONES SANITARIAS	36 días	24/10/22	12/12/22												
49		Inodoro azteca blanco c/tapa Suministro y Colocación	4 días	26/10/22	31/10/22												
50		Lavamanos Blanco Inc. Mezcladora	4 días	1/11/22	4/11/22												
51		Fregaderos dos bocas teka	2 días	7/11/22	8/11/22												
52		Desague de piso	4 días	9/11/22	14/11/22												
53		Ventilación 3"	2 días	15/11/22	16/11/22												
54		Acometida de agua potable	2 días	17/11/22	18/11/22												
55		Trampa de Grasa	2 días	21/11/22	22/11/22												
56		Registro	2 días	23/11/22	24/11/22												
57		Septico	2 días	25/11/22	28/11/22												
58		Filtrante de 12" PVC	2 días	29/11/22	30/11/22												
59		Sumistro e instalacion de tinaco 265 gls	2 días	1/12/22	2/12/22												
60		Sum. Y col. Bomba de 1/2 HP pedrolo	2 días	5/12/22	6/12/22												
61		Botiquin	2 días	7/12/22	8/12/22												
62		Accesorios	2 días	9/12/22	12/12/22												
63		Tuberias y Piezas especiales	2 días	24/10/22	25/10/22												
64		Mano de Obra Plomeria	2 días	26/10/22	27/10/22												
65		INSTALACIONES ELECTRICAS	36 días	24/10/22	12/12/22												

Proyecto: PRESUPUESTO CONS

Fecha: 15/7/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 2

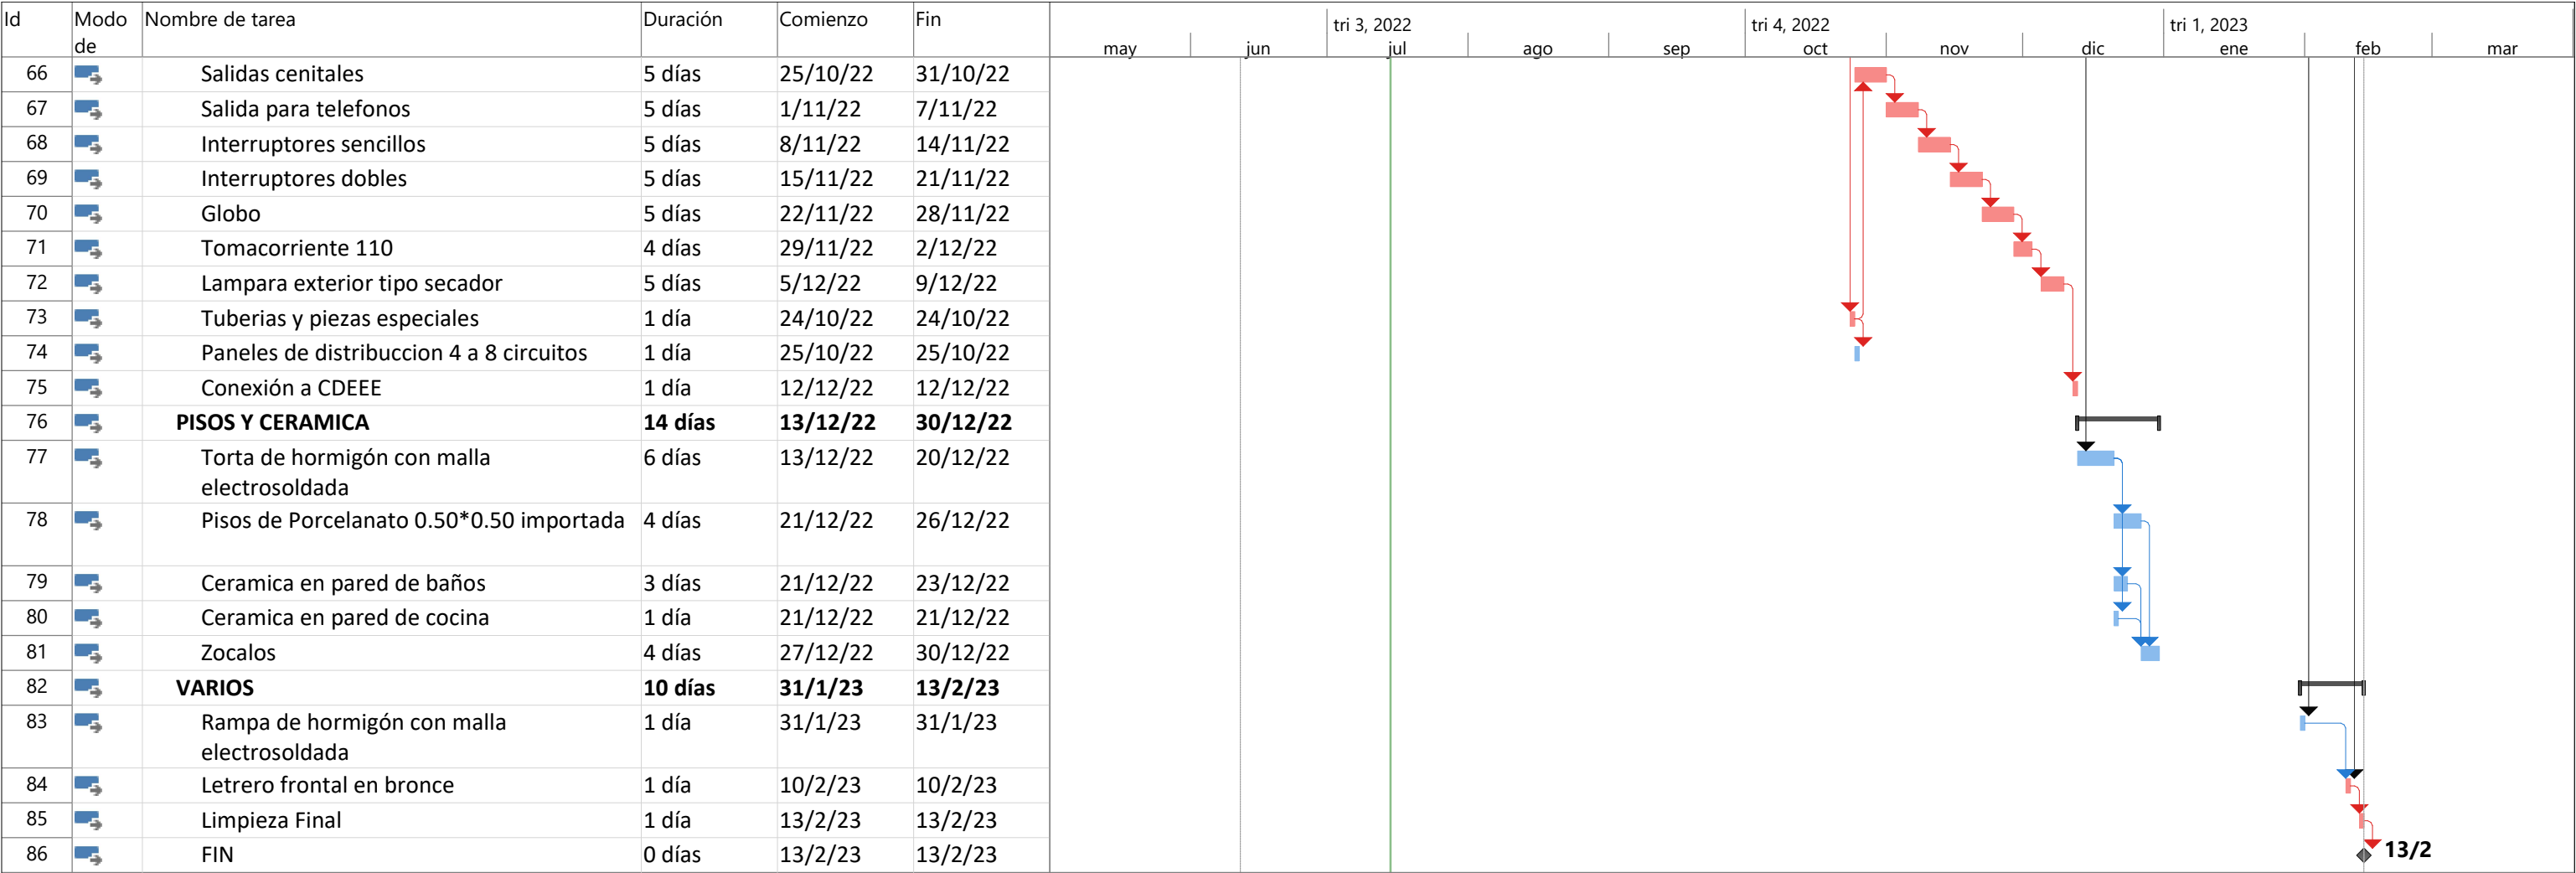

Proyecto: PRESUPUESTO CONS
Fecha: 15/7/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
