










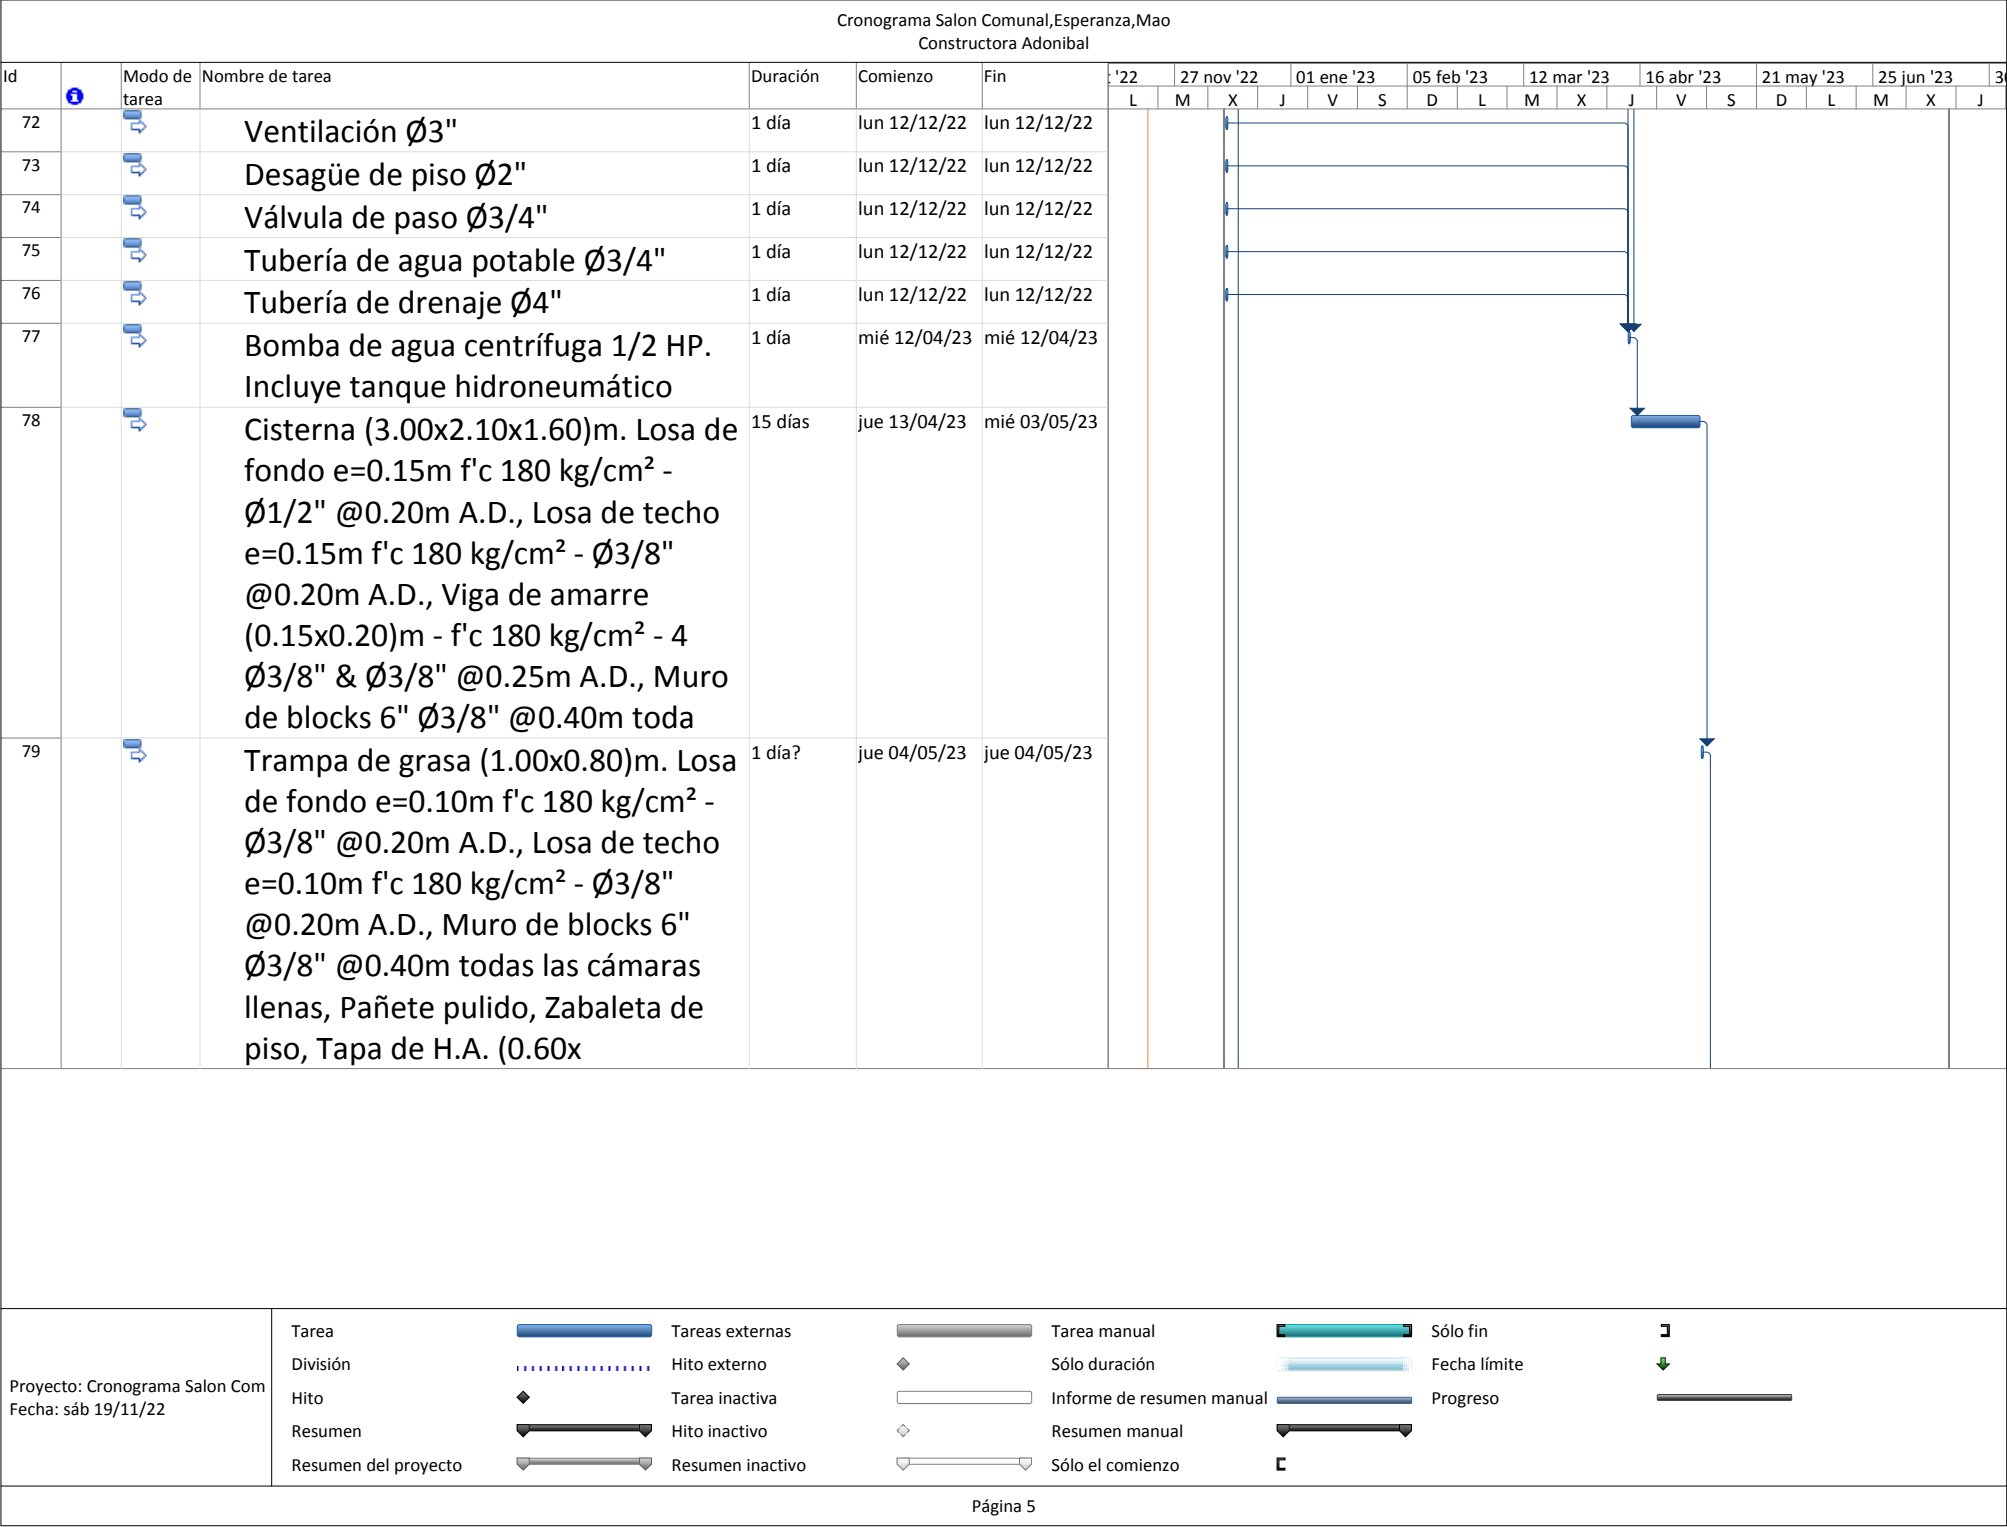





| Cronograma Salon Comunal,Esperanza,Mao |  |  |                                                                       |           |              |              |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Constructora Adonibal                  |  |  |                                                                       |           |              |              |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
|                                        |  |  |                                                                       |           |              | '22          |   | 27 nov '22 |   | 01 ene '23 |   | 05 feb '23 |   | 12 mar '23 |   | 16 abr '23 |   | 21 may '23 |   | 25 jun '23 |   | 30 jul '23 |   |  |  |  |  |  |  |
| Id                                     |  |  |                                                                       |           |              | L            | M | X          | J | V          | S | D          | L | M          | X | J          | V | S          | D | L          | M | X          | J |  |  |  |  |  |  |
| 108                                    |  |  | Puerta de madera en andiroba (2.00x2.10)m (2 hojas)                   | 1 día     | mar 13/06/23 | mar 13/06/23 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 109                                    |  |  | Puerta de madera en andiroba (1.10x2.10)m (1 hoja)                    | 3 días    | mié 14/06/23 | vie 16/06/23 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 110                                    |  |  | Puerta de madera en andiroba (1.00x2.10)m (1 hoja)                    | 2 días    | lun 19/06/23 | mar 20/06/23 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 111                                    |  |  | Puerta en malla ciclónica de entrada peatonal (2.00x1.83)m            | 3 días    | mié 21/06/23 | vie 23/06/23 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 112                                    |  |  |                                                                       |           |              |              |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 113                                    |  |  | Pintura                                                               | 144 días  | lun 12/12/22 | jue 29/06/23 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 114                                    |  |  | Pintura acrílica en muros interior (2 manos)                          | 8 días    | lun 12/12/22 | mié 21/12/22 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 115                                    |  |  | Pintura acrílica en muros exterior (2 manos)                          | 7 días    | lun 12/12/22 | mar 20/12/22 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 116                                    |  |  | Pintura acrílica en techo interior (2 manos)                          | 4 días    | lun 12/12/22 | jue 15/12/22 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 117                                    |  |  | Pintura acrílica en verja perimetral (2 manos)                        | 4 días    | lun 26/06/23 | jue 29/06/23 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 118                                    |  |  |                                                                       |           |              |              |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 119                                    |  |  | Miscelaneos                                                           | 152 días? | mié 14/12/22 | jue 13/07/23 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 120                                    |  |  | Malla ciclónica h=6' con palometa doble y 6 líneas de alambre de púas | 10 días   | vie 30/06/23 | jue 13/07/23 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 121                                    |  |  | Letrero en obra 48"x96" (señal informativa)                           | 1 día?    | mié 14/12/22 | mié 14/12/22 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 122                                    |  |  | Limpieza continua y final                                             | 3 días    | vie 30/06/23 | mar 04/07/23 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 123                                    |  |  |                                                                       |           |              |              |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 124                                    |  |  | Adicionales                                                           | 3 días    | mié 05/07/23 | vie 07/07/23 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 125                                    |  |  |                                                                       |           |              |              |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |
| 126                                    |  |  | Hormigón Armado                                                       | 3 días    | mié 05/07/23 | vie 07/07/23 |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |   |  |  |  |  |  |  |

Proyecto: Cronograma Salon Com

Fecha: sáb 19/11/22

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 8

|                                                       |                      |                                                                                     |                  |                                                                                       |                           |                                                                                       |              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto: Cronograma Salon Com<br>Fecha: sáb 19/11/22 | Tarea                |  | Tareas externas  |  | Tarea manual              |  | Sólo fin     |  |
|                                                       | División             |  | Hito externo     |  | Sólo duración             |  | Fecha límite |  |
|                                                       | Hito                 |  | Tarea inactiva   |  | Informe de resumen manual |  | Progreso     |  |
|                                                       | Resumen              |  | Hito inactivo    |  | Resumen manual            |  |              |                                                                                       |
|                                                       | Resumen del proyecto |  | Resumen inactivo |  | Sólo el comienzo          |  |              |                                                                                       |
