

ID	Task Name	Duration/Start	Finish
1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>	3 days	Mon 4/27/20 Wed 4/29/20
2	Ingeniería	1 day	Mon 4/27/20 Mon 4/27/20
3	Campamento	3 days	Mon 4/27/20 Wed 4/29/20
4	<b>REMOZAMIENTO CASA DE EMPLEADOS DE TECHO PLANO I Y II</b>	6 days	Sat 5/23/20 Thu 5/28/20
5	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	3 days	Sat 5/23/20 Mon 5/25/20
6	Remoción de Fino e impermeabilizante existente	2 days	Sat 5/23/20 Sun 5/24/20
7	Bote de Material de Remoción fino e impermeabiliz. 1 day	1 day	Mon 5/25/20 Mon 5/25/20
8	Limpieza en area de fino con detergente y cloro	1 day	Mon 5/25/20 Mon 5/25/20
9	Limpieza de techo con detergente (cloro) y remoci. 1 day	1 day	Mon 5/25/20 Mon 5/25/20
10	<b>PINTURA:</b>	2 days	Wed 5/27/20 Thu 5/28/20
11	Pintura Acrilica superior en techo	2 days	Wed 5/27/20 Thu 5/28/20
12	Pintura acrílica en muros general	2 days	Wed 5/27/20 Thu 5/28/20
13	<b>TERMINACION DE TECHO</b>	2 days	Tue 5/26/20 Wed 5/27/20
14	Fino en techo plano, e=0.07 m	1 day	Tue 5/26/20 Tue 5/26/20
15	Suministro y Colocación de Lona Asfáltica Granul. 1 day	1 day	Wed 5/27/20 Wed 5/27/20
16	<b>REMOZAMIENTO CASA ALMACEN</b>	25 days	Tue 4/28/20 Fri 5/22/20
17	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	5 days	Tue 4/28/20 Sat 5/2/20
18	Desmonte de Techo de asbesto cemento y de estructuras Existentes	5 days	Tue 4/28/20 Sat 5/2/20
19	<b>TECHO</b>	5 days	Sun 5/3/20 Thu 5/7/20
20	En Aluzinc Cal.26 Con Aislante Prepintado (Inc. Tijerilla, Estructura Metálica, mano de obra, Suministro y Colocación Placas metálicas de (0.3x0.3) m HN e= 3/16" y Pernos de 3/4"	5 days	Sun 5/3/20 Thu 5/7/20
21	<b>TERMINACION PISOS:</b>	5 days	Sat 5/9/20 Wed 5/13/20
22	Pisos de Granito fondo blanco 0.4 m x 0.40 m	3 days	Sat 5/9/20 Mon 5/11/20
23	Zócalos de Granito fondo Blanco 0.07 m x 0.40 m	2 days	Tue 5/12/20 Wed 5/13/20
24	<b>PORTAJE :</b>	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
25	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.94 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
26	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.80 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
27	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.78 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
28	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.72 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
29	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.67 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
30	Suministro y Colocacion de Puerta Plegable en despensa(#218 caoba en diamond panel flex o Cerradura para Puerta	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
31	<b>PINTURA:</b>	8 days	Thu 5/14/20 Thu 5/21/20
32	Pintura acrílica en muros general	8 days	Thu 5/14/20 Thu 5/21/20
33	<b>TERMINACION</b>	4 days	Thu 5/14/20 Sun 5/17/20
34	Plafon PVC con estructura metálica (incluye suministro e instalación)	4 days	Thu 5/14/20 Sun 5/17/20
35	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS:</b>	12 days	Fri 5/8/20 Tue 5/19/20
36	Lamparas Fluorescentes de 3 tubos de (2x4) pies	2 days	Mon 5/18/20 Tue 5/19/20

**Nombre:** Complejo Jimenoa  
**Inicio:** Mon 4/27/20  
**Terminación:** Fri 7/17/20

**Task** (Solid bar)    **Project Summary** (Dashed bar)    **Manual Task** (Dotted bar)  
**Split** (Dotted bar)    **Inactive Task** (Dotted bar)    **Duration-only** (Dotted bar)  
**Milestone** (Diamond)    **Inactive Milestone** (Diamond)    **Manual Summary Rollup** (Dotted bar)  
**Summary** (Dotted bar)    **Inactive Summary** (Dotted bar)    **Manual Summary** (Dotted bar)

**Start-only** (Solid bar)    **Finish-only** (Dotted bar)    **External Tasks** (Dotted bar)    **External Milestone** (Diamond)

**Deadline** (Arrow)    **Progress** (Horizontal line)    **Manual Progress** (Horizontal line)



*Jose Castillo*



ID	Task Name	Duration/Start	Finish	May 2020	June 2020	July 2020
39	Interruptores sencillo,	12 days Fri 5/8/20	Tue 5/19/20	7-16		
40	Tomacorriente doble 120V, polarizado,	12 days Fri 5/8/20	Tue 5/19/20	7-16		
41	Mano de obra electricidad (30%)	12 days Fri 5/8/20	Tue 5/19/20	7-16		
42	<b>MISCELANEOS:</b>	<b>15 days Fri 5/8/20</b>	<b>Fri 5/22/20</b>	7-21		
43	Desinstalación de Inodoro	1 day Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	7		
44	Desmonte y Reinstalación de Registro Eléctrico	6 days Fri 5/8/20	Wed 5/13/20	7-12		
45	Desmonte, Reinstalación y Mantenimiento de Puerta	6 days Fri 5/8/20	Wed 5/13/20	7-12		
46	Desmonte de Plafones de estructuras Existentes	1 day Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	7		
47	Desmonte de gavinete, meseta y gavinete de piso	1 day Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	7		
48	Suministro y Colocación Extractor de Grasa Blanco	1 day Wed 5/20/20	Wed 5/20/20	28		
49	Limpieza final de Terminación	1 day Fri 5/22/20	Fri 5/22/20	28		
50	<b>REMOZAMIENTO DE 2 CASAS DE EMPLEADOS TECHO INCLINADO</b>	<b>30 days Tue 4/28/20</b>	<b>Wed 5/27/20</b>	25-28		
51	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>17 days Tue 4/28/20</b>	<b>Thu 5/14/20</b>	25-31		
52	Demolición de pisos existente	3 days Mon 5/11/20	Wed 5/13/20	10-12		
53	Demolición de impermeabilizante en techo inclinado y limpieza de Hongos con productos	3 days Tue 4/28/20	Thu 4/30/20	7-9		
54	Desmonte de puertas existentes	2 days Mon 5/11/20	Tue 5/12/20	10-11		
55	Desmonte de estructura madera y aluzinc	3 days Tue 4/28/20	Thu 4/30/20	7-9		
56	Bote material	1 day Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	19		
57	<b>TERMINACION PISOS:</b>	<b>5 days Fri 5/15/20</b>	<b>Tue 5/19/20</b>	10-14		
58	Pisos de Granito fondo blanco 0.4 m x 0.40 m	3 days Fri 5/15/20	Sun 5/17/20	10-12		
59	Zócalos de Granito fondo Blanco 0.07 m x 0.40 m	2 days Mon 5/18/20	Tue 5/19/20	13-14		
60	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS:</b>	<b>10 days Thu 5/14/20</b>	<b>Sat 5/23/20</b>	15-24		
61	Salida cenitales de techo c/roceta	10 days Thu 5/14/20	Sat 5/23/20	15-24		
62	Salidas interruptores sencillo	10 days Thu 5/14/20	Sat 5/23/20	15-24		
63	Salida tomacorriente sencillo 110V, polarizado	10 days Thu 5/14/20	Sat 5/23/20	15-24		
64	Salida tomacorriente doble normal 220V, polarizado	10 days Thu 5/14/20	Sat 5/23/20	15-24		
65	Mano de Obra general instalaciones electricas	10 days Thu 5/14/20	Sat 5/23/20	15-24		
66	<b>PORTAJE Y VENTANAS :</b>	<b>7 days Wed 5/20/20</b>	<b>Tue 5/26/20</b>	25-31		
67	Suministro y Colocación de Puerta everdor (0.94 x 3	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
68	2.10) m	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
69	Suministro y Colocación de Puerta everdor (0.86 x 3	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
70	2.10) m	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
71	Suministro y Colocación de Puerta everdor (0.80 x 3	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
72	2.10) m	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
73	Suministro y Colocación de Puerta everdor (0.78 x 3	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
74	2.10) m	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
75	Suministro y Colocación de Puerta everdor (0.72 x 3	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
76	2.10) m	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
77	Suministro y Colocación de Puerta everdor (0.69 x 3	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
78	2.10) m	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
79	Suministro y Colocación de Puerta everdor (0.67 x 3	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
80	2.10) m	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
81	Suministro y Colocación de Puerta everdor en closet (0.67 x 1.7) m	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
82	Suministro y Colocación Puerta Plegable en desper	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
83	3 days	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		
84	Cerradura para Puerta Principal	3 days Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	25-27		

*Handwritten signature*



**Nombre:** Complejo Jimenoa  
**Inicio:** Mon 4/27/20  
**Terminación:** Fri 7/17/20


**Task**  
 Split  
 Milestone  
 Summary

**Manual Task**  
 Duration-only  
 Manual Summary Rollup  
 Manual Summary

**Project Summary**  
 Inactive Task  
 Inactive Milestone  
 Inactive Summary

**Start-only**  
 Finish-only  
 External Tasks  
 External Milestone


**Deadline**  
 Progress  
 Manual Progress

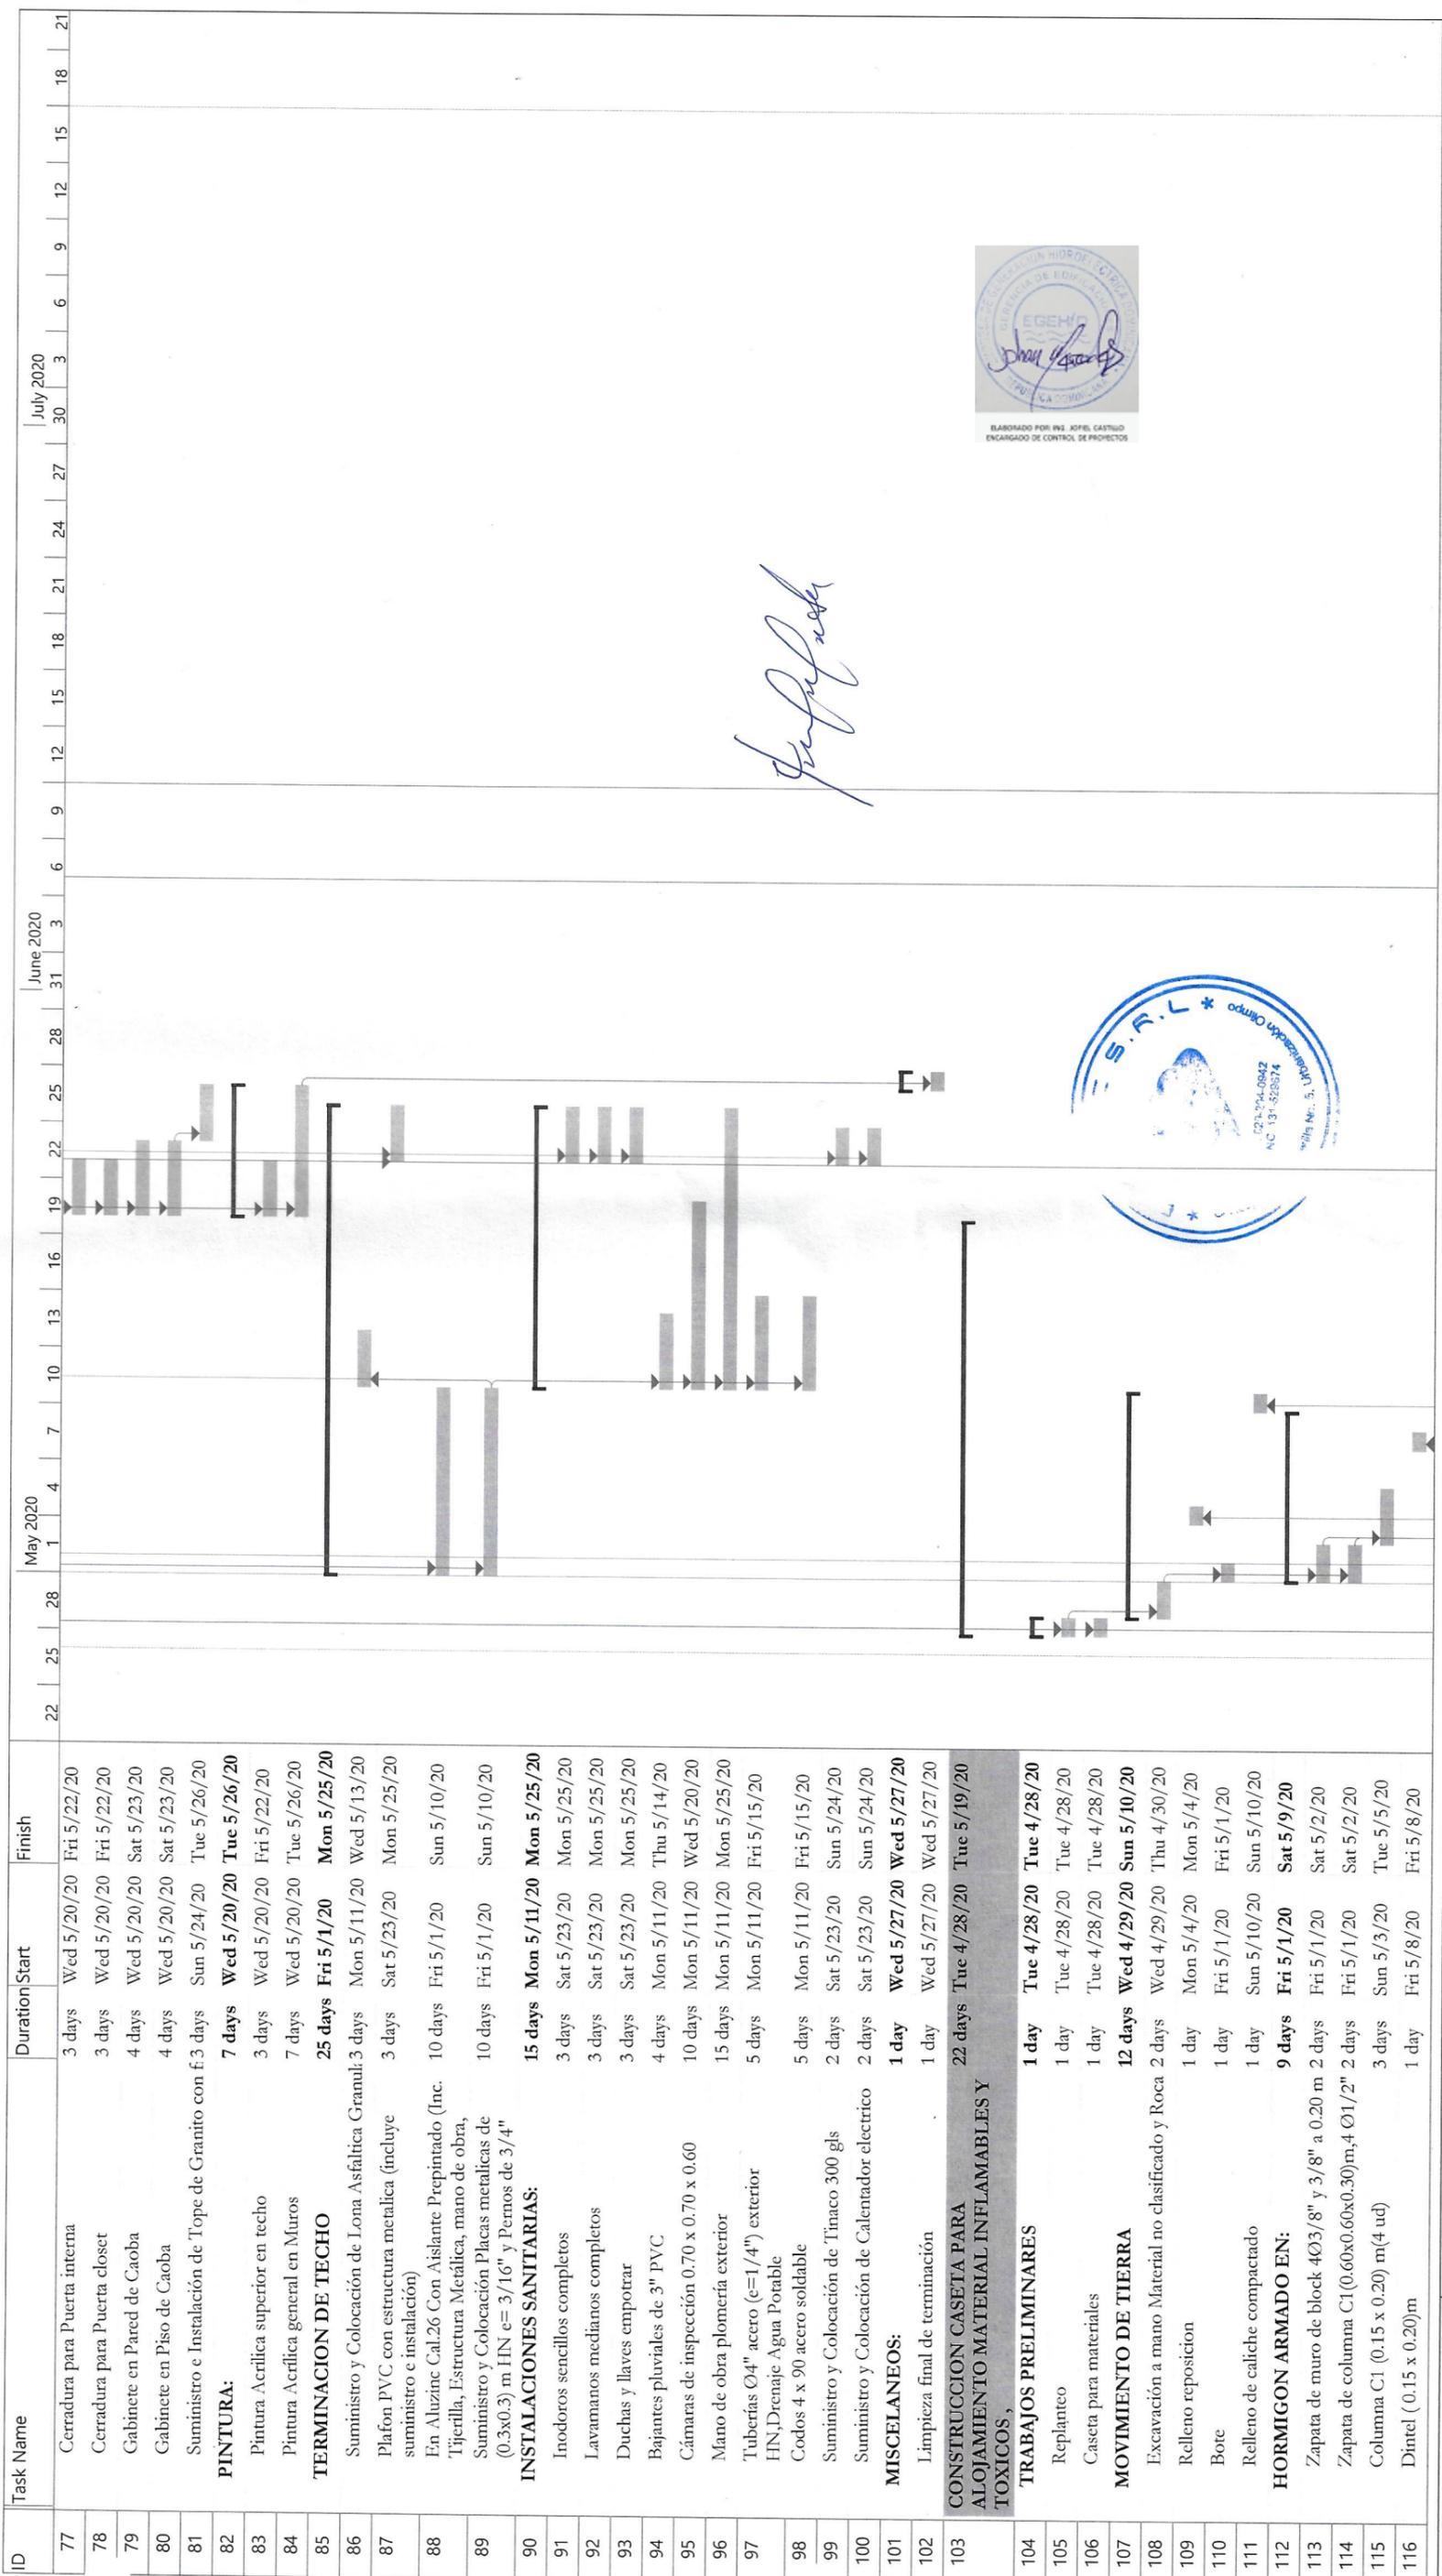

*[Handwritten Signature]*



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Task Type	Summary	Start-only	Finish-only	External Tasks	External Milestone	Deadline
77	Cerradura para Puerta interna	3 days	Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	Manual Task	Project Summary					
78	Cerradura para Puerta closet	3 days	Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	Manual Task	Project Summary					
79	Gabinete en Pared de Caoba	4 days	Wed 5/20/20	Sat 5/23/20	Manual Task	Project Summary					
80	Gabinete en Piso de Caoba	4 days	Wed 5/20/20	Sat 5/23/20	Manual Task	Project Summary					
81	Suministro e Instalación de Tope de Granito con f.3 days	3 days	Sun 5/24/20	Tue 5/26/20	Manual Task	Project Summary					
82	PINTURA:	7 days	Wed 5/20/20	Tue 5/26/20	Manual Task	Project Summary					
83	Pintura Acrilica superior en techo	3 days	Wed 5/20/20	Fri 5/22/20	Manual Task	Project Summary					
84	Pintura Acrilica general en Muros	7 days	Wed 5/20/20	Tue 5/26/20	Manual Task	Project Summary					
85	TERMINACION DE TECHO	25 days	Fri 5/1/20	Mon 5/25/20	Manual Task	Project Summary					
86	Suministro y Colocación de Lona Asfáltica Granul: 3 days	3 days	Mon 5/11/20	Wed 5/13/20	Manual Task	Project Summary					
87	Plafón PVC con estructura metálica (incluye suministro e instalación)	3 days	Sat 5/23/20	Mon 5/25/20	Manual Task	Project Summary					
88	En Aluzinc Cal.26 Con Aislante Prepintado (Inc. Tijerilla, Estructura Metálica, mano de obra, Suministro y Colocación Placas metálicas de 0.3x0.3) m HN e= 3/16" y Pernos de 3/4"	10 days	Fri 5/1/20	Sun 5/10/20	Manual Task	Project Summary					
89	INSTALACIONES SANITARIAS:	10 days	Fri 5/1/20	Sun 5/10/20	Manual Task	Project Summary					
90	Inodoros sencillos completos	15 days	Mon 5/11/20	Mon 5/25/20	Manual Task	Project Summary					
91	Lavamanos medianos completos	3 days	Sat 5/23/20	Mon 5/25/20	Manual Task	Project Summary					
92	Duchas y llaves empotrar	3 days	Sat 5/23/20	Mon 5/25/20	Manual Task	Project Summary					
93	Bajantes pluviales de 3" PVC	4 days	Mon 5/11/20	Thu 5/14/20	Manual Task	Project Summary					
94	Cámaras de inspección 0.70 x 0.70 x 0.60	10 days	Mon 5/11/20	Wed 5/20/20	Manual Task	Project Summary					
95	Mano de obra plomería exterior	15 days	Mon 5/11/20	Mon 5/25/20	Manual Task	Project Summary					
96	Tubertías Ø4" acero (e=1/4") exterior	5 days	Mon 5/11/20	Fri 5/15/20	Manual Task	Project Summary					
97	HN, Drenaje Agua Potable	5 days	Mon 5/11/20	Fri 5/15/20	Manual Task	Project Summary					
98	Codos 4 x 90 acero soldable	5 days	Mon 5/11/20	Fri 5/15/20	Manual Task	Project Summary					
99	Suministro y Colocación de Tinaco 300 gls	2 days	Sat 5/23/20	Sun 5/24/20	Manual Task	Project Summary					
100	Suministro y Colocación de Calentador electrico	2 days	Sat 5/23/20	Sun 5/24/20	Manual Task	Project Summary					
101	MISCELANEOS:	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20	Manual Task	Project Summary					
102	Limpieza final de terminación	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20	Manual Task	Project Summary					
103	CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO MATERIAL INFLAMABLES Y TOXICOS,	22 days	Tue 4/28/20	Tue 5/19/20	Manual Task	Project Summary					
104	TRABAJOS PRELIMINARES	1 day	Tue 4/28/20	Tue 4/28/20	Manual Task	Project Summary					
105	Replanteo	1 day	Tue 4/28/20	Tue 4/28/20	Manual Task	Project Summary					
106	Caseta para materiales	1 day	Tue 4/28/20	Tue 4/28/20	Manual Task	Project Summary					
107	MOVIMIENTO DE TIERRA	12 days	Wed 4/29/20	Sun 5/10/20	Manual Task	Project Summary					
108	Excavación a mano Material no clasificado y Roca	2 days	Wed 4/29/20	Thu 4/30/20	Manual Task	Project Summary					
109	Relleno reposición	1 day	Mon 5/4/20	Mon 5/4/20	Manual Task	Project Summary					
110	Bote	1 day	Fri 5/1/20	Fri 5/1/20	Manual Task	Project Summary					
111	Relleno de caliche compactado	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20	Manual Task	Project Summary					
112	HORMIGON ARMADO EN:	9 days	Fri 5/1/20	Sat 5/9/20	Manual Task	Project Summary					
113	Zapata de muro de block 403/8" y 3/8" a 0.20 m	2 days	Fri 5/1/20	Sat 5/2/20	Manual Task	Project Summary					
114	Zapata de columna C1(0.60x0.60x0.30)m,4 Ø1/2"	2 days	Fri 5/1/20	Sat 5/2/20	Manual Task	Project Summary					
115	Columna C1 (0.15 x 0.20) m(4 ud)	3 days	Sun 5/3/20	Tue 5/5/20	Manual Task	Project Summary					
116	Dintel (0.15 x 0.20)m	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	Manual Task	Project Summary					

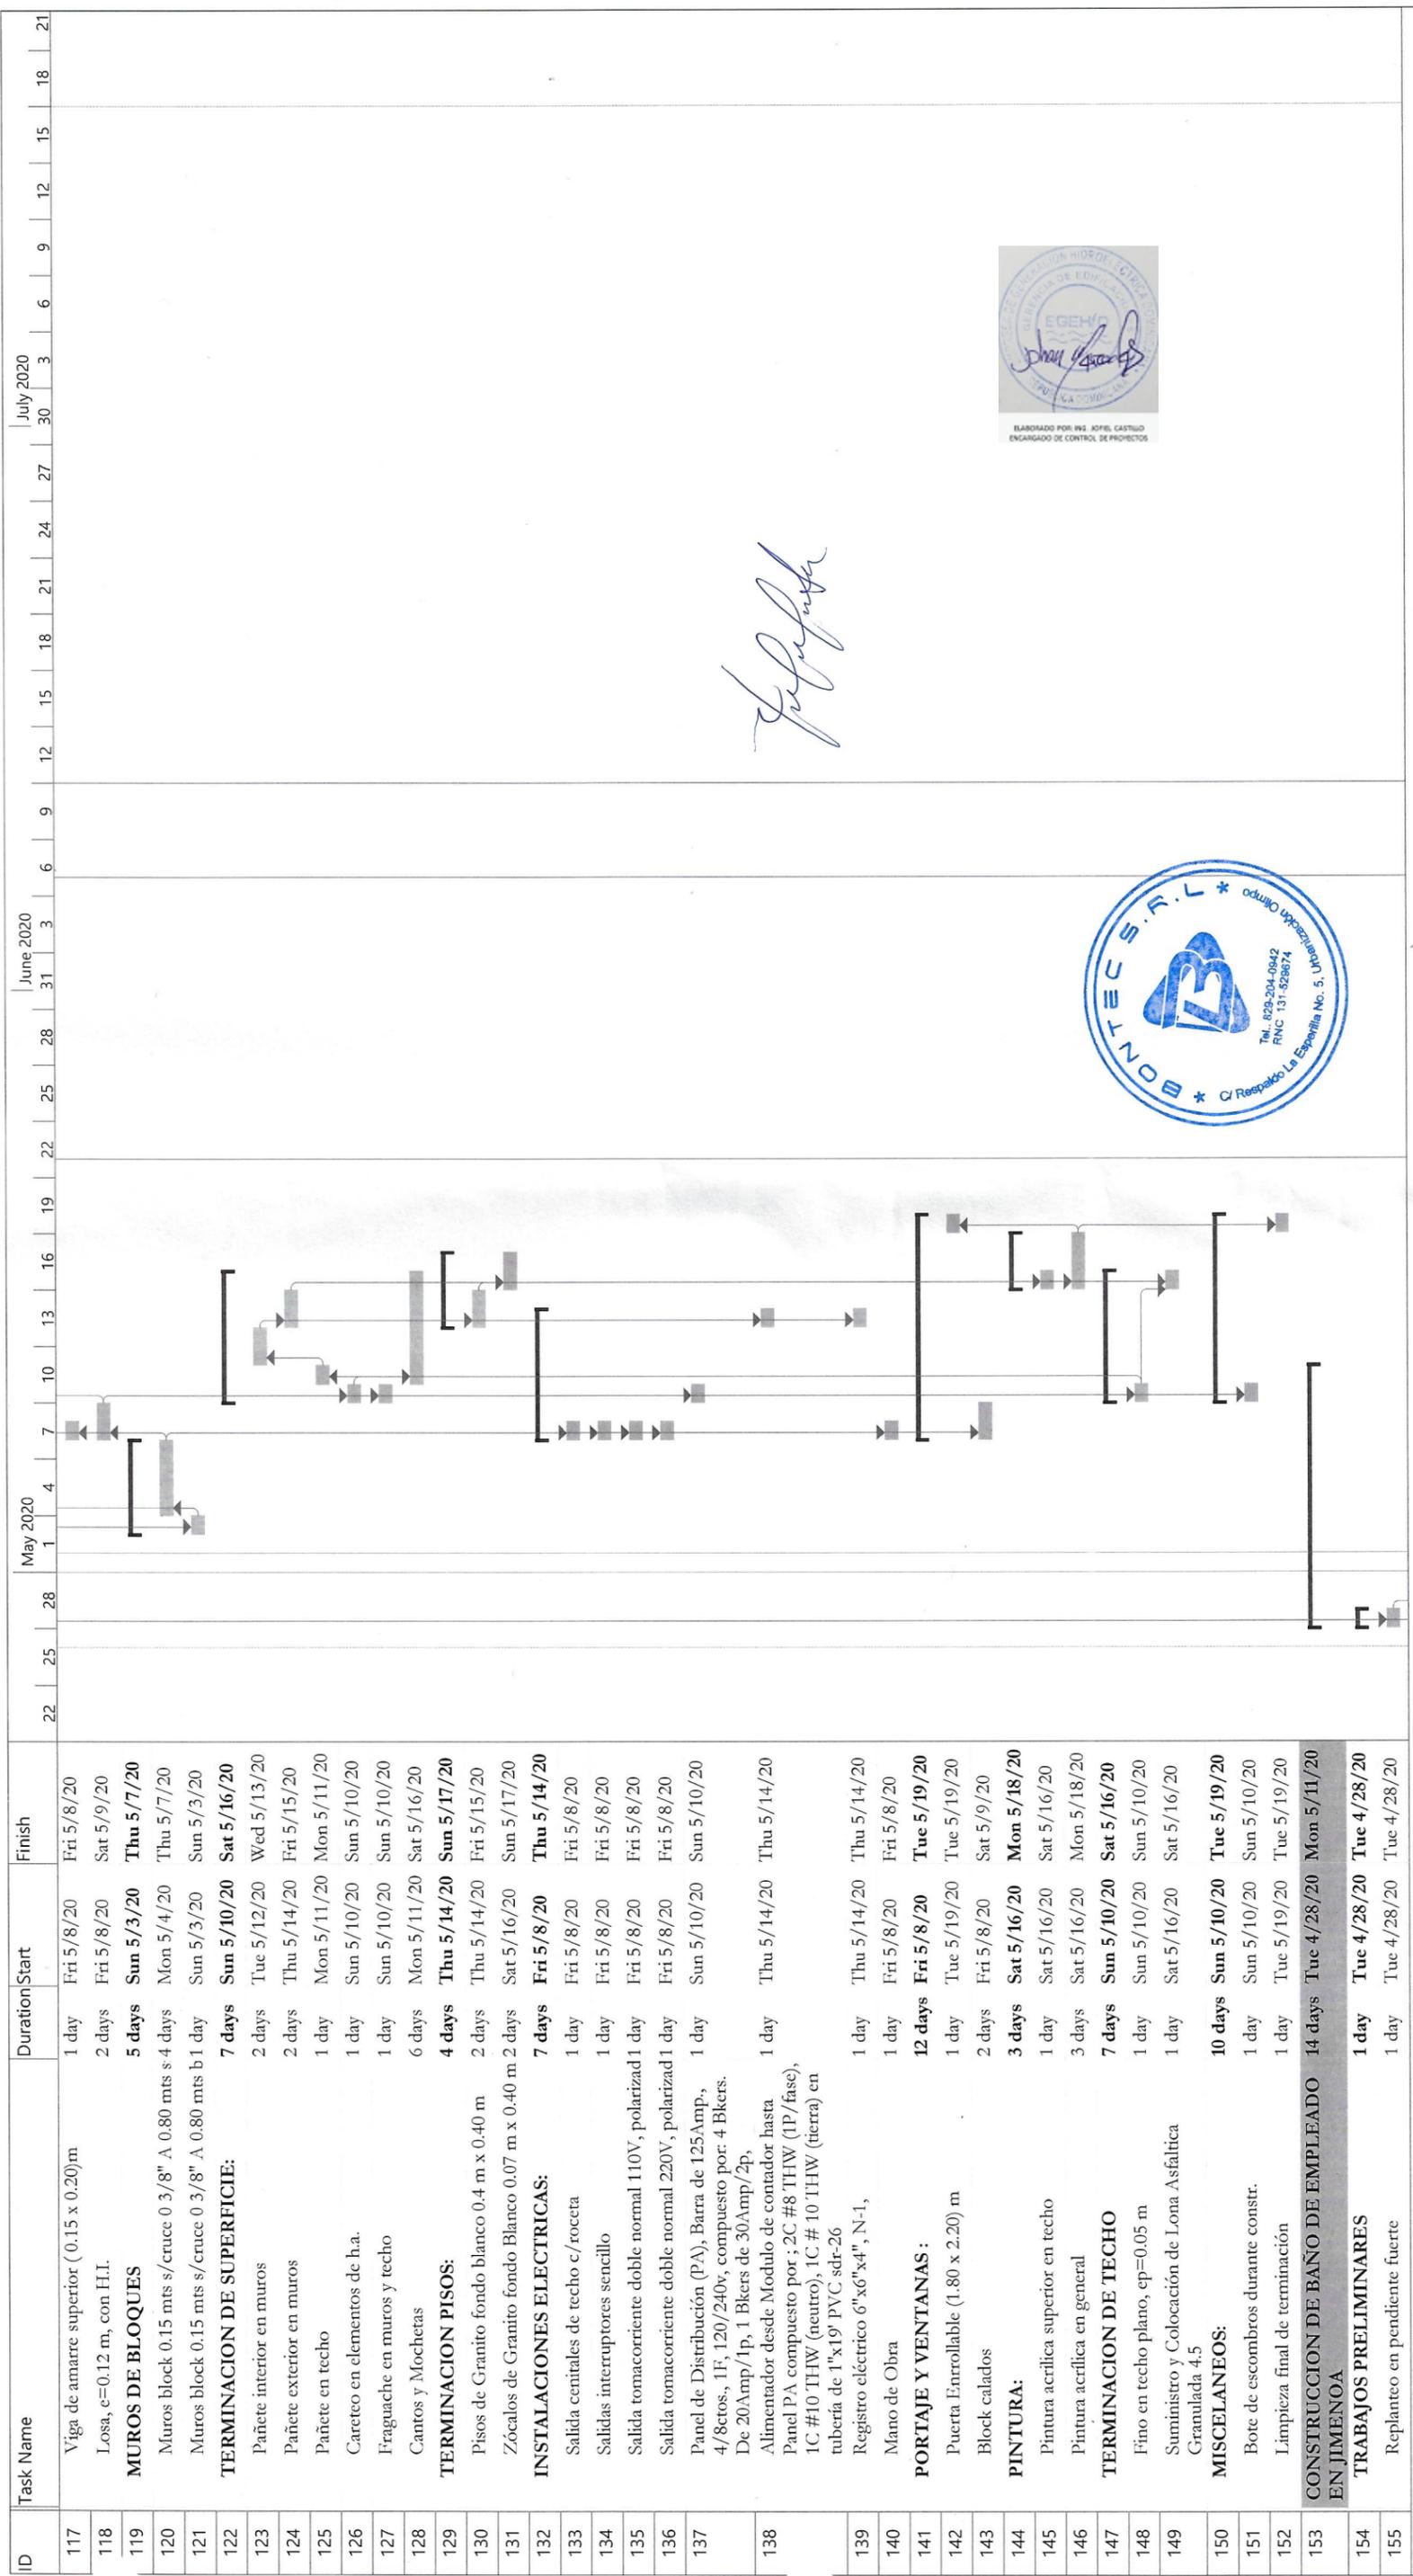

*Jose Castro*

**Nombre:** Complejo Jimenoa  
**Inicio:** Mon 4/27/20  
**Terminación:** Fri 7/17/20


**Task**  
 Split  
 Milestone  
 Summary

**Project Summary**  
 Inactive Task  
 Inactive Milestone  
 Inactive Summary

**Manual Task**  
 Duration-only  
 Manual Summary Rollup  
 Manual Summary

**Start-only**  
 Finish-only  
 External Tasks  
 External Milestone


**Deadline**  
 Progress  
 Manual Progress

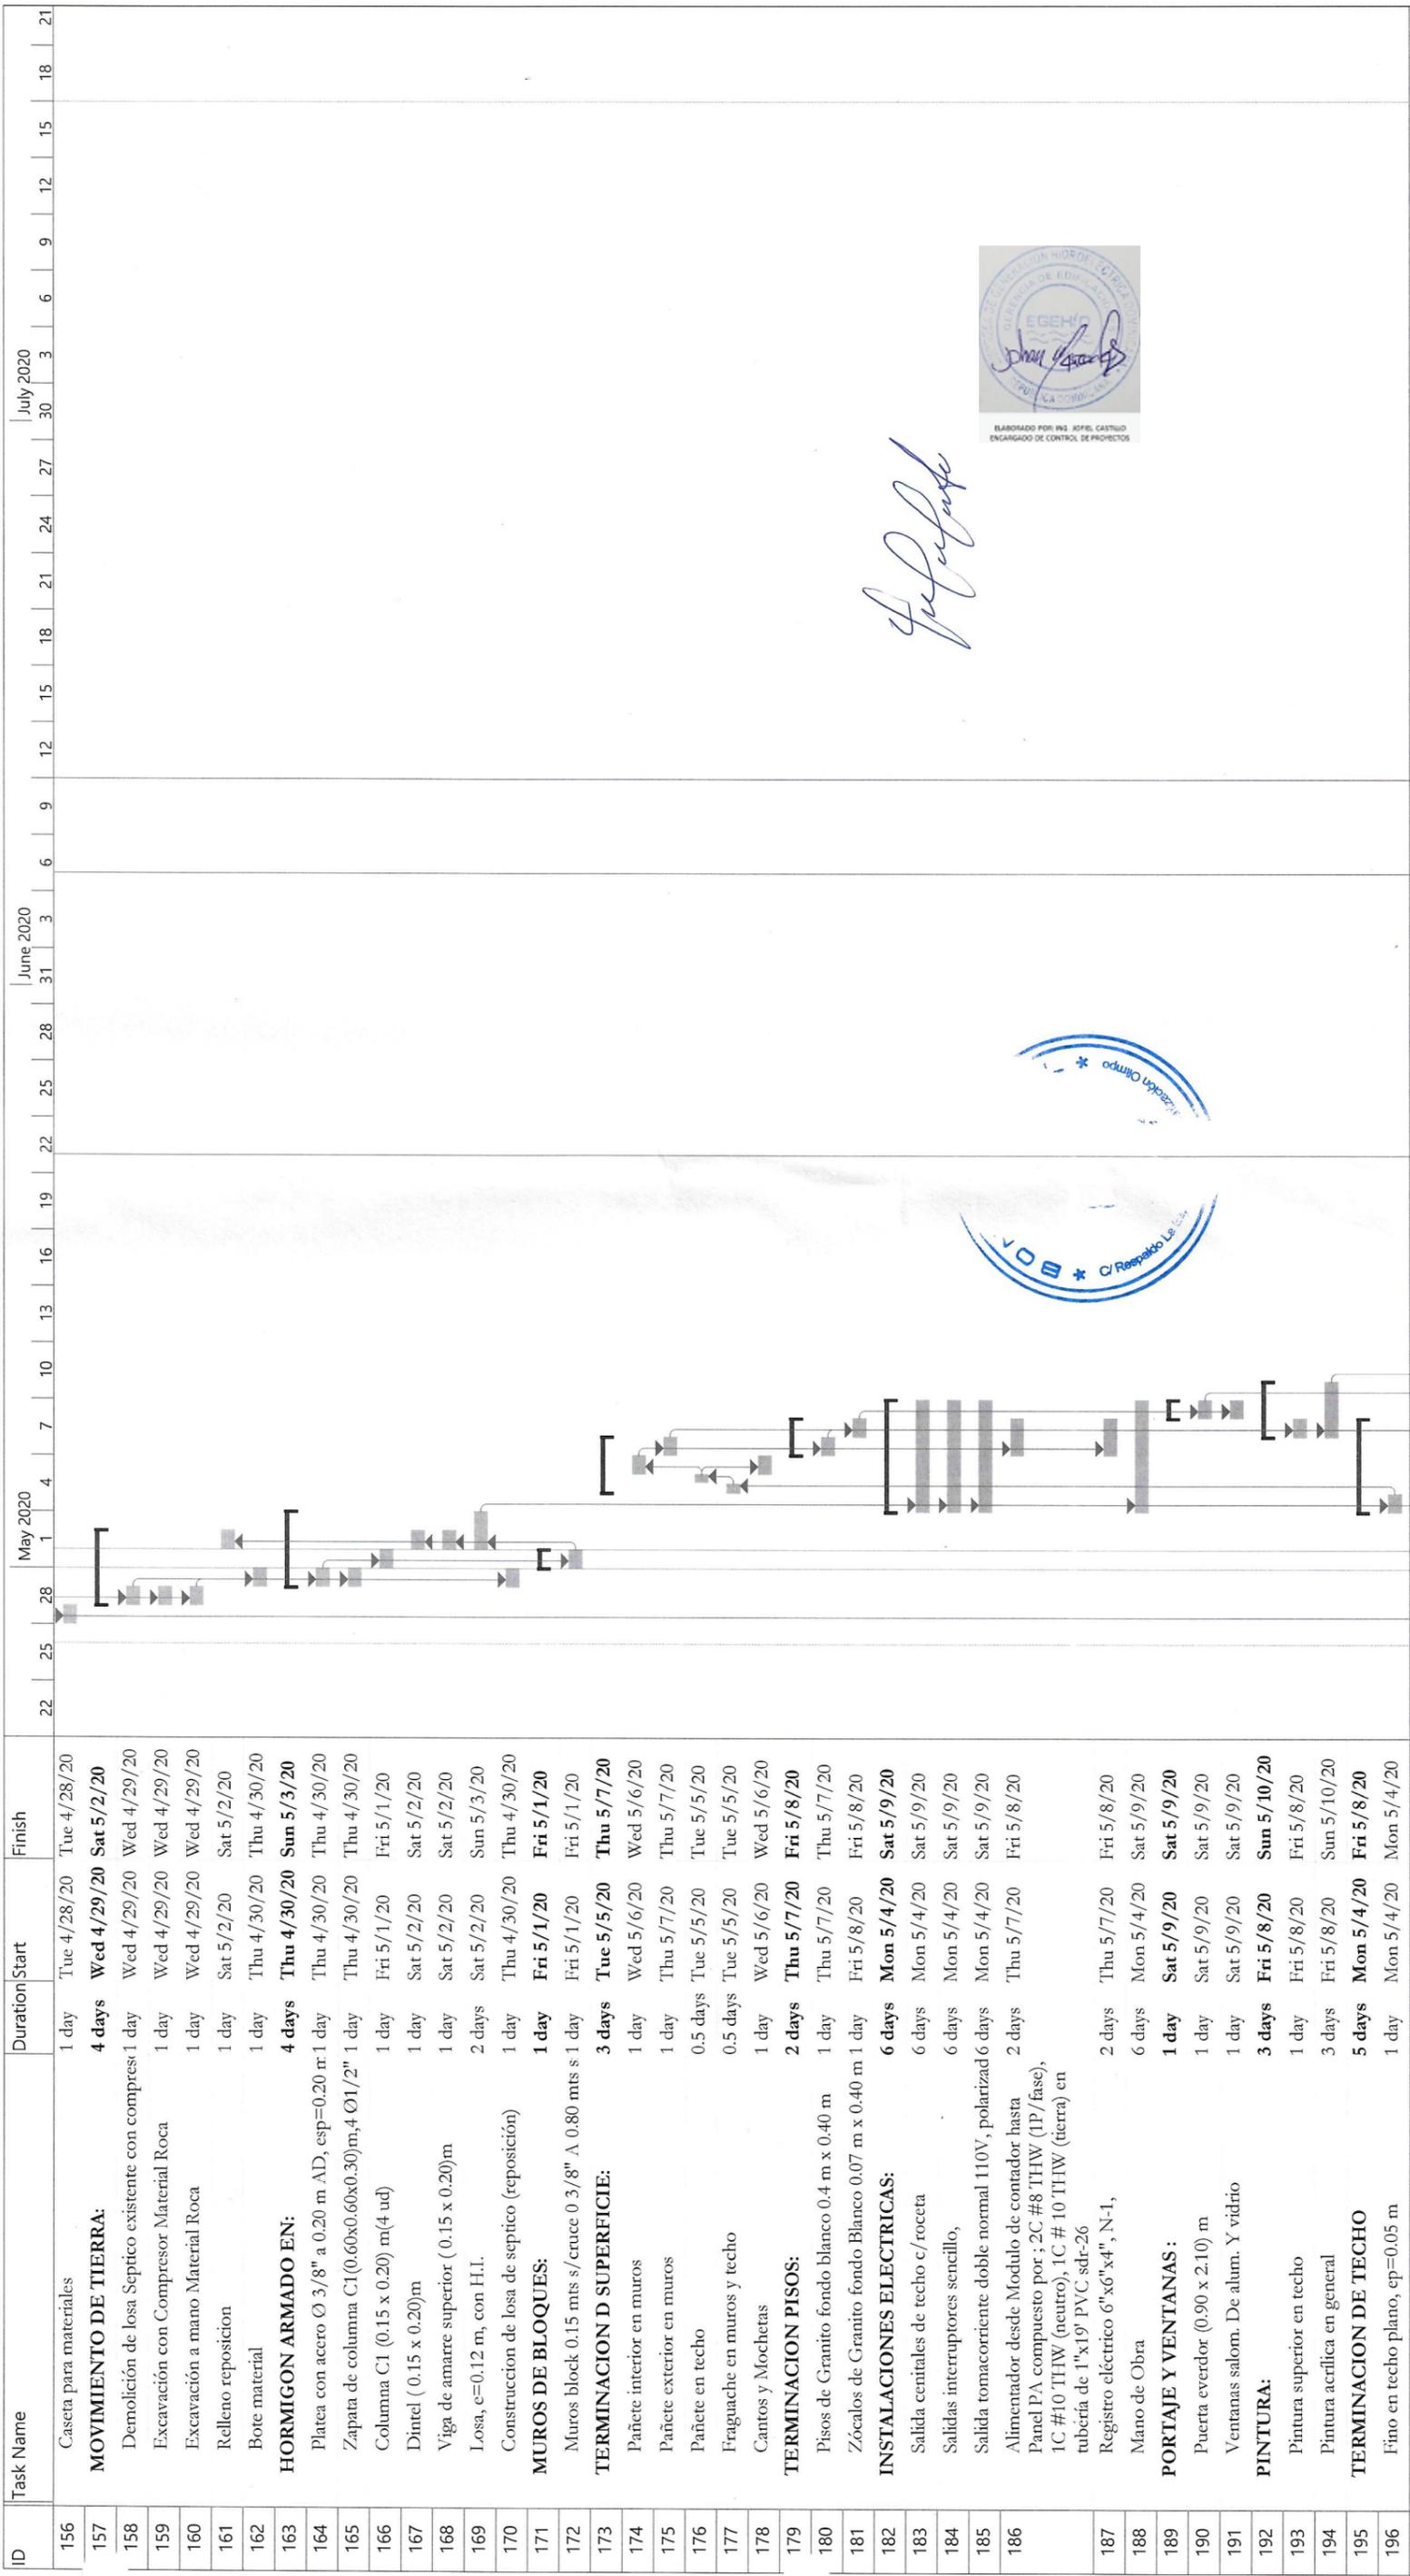

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
156	Casera para materiales	1 day	Tue 4/28/20	Tue 4/28/20
157	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>	<b>4 days</b>	<b>Wed 4/29/20</b>	<b>Sat 5/2/20</b>
158	Demolicion de losa Septico existente con compresor	1 day	Wed 4/29/20	Wed 4/29/20
159	Excavacion con Compresor Material Roca	1 day	Wed 4/29/20	Wed 4/29/20
160	Excavacion a mano Material Roca	1 day	Wed 4/29/20	Wed 4/29/20
161	Relleno reposicion	1 day	Sat 5/2/20	Sat 5/2/20
162	Bote material	1 day	Thu 4/30/20	Thu 4/30/20
163	<b>HORMIGON ARMADO EN:</b>	<b>4 days</b>	<b>Thu 4/30/20</b>	<b>Sun 5/3/20</b>
164	Plata con acero Ø 3/8" a 0.20 m AD, esp=0.20 m	1 day	Thu 4/30/20	Thu 4/30/20
165	Zapata de columna C1(0.60x0.60x0.30)m,4 Ø1/2"	1 day	Thu 4/30/20	Thu 4/30/20
166	Columna C1 (0.15 x 0.20) m(4 ud)	1 day	Fri 5/1/20	Fri 5/1/20
167	Dintel (0.15 x 0.20)m	1 day	Sat 5/2/20	Sat 5/2/20
168	Viga de amarre superior (0.15 x 0.20)m	1 day	Sat 5/2/20	Sat 5/2/20
169	Losa, e=0.12 m, con H.I.	2 days	Sat 5/2/20	Sun 5/3/20
170	Construccion de losa de septico (reposicion)	1 day	Thu 4/30/20	Thu 4/30/20
171	<b>MUROS DE BLOQUES:</b>	<b>1 day</b>	<b>Fri 5/1/20</b>	<b>Fri 5/1/20</b>
172	Muros block 0.15 mts s/cruce 0 3/8" Λ 0.80 mts s 1 day	1 day	Fri 5/1/20	Fri 5/1/20
173	<b>TERMINACION D SUPERFICIE:</b>	<b>3 days</b>	<b>Tue 5/5/20</b>	<b>Thu 5/7/20</b>
174	Pañete interior en muros	1 day	Wed 5/6/20	Wed 5/6/20
175	Pañete exterior en muros	1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20
176	Pañete en techo	0.5 days	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20
177	Fraguache en muros y techo	0.5 days	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20
178	Cantos y Mochetas	1 day	Wed 5/6/20	Wed 5/6/20
179	<b>TERMINACION PISOS:</b>	<b>2 days</b>	<b>Thu 5/7/20</b>	<b>Fri 5/8/20</b>
180	Pisos de Granito fondo blanco 0.4 m x 0.40 m	1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20
181	Zócalos de Granito fondo Blanco 0.07 m x 0.40 m	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20
182	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS:</b>	<b>6 days</b>	<b>Mon 5/4/20</b>	<b>Sat 5/9/20</b>
183	Salida cenitales de techo c/roceta	6 days	Mon 5/4/20	Sat 5/9/20
184	Salidas interruptores sencillo,	6 days	Mon 5/4/20	Sat 5/9/20
185	Salida tomacorriente doble normal 110V, polarizad	6 days	Mon 5/4/20	Sat 5/9/20
186	Alimentador desde Modulo de contador hasta Panel PA compuesto por : 2C #8 THW (1P/fase), 1C #10 THW (neutro), 1C # 10 THW (tierra) en tubería de 1"x19" PVC sdr-26	2 days	Thu 5/7/20	Fri 5/8/20
187	Registro eléctrico 6"x6"x4", N-1,	2 days	Thu 5/7/20	Fri 5/8/20
188	Mano de Obra	6 days	Mon 5/4/20	Sat 5/9/20
189	<b>PORTAJE Y VENTANAS :</b>	<b>1 day</b>	<b>Sat 5/9/20</b>	<b>Sat 5/9/20</b>
190	Puerta everdor (0.90 x 2.10) m	1 day	Sat 5/9/20	Sat 5/9/20
191	Ventanas salom. De alum. Y vidrio	1 day	Sat 5/9/20	Sat 5/9/20
192	<b>PINTURA:</b>	<b>3 days</b>	<b>Fri 5/8/20</b>	<b>Sun 5/10/20</b>
193	Pintura superior en techo	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20
194	Pintura acrílica en general	3 days	Fri 5/8/20	Sun 5/10/20
195	<b>TERMINACION DE TECHO</b>	<b>5 days</b>	<b>Mon 5/4/20</b>	<b>Fri 5/8/20</b>
196	Fino en techo plano, ep=0.05 m	1 day	Mon 5/4/20	Mon 5/4/20




*Handwritten signature*



Nombre: Complejo Jimenoa  
 Inicio: Mon 4/27/20  
 Terminación: Fri 7/17/20

Legend for Gantt chart symbols:

- Manual Task
- Duration-only
- Manual Summary Rollup
- Manual Summary
- Project Summary
- Inactive Task
- Inactive Milestone
- Inactive Summary
- Start-only
- Finish-only
- External Tasks
- External Milestone
- Deadline
- Progress
- Manual Progress

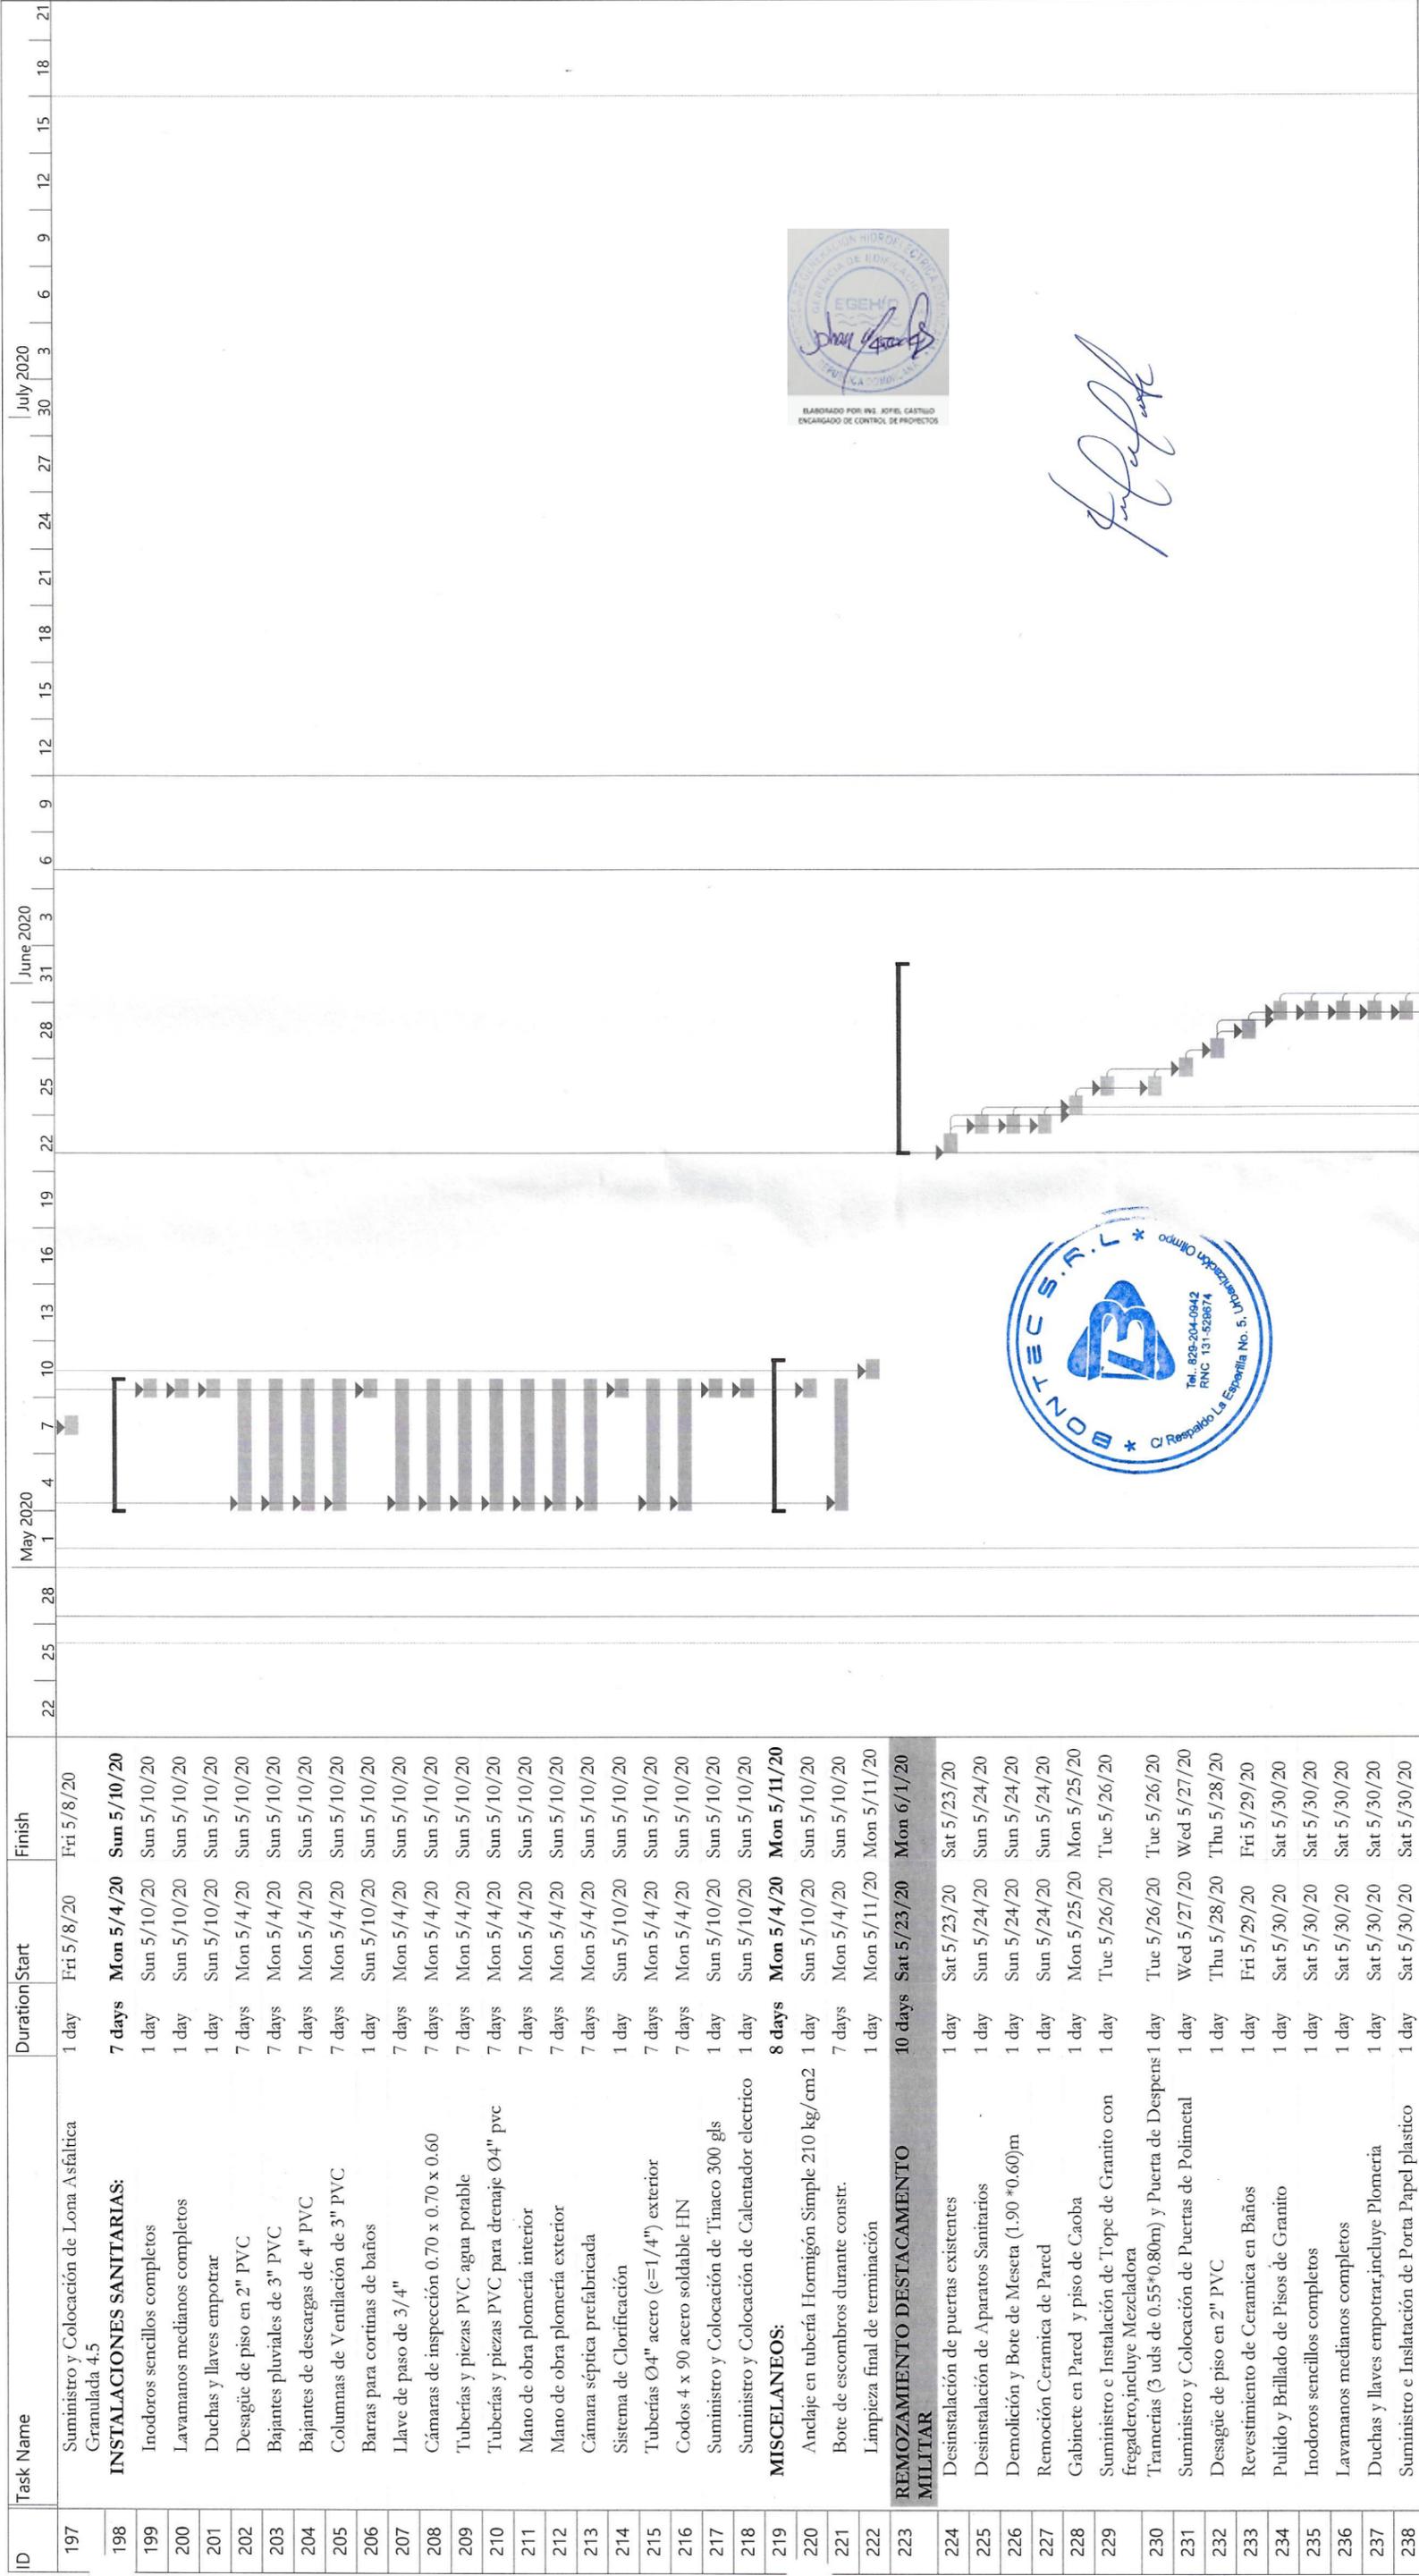

*Handwritten signature*

**Nombre:** Complejo Jimenoa  
**Inicio:** Mon 4/27/20  
**Terminación:** Fri 7/17/20


**Task** (Grey bar)  
**Split** (Dotted line)  
**Milestone** (Diamond)  
**Summary** (Thick bar)

**Project Summary** (Grey bar)  
**Inactive Task** (Dotted line)  
**Inactive Milestone** (Diamond)  
**Inactive Summary** (Thick bar)

**Manual Task** (Grey bar)  
**Duration-only** (Thin bar)  
**Manual Summary Rollup** (Thick bar)  
**Manual Summary** (Thin bar)

**Start-only** (Thin bar)  
**Finish-only** (Thin bar)  
**External Tasks** (Thin bar)  
**External Milestone** (Diamond)


**Deadline** (Arrow)  
**Progress** (Thin bar)  
**Manual Progress** (Thin bar)

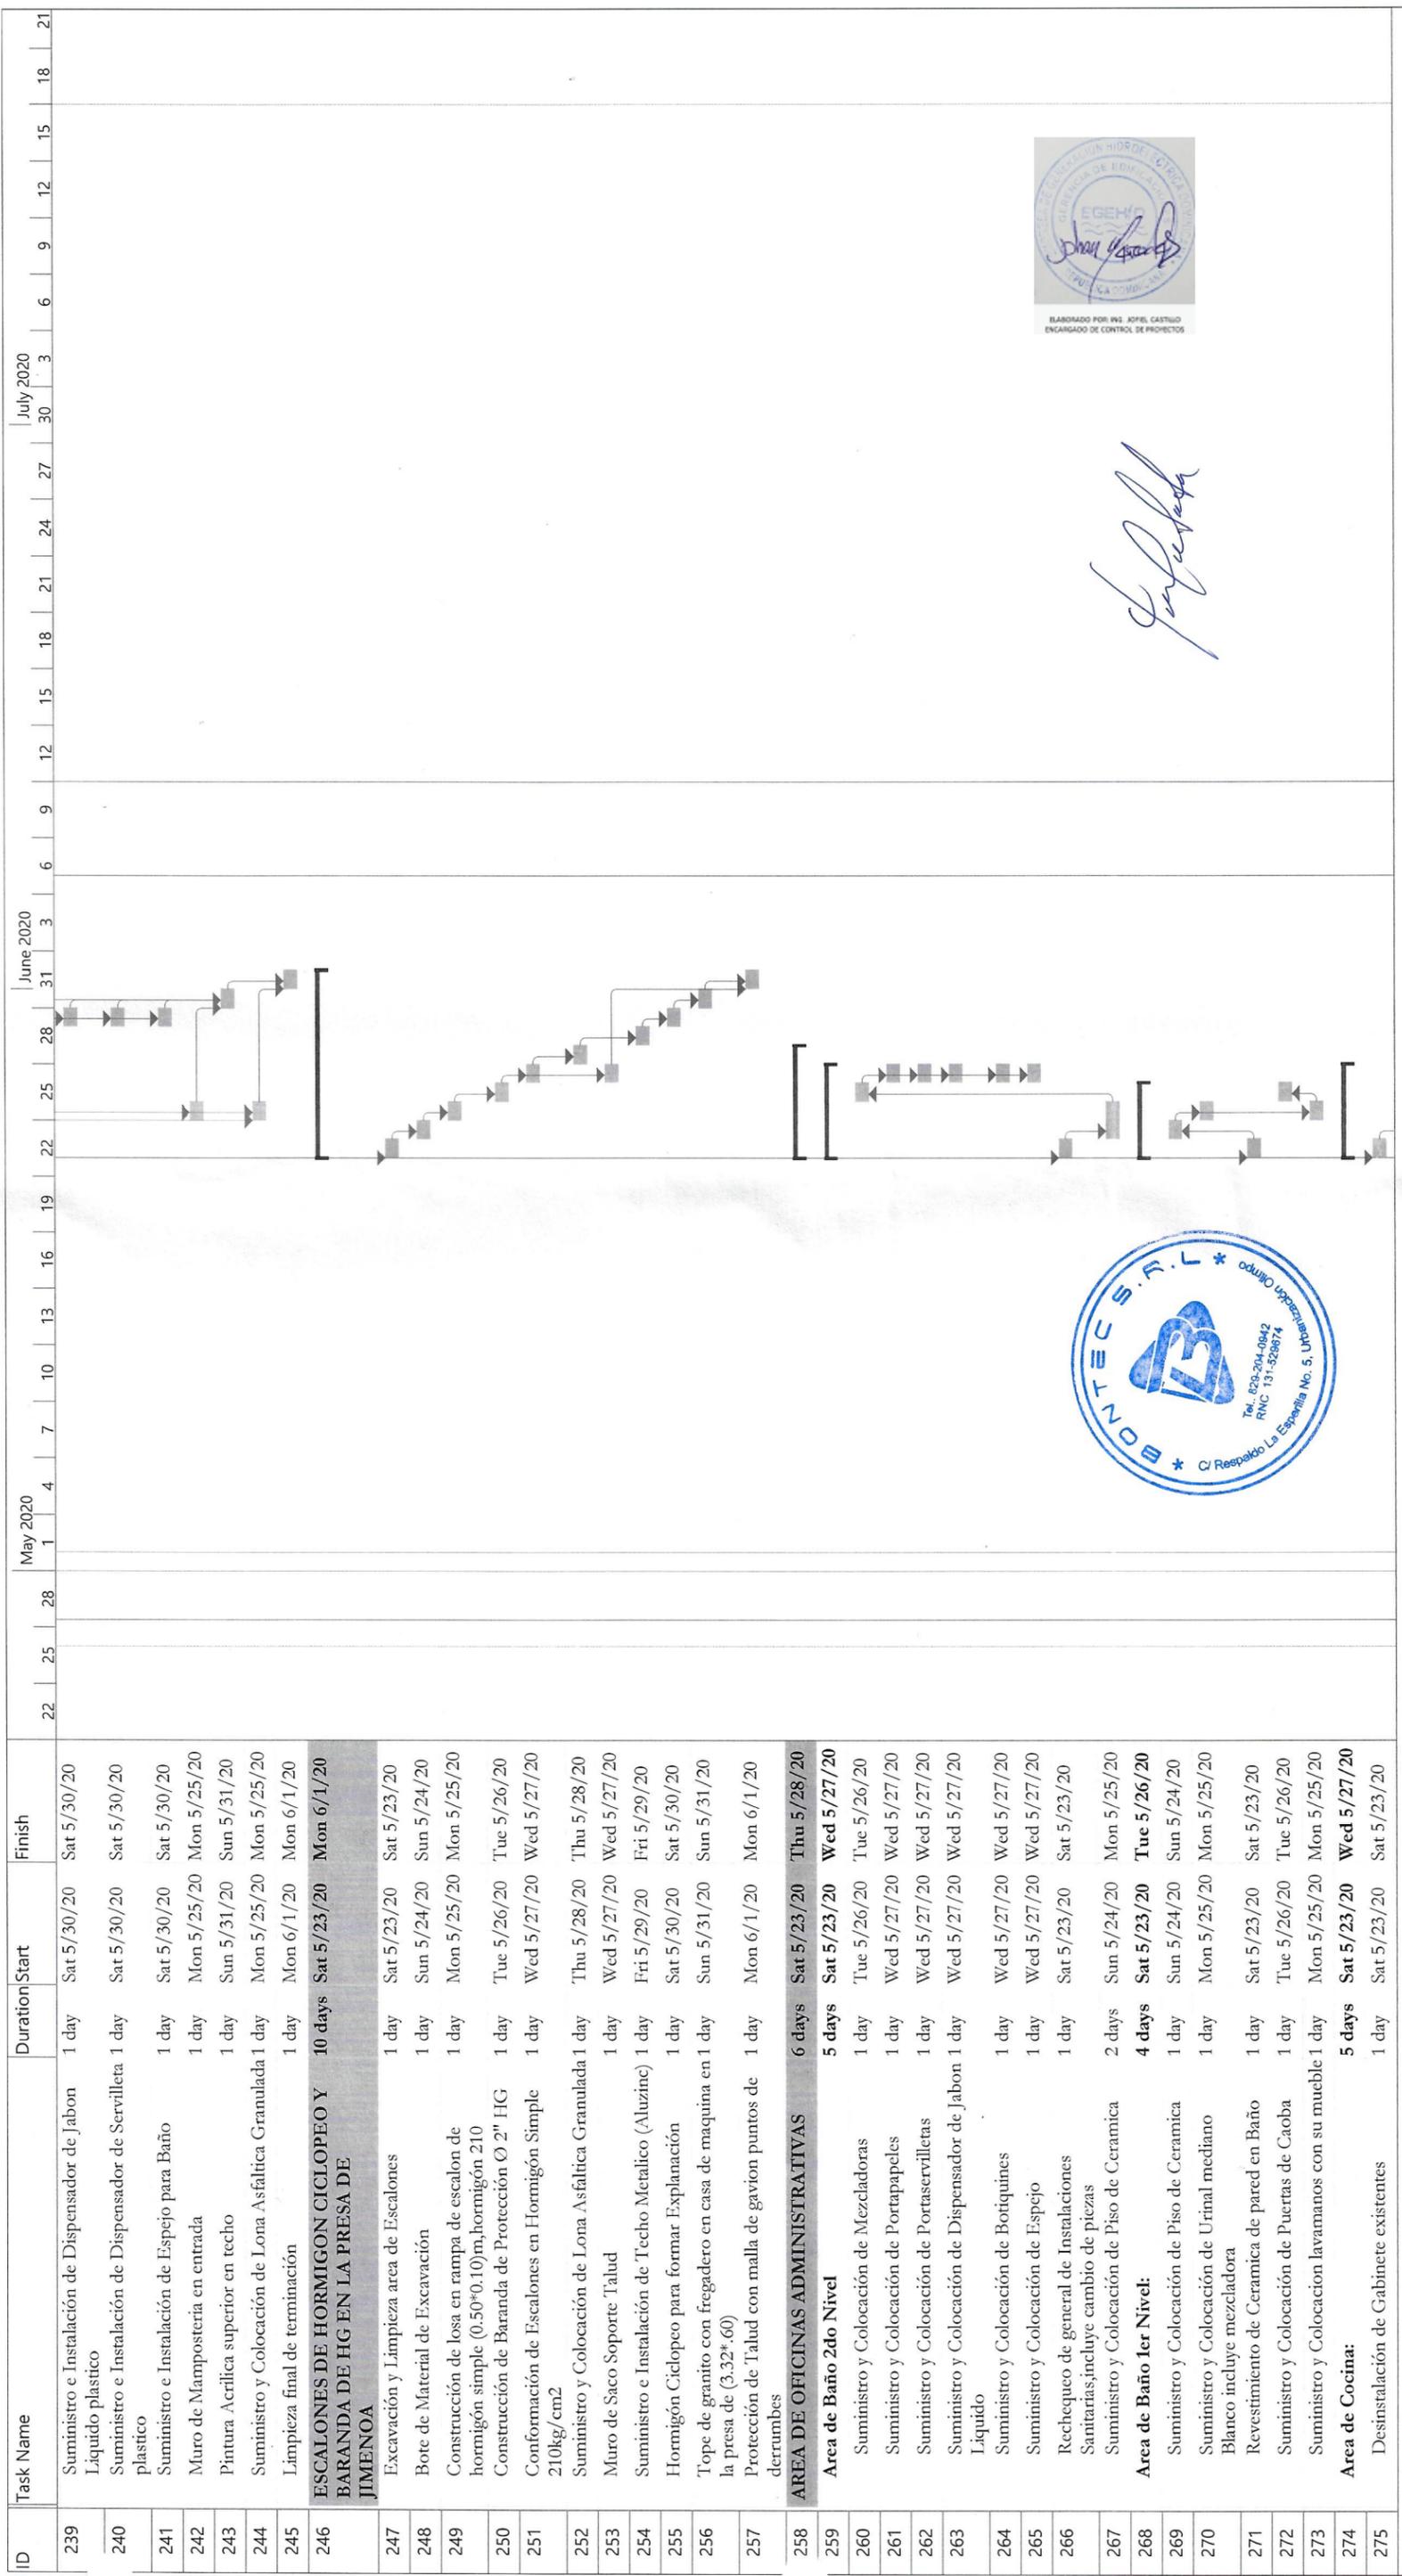

*[Handwritten signature]*

**Nombre: Complejo Jimenoa**  
**Inicio: Mon 4/27/20**  
**Terminación: Fri 7/17/20**


Legend:  
 Task: [Bar] Task  
 Split: [Dotted line] Split  
 Milestone: [Diamond] Milestone  
 Summary: [Bracket] Summary  
 Project Summary: [Thick bar] Project Summary  
 Inactive Task: [Dotted line] Inactive Task  
 Inactive Milestone: [Diamond] Inactive Milestone  
 Inactive Summary: [Bracket] Inactive Summary  
 Manual Task: [Thick bar] Manual Task  
 Duration-only: [Thin bar] Duration-only  
 Manual Summary Rollup: [Thick bar] Manual Summary Rollup  
 Manual Summary: [Bracket] Manual Summary  
 Start-only: [Thin bar] Start-only  
 Finish-only: [Thin bar] Finish-only  
 External Tasks: [Thin bar] External Tasks  
 External Milestone: [Diamond] External Milestone  
 Deadline: [Arrow] Deadline  
 Progress: [Thin bar] Progress  
 Manual Progress: [Thin bar] Manual Progress

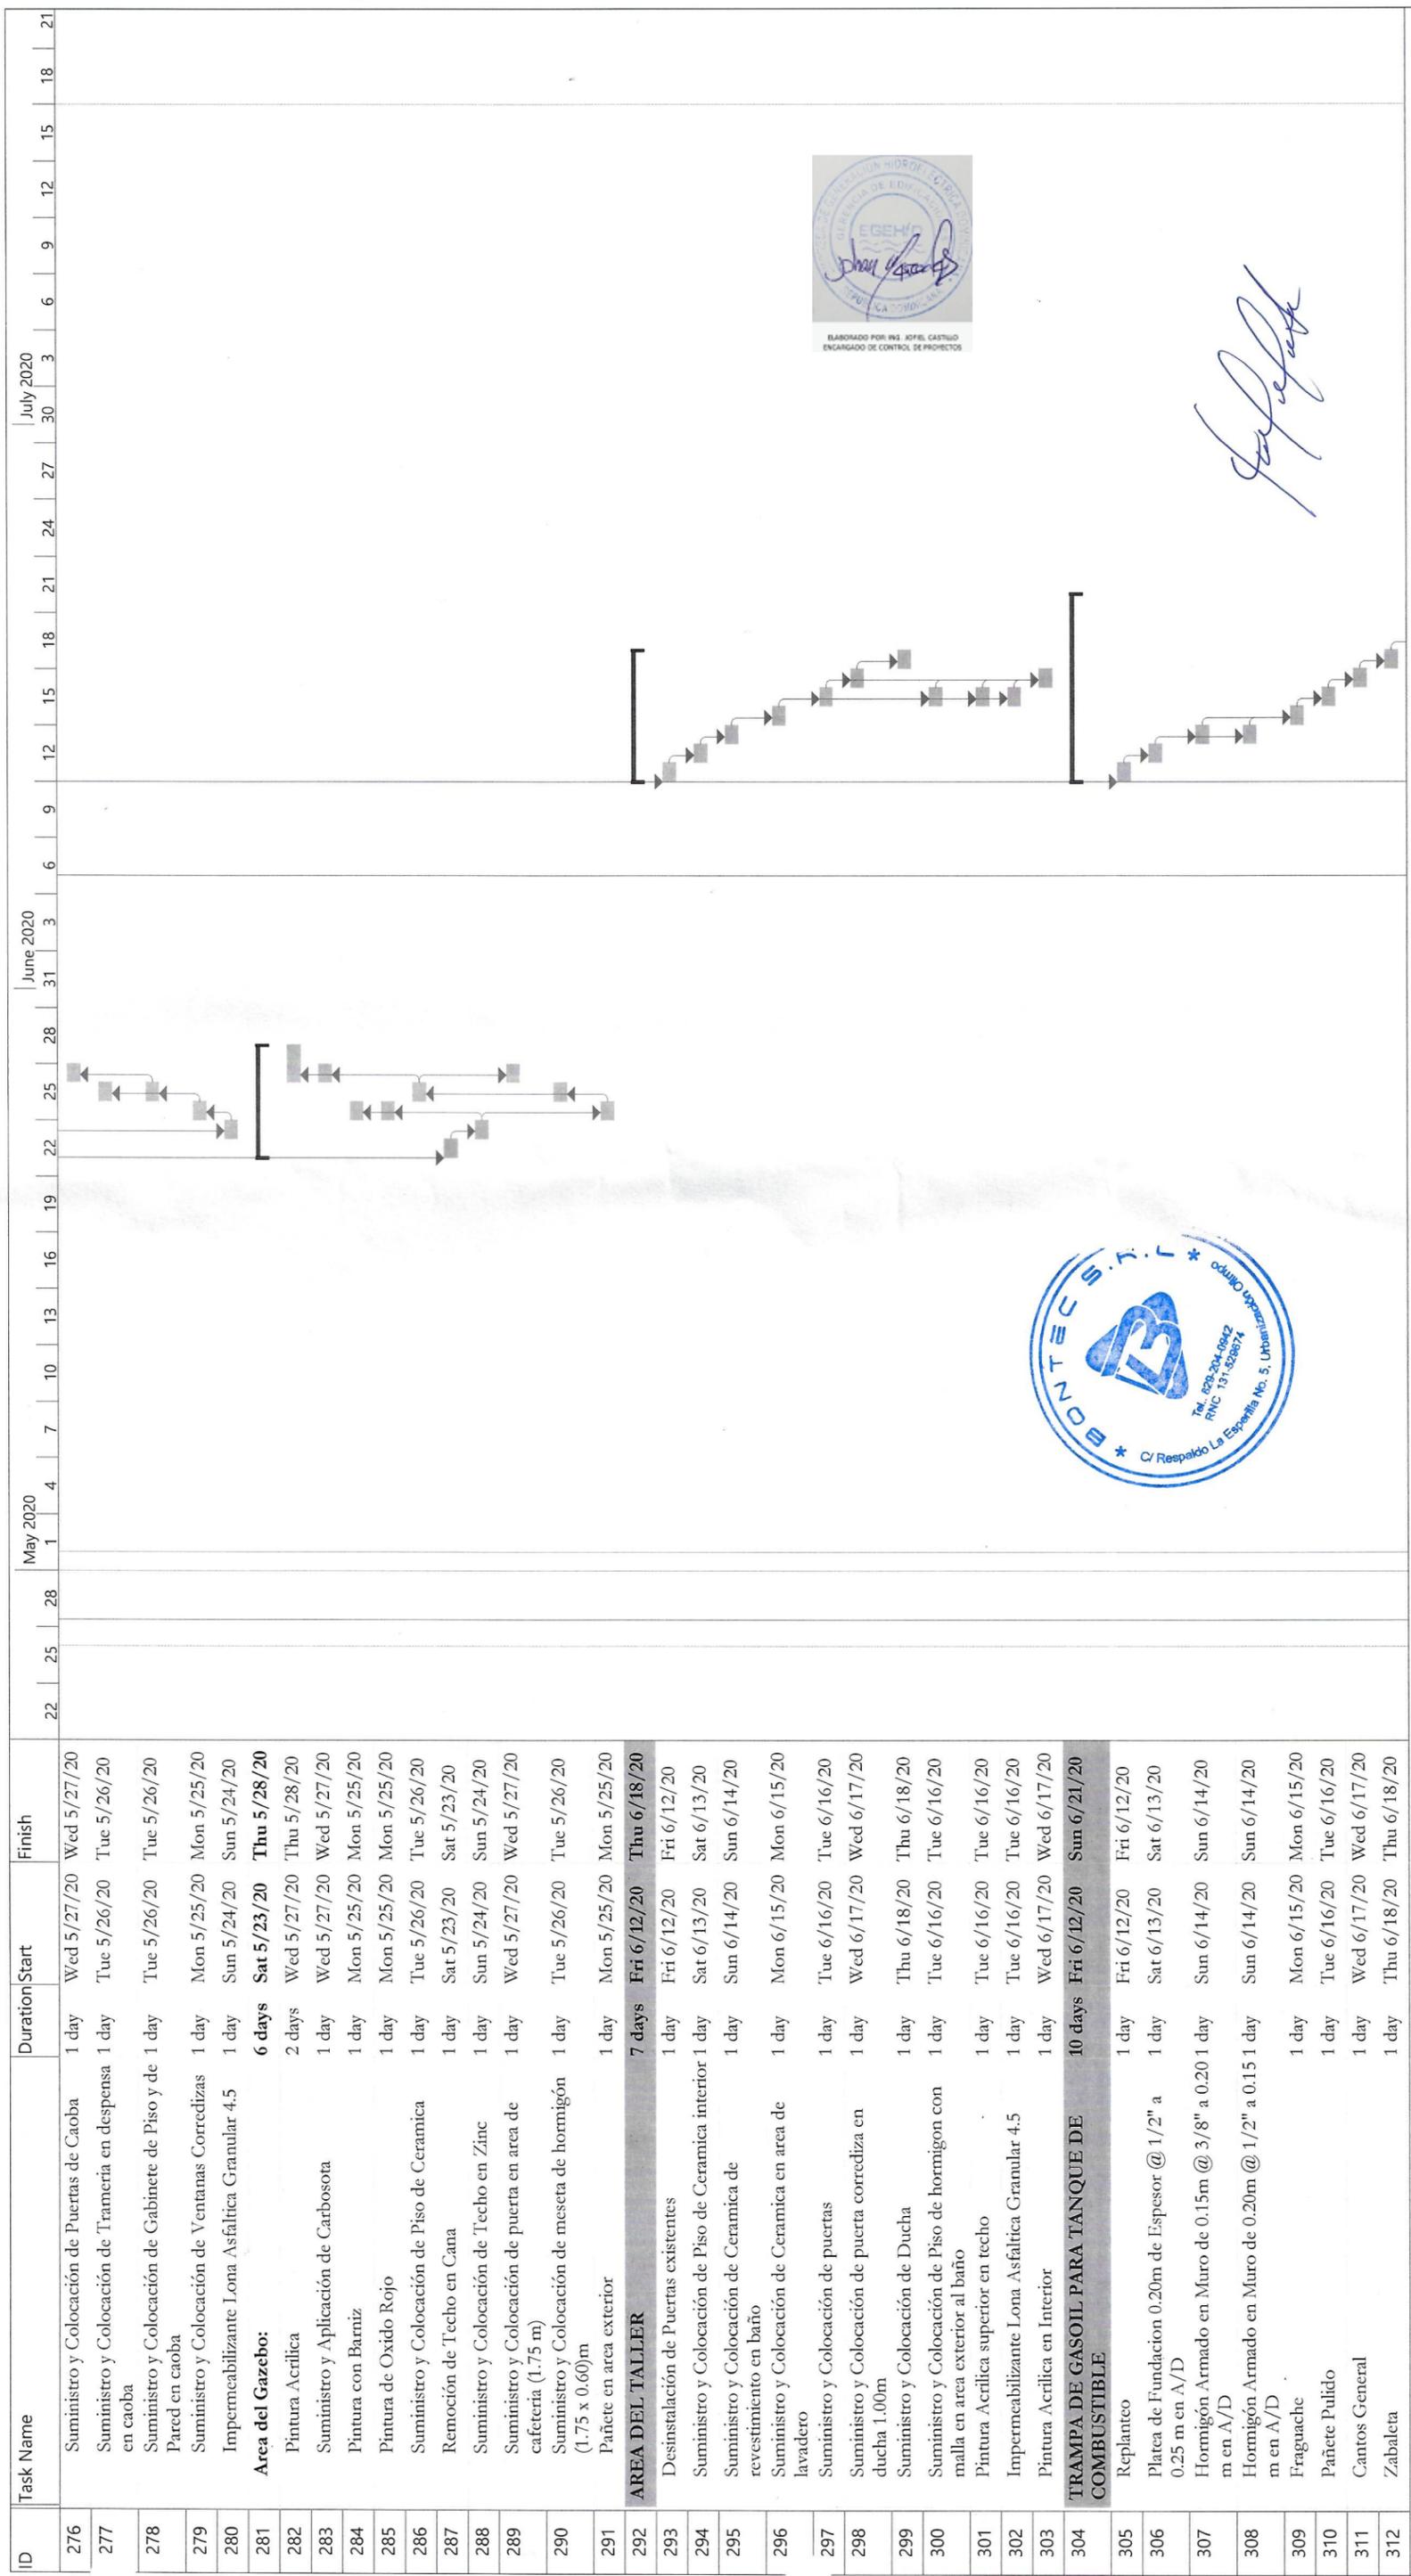

*Handwritten signature*

**Nombre:** Complejo Jimenoa  
**Inicio:** Mon 4/27/20  
**Terminación:** Fri 7/17/20

**Task Legend:**  
 Manual Task: [Solid Grey Bar]  
 Duration-only: [Light Grey Bar]  
 Manual Summary Rollup: [Thick Grey Bar]  
 Manual Summary: [Thin Grey Bar]  
 Project Summary: [Thick Grey Bar]  
 Inactive Task: [Dotted Line]  
 Inactive Milestone: [Dotted Line with Diamond]  
 Inactive Summary: [Dotted Line with Bar]  
 Start-only: [Thin Grey Bar]  
 Finish-only: [Thin Grey Bar]  
 External Tasks: [Thin Grey Bar]  
 External Milestone: [Thin Grey Bar with Diamond]  
 Deadline: [Arrow]  
 Progress: [Thin Grey Bar]  
 Manual Progress: [Thin Grey Bar]

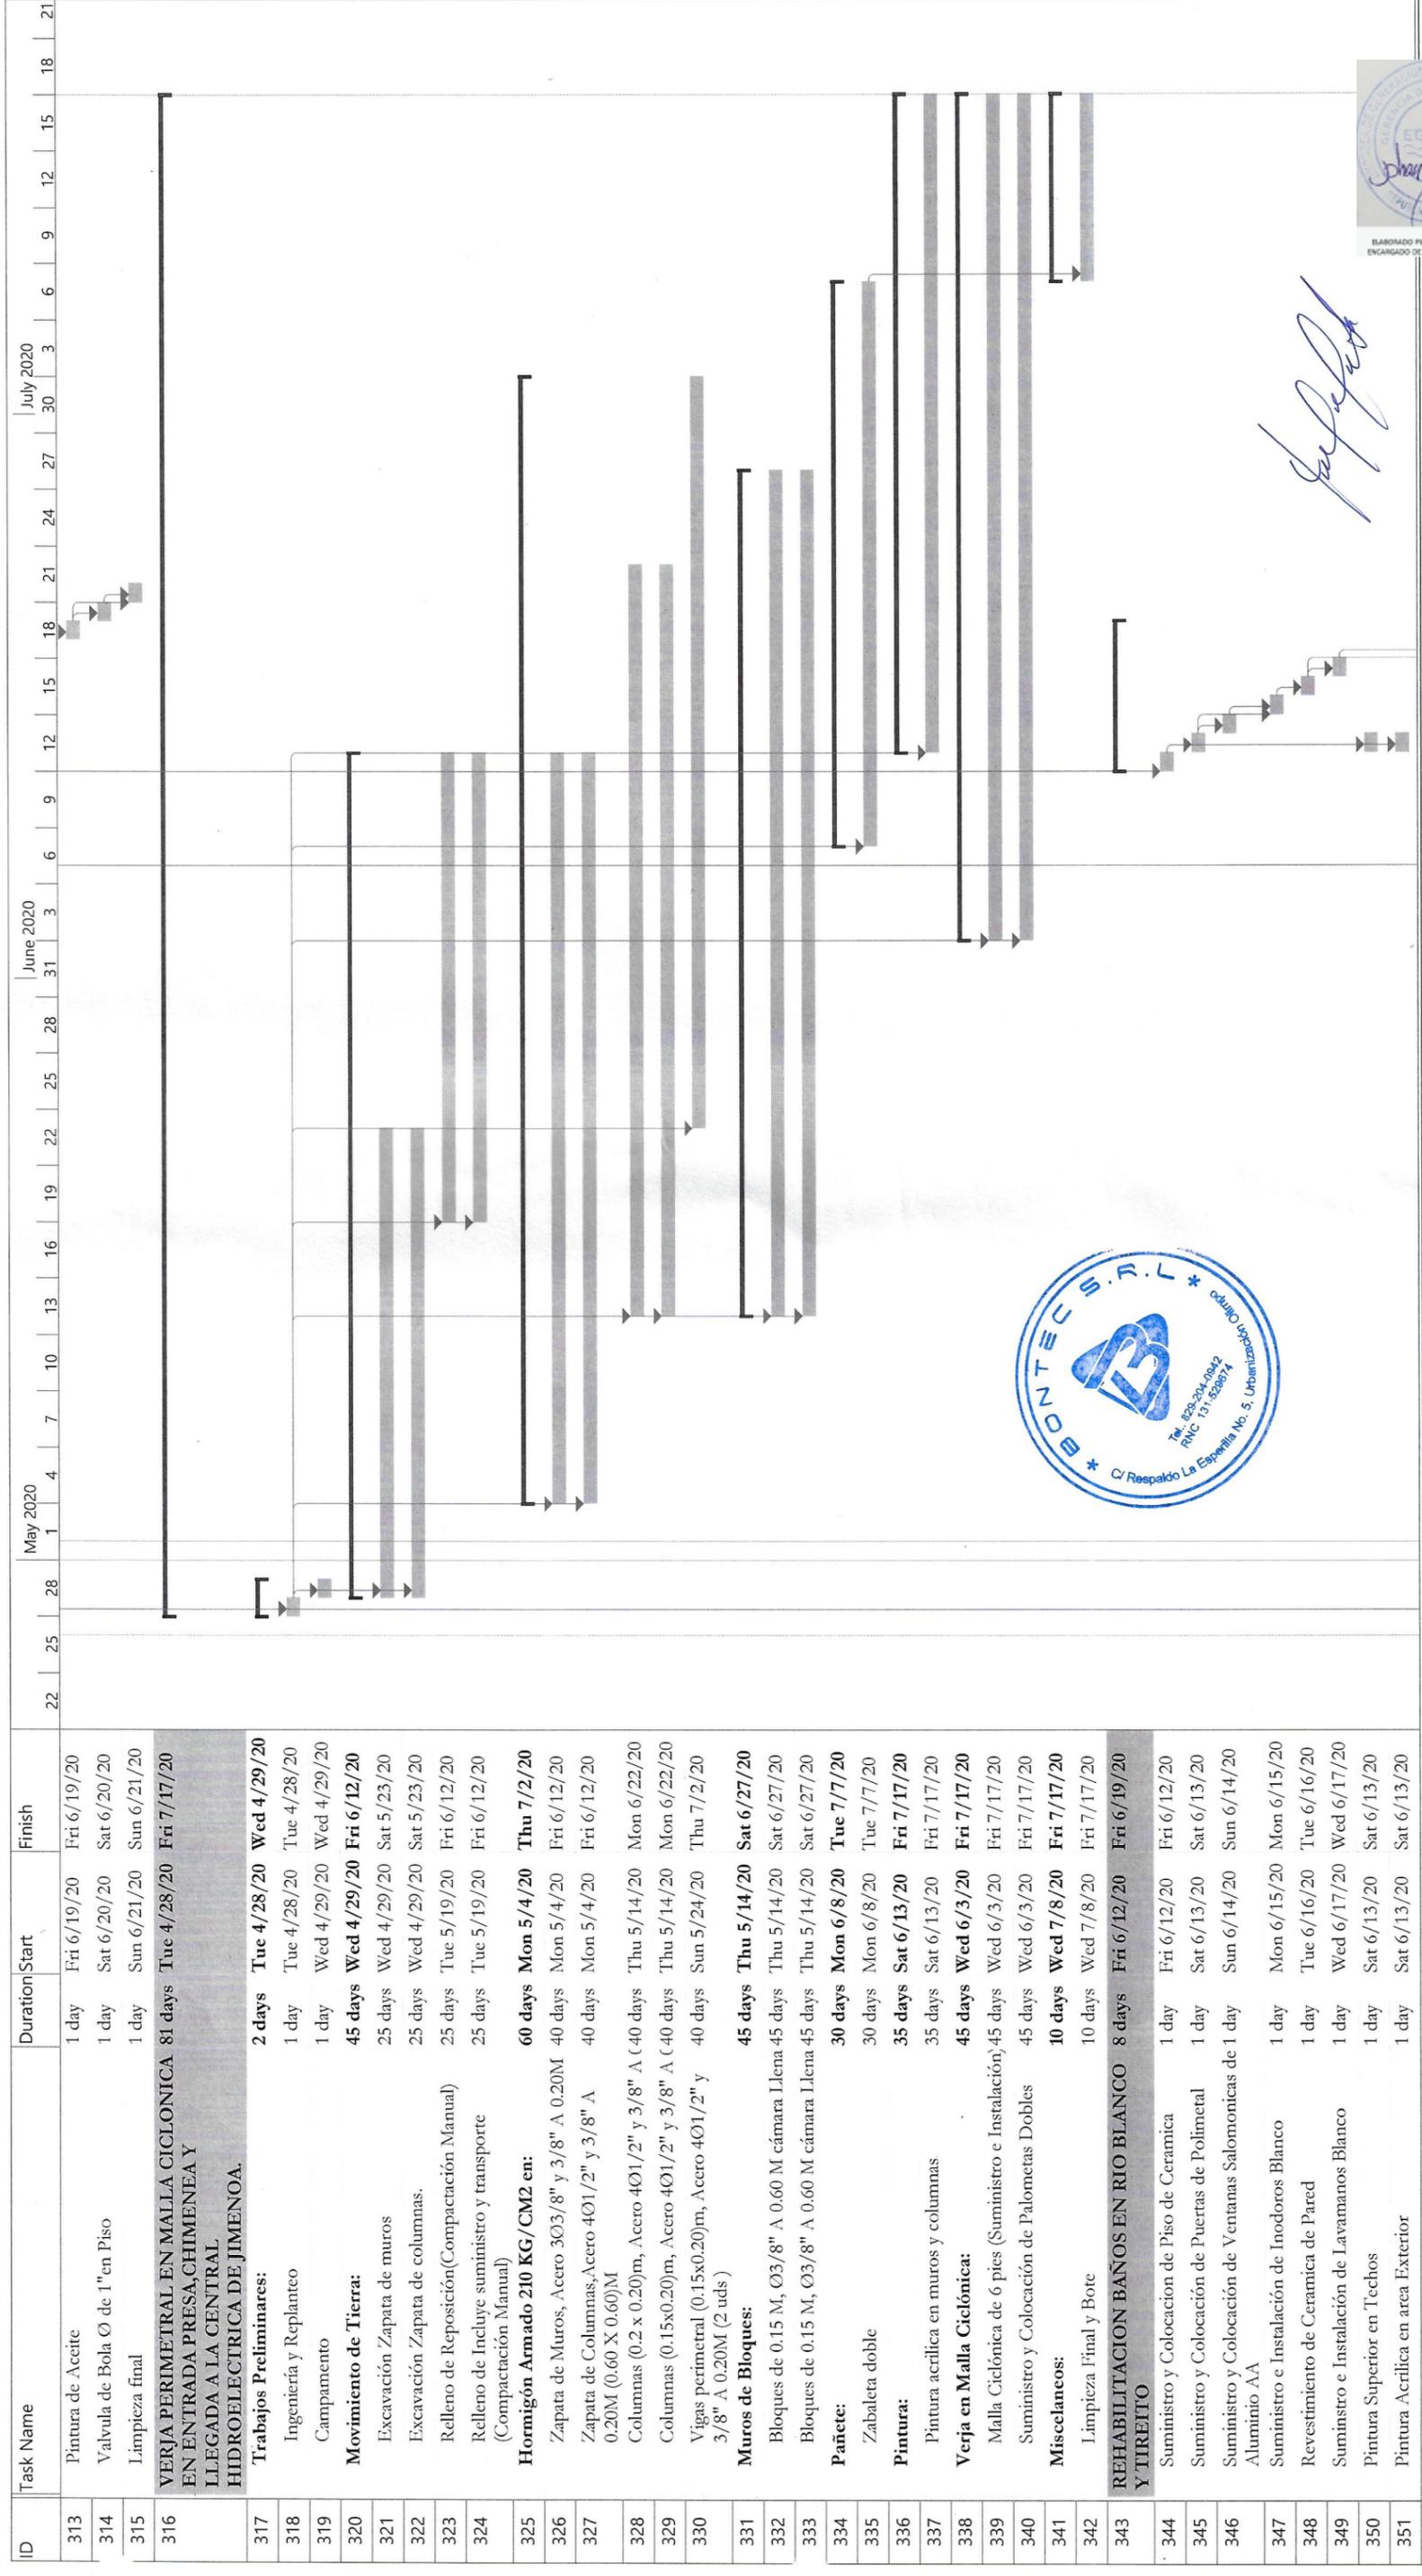

*Handwritten signature*



**Nombre:** Complejo Jimenoa  
**Inicio:** Mon 4/27/20  
**Terminación:** Fri 7/17/20

Legend:
 

- Task
- Split
- Milestone
- Summary
- Project Summary
- Inactive Task
- Inactive Milestone
- Inactive Summary
- Manual Task
- Duration-only
- Manual Summary Rollup
- Manual Summary
- Start-only
- Finish-only
- External Tasks
- External Milestone
- Deadline
- Progress
- Manual Progress

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
352	Suministro y Colocación de Portapapeles, dispensador de Jabon Líquido, Dispensador de Suministro e Instalación de Espejos para Baño	1 day	Thu 6/18/20	Thu 6/18/20
353	REHABILITACION PISCINA	38 days	Sun 6/7/20	Tue 7/14/20
355	Demolición General Area de Piscina	3 days	Sun 6/7/20	Tue 6/9/20
356	Bote General	1 day	Tue 6/30/20	Tue 6/30/20
357	Piso y Muros de Hormigón Doblemente Armado Ø1/2" a 0.20m en A/D	10 days	Wed 6/10/20	Fri 6/19/20
358	Suministro y Colocación de mosaico para Revestimiento Muros y Piso interior en Piscina	10 days	Sat 6/20/20	Mon 6/29/20
359	Suministro y Colocación de Piso Exterior em Coralin	10 days	Sun 7/5/20	Tue 7/14/20
360	Tuberías y Piezas en Area de Craga y Descarga	25 days	Wed 6/10/20	Sat 7/4/20
361	Suministro e Instalación de Bomba de 1.5 HP y Valvula Selectora de 6 posiciones y filtro de 32	1 day	Sun 7/5/20	Sun 7/5/20
362	Suministro e Instalación de Desague de Piso	1 day	Sun 7/5/20	Sun 7/5/20
363	Suministro e Instalación de Skinner	1 day	Sun 7/5/20	Sun 7/5/20
364	Suministro e Instalación de Jet	1 day	Sat 6/20/20	Sat 6/20/20
365	Suministro e Instalación de Luces	1 day	Sat 6/20/20	Sat 6/20/20
366	Pozo Filtrante de 200 pies	1 day	Sun 7/5/20	Sun 7/5/20
367	ALCANTARILLA TUBULAR DE 42"	15 days	Tue 4/28/20	Tue 5/12/20
368	Replanteo	1 day	Tue 4/28/20	Tue 4/28/20
369	Excavación	10 days	Wed 4/29/20	Fri 5/8/20
370	Asiento de Arena	10 days	Fri 5/1/20	Sun 5/10/20
371	Suministro, Colocación y Transporte de Alcantarillas de 42"	10 days	Fri 5/1/20	Sun 5/10/20
372	Relleno de reposición	10 days	Sat 5/2/20	Mon 5/11/20
373	Bote	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20
374	GASTOS INDIRECTOS	82 days?	Mon 4/27/20	Fri 7/17/20
375	Dirección Técnica	82 days?	Mon 4/27/20	Fri 7/17/20
376	Gastos Administrativos	82 days?	Mon 4/27/20	Fri 7/17/20
377	Seguro y Fianzas	82 days?	Mon 4/27/20	Fri 7/17/20
378	Liquidación de Obreros	82 days?	Mon 4/27/20	Fri 7/17/20
379	Imprevistos	82 days?	Mon 4/27/20	Fri 7/17/20
380	18% ITBIS A Dirección Técnica	82 days?	Mon 4/27/20	Fri 7/17/20



*Handwritten signature*

<p>Nombre: Complejo Jimenoa</p> <p>Inicio: Mon 4/27/20</p> <p>Terminación: Fri 7/17/20</p>	<p>Task</p> <p>Split</p> <p>Milestone</p> <p>Summary</p>	<p>Project Summary</p> <p>Inactive Task</p> <p>Inactive Milestone</p> <p>Inactive Summary</p>	<p>Manual Task</p> <p>Duration-only</p> <p>Manual Summary Rollup</p> <p>Manual Summary</p>	<p>Start-only</p> <p>Finish-only</p> <p>External Tasks</p> <p>External Milestone</p>	<p>Deadline</p> <p>Progress</p> <p>Manual Progress</p>
--	--	---	--	--	--
