



ID	Tarea	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessor Names
1	CUARTEL POLICIAL	78 days	Mon 4/13/20	Wed 7/29/20		
2	PRIMER NIVEL	43 days	Mon 4/13/20	Wed 6/10/20		
3	PARTIDAS GENERALES	4 days	Mon 4/13/20	Thu 4/15/20		
4	Limpieza y Replanteo	2 days	Mon 4/13/20	Tue 4/14/20		
5	Induye charrencia	2 days	Wed 4/15/20	Thu 4/16/20		
6	Caseta de Materiales	2 days	Wed 4/15/20	Thu 4/16/20		
7	MOVIMIENTO DE TIERRA 15 days	15 days	Fri 4/17/20	Thu 5/7/20		
8	Demolicion de	2 days	Fri 4/17/20	Mon 4/20/20		
9	Estructuras de Hormigon	3 days	Tue 4/21/20	Thu 4/23/20		
10	Excavacion en Material C2	2 days	Fri 4/24/20	Mon 4/27/20		
11	Excavacion Zanja de Mz	2 days	Tue 4/28/20	Wed 4/29/20		
12	Excavacion C1	2 days	Tue 4/28/20	Wed 4/29/20		
13	Replanteo de Responsion	1 day	Wed 5/6/20	Wed 5/6/20		
14	Replanteo Competicion en 1 day	1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20		
15	Puro de Herrerado	1 day	Thu 4/30/20	Thu 4/30/20		
16	HORIBICON ARMADO EK 32 days	32 days	Mon 4/13/20	Tue 5/25/20		
17	Zapatas para a Muros de	4 days	Thu 4/30/20	Tue 5/12/20		
18	Borcas 2, 210kg/cm2	4 days	Thu 4/30/20	Tue 5/12/20		
19	Borcas 4, 210kg/cm2	4 days	Thu 4/30/20	Tue 5/12/20		
20	Zanja para Columnas	4 days	Thu 4/30/20	Tue 5/12/20		
21	C2 0.80M/0.80M	4 days	Thu 4/30/20	Tue 5/12/20		
22	Columnas de Amarré	4 days	Wed 5/6/20	Mon 5/11/20		
23	Columnas Circulares de 14	4 days	Wed 5/6/20	Mon 5/11/20		
24	Vigas de Amarré	4 days	Wed 5/6/20	Mon 5/11/20		
25	Vigas 0.10x2.0	4 days	Wed 5/6/20	Mon 5/11/20		
26	Vigas 0.20x0.30m a	4 days	Wed 5/6/20	Mon 5/11/20		
27	Dielat Puerta Frontal	1 day	Wed 5/6/20	Wed 5/6/20		
28	Relanzado Plancha 14	30m x 2.0m	Tue 5/12/20	Wed 5/13/20		
29	Losa de Techo en 14m	4 days	Tue 5/12/20	Fri 5/15/20		
30	Muros de Bloques	1 day	Mon 4/13/20	Mon 4/13/20		
31	Borcas Hom. 6" 0.127	7 days	Mon 5/18/20	Tue 5/19/20		
32	Borcas Hom. 6" 0.127	7 days	Mon 5/18/20	Tue 5/19/20		
33	Borcas Hom. 4" 0.127	2 days	Mon 5/18/20	Tue 5/19/20		
34	Borcas Hom. 4" 0.127	4 days	Mon 5/18/20	Thu 5/21/20		
35	TERMINACION DE SUPER 7 days	7 days	Mon 5/18/20	Tue 5/25/20		
36	Paralelo en Muros Exteriores	5 days	Wed 5/20/20	Thu 5/21/20		
37	Paralelo en Muros Exteriores	5 days	Wed 5/20/20	Thu 5/21/20		
38	Foguetada sobre superficie	3 days	Wed 5/20/20	Fri 5/22/20		
39	Cortes en general	3 days	Fri 5/22/20	Tue 5/25/20		
40	Estrías o alto relieve	2 days	Fri 5/22/20	Mon 5/25/20		
41	VENIVANAS	6 days	Wed 5/27/20	Wed 6/3/20		
42	Ventanas Cortadas de 4	4 days	Wed 5/27/20	Mon 6/1/20		
43	Aluminio y Cristal	2 days	Tue 6/2/20	Wed 6/3/20		
44	Puertas en Aluminio y Cristal	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20		
45	Puertas en Aluminio y Cristal	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20		
46	Puertas en Aluminio y Cristal	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20		
47	Puertas en Aluminio y Cristal	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20		
48	Puertas en Aluminio y Cristal	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20		
49	Puertas en Aluminio y Cristal	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20		
50	Riglas Hierro en acrílicas	2 days	Mon 6/1/20	Mon 6/1/20		
51	Gabinete de Pied en 1 day	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20		
52	Tubo de Galva Natural	1 day	Tue 6/2/20	Tue 6/2/20		
53	TERMINACION DE PISO 7 days	7 days	Tue 5/26/20	Wed 6/3/20		
54	Piso en Pisos	3 days	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20		
55	Zoclos de piso	3 days	Mon 6/1/20	Wed 6/3/20		
56	Acera (Vehículo en 3 days	3 days	Tue 5/26/20	Thu 5/28/20		
57	Acera (Vehículo en 3 days	3 days	Tue 5/26/20	Thu 5/28/20		
58	REVESTIMIENTO EN PARED 2 days	2 days	Wed 5/27/20	Thu 5/28/20		
59	Ceramica empastada	2 days	Wed 5/27/20	Thu 5/28/20		
60	Instalaciones sanitarias	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20		
61	Instalaciones sanitarias	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20		
62	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		
63	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		
64	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		
65	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		
66	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		
67	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		
68	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		
69	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		
70	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		
71	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		
72	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		
73	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		
74	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		
75	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		
76	Instalaciones sanitarias	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20		

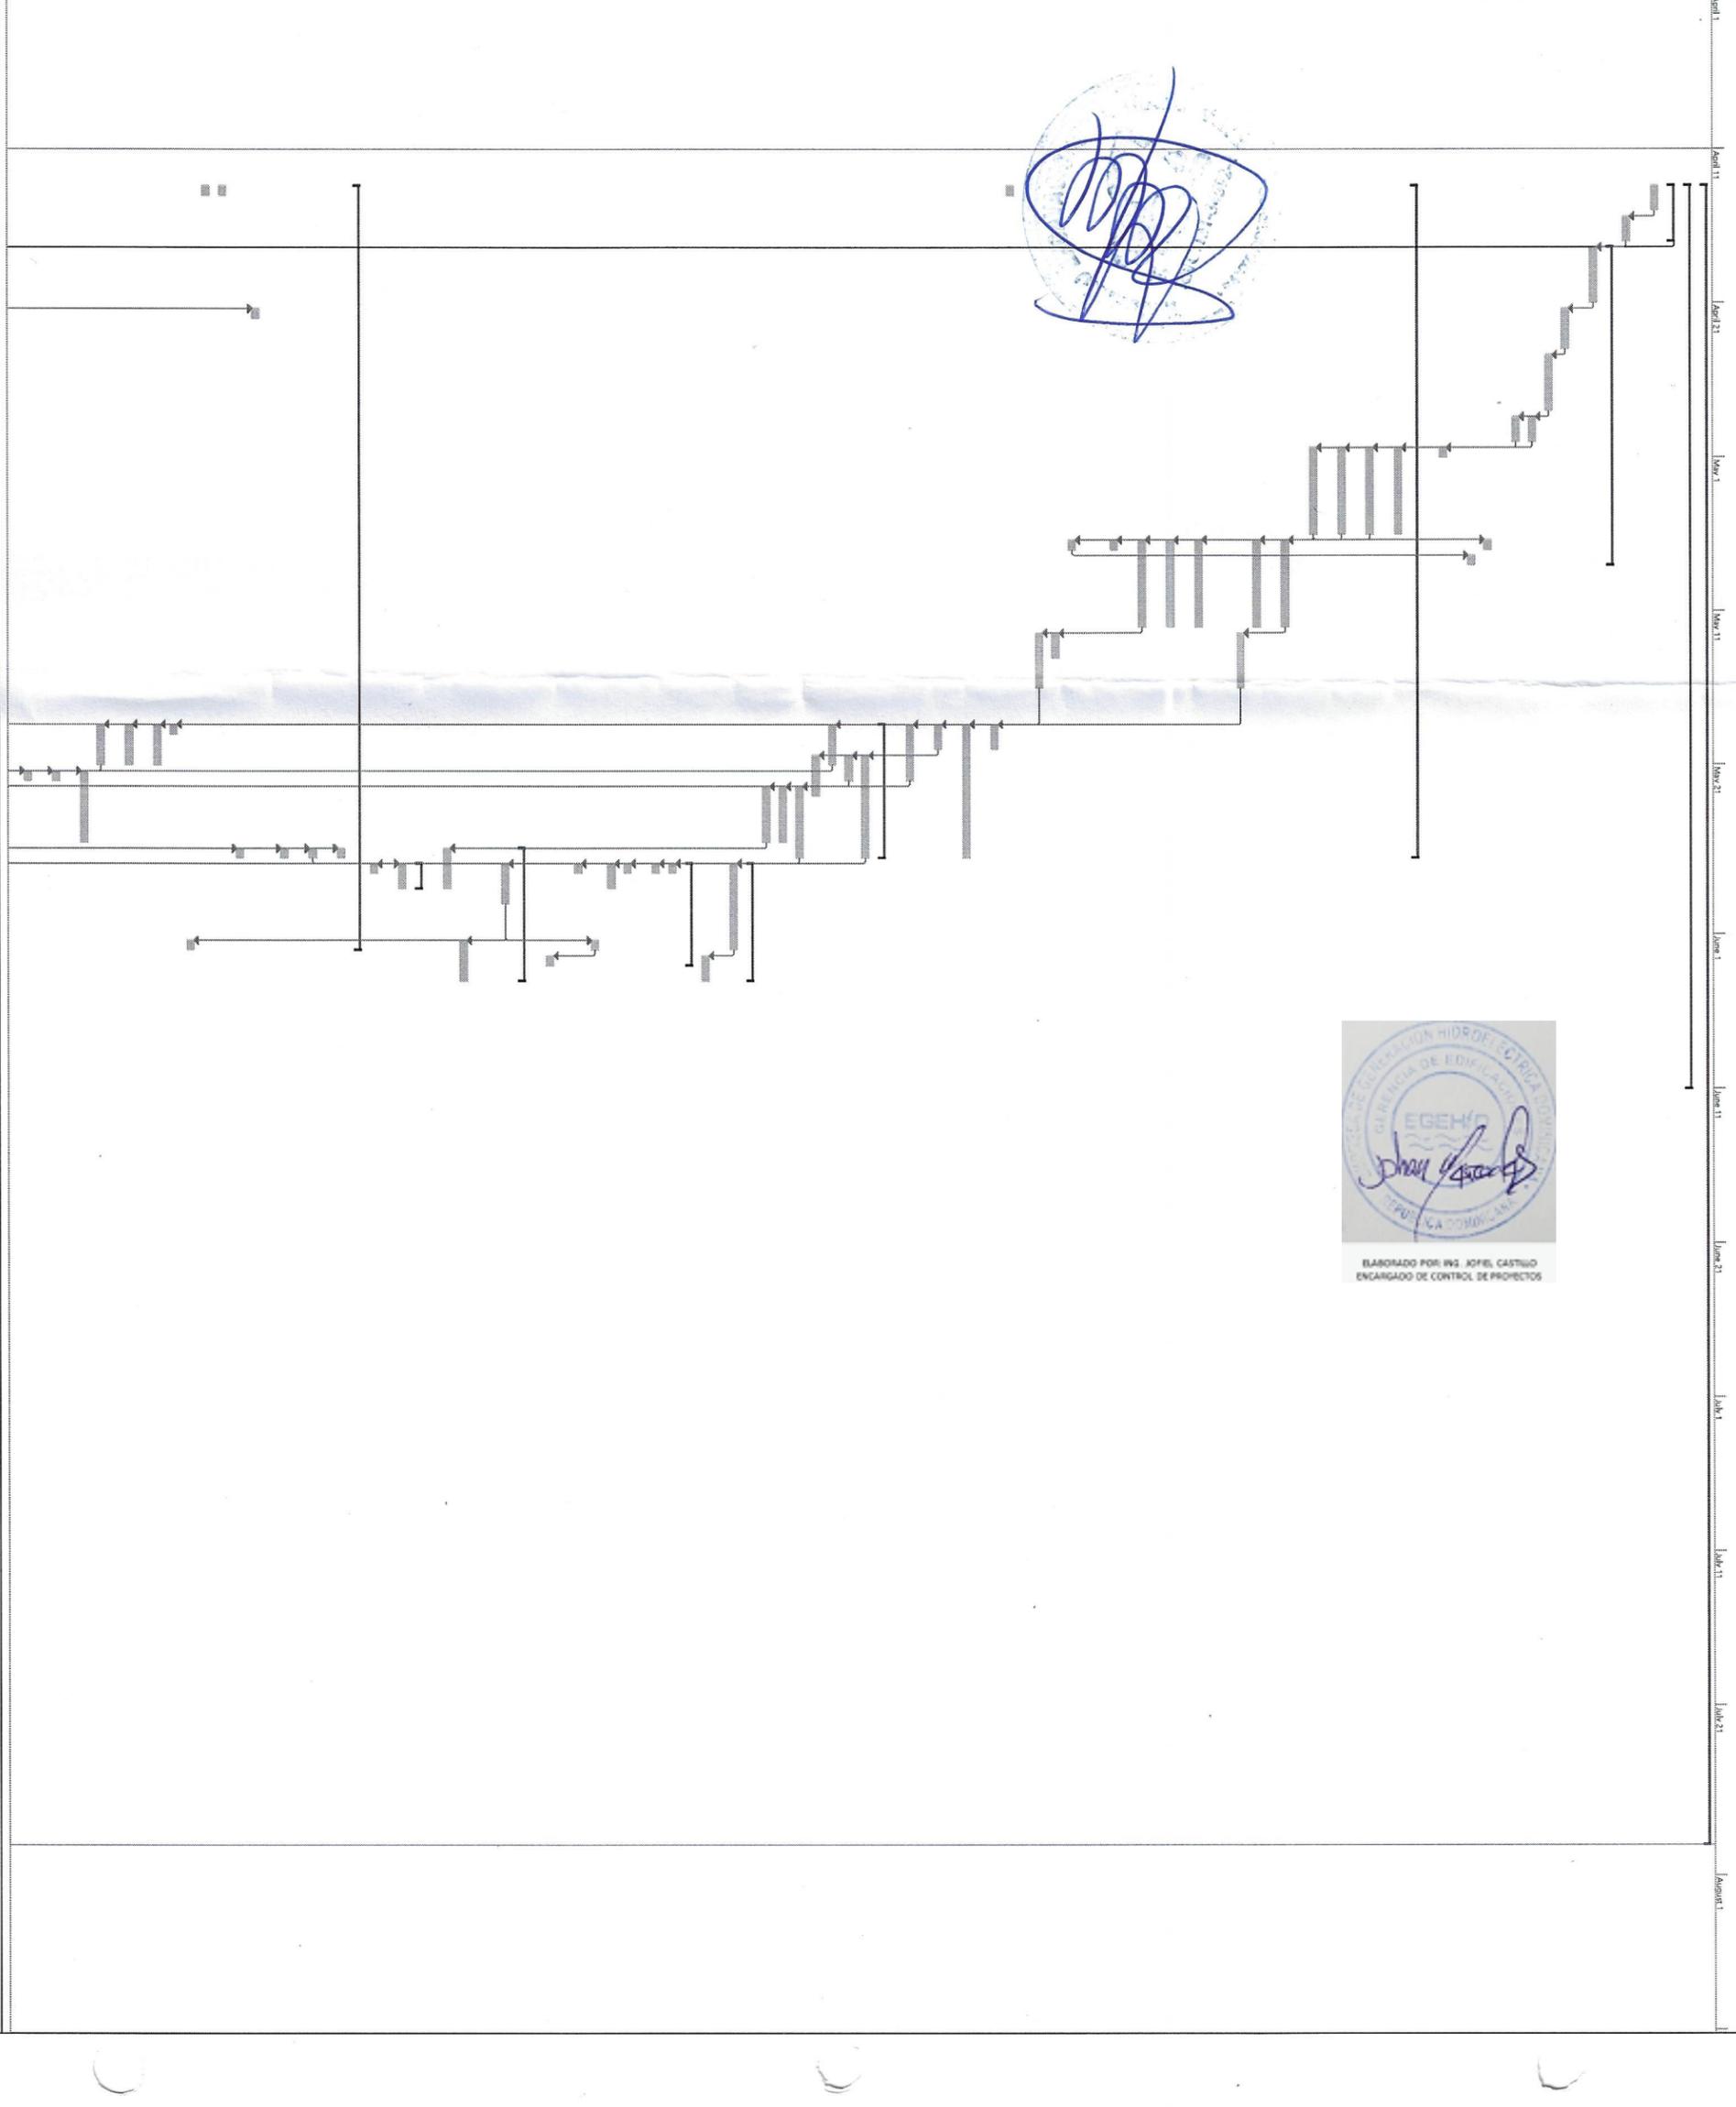

ELABORADO POR ING. JOSE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

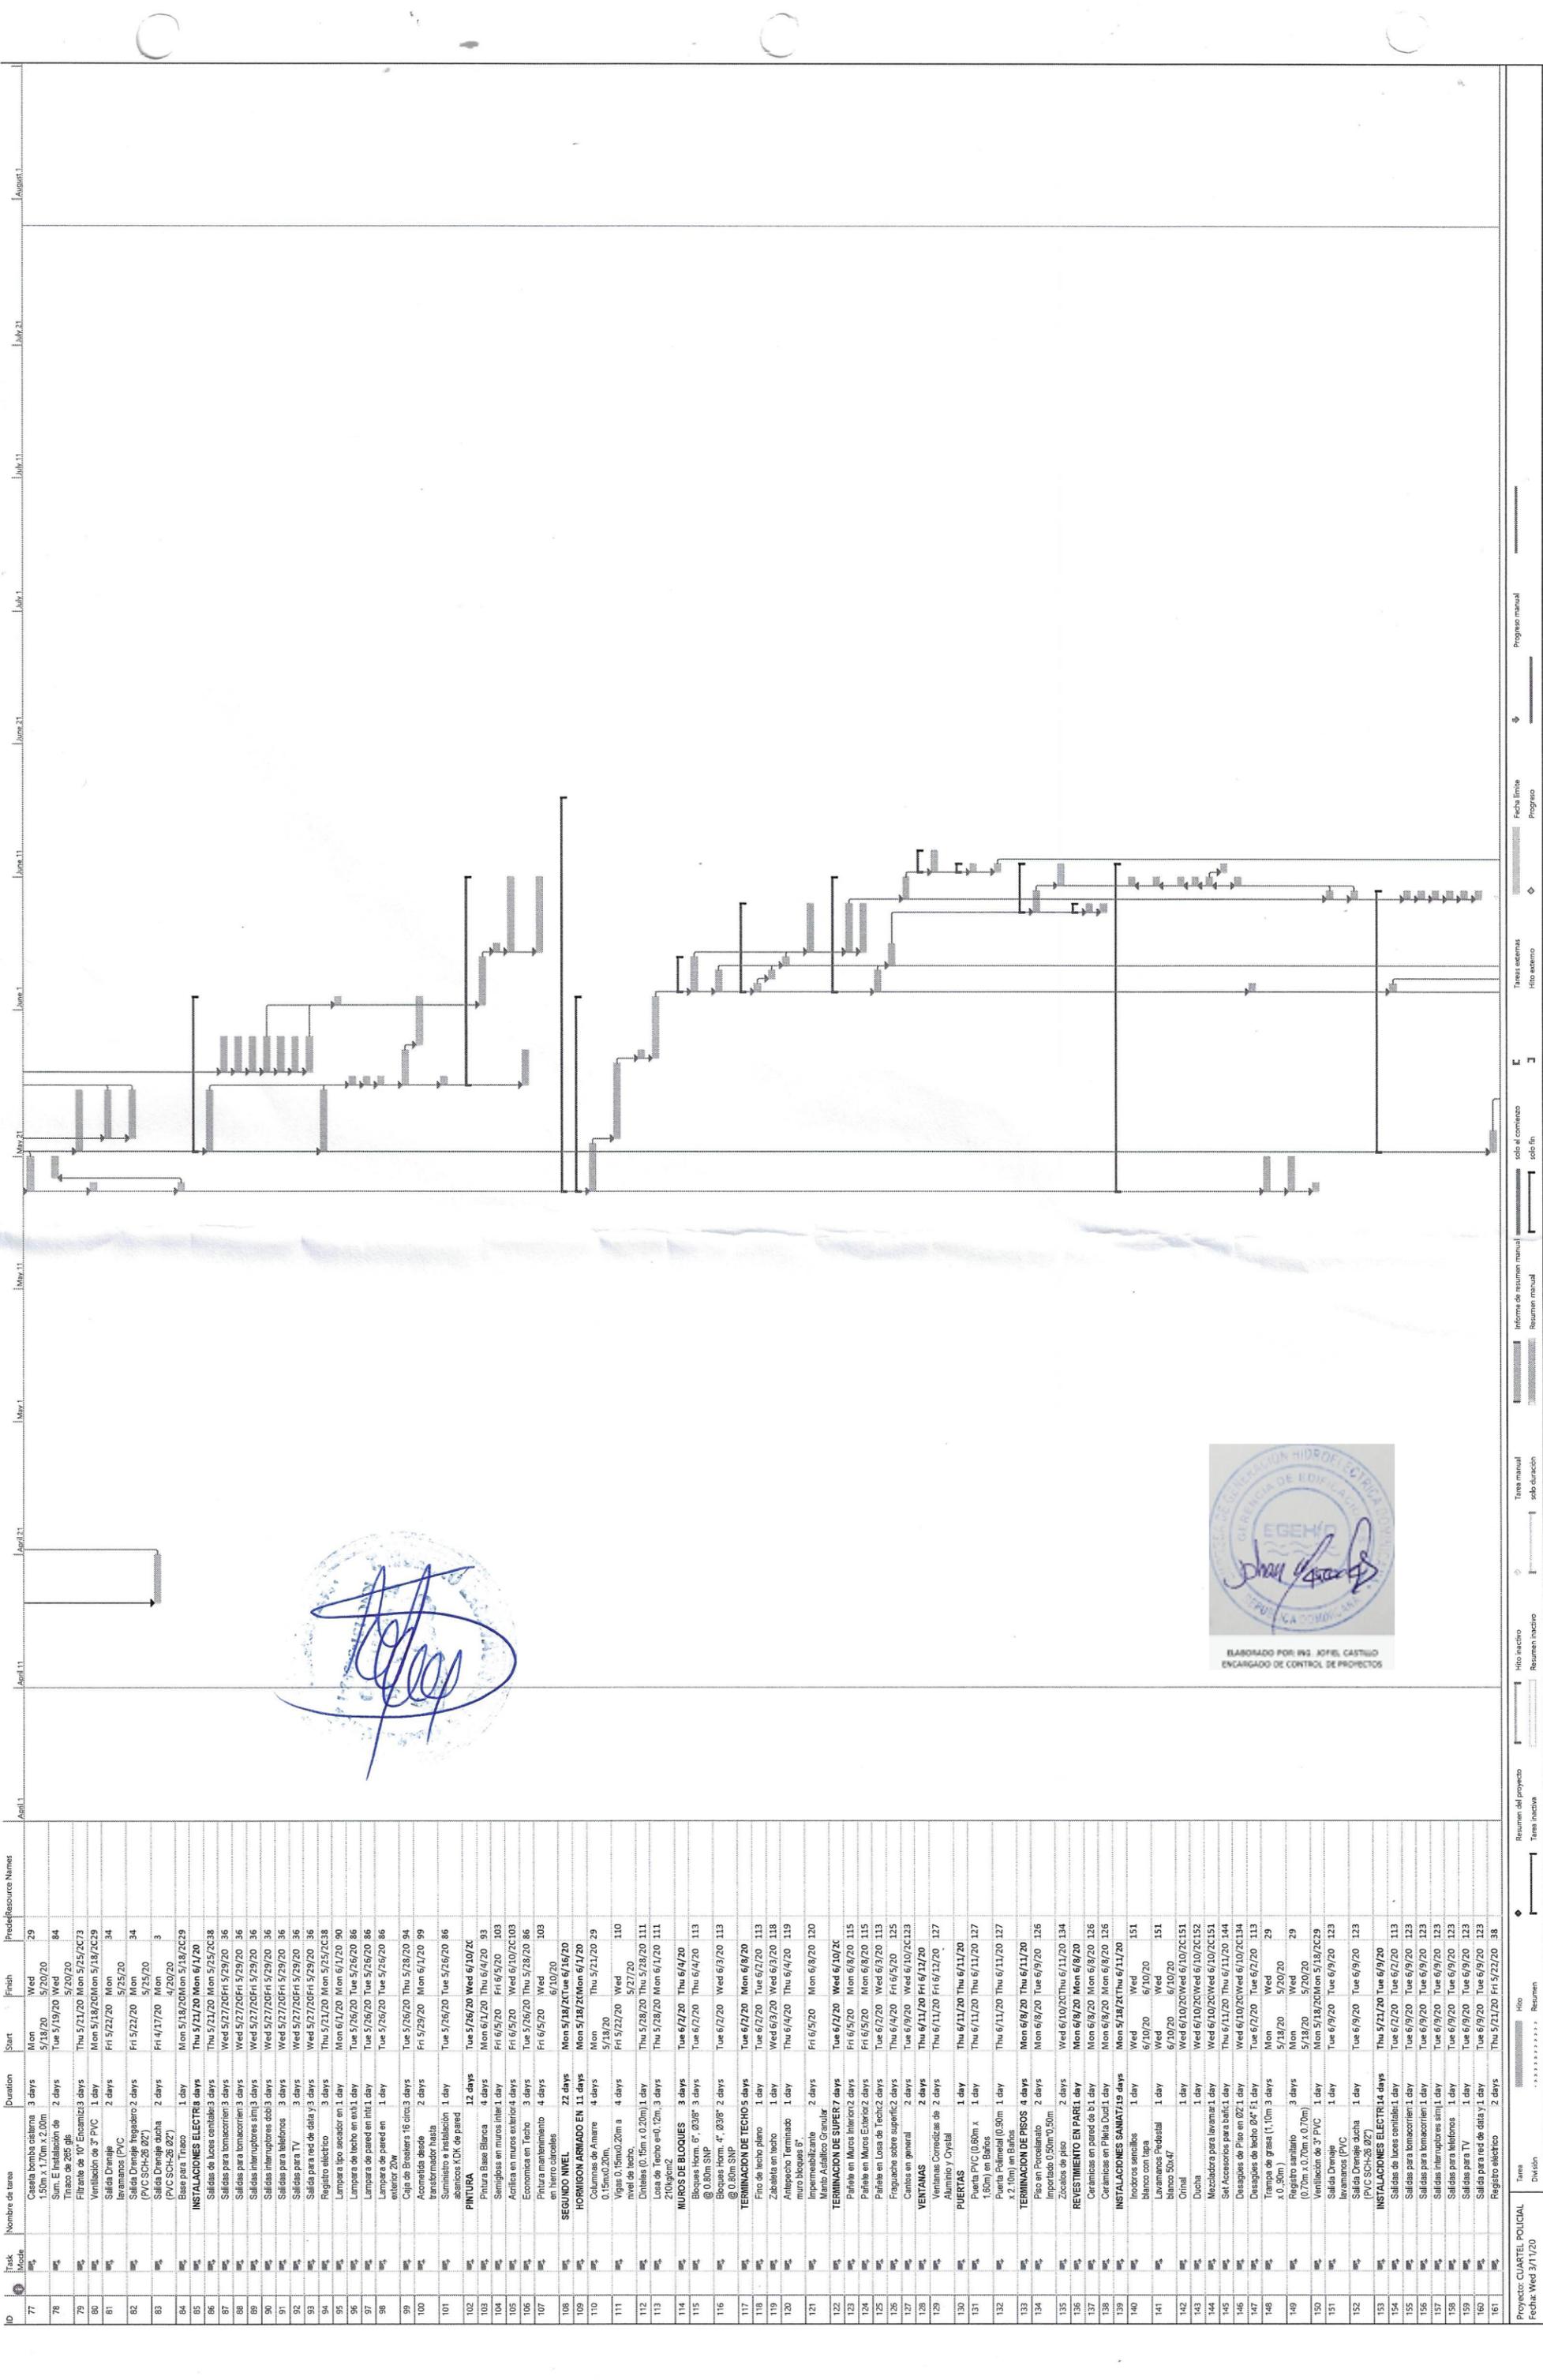

ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Predecessor Names
77	Caseta bomba cisterna 1.50m x 1.70m x 2.00m	Mon 5/18/20	Wed 5/20/20	3 days	29
78	Sum. E instalación de Tlaco de 285 gts	Tue 5/19/20	Wed 5/20/20	2 days	84
79	Filtrante de 10' Ecomizic3	Thu 5/21/20	Mon 5/25/20	3 days	79
80	Ventilación de 3" PVC	Mon 5/18/20	Mon 5/18/20	1 day	79
81	Salida Drainaje Iramanos (PVC)	Fri 5/22/20	Mon 5/25/20	2 days	34
82	Salida Drainaje Regadero (PVC SCH-26.02')	Fri 5/22/20	Mon 5/25/20	2 days	34
83	Salida Drainaje ducha (PVC SCH-26.02')	Fri 4/17/20	Mon 4/20/20	2 days	3
84	Base para Tlaco	Mon 5/18/20	Mon 5/18/20	1 day	29
85	INSTALACIONES ELECTRICAS	Thu 5/21/20	Mon 6/1/20	12 days	85
86	Salidas de luces cisternas	Thu 5/21/20	Mon 5/25/20	3 days	36
87	Salidas para tomacorrientes	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	3 days	36
88	Salidas para tomacorrientes sim	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	3 days	36
89	Salidas interruptores sim	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	3 days	36
90	Salidas interruptores dos	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	3 days	36
91	Salidas para teléfonos	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	3 days	36
92	Salidas para TV	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	3 days	36
93	Salida para red de datos	Wed 5/27/20	Fri 5/29/20	3 days	36
94	Registro eléctrico	Thu 5/21/20	Mon 5/25/20	3 days	90
95	Lampara tipo secador en techo	Mon 6/1/20	Mon 6/1/20	1 day	90
96	Lampara de techo en est1	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	1 day	86
97	Lampara de pared en int1	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	1 day	86
98	Lampara de pared en exterior 20w	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	1 day	86
99	Caja de Breakers 16 circuitos	Tue 5/26/20	Thu 5/28/20	3 days	94
100	Acomodación desde transformador hasta	Fri 5/29/20	Mon 6/1/20	2 days	99
101	Suministro e instalación de interruptores	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	1 day	86
102	PINTURA	Tue 5/26/20	Wed 6/10/20	12 days	102
103	Pintura Base Blanca	Mon 6/1/20	Thu 6/4/20	4 days	93
104	Semipase en muros inter	Fri 6/5/20	Fri 6/5/20	1 day	103
105	Acilica en muros exterior	Fri 6/5/20	Wed 6/10/20	4 days	103
106	Economica en Techo	Tue 5/26/20	Thu 5/28/20	3 days	86
107	Pintura mantenimiento en hierro catodicas	Fri 6/5/20	Wed 6/10/20	4 days	103
108	SEGUNDO NIVEL	Mon 5/18/20	Tue 6/1/20	22 days	108
109	HORMIGON ARMADO EN COLUMNAS DE AMARRE	Mon 5/18/20	Mon 6/1/20	11 days	108
110	Columnas de Amarre	Mon 5/18/20	Thu 5/21/20	4 days	29
111	Vigas 0.15m x 0.20m a nivel de techo	Fri 5/22/20	Wed 5/27/20	4 days	110
112	Dondeles 0.15m x 0.20m	Thu 5/28/20	Thu 5/28/20	1 day	111
113	Losa de Techo e=0.12m	Thu 5/28/20	Mon 6/1/20	3 days	111
114	MUROS DE BLOQUES	Tue 6/2/20	Thu 6/4/20	3 days	113
115	Blocos horm. 6' x 6' x 6' @ 0.80m SNP	Tue 6/2/20	Thu 6/4/20	3 days	113
116	Blocos horm. 4' x 6' x 6' @ 0.80m SNP	Tue 6/2/20	Wed 6/3/20	2 days	113
117	TERMINACION DE TECHOS	Tue 6/2/20	Mon 6/8/20	5 days	113
118	Fino de techo plano	Tue 6/2/20	Tue 6/2/20	1 day	113
119	Zaballata en techo	Wed 6/3/20	Wed 6/3/20	1 day	118
120	Aniepecho Terminado muro bicapas 5"	Thu 6/4/20	Thu 6/4/20	1 day	119
121	Impermeabilizante Manto Asfáltico Granular	Fri 6/5/20	Mon 6/8/20	2 days	120
122	TERMINACION DE SUPERFICIES	Tue 6/2/20	Wed 6/10/20	7 days	122
123	Pañete en Muros Interiores	Fri 6/5/20	Mon 6/8/20	2 days	115
124	Pañete en Muros Exteriores	Fri 6/5/20	Mon 6/8/20	2 days	115
125	Pañete en Losa de Techo	Tue 6/2/20	Wed 6/3/20	1 day	113
126	Freguache sobre superficie	Thu 6/4/20	Fri 6/5/20	2 days	125
127	Cambios en general	Tue 6/9/20	Wed 6/10/20	2 days	125
128	VENTANAS	Thu 6/11/20	Fri 6/12/20	2 days	127
129	Ventanas Concreto de Aluminio / Cristal	Thu 6/11/20	Fri 6/12/20	2 days	127
130	PUERTAS	Thu 6/11/20	Thu 6/11/20	1 day	127
131	Puerta PVC (0.80m x 0.80m) en Blanco	Thu 6/11/20	Thu 6/11/20	1 day	127
132	Puerta en PVC (0.80m x 2.10m) en Blanco	Thu 6/11/20	Thu 6/11/20	1 day	127
133	TERMINACION DE PISOS	Mon 6/8/20	Thu 6/11/20	3 days	126
134	Piso en Poliacrilato	Mon 6/8/20	Tue 6/9/20	2 days	126
135	Zocales de piso	Wed 6/10/20	Thu 6/11/20	2 days	134
136	REVESTIMIENTO EN PAREDES	Mon 6/8/20	Mon 6/8/20	1 day	126
137	Cerámicas en pared de b1	Mon 6/8/20	Mon 6/8/20	1 day	126
138	Cerámicas en Pared Duct	Mon 6/8/20	Mon 6/8/20	1 day	126
139	INSTALACIONES SANITARIAS	Mon 5/18/20	Thu 6/11/20	19 days	139
140	Inodoros sencillos blanco con tapa	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	1 day	151
141	Lavamanos Pedestal blanco 50x47	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	1 day	151
142	Orinal	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	1 day	151
143	Mezcladora para lavamanos	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	1 day	151
144	Set Accesorios para baño	Thu 6/11/20	Thu 6/11/20	1 day	144
145	Desagüe de Piso en 021	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	1 day	134
146	Desagüe de techo 2" x 1"	Wed 6/10/20	Wed 6/10/20	1 day	134
147	Trampa de grasa (1.10m x 0.50m)	Mon 5/18/20	Mon 5/18/20	1 day	29
148	Registro sanitario (0.70m x 0.70m)	Mon 5/18/20	Mon 5/18/20	1 day	29
149	Ventilación de 3" PVC	Mon 5/18/20	Mon 5/18/20	1 day	29
150	Salida Drainaje Iramanos (PVC)	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	1 day	123
151	INSTALACIONES ELECTRICAS	Thu 5/21/20	Tue 6/9/20	14 days	151
152	Salidas de luces cisternas	Tue 6/2/20	Tue 6/2/20	1 day	113
153	Salidas para tomacorrientes	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	1 day	123
154	Salidas para tomacorrientes sim	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	1 day	123
155	Salidas interruptores sim	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	1 day	123
156	Salidas para teléfonos	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	1 day	123
157	Salidas para TV	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	1 day	123
158	Salida para red de datos	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	1 day	123
159	Registro eléctrico	Thu 5/21/20	Fri 5/22/20	2 days	38



