


ID	Task/Mod	Duration	Start	Finish	Preced
1	IGLESIA SANTA LUCIA, MARTAS DE FARFAN	174.5 days	Thu 1/8/19	Wed 29/1/20	
2	IGLESIA Y AREAS ADMINISTRATIVAS	134 days	Thu 1/8/19	Wed 18/12/19	
3	PARTIDAS GENERALES	23 days	Thu 1/8/19	Sat 24/8/19	
4	DEMOLICIONES DE PISOS EN SALONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS	5 days	Thu 1/8/19	Tue 6/8/19	
5	DEMOLICIONES DE MUROS EN EL GRAN SALON	3 days	Tue 6/8/19	Fri 9/8/19	4
6	BOTE ESCOMBRO (VOLTEO DE 8 MB)	8 days	Fri 9/8/19	Sat 17/8/19	5
7	LIMPIEZA	5 days	Sat 17/8/19	Thu 22/8/19	6
8	REPLANTEO	2 days	Thu 22/8/19	Sat 24/8/19	7
9	MOVIMIENTO DE TIERRA	16 days	Sat 24/8/19	Tue 10/9/19	
10	EXCAVACION PARA MURO BLOCK DIVISORIO	4 days	Thu 10/9/19	Wed 28/8/19	8
11	RELLENO DE REPOSICION	3 days	Thu 28/8/19	Sat 31/8/19	10
12	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	4 days	Sat 31/8/19	Thu 5/9/19	11
13	RELLENO COMPACTADO CALICHE	5 days	Thu 5/9/19	Tue 10/9/19	12
14	HORMIGON ARMADO EN:	10 days	Tue 10/9/19	Fri 20/9/19	
15	ZANAYA DE MURO 6 DIVISORIO *	4 days	Tue 10/9/19	Sat 14/9/19	13
16	ZANAYA DE COLUMNA C1	3 days	Sat 14/9/19	Tue 17/9/19	15
17	COLUMNAS PORTICO B.N.P.	3 days	Tue 17/9/19	Fri 20/9/19	16
18	HORMIGON ARMADO B.N.P.	7 days	Fri 20/9/19	Fri 27/9/19	
19	COLUMNAS PORTICO S.N.P.	4 days	Fri 20/9/19	Wed 25/9/19	17
20	VIGA DAPTEL (V.O)	3 days	Wed 25/9/19	Fri 27/9/19	19
21	MUROS BLOQUES	48 days	Thu 1/8/19	Thu 19/9/19	
22	MUROS BLOQUES S.N.P	1 day	Thu 1/8/19	Thu 1/8/19	
23	BLOQUES DE P.S. 30' x 30' S.N.P	5 days	Sat 14/9/19	Thu 1/8/19	15
24	TERMINACION DE SUPERFICIE	24 days	Wed 25/9/19	Sat 19/10/19	
25	FRAGUACHE SOBRE HORMIGON	5 days	Wed 25/9/19	Mon 30/9/19	19
26	PANELES INTERIORES Y EXTERIORES EL 20%	8 days	Mon 30/9/19	Tue 8/10/19	25
27	CANTOS	4 days	Tue 8/10/19	Sat 12/10/19	26
28	CORNISAS EXT. DE CEMENTO EN TODO EL PERIMETRO	7 days	Sat 12/10/19	Sat 19/10/19	27
29	CORNISAS INTERIORES DE YESO TODO PERIMETRO	5 days	Sat 12/10/19	Thu 17/10/19	27
30	DIBUÑO DECORATIVO EN CORNISA ARCO	27 days	Thu 17/10/19	Thu 14/11/19	
31	EN PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO	4 days	Thu 17/10/19	Tue 22/10/19	29
32	REVESTIMIENTO DE COLUMNAS EN MARMOL	5 days	Tue 22/10/19	Sat 26/10/19	31
33	PEDESTALES EN COLUMNAS	3 days	Sat 26/10/19	Wed 30/10/19	32
34	REVESTIMIENTO DE COLUMNAS EN PERILLA	3 days	Wed 30/10/19	Fri 1/11/19	33
35	GOTERO MAQUILADO	3 days	Sat 2/11/19	Tue 5/11/19	34
36	SUMINISTRO E INST. DE UN CRISTO EN BRONCE	5 days	Tue 5/11/19	Mon 11/11/19	35
37	TRABAJOS ARTISTICO EN EL PRENTE DEL TIEMPO	4 days	Mon 11/11/19	Thu 14/11/19	36
38	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE DE TECHO:	10 days	Thu 14/11/19	Mon 25/11/19	
39	CONSTRUCCION CUPULA DEL TECHO	10 days	Thu 14/11/19	Mon 25/11/19	
40	EN TEJAS METALICA	6 days	Thu 14/11/19	Mon 25/11/19	37
41	PISO DE TECHO PLANO	4 days	Thu 14/11/19	Tue 19/11/19	37
42	TERMINACION DE DE TECHO EN DUREX	6 days	Tue 19/11/19	Mon 25/11/19	41
43	ZABILETAS	2 days	Tue 19/11/19	Wed 20/11/19	41
44	APUNTES/ALICATILES	2 days	Thu 21/11/19	Fri 22/11/19	43
45	TERMINACION DE PISO:	18 days	Thu 19/9/19	Tue 8/10/19	
46	DE CERAMICA ESPANOLA DE 1m. FONDO Blanco	12 days	Thu 19/9/19	Wed 27/10/19	23
47	ZOCALO DE CERAMICA FONDO BLANCO	6 days	Wed 27/10/19	Tue 8/10/19	46
48	REVESTIMIENTO DE JARDINERAS EN LADRILLOS	5 days	Thu 19/9/19	Wed 25/9/19	23
49	LADRILLOS EN ENTRADA PUERTA PRINCIPAL	4 days	Wed 25/9/19	Sat 28/9/19	48
50	INSTALACIONES ELECTRICAS	22 days	Mon 25/11/19	Wed 18/12/19	
51	LUCES LAMPARA DECORATIVAS COLGANTES	5 days	Mon 25/11/19	Fri 29/11/19	42
52	LAMPARAS DECORATIVAS EN FRENTE DEL TEMP.	7 days	Sat 30/11/19	Sat 7/12/19	51
53	INTERRUPTORES DOBLES	4 days	Tue 10/12/19	Fri 13/12/19	53
54	INTERRUPTORES SIMPLE	4 days	Fri 13/12/19	Wed 18/12/19	54
55	TOMACORRIENTES	3 days	Fri 13/12/19	Tue 17/12/19	54
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE AERES ACONDICIONADOS DE 18000 BTU	3 days	Wed 27/11/19	Fri 29/11/19	58
57	PANEL DE DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS	2 days	Mon 25/11/19	Wed 27/11/19	42
58	AMMO DE OMBIA	5 days	Mon 25/11/19	Mon 25/11/19	42




ID	Task/Task Mod	Duration	Start	Finish	Preced
60	PORTALES Y ESTANTERIA TODO CACABA Y METALICAS	67 days	Sat 28/8/19	Sat 7/12/19	
61	PASAMANOS BARANDAS EN MESANINE DEL CAMPANARIO DE 13 Y 14 PULO	12 days	Sat 28/8/19	Fri 11/10/19	49
62	PASAMANOS DE 87 PULO PARA DIVIDIR EL ALTAR	10 days	Fri 11/10/19	Tue 22/10/19	61
63	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUERTAS NUEVAS EN CACABA	7 days	Tue 22/10/19	Tue 29/10/19	62
64	REPARACION PUERTAS PRINCIPALES TEMPLO	6 days	Tue 22/10/19	Mon 28/10/19	62
65	REPARACION DE PUERTAS	6 days	Mon 28/10/19	Sat 2/11/19	64
66	REPARACION DE BANCOS INCLUYE PINTURA	5 days	Mon 28/10/19	Fri 1/11/19	64
67	REPARACION DE UN JUEGO DE COMEDOR	18 days	Sat 2/11/19	Wed 20/11/19	66
68	REPARACION DE ARMARIOS GRANDES	7 days	Thu 28/11/19	Thu 28/11/19	67
69	REPARACION DE ESTANTES GRANDES	6 days	Thu 28/11/19	Wed 4/12/19	68
70	REPARACION DE BOTACAS	3 days	Wed 4/12/19	Sat 7/12/19	69
71	REPARACION DE PANELES TRAGALUZ	3 days	Thu 28/11/19	Sat 30/11/19	68
72	REPAR. VITRINA DE LA VIRGEN STA. LUCIA	12 days	Tue 22/10/19	Sat 2/11/19	62
73	REPAR. VITRINA DE LA VIRGEN ALTA GRACIA	4 days	Sat 28/9/19	Thu 3/10/19	49
74	REPARACION VENTANILLAS DE ARRIBA EN EL TEMPLO	2 days	Thu 3/10/19	Fri 4/10/19	73
75	REPARACION VENTANILLAS DE ARRIBA EN EL TEMPLO	2 days	Sat 5/10/19	Mon 7/10/19	74
76	REPARACION ENTIBILLADO CON CRISTAL	2 days	Mon 7/10/19	Wed 9/10/19	75
77	CONSTRUCCION GABINETES Y DEPENSA EN COCINA	5 days	Sat 28/9/19	Fri 4/10/19	49
78	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUERTAS METALICAS APARTELLONES	4 days	Sat 28/9/19	Thu 3/10/19	49
79	VENTANAS REFORZADAS CORRIJIDAS DE ALUMINIO Y VIDRIO EN TEMPLO	6 days	Sat 12/10/19	Fri 18/10/19	79
80	VENTANAS REFORZADAS CORRIJIDAS DE ALUMINIO Y VIDRIO EN AREAS ALUMINIAS	3 days	Sat 12/10/19	Tue 15/10/19	27
81	PINTURAS	29 days	Sat 12/10/19	Mon 11/11/19	
82	REMOCCION DE PINTURA EXISTENTE	15 days	Sat 12/10/19	Mon 28/10/19	127
83	ASEILLADO Y RELLENO DE SUPERFICIE	6 days	Mon 28/10/19	Sat 2/11/19	83
84	ACRILICA ESPECIAL EN TECHO	4 days	Sat 2/11/19	Thu 7/11/19	84
85	PINTURA ESPECIAL EN PAREDES EXTERIOR, INTERIOR	8 days	Sat 2/11/19	Mon 11/11/19	84
86	UTILIZACION DE GONDOLA	8 days	Sat 2/11/19	Mon 11/11/19	184
87	MANTENIMIENTO EN PUERTAS	3 days	Thu 7/11/19	Mon 11/11/19	185
88	VARIOS	50 days	Sat 28/9/19	Wed 20/11/19	
89	ACERA PERIMETRAL	4 days	Sat 28/9/19	Thu 3/10/19	49
90	PROTECCION DE VENTANAS Y PUERTAS HIERRO	6 days	Fri 18/10/19	Thu 24/10/19	81
91	CANALERA PARA DESGUE DE TECHOS PVC	1 day	Tue 19/11/19	Wed 20/11/19	141
92	SIEMBRA DE GRAMAS Y FLORES	3 days	Thu 3/10/19	Sat 5/10/19	90
93	LIMPIEZA Y PINTURA CAMPANARIO	3 days	Sat 5/10/19	Wed 9/10/19	93
94	LIMPIEZA FINAL	2 days	Wed 9/10/19	Fri 11/10/19	94
95	CONSTRUCCION AREA DE BAÑO EXTERIOR	118 days	Tue 6/8/19	Fri 6/12/19	
96	PAREDES GENERALES	11 days	Tue 6/8/19	Sat 17/8/19	
97	DEMOLICIONES DE PISOS EN SALONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS Y MUROS	3 days	Tue 6/8/19	Fri 9/8/19	4
98	BOITE ESCOMBRO	4 days	Fri 9/8/19	Tue 13/8/19	98
99	LIMPIEZA	4 days	Tue 13/8/19	Sat 17/8/19	99
100	MOVIMIENTO DE TIERRA	9 days	Sat 17/8/19	Tue 27/8/19	
101	EXCAVACION PARA MAJO BLOCK DIVISORIO	2 days	Sat 17/8/19	Mon 19/8/19	100
102	RELLENO DE REPOSICION	2 days	Tue 20/8/19	Wed 21/8/19	102
103	BOITE DE MATERIAL INSERVIBLE	3 days	Wed 21/8/19	Sat 24/8/19	103
104	RELLENO COMPACTADO CALICHE	2 days	Sat 24/8/19	Tue 27/8/19	104
105	HORMICON ARMADO EN:	4 days	Tue 27/8/19	Fri 30/8/19	
106	ZAPATA DE COLUMNA C1	2 days	Tue 27/8/19	Wed 28/8/19	105
107	COLUMNAS PORTICO B.N.P	2 days	Thu 29/8/19	Fri 30/8/19	107
108	HORMICON ARMADO B.N.P EN:	9 days	Fri 30/8/19	Mon 9/9/19	
109	COLUMNAS PORTICO S.N.P	2 days	Mon 9/9/19	Mon 2/9/19	108
110	VIGA DANTEL (V0)	2 days	Mon 2/9/19	Wed 4/9/19	110
111	VIGA DE CARGA	2 days	Mon 2/9/19	Wed 4/9/19	110
112	LOSAS Y VUELOS	5 days	Wed 4/9/19	Mon 9/9/19	112
113	MUROS BLOQUES	2 days	Tue 20/8/19	Wed 21/8/19	
114	BLOQUES DE PIS S/F0, 40 SMP	2 days	Tue 20/8/19	Wed 21/8/19	102
115	TERMINACION DE SUPERFICIE	7 days	Wed 21/8/19	Wed 28/8/19	
116	PRAGUACHE SOBRE HORMICON	2 days	Wed 21/8/19	Fri 23/8/19	115
117					

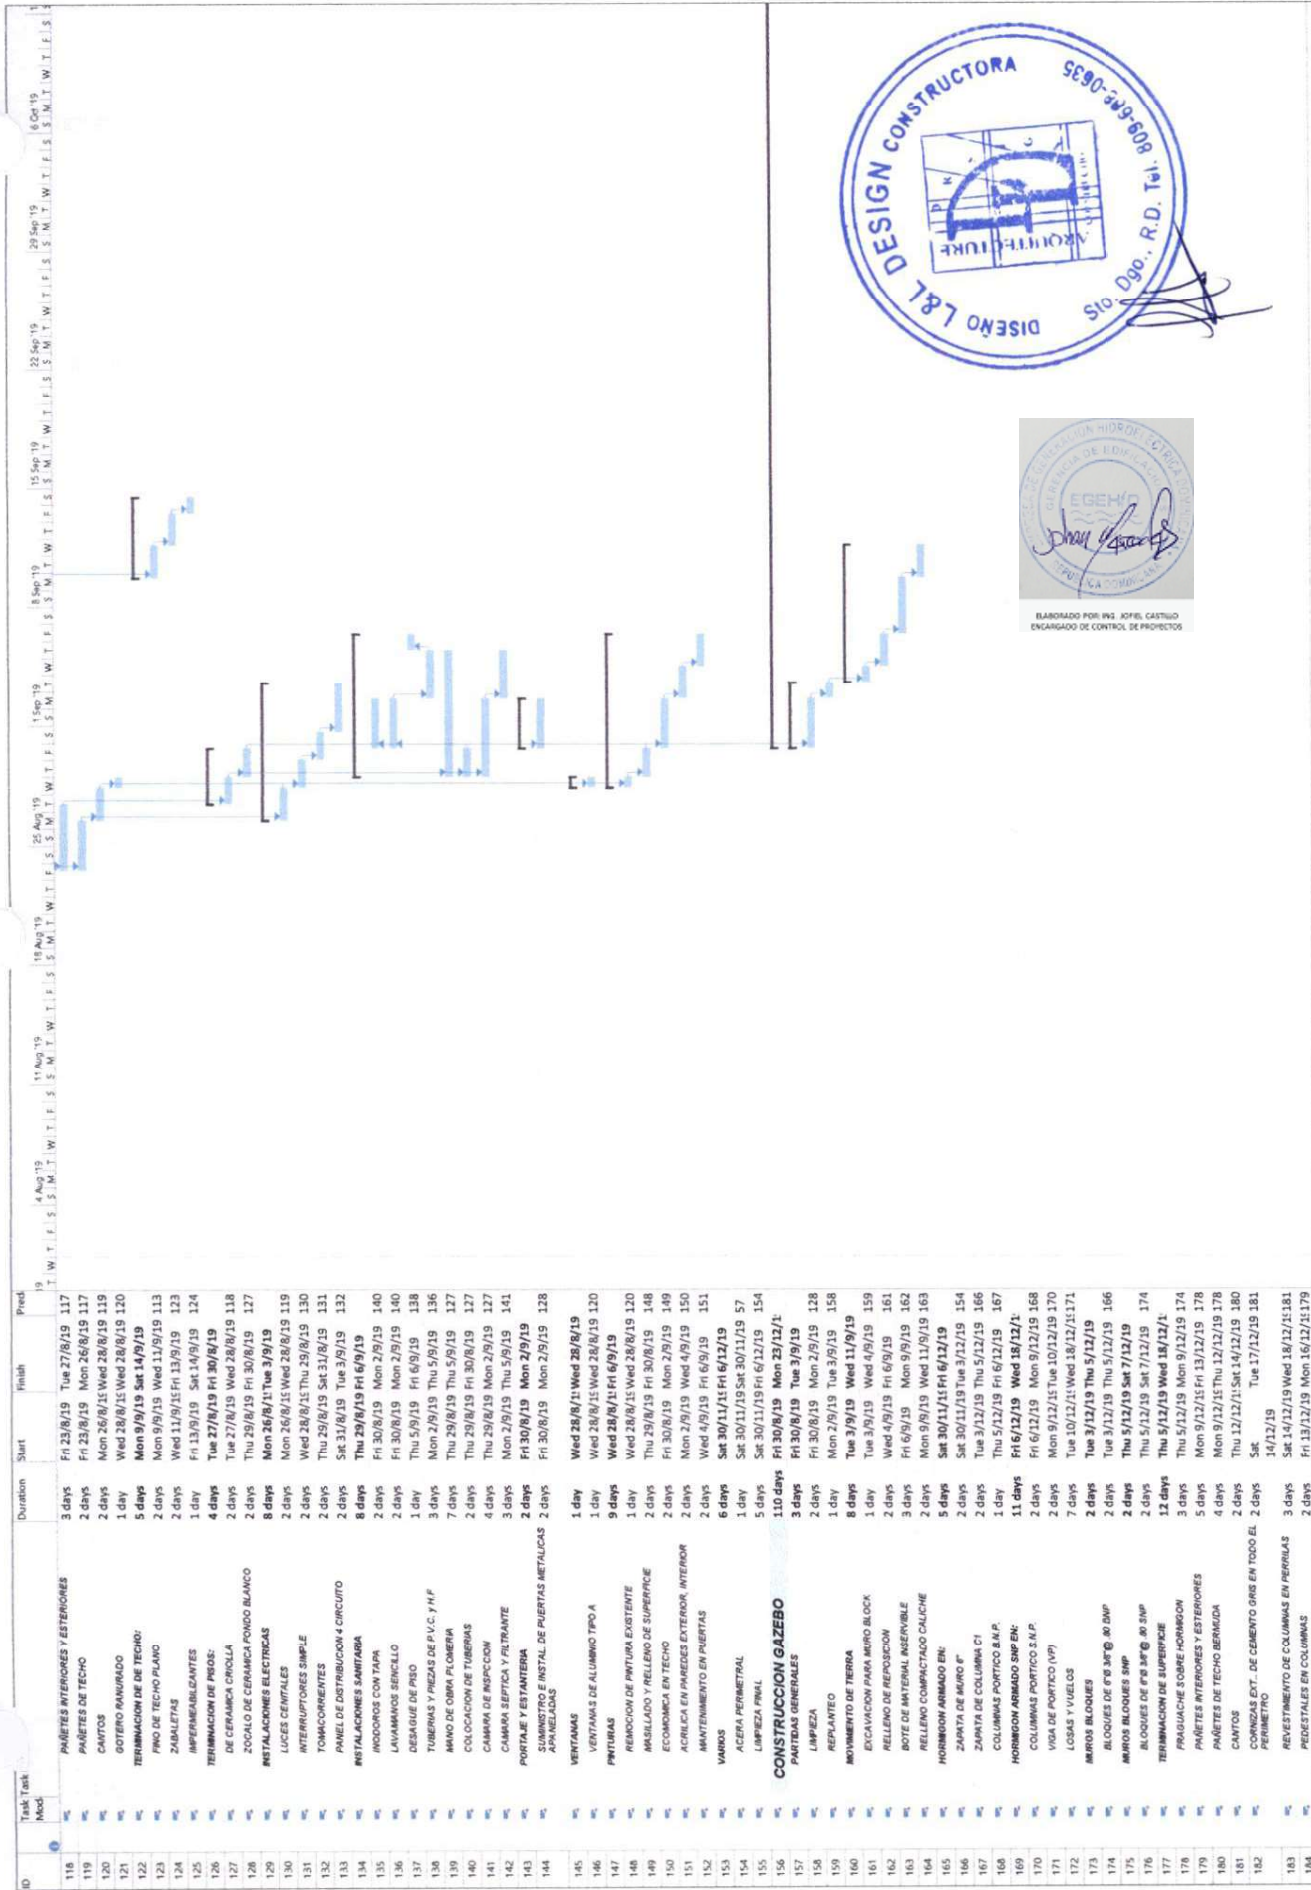


Task	Split	Milestone	Summary		Inactive Milestone	Current-only	Start-only	External Milestone	Manual Program
			Project Summary	Inactive Task					
Project: crono-Santa Lucia									
Date: Thu 30/5/19									

13 Oct 19
 20 Oct 19
 27 Oct 19
 3 Nov 19
 10 Nov 19
 17 Nov 19
 24 Nov 19
 1 Dec 19
 8 Dec 19
 15 Dec 19
 22 Dec 19
 29 Dec 19
 5 Jan 20
 12 Jan 20
 19 Jan 20
 26 Jan 20

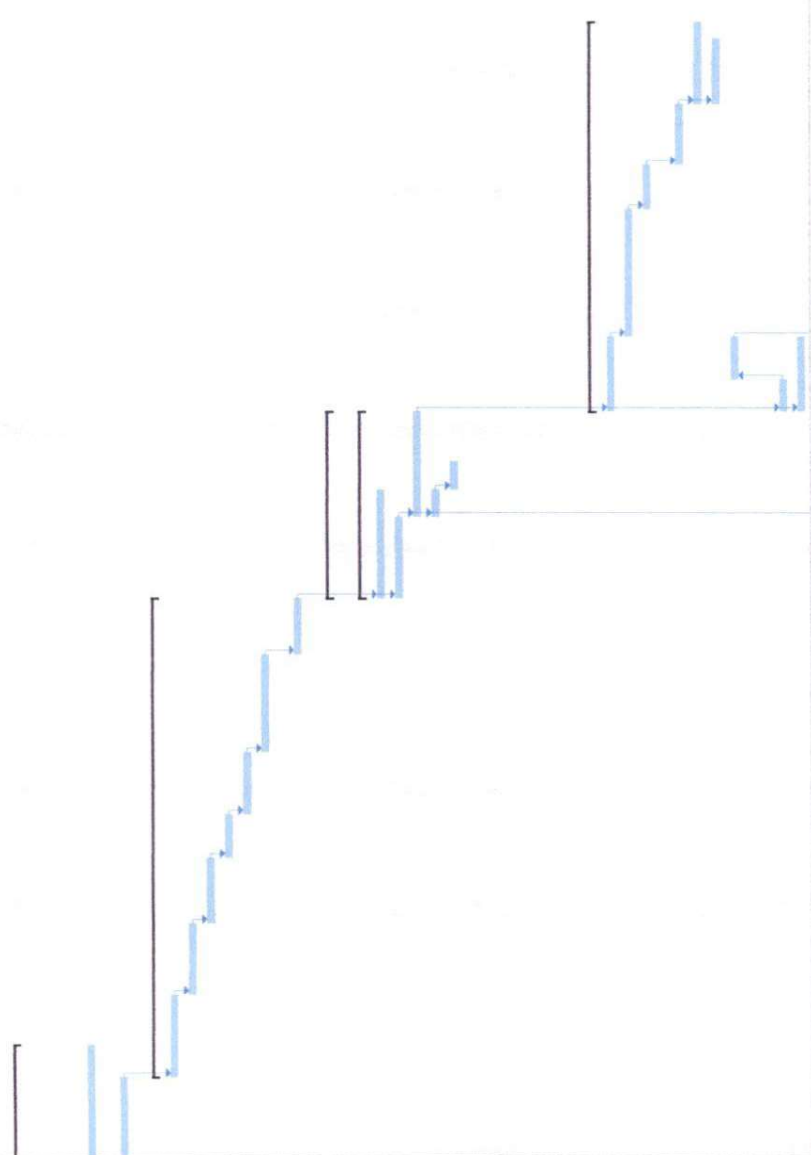

19 Oct 19 20 Oct 19 27 Oct 19 3 Nov 19 10 Nov 19 17 Nov 19 24 Nov 19 1 Dec 19 8 Dec 19 15 Dec 19 22 Dec 19 29 Dec 19 5 Jan 20 12 Jan 20 19 Jan 20 26 Jan 20

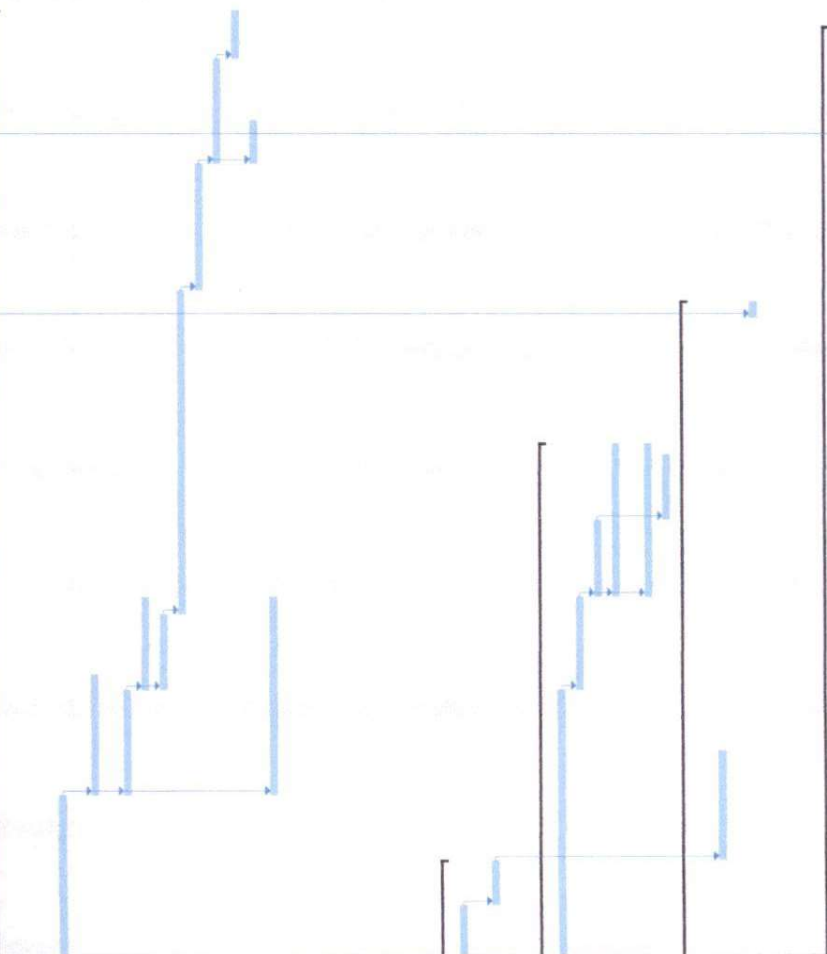

ELABORADO POR: ING. JOFEL CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



Manual Program

External Milestone

Start-only

Finish-only

Duration-only

Manual Summary Setup

Manual Summary

Active Milestone

Inactive Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task


Task

Milestone

Project: crono-Santa Lucia

Date: Thu 30/5/19

15 Oct 19
 20 Oct 19
 27 Oct 19
 3 Nov 19
 10 Nov 19
 17 Nov 19
 24 Nov 19
 1 Dec 19
 8 Dec 19
 15 Dec 19
 22 Dec 19
 29 Dec 19
 5 Jan 20
 12 Jan 20
 19 Jan 20
 26 Jan 20

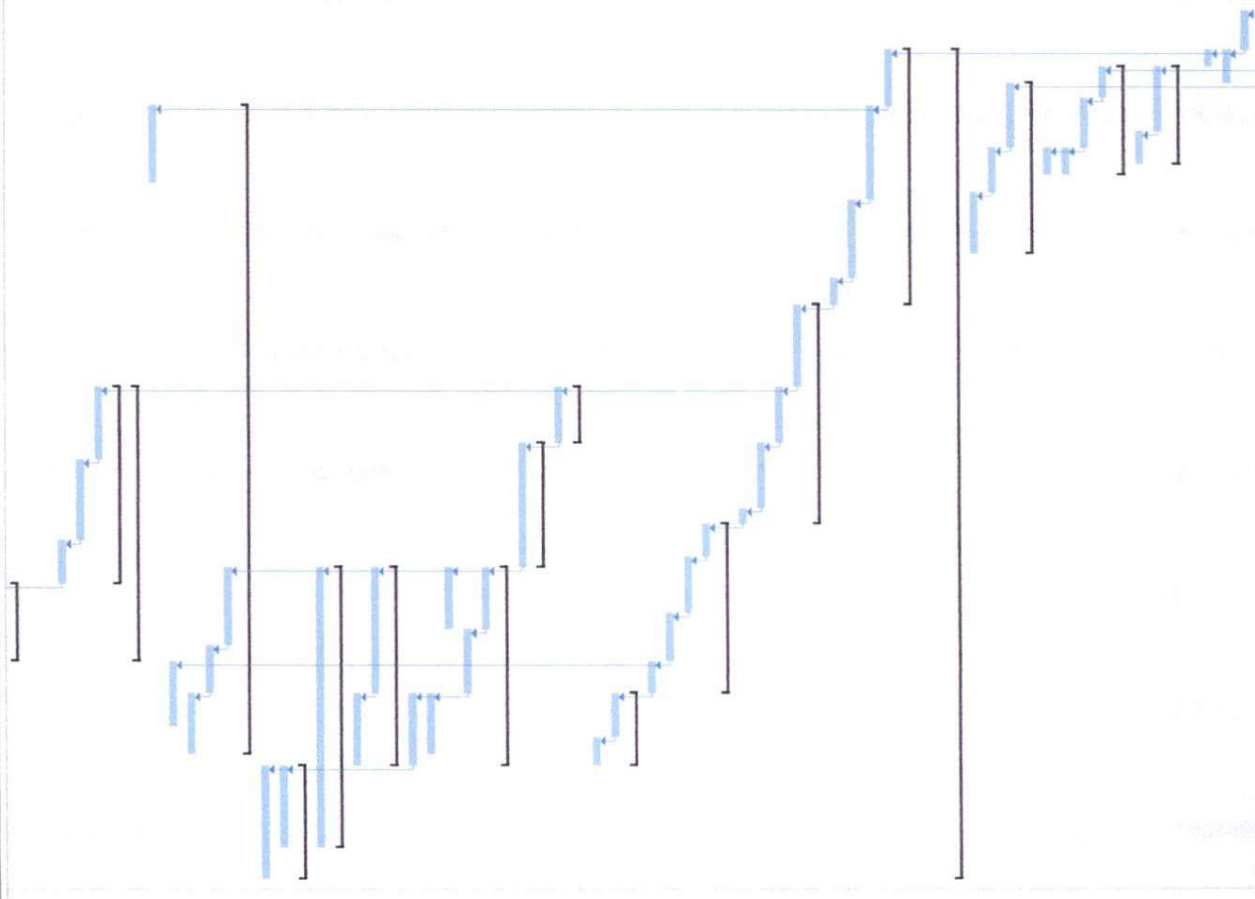

ELABORADO POR: ING. JOFEL CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



Project: cromo Santa Lucia
Date: Thu 30/9/19

Task
Split

Summary
Request Summary
Inserts Task

Inserts Milestone
Inserts Summary
Manual Task

Question-only
Manual Summary Setup
Manual Summary

Start-only
Insert-only
External Task

External Milestone
Deadline
Project

Manual Program

