




PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BATEY, DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	jun '19	28 jul '19	25 ago '19	22 sep '19	20
1		CONSTRUCCION PARQUE EN EL BATEY, DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN	46 días	vie 02-08-19					
2									
3		TRABAJOS PRELIMINARES	46 días	vie 02-08-19					
4		Replanteo	2 días	vie 02-08-19					
5		Campamento	46 días	vie 02-08-19					
6									
7		MOVIMIENTO DE TIERRA	4 días	vie 02-08-19					
8		Excavación de Material	1 día	vie 02-08-19					
9		Sum y Col. Tierra negra	1 día	lun 05-08-19					
10		Colocación de Tierra Común	1 día	lun 05-08-19					
11		Relleno de Reposición	1 día	mar 06-08-19					
12		Bote de Material	1 día	mié 07-08-19					
13									
14		HORMIGON ARMADO	14 días	jue 08-08-19					
15		Zapata de Muros	7 días	jue 08-08-19					
16		Hormigón en Vigas 0,15m*0,20m	7 días	lun 19-08-19					
17									
18		MUROS DE BLOQUES	7 días	mié 28-08-19					




Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	



PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BATEY, DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	jun '19	28 jul '19	25 ago '19	22 sep '19
19								
20		TERMINACION DE SUPERFICIES	4 días	vie 06-09-19				
21		Empañete muros	1 día	vie 06-09-19				
22		Cantos general	1 día	lun 09-09-19				
23		Corniza de Cemento Gris En Jardineras	1 día	lun 09-09-19				
24		Fraguache en Viga	1 día	lun 10-09-19				
25			1 día	mié 11-09-19				
26		PINTURA	2 días	jue 12-09-19				
27								
28		PLANTAS HORNAMENTALES	5 días	lun 16-09-19				
29								
30		GLORIETA	10 días	lun 23-09-19				
31		Pañete en Vigas y Columnas	2 días	lun 23-09-19				
32		Pañete en Techo	2 días	lun 23-09-19				
33		Cantos general	2 días	lun 23-09-19				
34		Fraguache	2 días	lun 23-09-19				
35		Terminación Cúpula,(Pañete, Pintura, Cantos, Fino, Imperm.)	1 día	mié 25-09-19				
36		Fino de techo	1 día	jue 26-09-19				




Proyecto: PROGRAMACION CO	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			




PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BATEY, DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	jun '19	28 jul '19	25 ago '19	22 sep '19	20
37		Impermeabilizante	1 día	vie 27-09-19					
38		Pintura en Techo Acrílico	1 día	jue 30-09-19					
39		Pintura Acrílica en Vigas y Columnas	1 día	jue 30-09-19					
40		Torta de Hormigón Con Malla Electrosoldadas 0,15m*0,15m, e=0,10m	1 día	mar 01-10-19					
41		Zócalos	1 día	mié 02-10-19					
42		Perillas en Columnas cemento Gris, Inc. Capitel	1 día	jue 03-10-19					
43		Revestimiento Escalones, Huellas y Cotrahuellas	1 día	jue 03-10-19					
44		Luces Cenitales	1 día	vie 04-10-19					
45		Interruptores sencillos	1 día	vie 04-10-19					
46		Tomacorriente 110	1 día	vie 04-10-19					
47									
48		AREA GENERAL	46 días	vie 02-08-19					
49		Limpieza, Nivelación y Replanteo	2 días	vie 02-08-19					
50		Demolición y Bote de Estructuras Existentes	2 días	mar 06-08-19					
51		Relleno Compactado	1 día	jue 08-08-19					
52		Piso de Hormigón Estampado Rojo	2 días	vie 09-08-19					



Proyecto: PROGRAMACION CO	Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
	División	Tarea manual	Hito externo
	Hito	solo duración	Fecha límite
	Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
	Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
	Tarea inactiva	solo el comienzo	
	Hito Inactivo	solo fin	

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

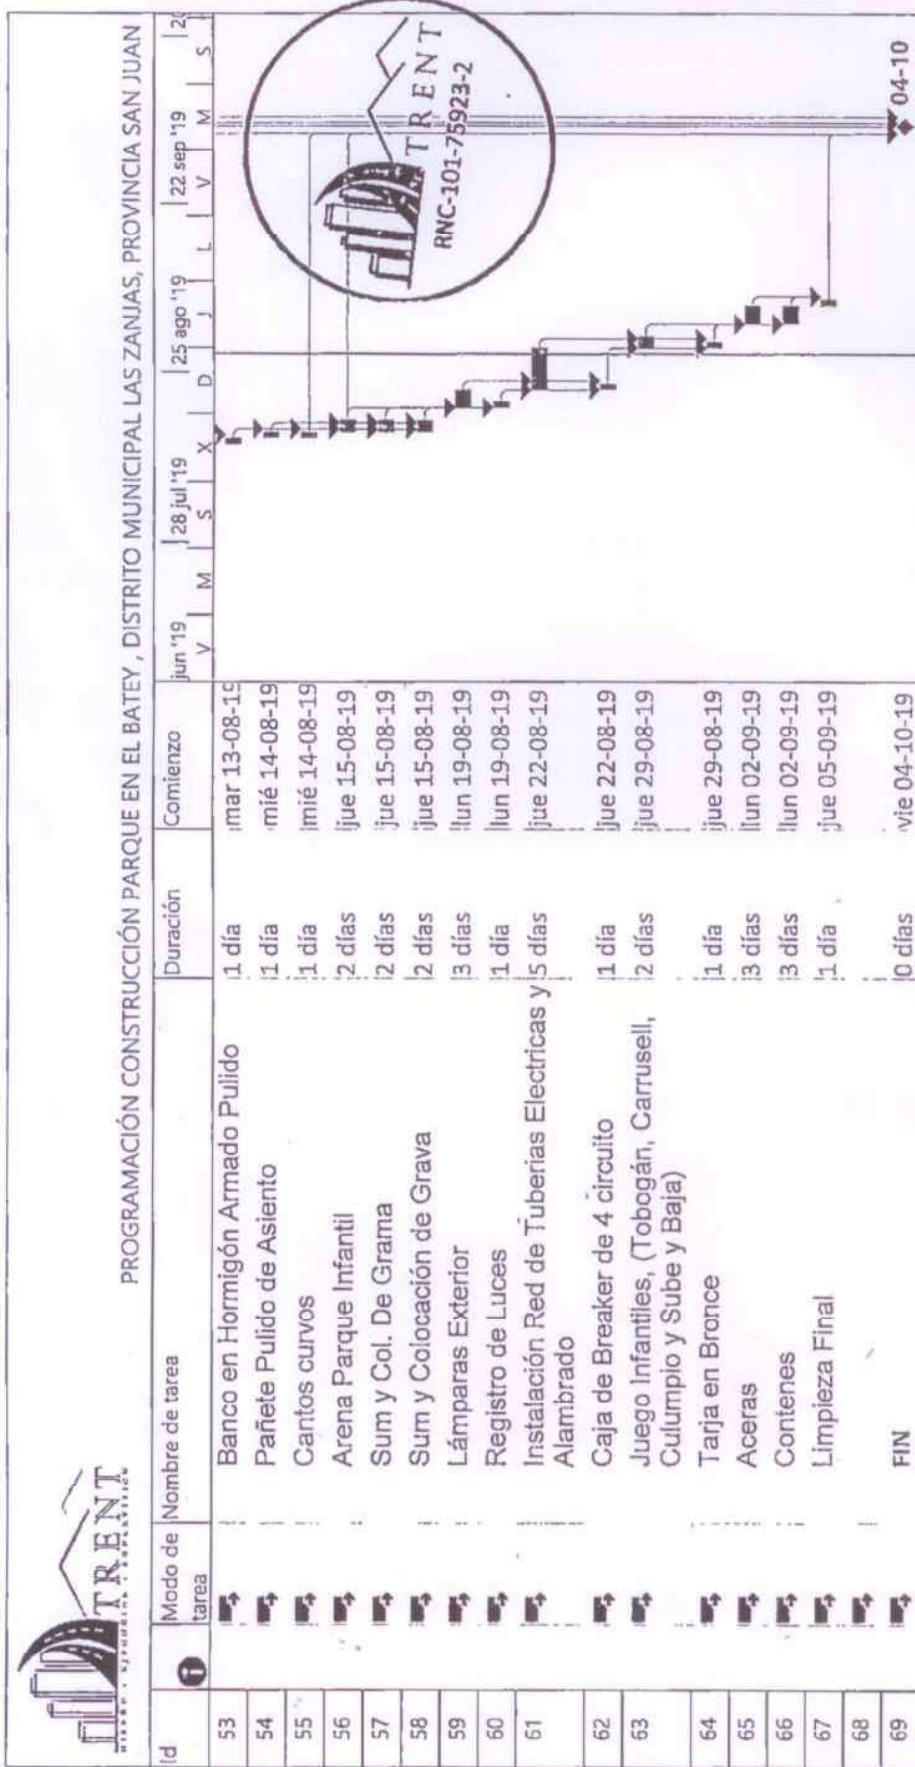

Proyecto: PROGRAMACION CO	Tarea		Resumen Inactivo	Tareas externas
	División		Tarea manual	Hito externo
	Hito		solo duración	Fecha límite
	Resumen		Informe de resumen manual	Progreso
	Resumen del proyecto		Resumen manual	Progreso manual
	Tarea inactiva		solo el comienzo	
	Hito inactivo		solo fin	
