

ID	Task Name	Duration/Start	Finish
1	TRABAJOS PRELIMINARES	3 days	Mon 4/27/20 Wed 4/29/20
2	Ingeniería	1 day	Mon 4/27/20 Mon 4/27/20
3	Campamento	3 days	Mon 4/27/20 Wed 4/29/20
4	REMOZAMIENTO CASA DE EMPLEADOS DE TECHO PLANO I Y II	6 days	Sat 5/23/20 Thu 5/28/20
5	MOVIMIENTO DE TIERRA	3 days	Sat 5/23/20 Mon 5/25/20
6	Remoción de Fino e impermeabilizante existente	2 days	Sat 5/23/20 Sun 5/24/20
7	Bote de Material de Remoción fino e impermeabiliz. 1 day	1 day	Mon 5/25/20 Mon 5/25/20
8	Limpieza en area de fino con detergente y cloro	1 day	Mon 5/25/20 Mon 5/25/20
9	Limpieza de techo con detergente (cloro) y remoci. 1 day	1 day	Mon 5/25/20 Mon 5/25/20
10	PINTURA:	2 days	Wed 5/27/20 Thu 5/28/20
11	Pintura Acrilica superior en techo	2 days	Wed 5/27/20 Thu 5/28/20
12	Pintura acrílica en muros general	2 days	Wed 5/27/20 Thu 5/28/20
13	TERMINACION DE TECHO	2 days	Tue 5/26/20 Wed 5/27/20
14	Fino en techo plano, e=0.07 m	1 day	Tue 5/26/20 Tue 5/26/20
15	Suministro y Colocación de Lona Asfáltica Granul. 1 day	1 day	Wed 5/27/20 Wed 5/27/20
16	REMOZAMIENTO CASA ALMACEN	25 days	Tue 4/28/20 Fri 5/22/20
17	MOVIMIENTO DE TIERRA	5 days	Tue 4/28/20 Sat 5/2/20
18	Desmonte de Techo de asbesto cemento y de estructuras Existentes	5 days	Tue 4/28/20 Sat 5/2/20
19	TECHO	5 days	Sun 5/3/20 Thu 5/7/20
20	En Aluzinc Cal.26 Con Aislante Prepintado (Inc. Tijerilla, Estructura Metálica, mano de obra, Suministro y Colocación Placas metálicas de (0.3x0.3) m HN e= 3/16" y Pernos de 3/4"	5 days	Sun 5/3/20 Thu 5/7/20
22	TERMINACION PISOS:	5 days	Sat 5/9/20 Wed 5/13/20
23	Pisos de Granito fondo blanco 0.4 m x 0.40 m	3 days	Sat 5/9/20 Mon 5/11/20
24	Zócalos de Granito fondo Blanco 0.07 m x 0.40 m	2 days	Tue 5/12/20 Wed 5/13/20
25	PORTAJE :	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
26	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.94 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
27	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.80 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
28	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.78 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
29	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.72 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
30	Suministro y Colocacion de Puerta everdor (0.67 x 2 days	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
31	Suministro y Colocacion Puerta Plegable en despensa(#218 caoba en diamond panel flex o Cerradura para Puerta	2 days	Thu 5/14/20 Fri 5/15/20
33	PINTURA:	8 days	Thu 5/14/20 Thu 5/21/20
34	Pintura acrílica en muros general	8 days	Thu 5/14/20 Thu 5/21/20
35	TERMINACION	4 days	Thu 5/14/20 Sun 5/17/20
36	Plafon PVC con estructura metálica (incluye suministro e instalación)	4 days	Thu 5/14/20 Sun 5/17/20
37	INSTALACIONES ELECTRICAS:	12 days	Fri 5/8/20 Tue 5/19/20
38	Lamparas Fluorescentes de 3 tubos de (2x4) pies	2 days	Mon 5/18/20 Tue 5/19/20

Nombre: Complejo Jimenoa
Inicio: Mon 4/27/20
Terminación: Fri 7/17/20

Legend:


- Task
- Split
- Milestone
- Summary
- Project Summary
- Inactive Task
- Inactive Milestone
- Inactive Summary
- Manual Task
- Duration-only
- Manual Summary Rollup
- Manual Summary
- Start-only
- Finish-only
- External Tasks
- External Milestone
- Deadline
- Progress
- Manual Progress



Jofiel Castillo




July 2020 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | June 2020 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | May 2020 | 28 | 25 | 22

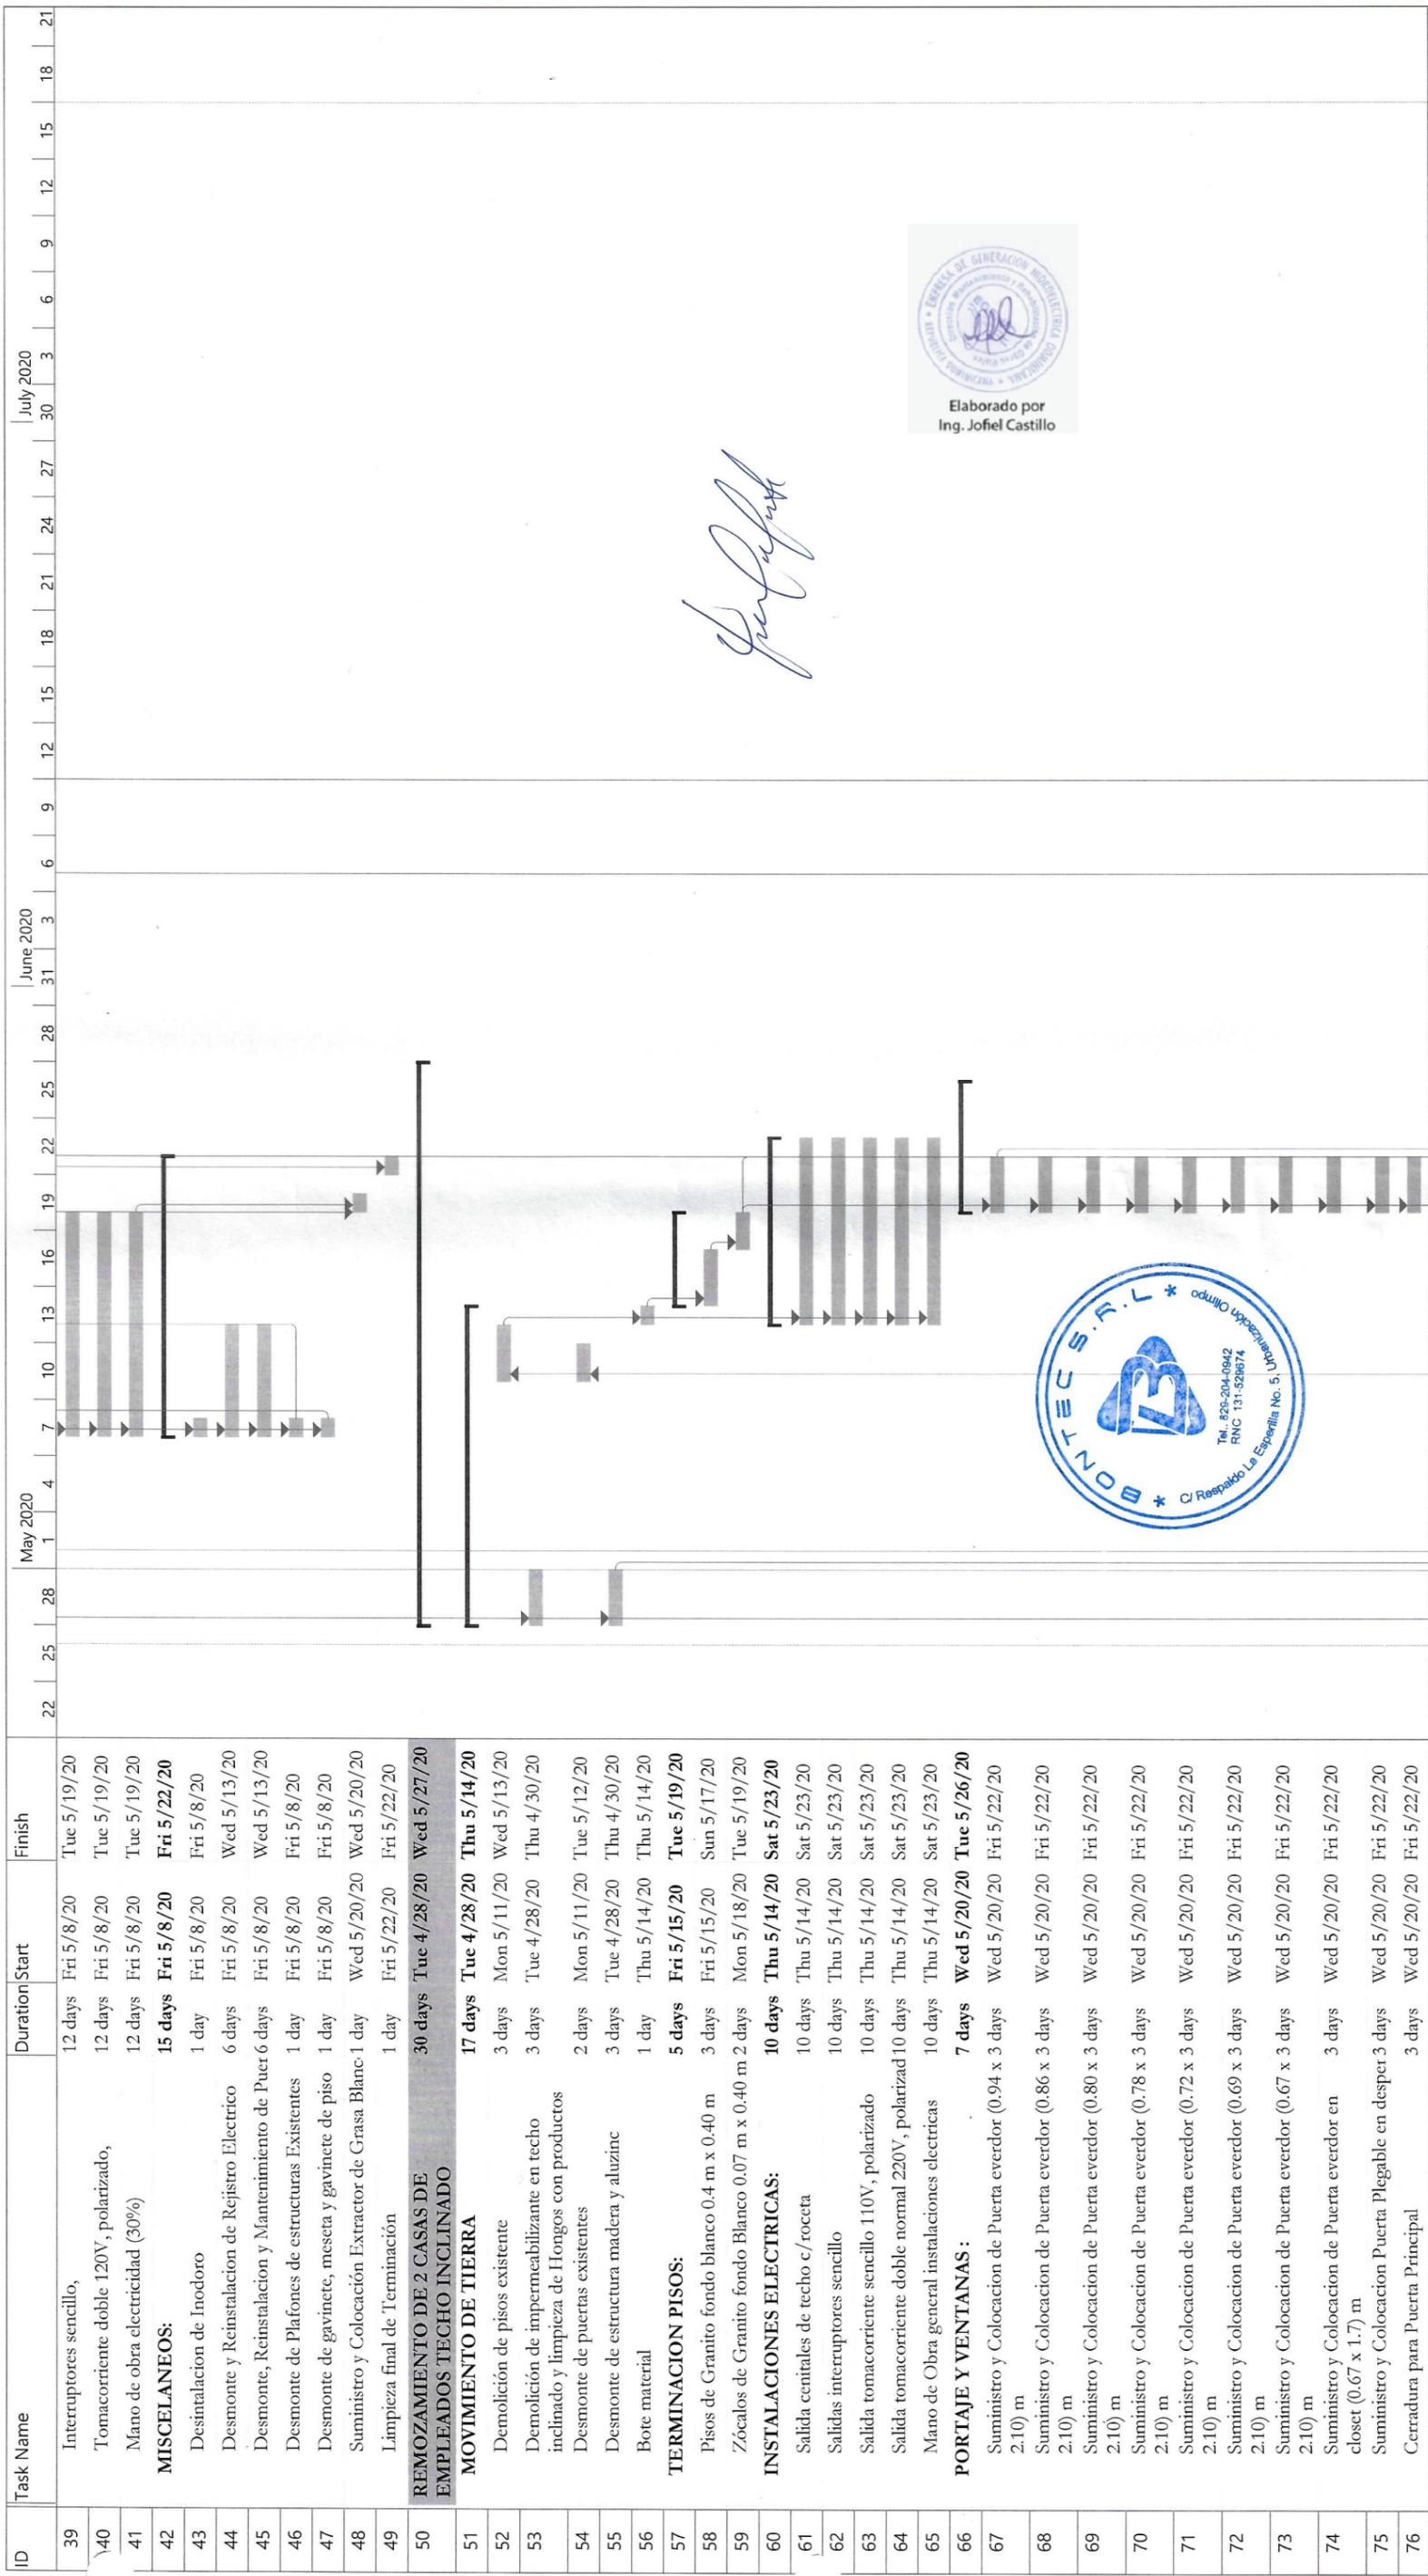

José Jofiel Castillo



Nombre: Complejo Jimenoa Inicio: Mon 4/27/20 Terminación: Fri 7/17/20	Task Split Milestone Summary	Project Summary Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary	Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary	Start-only Finish-only External Tasks External Milestone	Deadline Progress Manual Progress
--	--	---	--	--	--

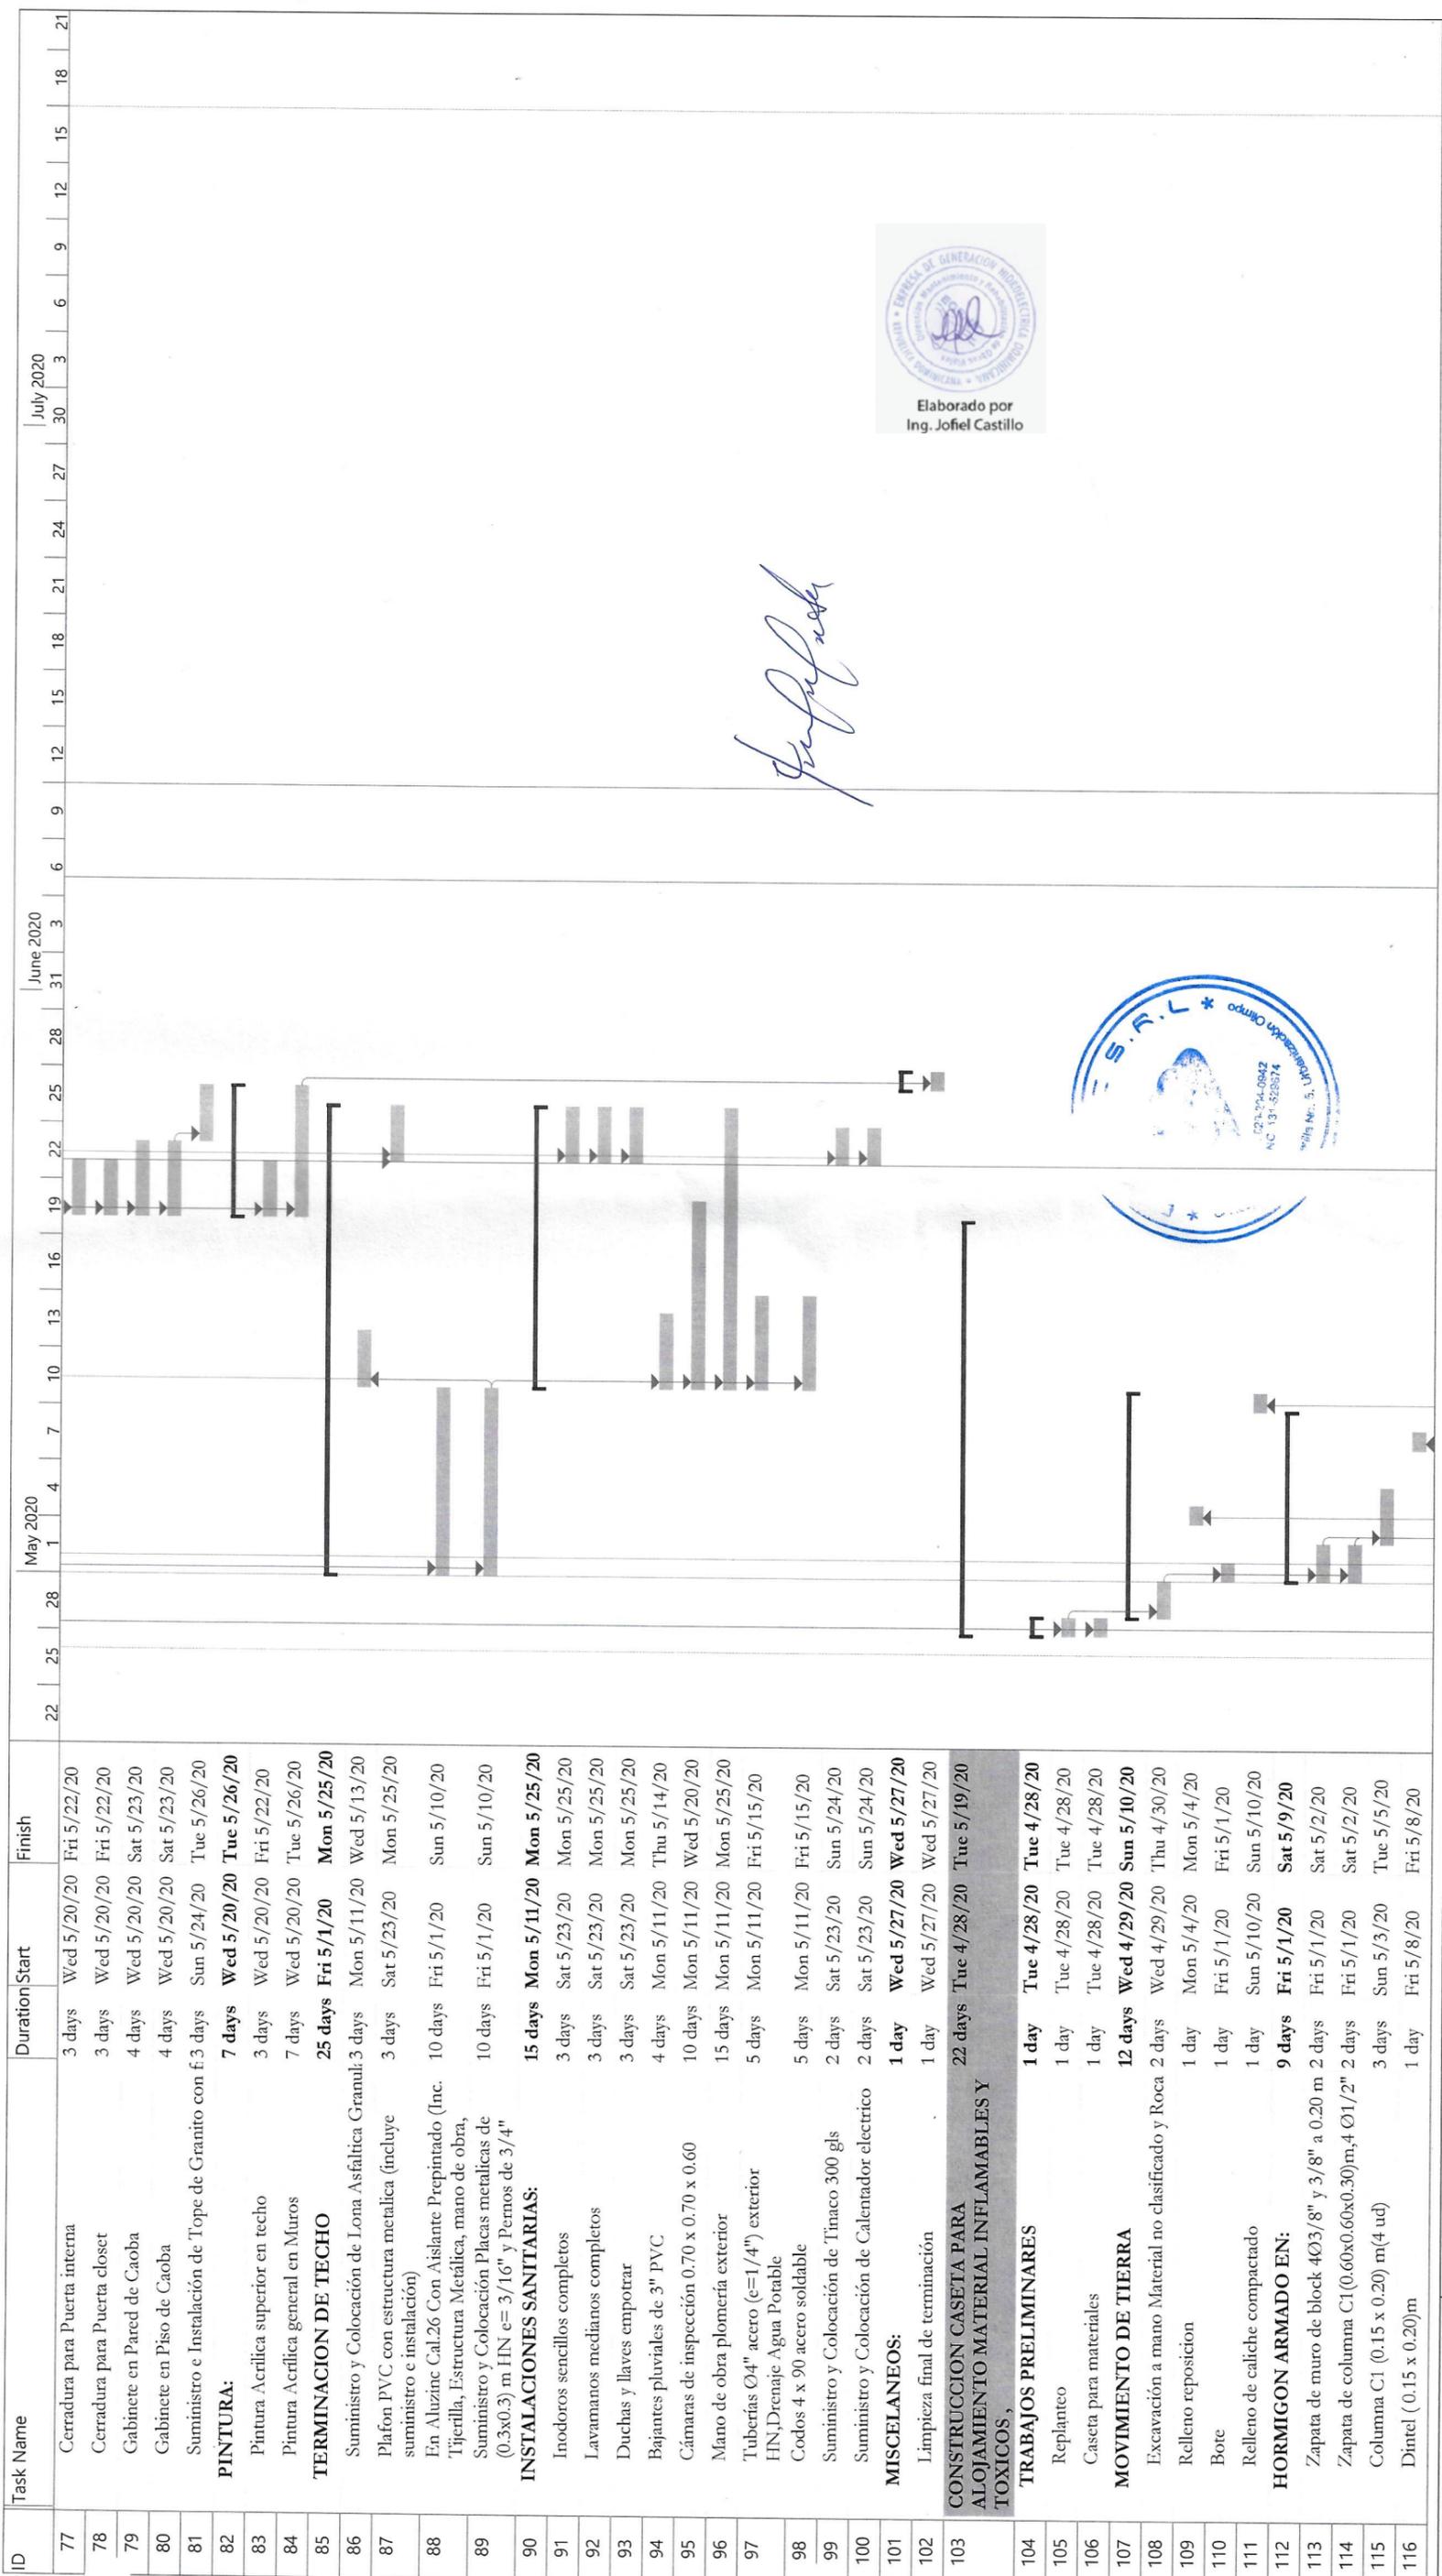

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Jofiel Castillo




ID	Task Name	Duration	Start	Finish
77	Cerradura para Puerta interna	3 days	Wed 5/20/20	Fri 5/22/20
78	Cerradura para Puerta closet	3 days	Wed 5/20/20	Fri 5/22/20
79	Gabinete en Pared de Caoba	4 days	Wed 5/20/20	Sat 5/23/20
80	Gabinete en Piso de Caoba	4 days	Wed 5/20/20	Sat 5/23/20
81	Suministro e Instalación de Tope de Granito con f.3 days	3 days	Sun 5/24/20	Tue 5/26/20
82	PINTURA:	7 days	Wed 5/20/20	Tue 5/26/20
83	Pintura Acrilica superior en techo	3 days	Wed 5/20/20	Fri 5/22/20
84	Pintura Acrilica general en Muros	7 days	Wed 5/20/20	Tue 5/26/20
85	TERMINACION DE TECHO	25 days	Fri 5/1/20	Mon 5/25/20
86	Suministro y Colocación de Lona Asfáltica Granul. 3 days	3 days	Mon 5/11/20	Wed 5/13/20
87	Plafón PVC con estructura metálica (incluye suministro e instalación)	3 days	Sat 5/23/20	Mon 5/25/20
88	En Aluzinc Cal.26 Con Aislante Prepintado (Inc. Tijerilla, Estructura Metálica, mano de obra, Suministro y Colocación Placas metálicas de (0.3x0.3) m HN e= 3/16" y Pernos de 3/4"	10 days	Fri 5/1/20	Sun 5/10/20
90	INSTALACIONES SANITARIAS:	15 days	Mon 5/11/20	Mon 5/25/20
91	Inodoros sencillos completos	3 days	Sat 5/23/20	Mon 5/25/20
92	Lavamanos medianos completos	3 days	Sat 5/23/20	Mon 5/25/20
93	Duchas y llaves empotrar	3 days	Sat 5/23/20	Mon 5/25/20
94	Bajantes pluviales de 3" PVC.	4 days	Mon 5/11/20	Thu 5/14/20
95	Cámaras de inspección 0.70 x 0.70 x 0.60	10 days	Mon 5/11/20	Wed 5/20/20
96	Mano de obra plomería exterior	15 days	Mon 5/11/20	Mon 5/25/20
97	Tuberías Ø4" acero (e=1/4") exterior HN, Drenaje Agua Potable	5 days	Mon 5/11/20	Fri 5/15/20
98	Codos 4 x 90 acero soldable	5 days	Mon 5/11/20	Fri 5/15/20
99	Suministro y Colocación de Tinaco 300 gls	2 days	Mon 5/11/20	Fri 5/15/20
100	Suministro y Colocación de Calentador eléctrico	2 days	Sat 5/23/20	Sun 5/24/20
101	MISCELANEOS:	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20
102	Limpieza final de terminación	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20
103	CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO MATERIAL INFLAMABLES Y TOXICOS,	22 days	Tue 4/28/20	Tue 5/19/20
104	TRABAJOS PRELIMINARES	1 day	Tue 4/28/20	Tue 4/28/20
105	Replanteo	1 day	Tue 4/28/20	Tue 4/28/20
106	Caseta para materiales	1 day	Tue 4/28/20	Tue 4/28/20
107	MOVIMIENTO DE TIERRA	12 days	Wed 4/29/20	Sun 5/10/20
108	Excavación a mano Material no clasificado y Roca 2 days	2 days	Wed 4/29/20	Thu 4/30/20
109	Relleno reposición	1 day	Mon 5/4/20	Mon 5/4/20
110	Bote	1 day	Fri 5/1/20	Fri 5/1/20
111	Relleno de caliche compactado	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20
112	HORMIGON ARMADO EN:	9 days	Fri 5/1/20	Sat 5/9/20
113	Zapata de muro de block 403/8" y 3/8" a 0.20 m 2 days	2 days	Fri 5/1/20	Sat 5/2/20
114	Zapata de columna C1(0.60x0.60x0.30)m,4 Ø1/2" 2 days	2 days	Fri 5/1/20	Sat 5/2/20
115	Columna C1 (0.15 x 0.20) m(4 ud)	3 days	Sun 5/3/20	Tue 5/5/20
116	Dintel (0.15 x 0.20)m	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20

Nombre: Complejo Jimenoa
Inicio: Mon 4/27/20
Terminación: Fri 7/17/20

Task Summary: Manual Task, Duration-only, Manual Summary Rollup, Manual Summary, Project Summary, Inactive Task, Inactive Milestone, Inactive Summary

Start-only, Finish-only, External Tasks, External Milestone

Deadline, Progress, Manual Progress

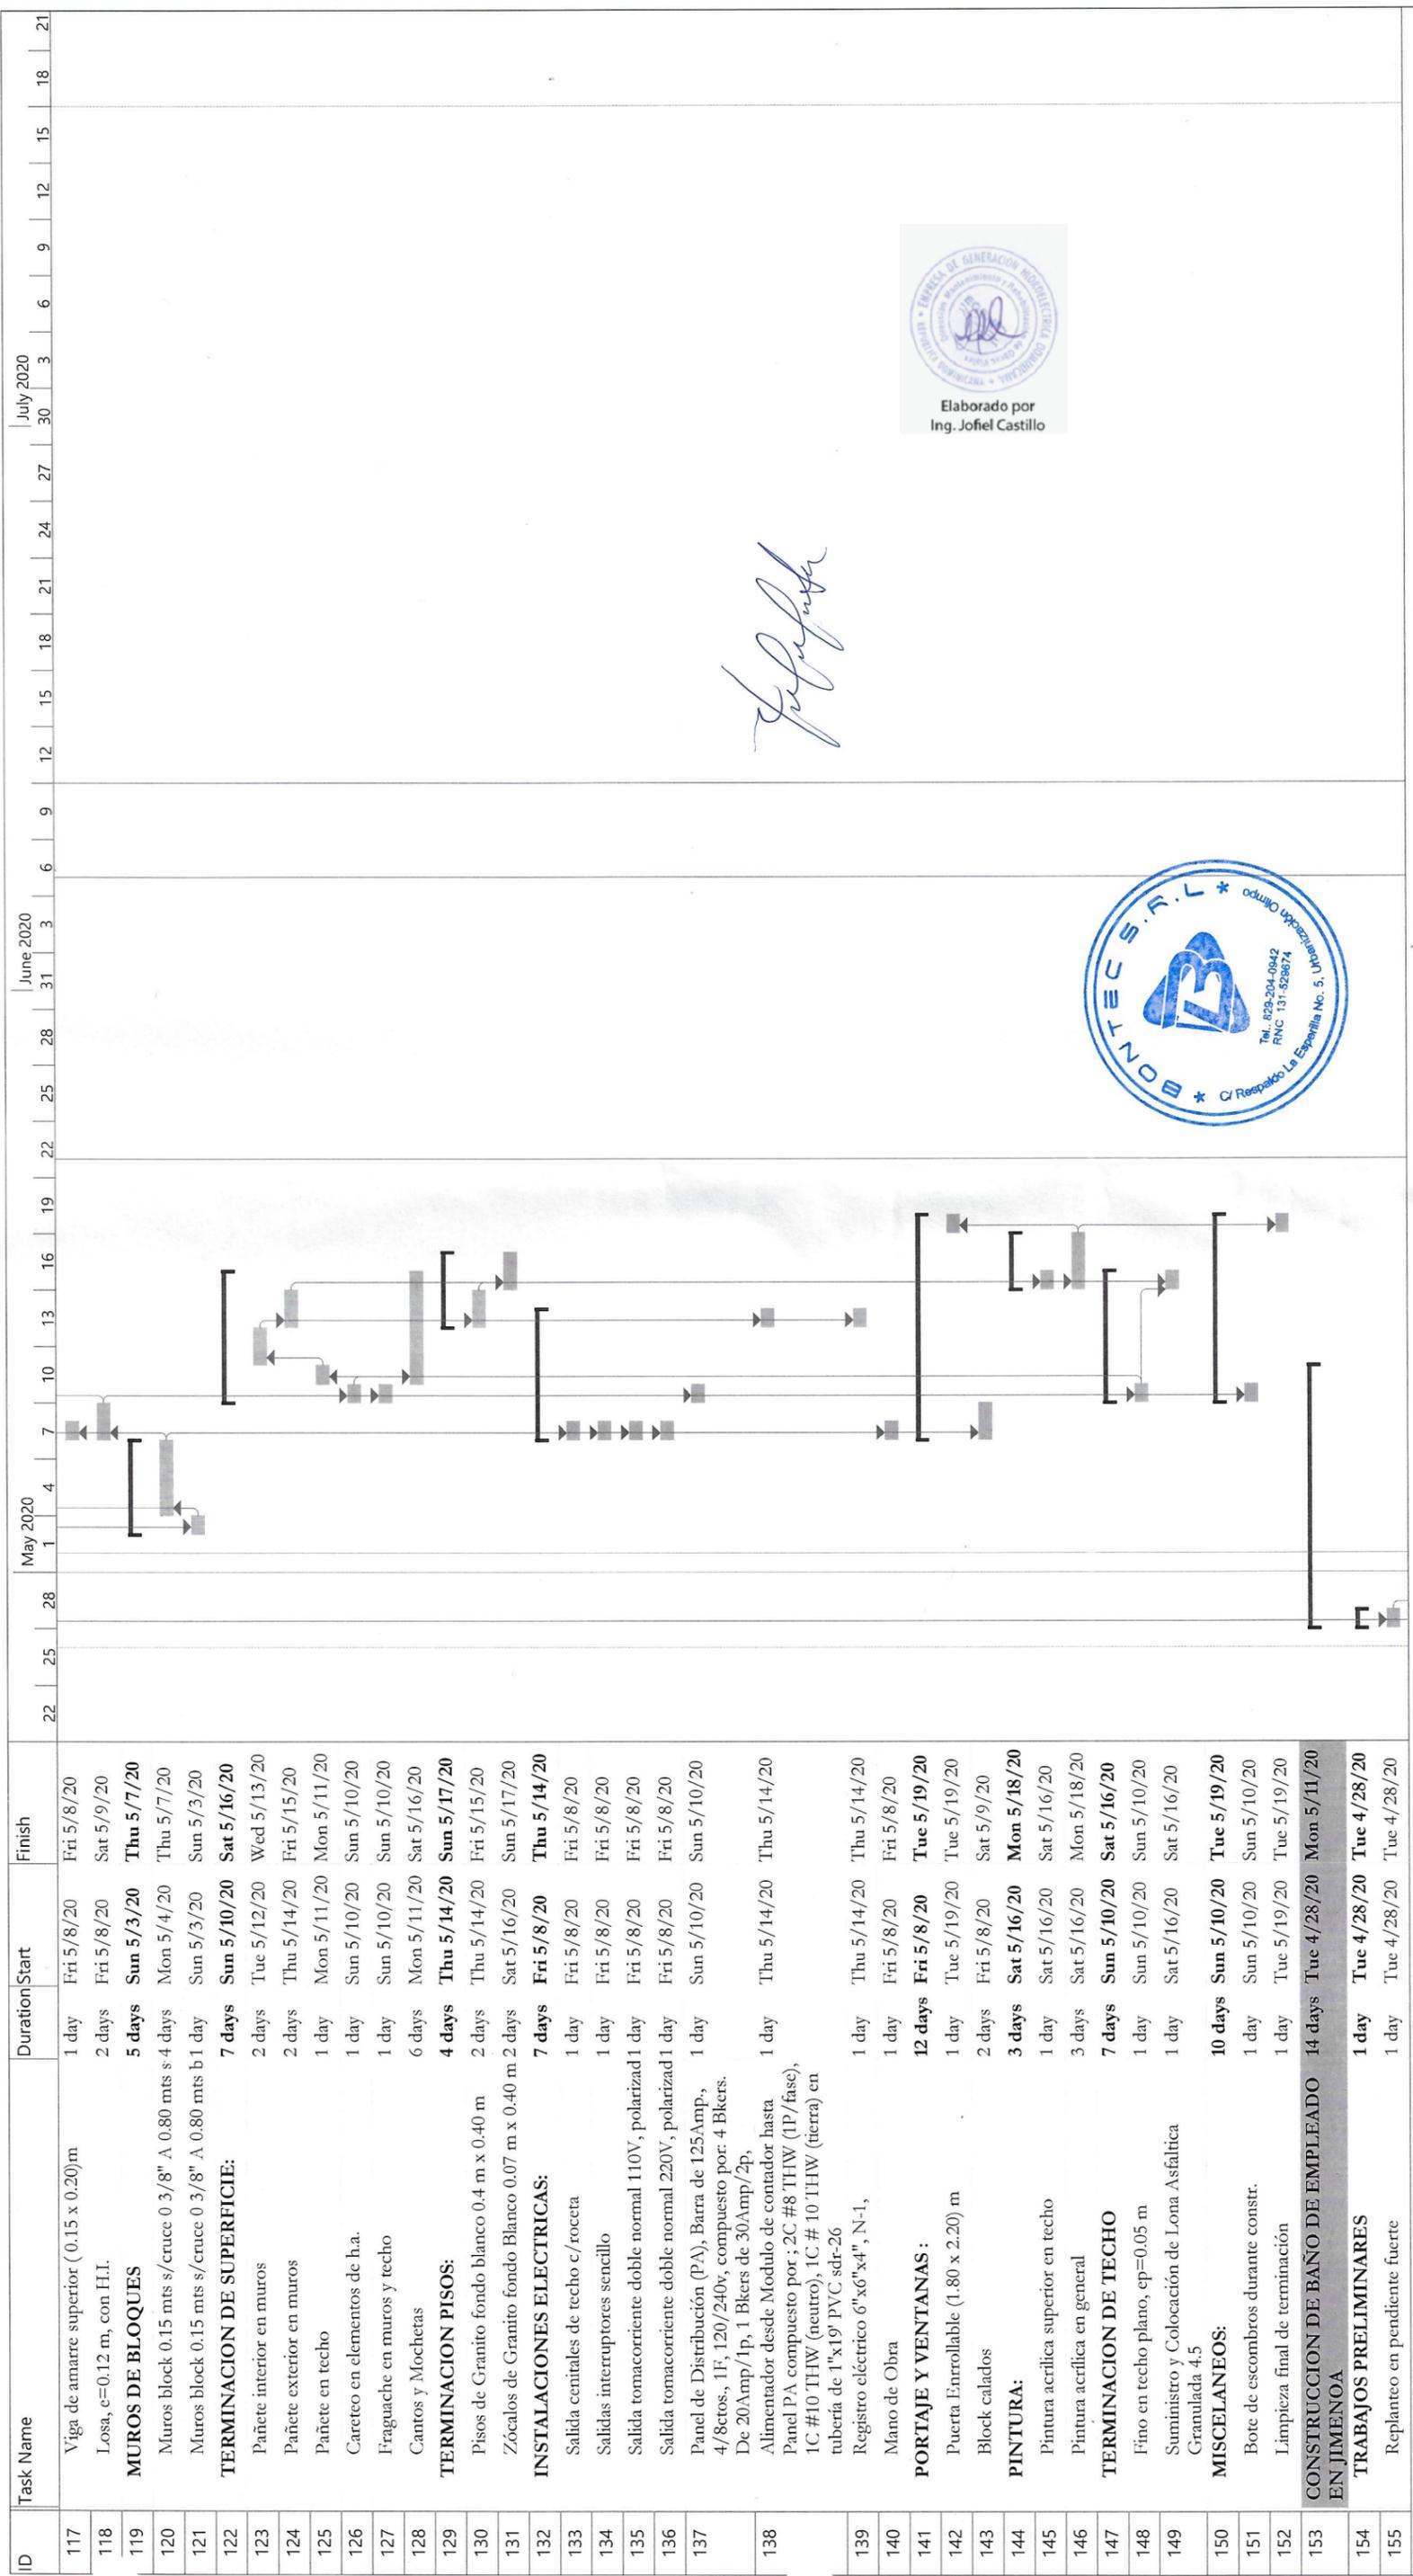

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo




Jofiel Castillo

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
117	Viga de amarre superior (0.15 x 0.20)m	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20
118	Losa, e=0.12 m, con H.I.	2 days	Fri 5/8/20	Sat 5/9/20
119	MUROS DE BLOQUES	5 days	Sun 5/3/20	Thu 5/7/20
120	Muros block 0.15 mts s/cruce 0 3/8" A 0.80 mts s: 4 days	4 days	Mon 5/4/20	Thu 5/7/20
121	Muros block 0.15 mts s/cruce 0 3/8" A 0.80 mts b: 1 day	1 day	Sun 5/3/20	Sun 5/3/20
122	TERMINACION DE SUPERFICIE:	7 days	Sun 5/10/20	Sat 5/16/20
123	Pañete interior en muros	2 days	Tue 5/12/20	Wed 5/13/20
124	Pañete exterior en muros	2 days	Thu 5/14/20	Fri 5/15/20
125	Pañete en techo	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20
126	Careteo en elementos de h.a.	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20
127	Fraguache en muros y techo	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20
128	Cantos y Mochetas	6 days	Mon 5/11/20	Sat 5/16/20
129	TERMINACION PISOS:	4 days	Thu 5/14/20	Sun 5/17/20
130	Pisos de Granito fondo blanco 0.4 m x 0.40 m	2 days	Thu 5/14/20	Fri 5/15/20
131	Zócalos de Granito fondo Blanco 0.07 m x 0.40 m	2 days	Sat 5/16/20	Sun 5/17/20
132	INSTALACIONES ELECTRICAS:	7 days	Fri 5/8/20	Thu 5/14/20
133	Salida cenitales de techo c/rocreta	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20
134	Salidas interruptores sencillo	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20
135	Salida tomacorriente doble normal 110V, polarizad	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20
136	Salida tomacorriente doble normal 220V, polarizad	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20
137	Panel de Distribución (PA), Barra de 125Amp, 4/8ctos, 1F, 120/240v, compuesto por: 4 Bkters. De 20Amp/1p, 1 Bkters de 30Amp/2p, Alimentador desde Modulo de contador hasta Panel PA compuesto por ; 2C #8 THW (1P/fase), 1C #10 THW (neutro), 1C # 10 THW (tierra) en tubería de 1"x19" PVC sdr-26	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20
138	Registro eléctrico 6"x6"x4", N-1, Mano de Obra	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20
139	Registro eléctrico 6"x6"x4", N-1,	1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20
140	Mano de Obra	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20
141	PORTAJE Y VENTANAS :	12 days	Fri 5/8/20	Tue 5/19/20
142	Puerta Enrollable (1.80 x 2.20) m	1 day	Tue 5/19/20	Tue 5/19/20
143	Block calados	2 days	Fri 5/8/20	Sat 5/9/20
144	PINTURA:	3 days	Sat 5/16/20	Mon 5/18/20
145	Pintura acrílica superior en techo	1 day	Sat 5/16/20	Sat 5/16/20
146	Pintura acrílica en general	3 days	Sat 5/16/20	Mon 5/18/20
147	TERMINACION DE TECHO	7 days	Sun 5/10/20	Sat 5/16/20
148	Fino en techo plano, ep=0.05 m	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20
149	Suministro y Colocación de Lona Asfáltica Granulada 4.5	1 day	Sat 5/16/20	Sat 5/16/20
150	MISCELANEOS:	10 days	Sun 5/10/20	Tue 5/19/20
151	Bote de escombros durante constr.	1 day	Sun 5/10/20	Sun 5/10/20
152	Limpieza final de terminación	1 day	Tue 5/19/20	Tue 5/19/20
153	CONSTRUCCION DE BAÑO DE EMPLEADO EN JIMENOA	14 days	Tue 4/28/20	Mon 5/11/20
154	TRABAJOS PRELIMINARES	1 day	Tue 4/28/20	Tue 4/28/20
155	Replanteo en pendiente fuerte	1 day	Tue 4/28/20	Tue 4/28/20

Nombre: Complejo Jimenoa
Inicio: Mon 4/27/20
Terminación: Fri 7/17/20

Task: Manual Task, Duration-only, Manual Summary Rollup, Manual Summary, Project Summary, Inactive Task, Inactive Milestone, Inactive Summary

Deadline: Progress, Manual Progress

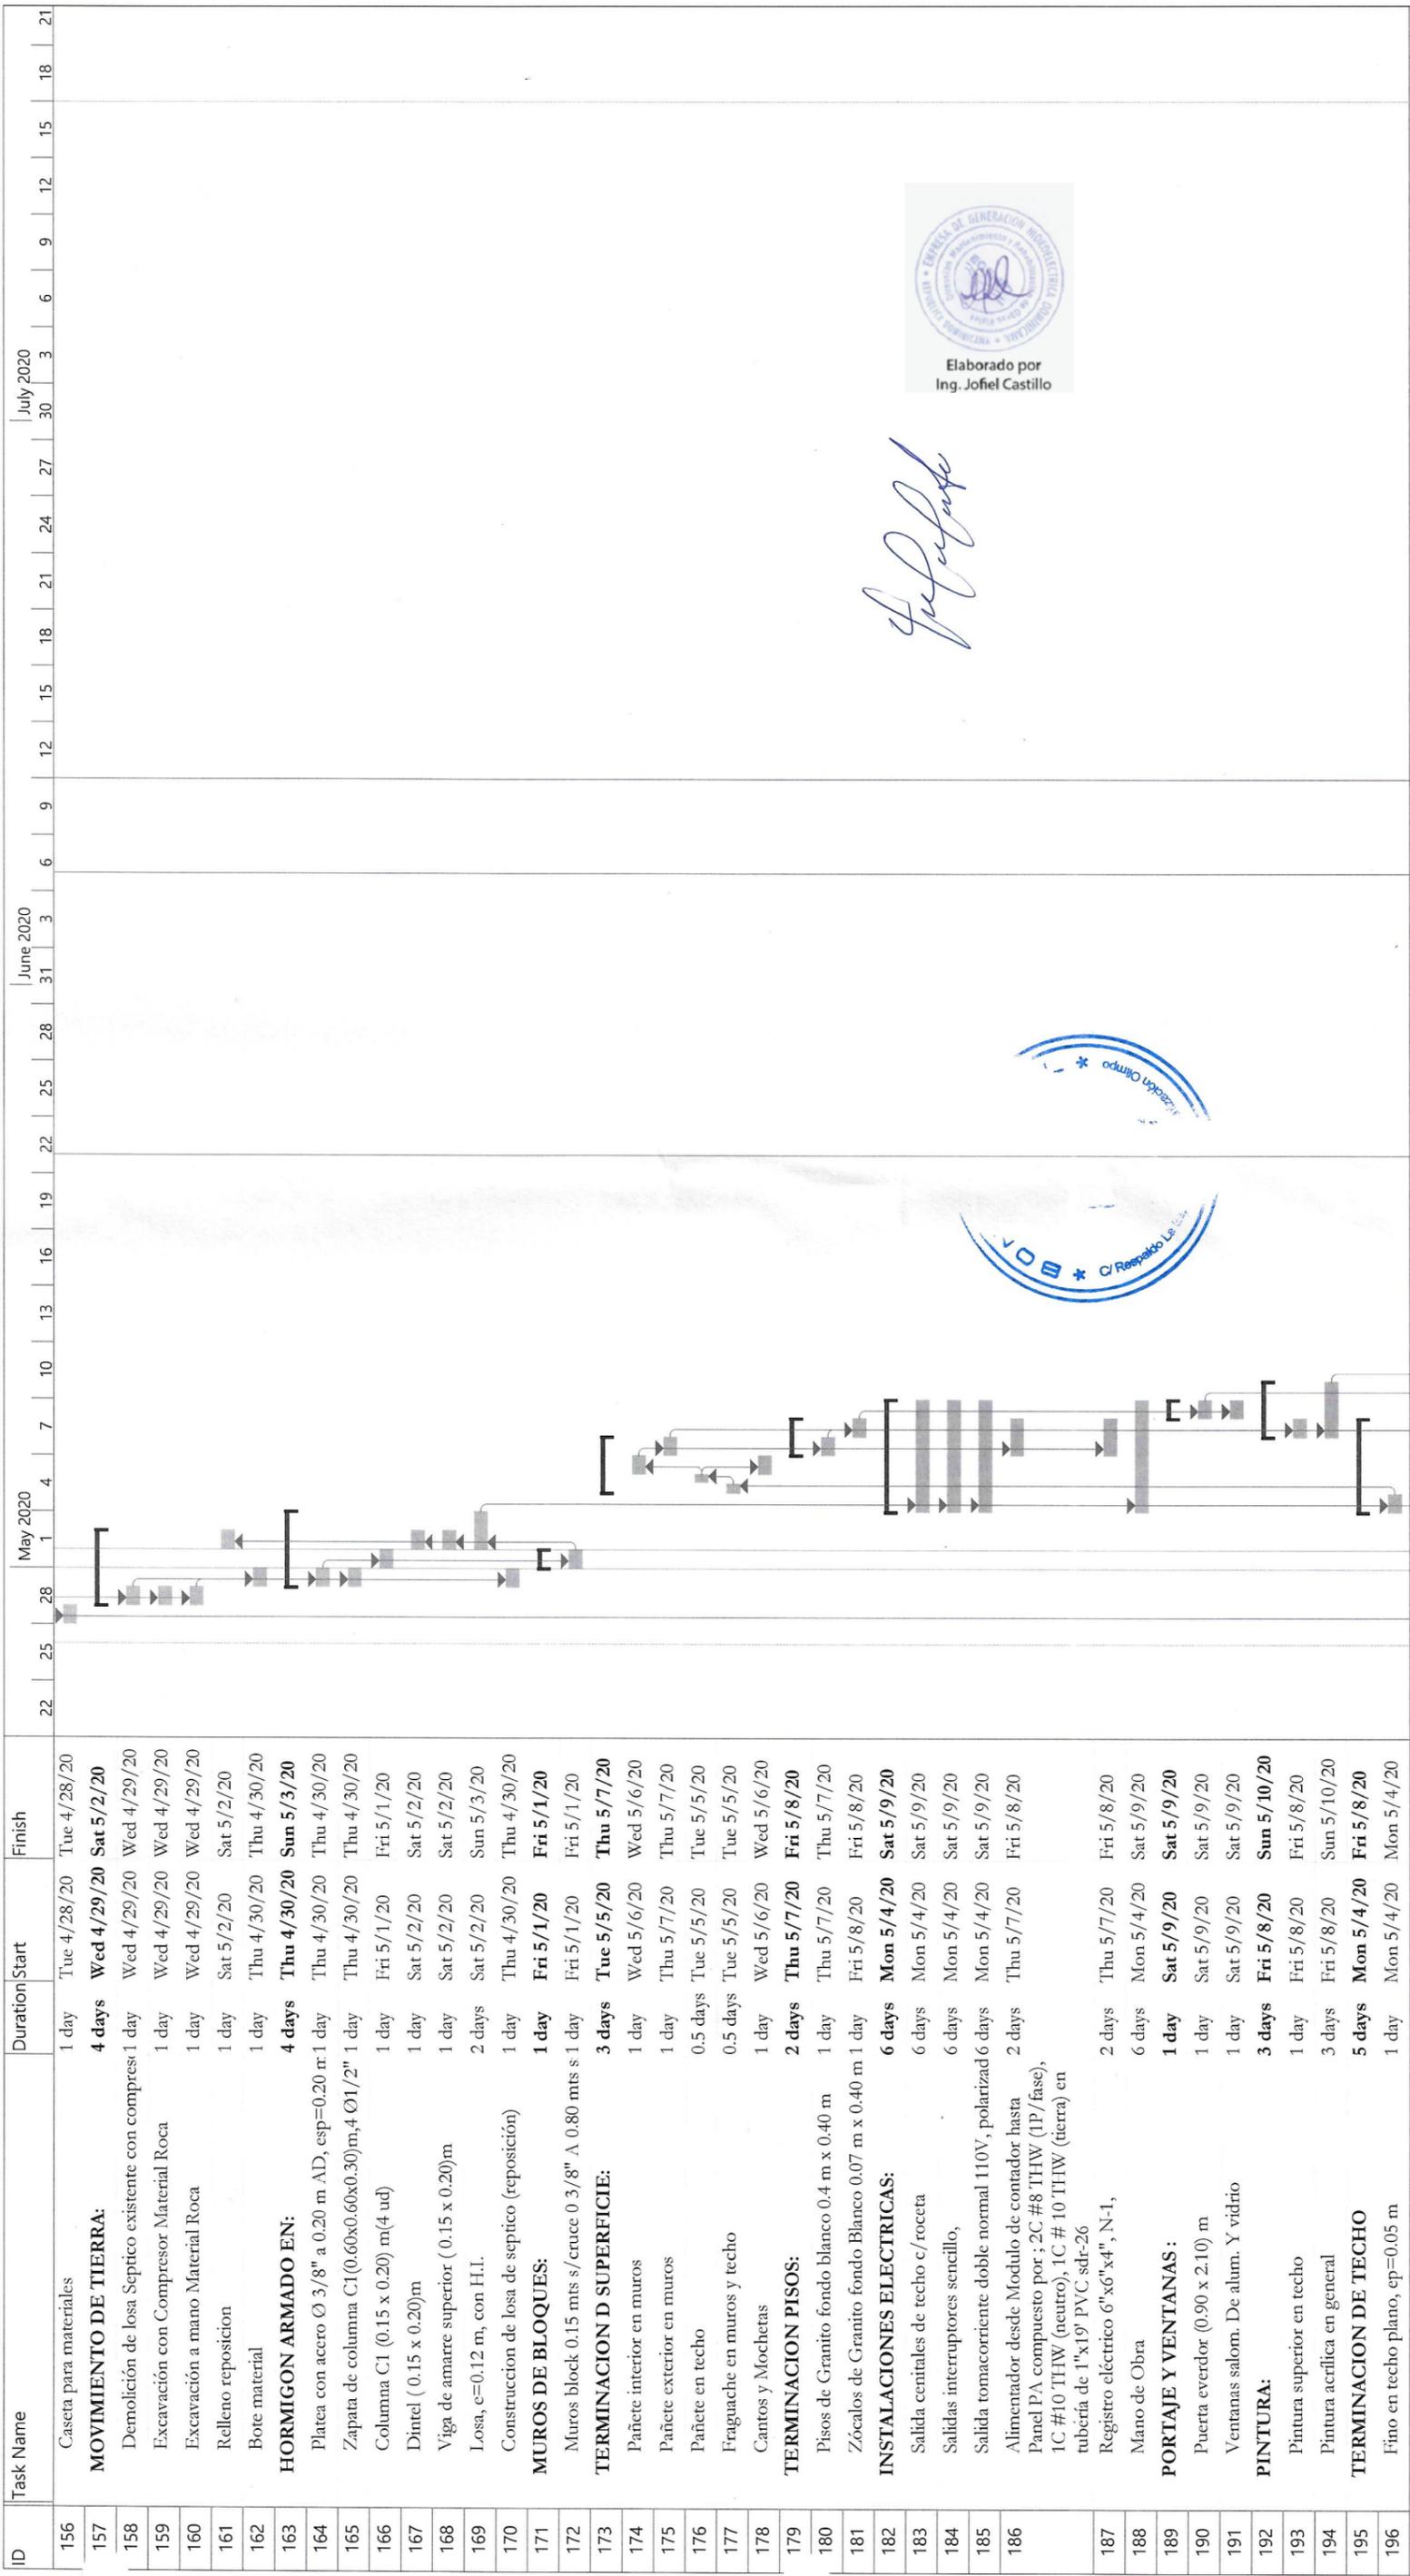

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo


ID	Task Name	Duration/Start	Finish	Manual Task	Duration-only	Manual Summary Rollup	Manual Summary	Project Summary	Inactive Task	Inactive Milestone	Inactive Summary	Task	Split	Milestone	Summary
156	Casera para materiales	1 day Tue 4/28/20	Tue 4/28/20									Task			
157	MOVIMIENTO DE TIERRA:	4 days Wed 4/29/20 Sat 5/2/20	Sat 5/2/20												
158	Demolicion de losa Septico existente con compresor	1 day Wed 4/29/20	Wed 4/29/20												
159	Excavacion con Compresor Material Roca	1 day Wed 4/29/20	Wed 4/29/20												
160	Excavacion a mano Material Roca	1 day Wed 4/29/20	Wed 4/29/20												
161	Relleno reposicion	1 day Sat 5/2/20	Sat 5/2/20												
162	Bote material	1 day Thu 4/30/20	Thu 4/30/20												
163	HORMIGON ARMADO EN:	4 days Thu 4/30/20 Sun 5/3/20	Sun 5/3/20												
164	Platea con acero Ø 3/8" a 0.20 m AD, esp=0.20 m	1 day Thu 4/30/20	Thu 4/30/20												
165	Zapata de columna C1(0.60x0.60x0.30)m,4 Ø1/2"	1 day Thu 4/30/20	Thu 4/30/20												
166	Columna C1 (0.15 x 0.20) m(4 ud)	1 day Fri 5/1/20	Fri 5/1/20												
167	Dintel (0.15 x 0.20)m	1 day Sat 5/2/20	Sat 5/2/20												
168	Viga de amarre superior (0.15 x 0.20)m	1 day Sat 5/2/20	Sat 5/2/20												
169	Losa, e=0.12 m, con H.I.	2 days Sat 5/2/20	Sun 5/3/20												
170	Construccion de losa de septico (reposicion)	1 day Thu 4/30/20	Thu 4/30/20												
171	MUROS DE BLOQUES:	1 day Fri 5/1/20 Fri 5/1/20	Fri 5/1/20												
172	Muros block 0.15 mts s/cruce 0.3/8" Λ 0.80 mts s 1 day	1 day Fri 5/1/20	Fri 5/1/20												
173	TERMINACION D SUPERFICIE:	3 days Tue 5/5/20 Thu 5/7/20	Thu 5/7/20												
174	Pañete interior en muros	1 day Wed 5/6/20	Wed 5/6/20												
175	Pañete exterior en muros	1 day Thu 5/7/20	Thu 5/7/20												
176	Pañete en techo	0.5 days Tue 5/5/20	Tue 5/5/20												
177	Fraguache en muros y techo	0.5 days Tue 5/5/20	Tue 5/5/20												
178	Cantos y Mochetas	1 day Wed 5/6/20	Wed 5/6/20												
179	TERMINACION PISOS:	2 days Thu 5/7/20 Fri 5/8/20	Fri 5/8/20												
180	Pisos de Granito fondo blanco 0.4 m x 0.40 m	1 day Thu 5/7/20	Thu 5/7/20												
181	Zócalos de Granito fondo Blanco 0.07 m x 0.40 m	1 day Fri 5/8/20	Fri 5/8/20												
182	INSTALACIONES ELECTRICAS:	6 days Mon 5/4/20 Sat 5/9/20	Sat 5/9/20												
183	Salida cenitales de techo c/roceta	6 days Mon 5/4/20	Sat 5/9/20												
184	Salidas interruptores sencillo,	6 days Mon 5/4/20	Sat 5/9/20												
185	Salida tomacorriente doble normal 110V, polarizad	6 days Mon 5/4/20	Sat 5/9/20												
186	Alimentador desde Modulo de contador hasta Panel PA compuesto por: 2C #8 THW (1P/fase), 1C #10 THW (neutro), 1C # 10 THW (tierra) en tubería de 1"x19" PVC sdr-26	2 days Thu 5/7/20	Fri 5/8/20												
187	Registro eléctrico 6"x6"x4", N-1,	2 days Thu 5/7/20	Fri 5/8/20												
188	Mano de Obra	6 days Mon 5/4/20	Sat 5/9/20												
189	PORTAJE Y VENTANAS :	1 day Sat 5/9/20 Sat 5/9/20	Sat 5/9/20												
190	Puerta everdor (0.90 x 2.10) m	1 day Sat 5/9/20	Sat 5/9/20												
191	Ventanas salom. De alum. Y vidrio	1 day Sat 5/9/20	Sat 5/9/20												
192	PINTURA:	3 days Fri 5/8/20 Sun 5/10/20	Sun 5/10/20												
193	Pintura superior en techo	1 day Fri 5/8/20	Fri 5/8/20												
194	Pintura acrílica en general	3 days Fri 5/8/20	Sun 5/10/20												
195	TERMINACION DE TECHO	5 days Mon 5/4/20 Fri 5/8/20	Fri 5/8/20												
196	Fino en techo plano, ep=0.05 m	1 day Mon 5/4/20	Mon 5/4/20												



Jofiel Castillo

Nombre: Complejo Jimenoa
Inicio: Mon 4/27/20
Terminación: Fri 7/17/20

Legend: Task, Split, Milestone, Summary, Project Summary, Inactive Task, Inactive Milestone, Inactive Summary, Manual Task, Duration-only, Manual Summary Rollup, Manual Summary, Start-only, Finish-only, External Tasks, External Milestone, Deadline, Progress, Manual Progress.

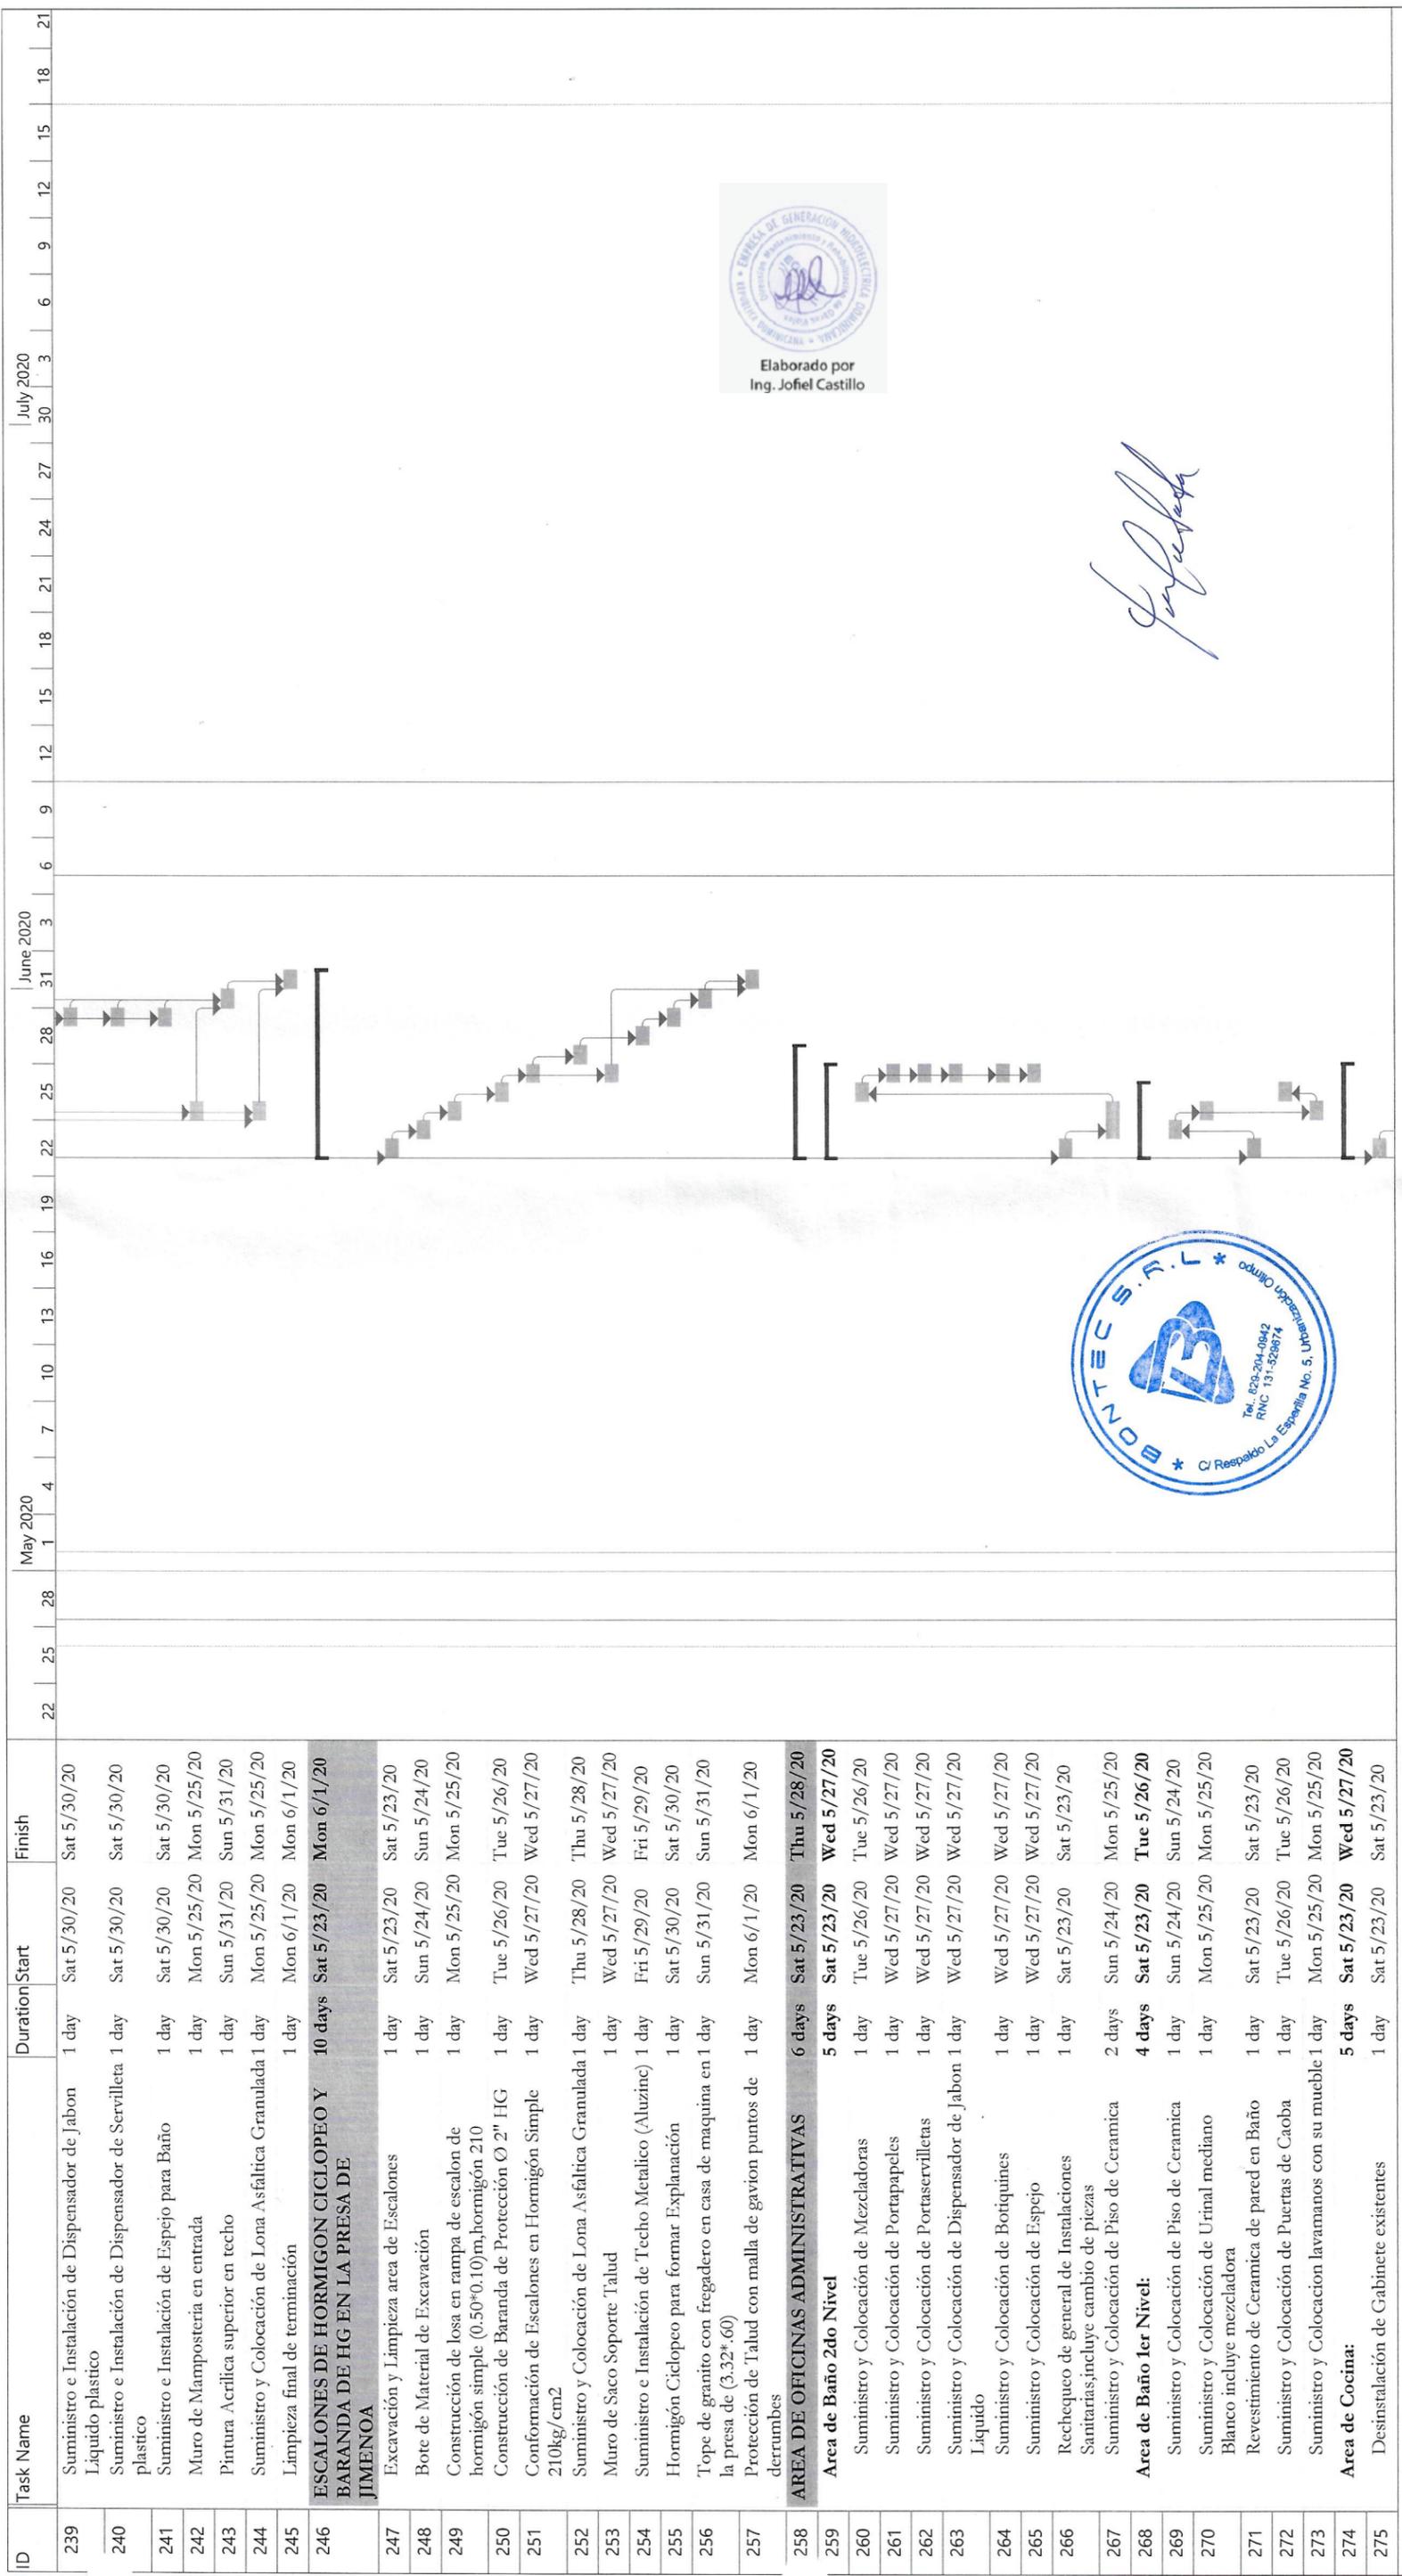

Elaborado por
Ing. Jofel Castillo

Jofel Castillo

Nombre: Complejo Jimenoa
Inicio: Mon 4/27/20
Terminación: Fri 7/17/20


Task
 Split
 Milestone
 Summary

Manual Task
 Duration-only
 Manual Summary Rollup
 Manual Summary

Project Summary
 Inactive Task
 Inactive Milestone
 Inactive Summary

Start-only
 Finish-only
 External Tasks
 External Milestone

Deadline
 Progress
 Manual Progress

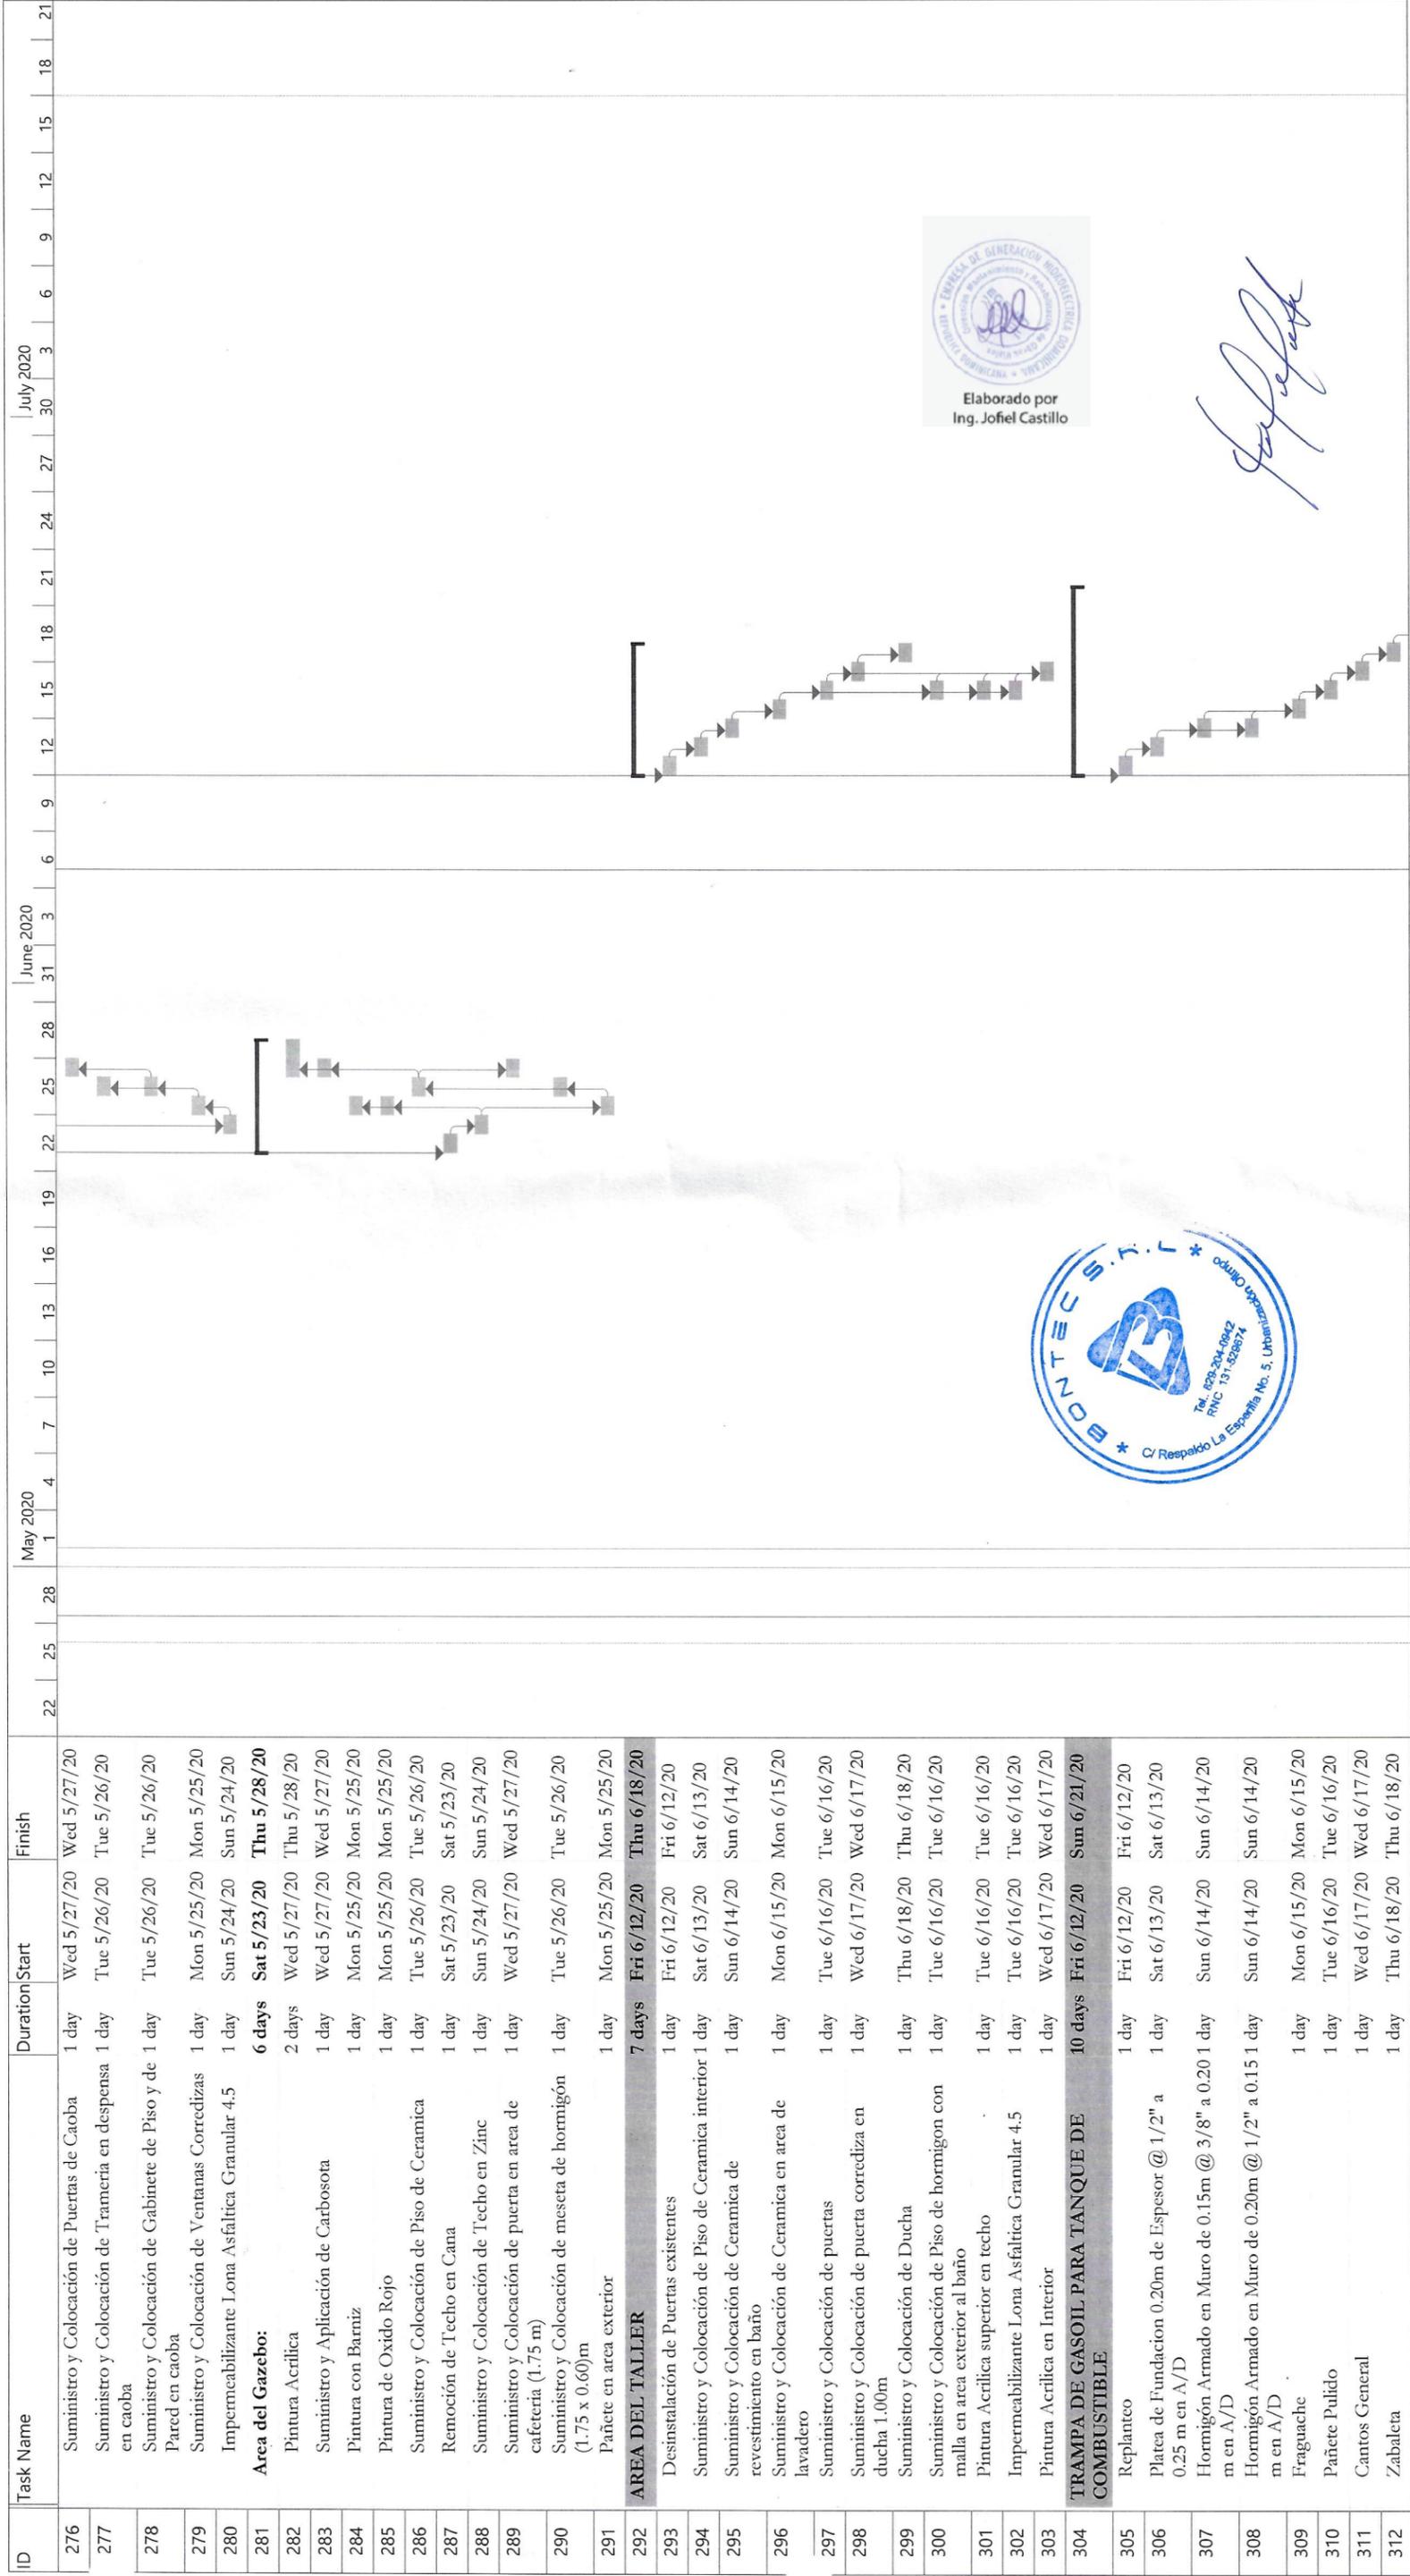


Jofiel Castillo



ID	Task Name	Duration	Start	Finish
276	Suministro y Colocación de Puertas de Caoba	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20
277	Suministro y Colocación de Trameria en despena en caoba	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20
278	Suministro y Colocación de Gabinete de Piso y de Pared en caoba	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20
279	Suministro y Colocación de Ventanas Corredizas	1 day	Mon 5/25/20	Mon 5/25/20
280	Impermeabilizante Lona Asfáltica Granular 4.5	1 day	Sun 5/24/20	Sun 5/24/20
281	Area del Gazebo:	6 days	Sat 5/23/20	Thu 5/28/20
282	Pintura Acrilica	2 days	Wed 5/27/20	Thu 5/28/20
283	Suministro y Aplicación de Carbosota	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20
284	Pintura con Barniz	1 day	Mon 5/25/20	Mon 5/25/20
285	Pintura de Oxido Rojo	1 day	Mon 5/25/20	Mon 5/25/20
286	Suministro y Colocación de Piso de Ceramica	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20
287	Remoción de Techo en Cana	1 day	Sat 5/23/20	Sat 5/23/20
288	Suministro y Colocación de Techo en Zinc	1 day	Sun 5/24/20	Sun 5/24/20
289	Suministro y Colocación de puerta en area de cafeteria (1.75 m)	1 day	Wed 5/27/20	Wed 5/27/20
290	Suministro y Colocación de meseta de hormigon (1.75 x 0.60)m	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20
291	Pañete en area exterior	1 day	Mon 5/25/20	Mon 5/25/20
292	AREA DEL TALLER	7 days	Fri 6/12/20	Thu 6/18/20
293	Desinstalación de Puertas existentes	1 day	Fri 6/12/20	Fri 6/12/20
294	Suministro y Colocación de Piso de Ceramica interior	1 day	Sat 6/13/20	Sat 6/13/20
295	Suministro y Colocación de Ceramica de revestimiento en baño	1 day	Sun 6/14/20	Sun 6/14/20
296	Suministro y Colocación de Ceramica en area de lavadero	1 day	Mon 6/15/20	Mon 6/15/20
297	Suministro y Colocación de puertas	1 day	Tue 6/16/20	Tue 6/16/20
298	Suministro y Colocación de puerta corrediza en ducha 1.00m	1 day	Wed 6/17/20	Wed 6/17/20
299	Suministro y Colocación de Ducha	1 day	Thu 6/18/20	Thu 6/18/20
300	Suministro y Colocación de Piso de hormigon con malla en area exterior al baño	1 day	Tue 6/16/20	Tue 6/16/20
301	Pintura Acrilica superior en techo	1 day	Tue 6/16/20	Tue 6/16/20
302	Impermeabilizante Lona Asfáltica Granular 4.5	1 day	Tue 6/16/20	Tue 6/16/20
303	Pintura Acrilica en Interior	1 day	Wed 6/17/20	Wed 6/17/20
304	TRAMPA DE GASOIL PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE	10 days	Fri 6/12/20	Sun 6/21/20
305	Replanteo	1 day	Fri 6/12/20	Fri 6/12/20
306	Plataca de Fundacion 0.20m de Espesor @ 1/2" a 0.25 m en A/D	1 day	Sat 6/13/20	Sat 6/13/20
307	Hormigon Armado en Muro de 0.15m @ 3/8" a 0.20 1 day en A/D	1 day	Sun 6/14/20	Sun 6/14/20
308	Hormigon Armado en Muro de 0.20m @ 1/2" a 0.15 1 day en A/D	1 day	Sun 6/14/20	Sun 6/14/20
309	Fraguache	1 day	Mon 6/15/20	Mon 6/15/20
310	Pañete Pulido	1 day	Tue 6/16/20	Tue 6/16/20
311	Cantos General	1 day	Wed 6/17/20	Wed 6/17/20
312	Zabaleta	1 day	Thu 6/18/20	Thu 6/18/20

Nombre: Complejo Jimenoa	Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Inicio: Mon 4/27/20	Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Terminación: Fri 7/17/20	Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
	Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

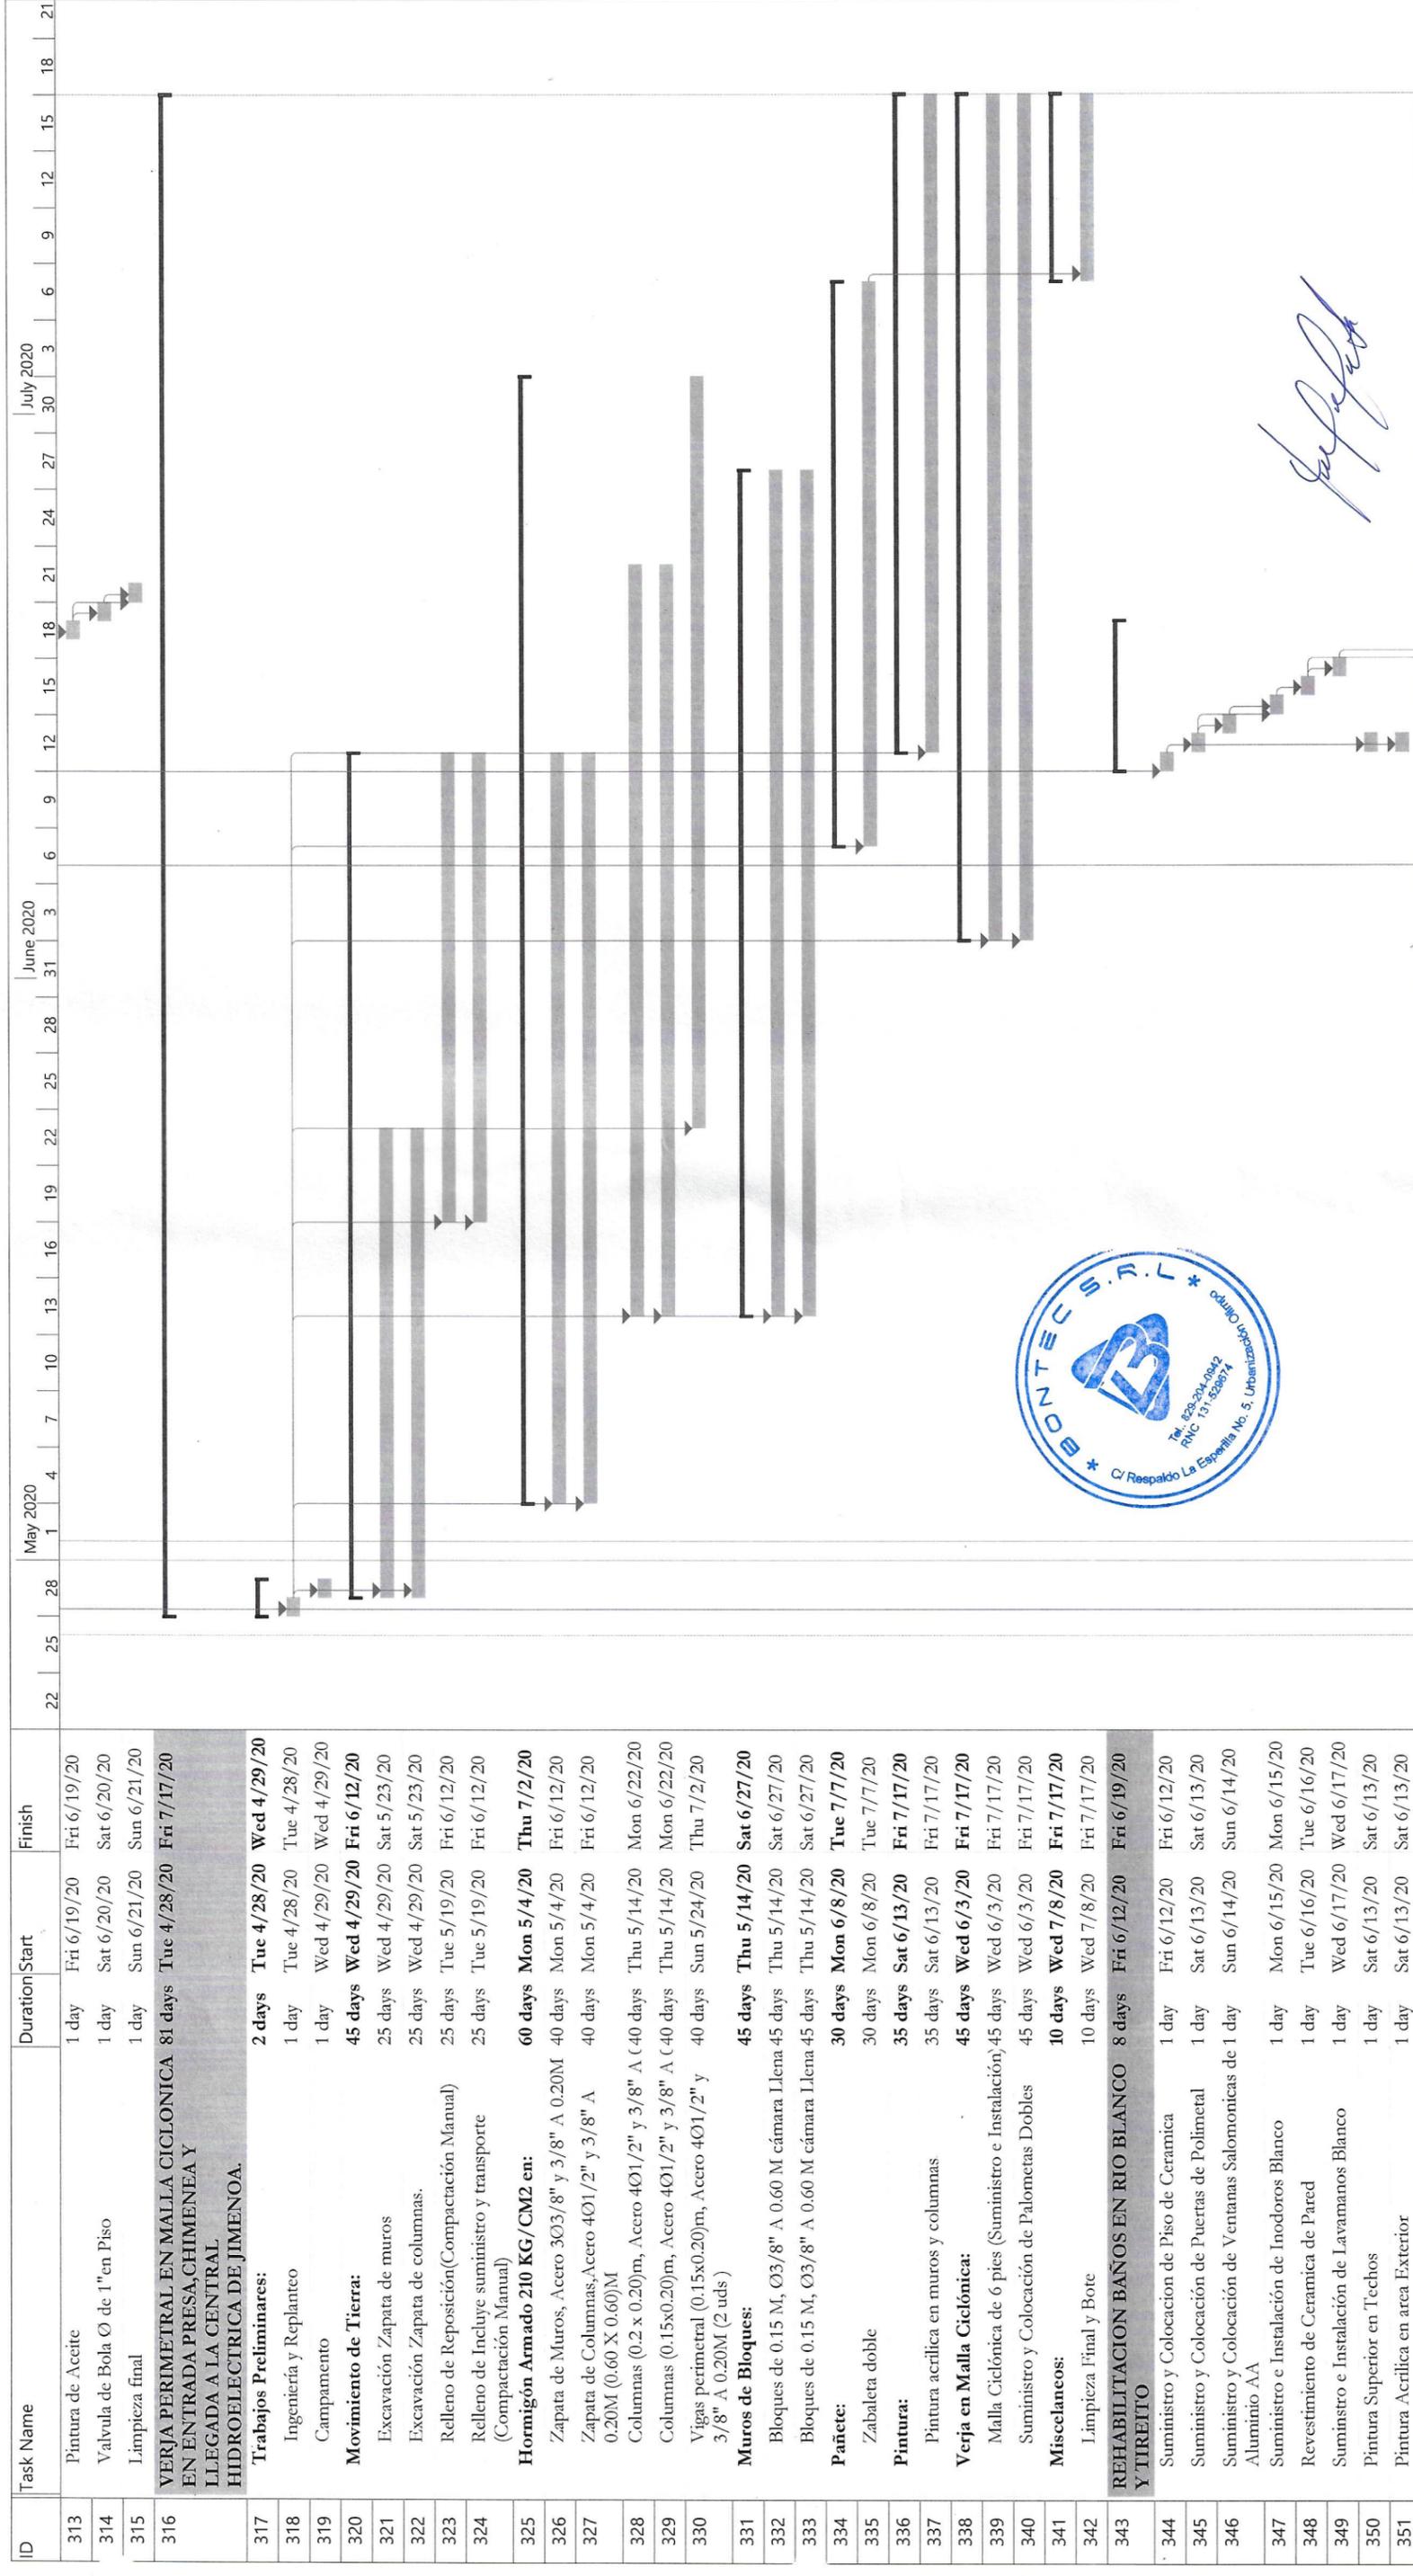


José Rafael



Task: Manual Task, Duration-only, Manual Summary Rollup, Manual Summary
 Split: Start-only, Finish-only, External Tasks, External Milestone
 Milestone: Project Summary, Inactive Task, Inactive Milestone, Inactive Summary
 Summary: Manual Progress, Manual Progress

Nombre: Complejo Jimenoa
 Inicio: Mon 4/27/20
 Terminación: Fri 7/17/20

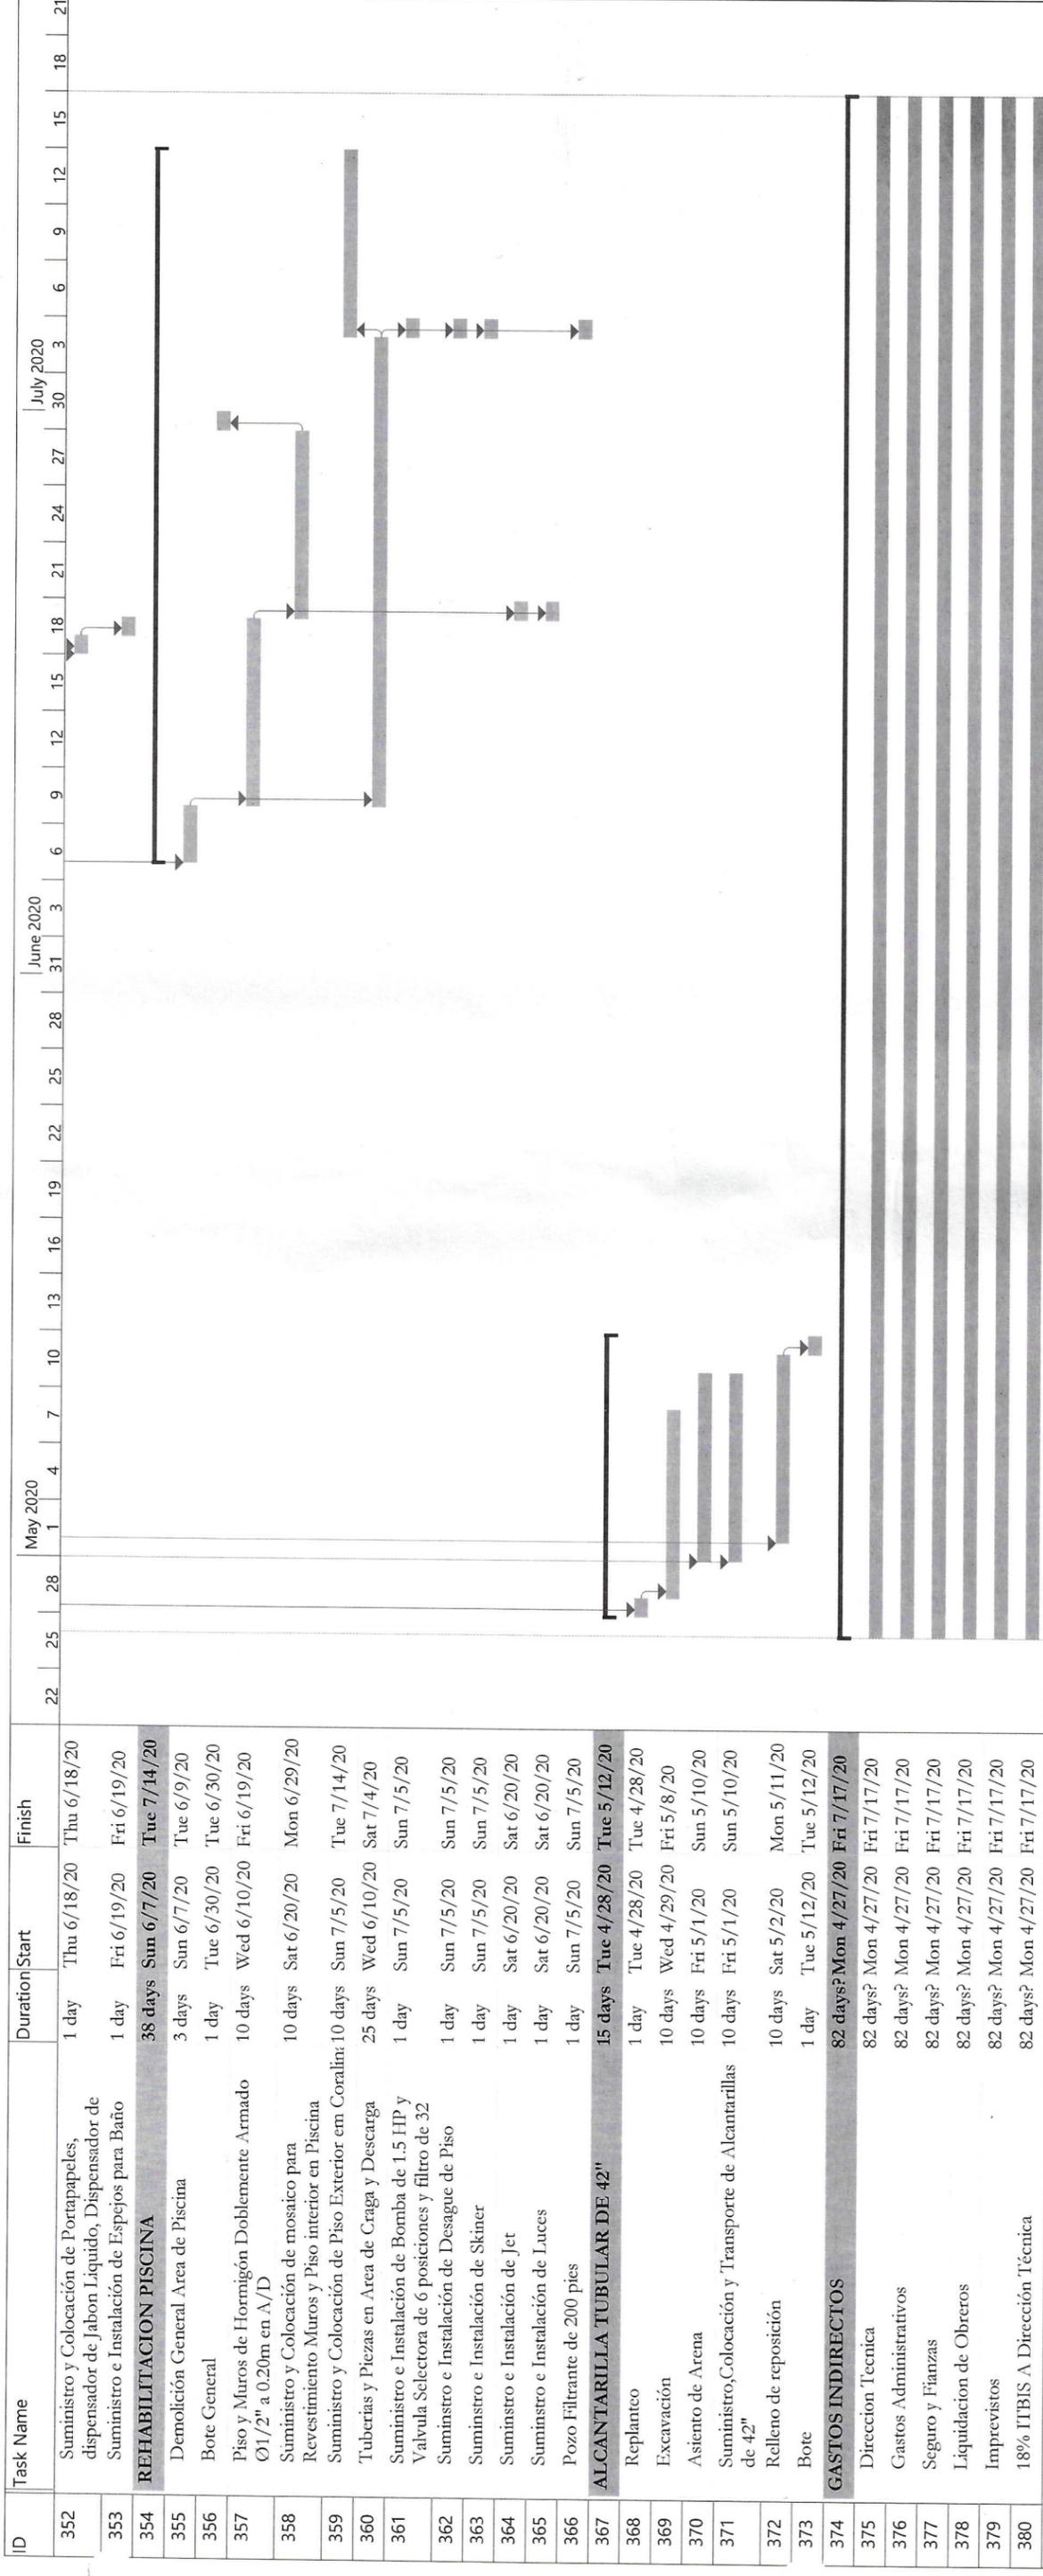

Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

Nombre: Complejo Jimenoa Inicio: Mon 4/27/20 Terminación: Fri 7/17/20	Task Project Summary Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Task Split Milestone Summary	Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary	Start-only Finish-only External Tasks External Milestone	Deadline Progress Manual Progress
--	---	---	---	---
