

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	T	W	T	W	T	F	S	S	M	Mar 22, '20	S	F	S	M	Mar 29, '20	S	F	S	M	Apr 5, '20		
1	?	DIVERSOS DE LA																											
2	?																												
3	?																												
4	?																												
5	?																												
6	?																												
7	?	Solución Agua Potable Sector Vista Hermosa y la Plata.																											
8	?		Trabajos Preliminares:																										
9	?		Ingeniería	2 days	Fri 4/24/20	Mon 4/27/20																							
10	?		Campamento	4 days	Tue 4/28/20	Fri 5/1/20	9																						
11	?		Limpieza de Cañada	5 days	Mon 5/4/20	Fri 5/8/20	10																						
12	?	Demolición de Acera	3 days	Mon 5/11/20	Wed 5/13/20	11																							
13	?	Movimiento de Tierra																											
14	?		Excavación para Tubería	2 days	Mon 5/11/20	Tue 5/12/20	11																						
15	?		Excavación para Manguera	2 days	Mon 5/11/20	Tue 5/12/20	11																						
16	?		Bote de Material	3 days	Wed 5/13/20	Fri 5/15/20	16																						
17	?	Miscelaneo																											
18	?		Suministro y Colocación de Tuberí de a Ø 2" en línea de impulsión Paso del Tunnel.	3 days	Wed 5/13/20	Fri 5/15/20	15																						
19	?		Suministro y Colocación de Tubería de Ø 3" Hg en línea de descarga Paso del Tunnel.	3 days	Wed 5/13/20	Fri 5/15/20	15																						
20	?	Suministro y Colocación de Manguera Ø 90 mm en línea de impulsión pn4.																											
21	?		Suministro y Colocación de Tubería Ø 3" PVC SDR-26 para empalme línea de	2 days	Wed 5/13/20	Thu 5/14/20	15																						
22	?	Suministro y Colocación de Tubería Ø 3" PVC SDR-26 para empalme línea de																											
23	?		empalme línea de	2 days	Wed 5/13/20	Thu 5/14/20	15																						



Fecha límite →
Progreso ———
Progreso manual ———
solo el comienzo [
solo fin]
Tareas externas ———
Hito externo ———
Tarea manual ———
solo duración ———
Informe de resumen manual ———
Resumen manual ———
Resumen del proyecto ———
Tarea inactiva
Hito inactivo ◆
Resumen inactivo ———
Tarea ———
División
Hito ◆
Resumen ———

Proyecto: Vista hermosa, la plata
 Fecha: Wed 3/18/20

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
36	★	Suministro de alambrado Triple AAA 1/0.	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	33	
37	★	Instalación Tendido Eléctrico.	2 days	Fri 5/15/20	Mon 5/18/20	33	
38	★	Transporte Postes de Luz (5unds.).	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	33	
39	★	Acera de Hormigón	2 days	Mon 5/18/20	Tue 5/19/20	35	
40	★	Construcción de Zabaleta de Protección a Tubería Hg Paso del Tunnel.	2 days	Mon 5/18/20	Tue 5/19/20	35	
41	★						
42	★						
43	★	Caseta de Bombeo					
44	★	Replanteo y Nivelación.	1 day	Mon 5/4/20	Mon 5/4/20	10	
45	★	Platea de Fundación	2 days	Tue 5/5/20	Wed 5/6/20	44	
46	★	Dinteles	2 days	Thu 5/7/20	Fri 5/8/20	45	
47	★	Losa de Techo de Ø 3/8" a 0.15m en AD doblemente armada.	3 days	Mon 5/11/20	Wed 5/13/20	46	
48	★	Blocks de 6" SNP	1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20	45	
49	★	Pañete en Muros	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	48	
50	★	Pañete en Techo.	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	48	
51	★	Piso de Hormigón Frotado.	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50	
52	★	Suministro y Colocación de Puerta Enrollable	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	51	
53	★	Pintura Acrílica en Muro.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	51	
54	★	Pintura Económica en Techo	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	51	
55	★	Salida de Luces Genitales	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50	
56	★	Interruptores Sencillos	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50	
57	★	Tomacorriente Doble 120V, Polarizado	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50	
58	★	Caja de Breakers de 2 a 4	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50	
59	★	Mano Obra de Electricidad	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50	
60	★	Tubería y Piezas	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	50	
61	★	Limpieza Final	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	60	
62	★						
63	★	Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en el Sector La Movimiento de Tierra.					
64	★	Construcción Terracería.	2 days	Tue 5/5/20	Wed 5/6/20	44	
65	★						



Proyecto: Vista hermosa, la plat
 Fecha: Wed 3/18/20

Legend:


- Tarea manual
- solo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual
- Resumen del proyecto
- Tarea inactiva
- Hito inactivo
- Resumen inactivo
- solo el comienzo
- solo fin
- Tareas externas
- Hito externo


Fecha límite:
 Progreso:
 Progreso manual:

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	T	W	T	W	T	F	S	Mar 22, '20	S	M	T	W	T	F	S	Mar 29, '20	S	M	T	W	T	F	S	Apr 5, '20		
108	✓	Dinteles	1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20	107																											
109	✓	Losa.	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	108																											
110	✓	Blocks de 6" SNP	1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20	107																											
111	✓	Pañete en Muros	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	110																											
112	✓	Pañete en Techo.	1 day	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	110																											
113	✓	Piso de Hormigón Pulido a col.	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																											
114	✓	Suministro y Colocación de Puerta Enrollable	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	113																											
115	✓	Pintura Acrilica en Muro.	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	113																											
116	✓	Pintura Económica en Techo	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	113																											
117	✓	Salida de Luces Genitales	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																											
118	✓	Interruptores Sencillos	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																											
119	✓	Tomacorriente Doble 120V, Polarizado	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																											
120	✓	Caja de Breakers de 2 a 4	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																											
121	✓	Mano Obra de Electricidad	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	112																											
122	✓	Tubería y Piezas	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	120																											
123	✓	Limpieza Final	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	122																											




royecto: Vista hermosa, la plat	Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha limite
Fecha: Wed 3/18/20	División	Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
	Hito	Hito inactivo	solo fin	Progreso manual
	Resumen	Resumen inactivo	Tareas externas	
			Hito externo	

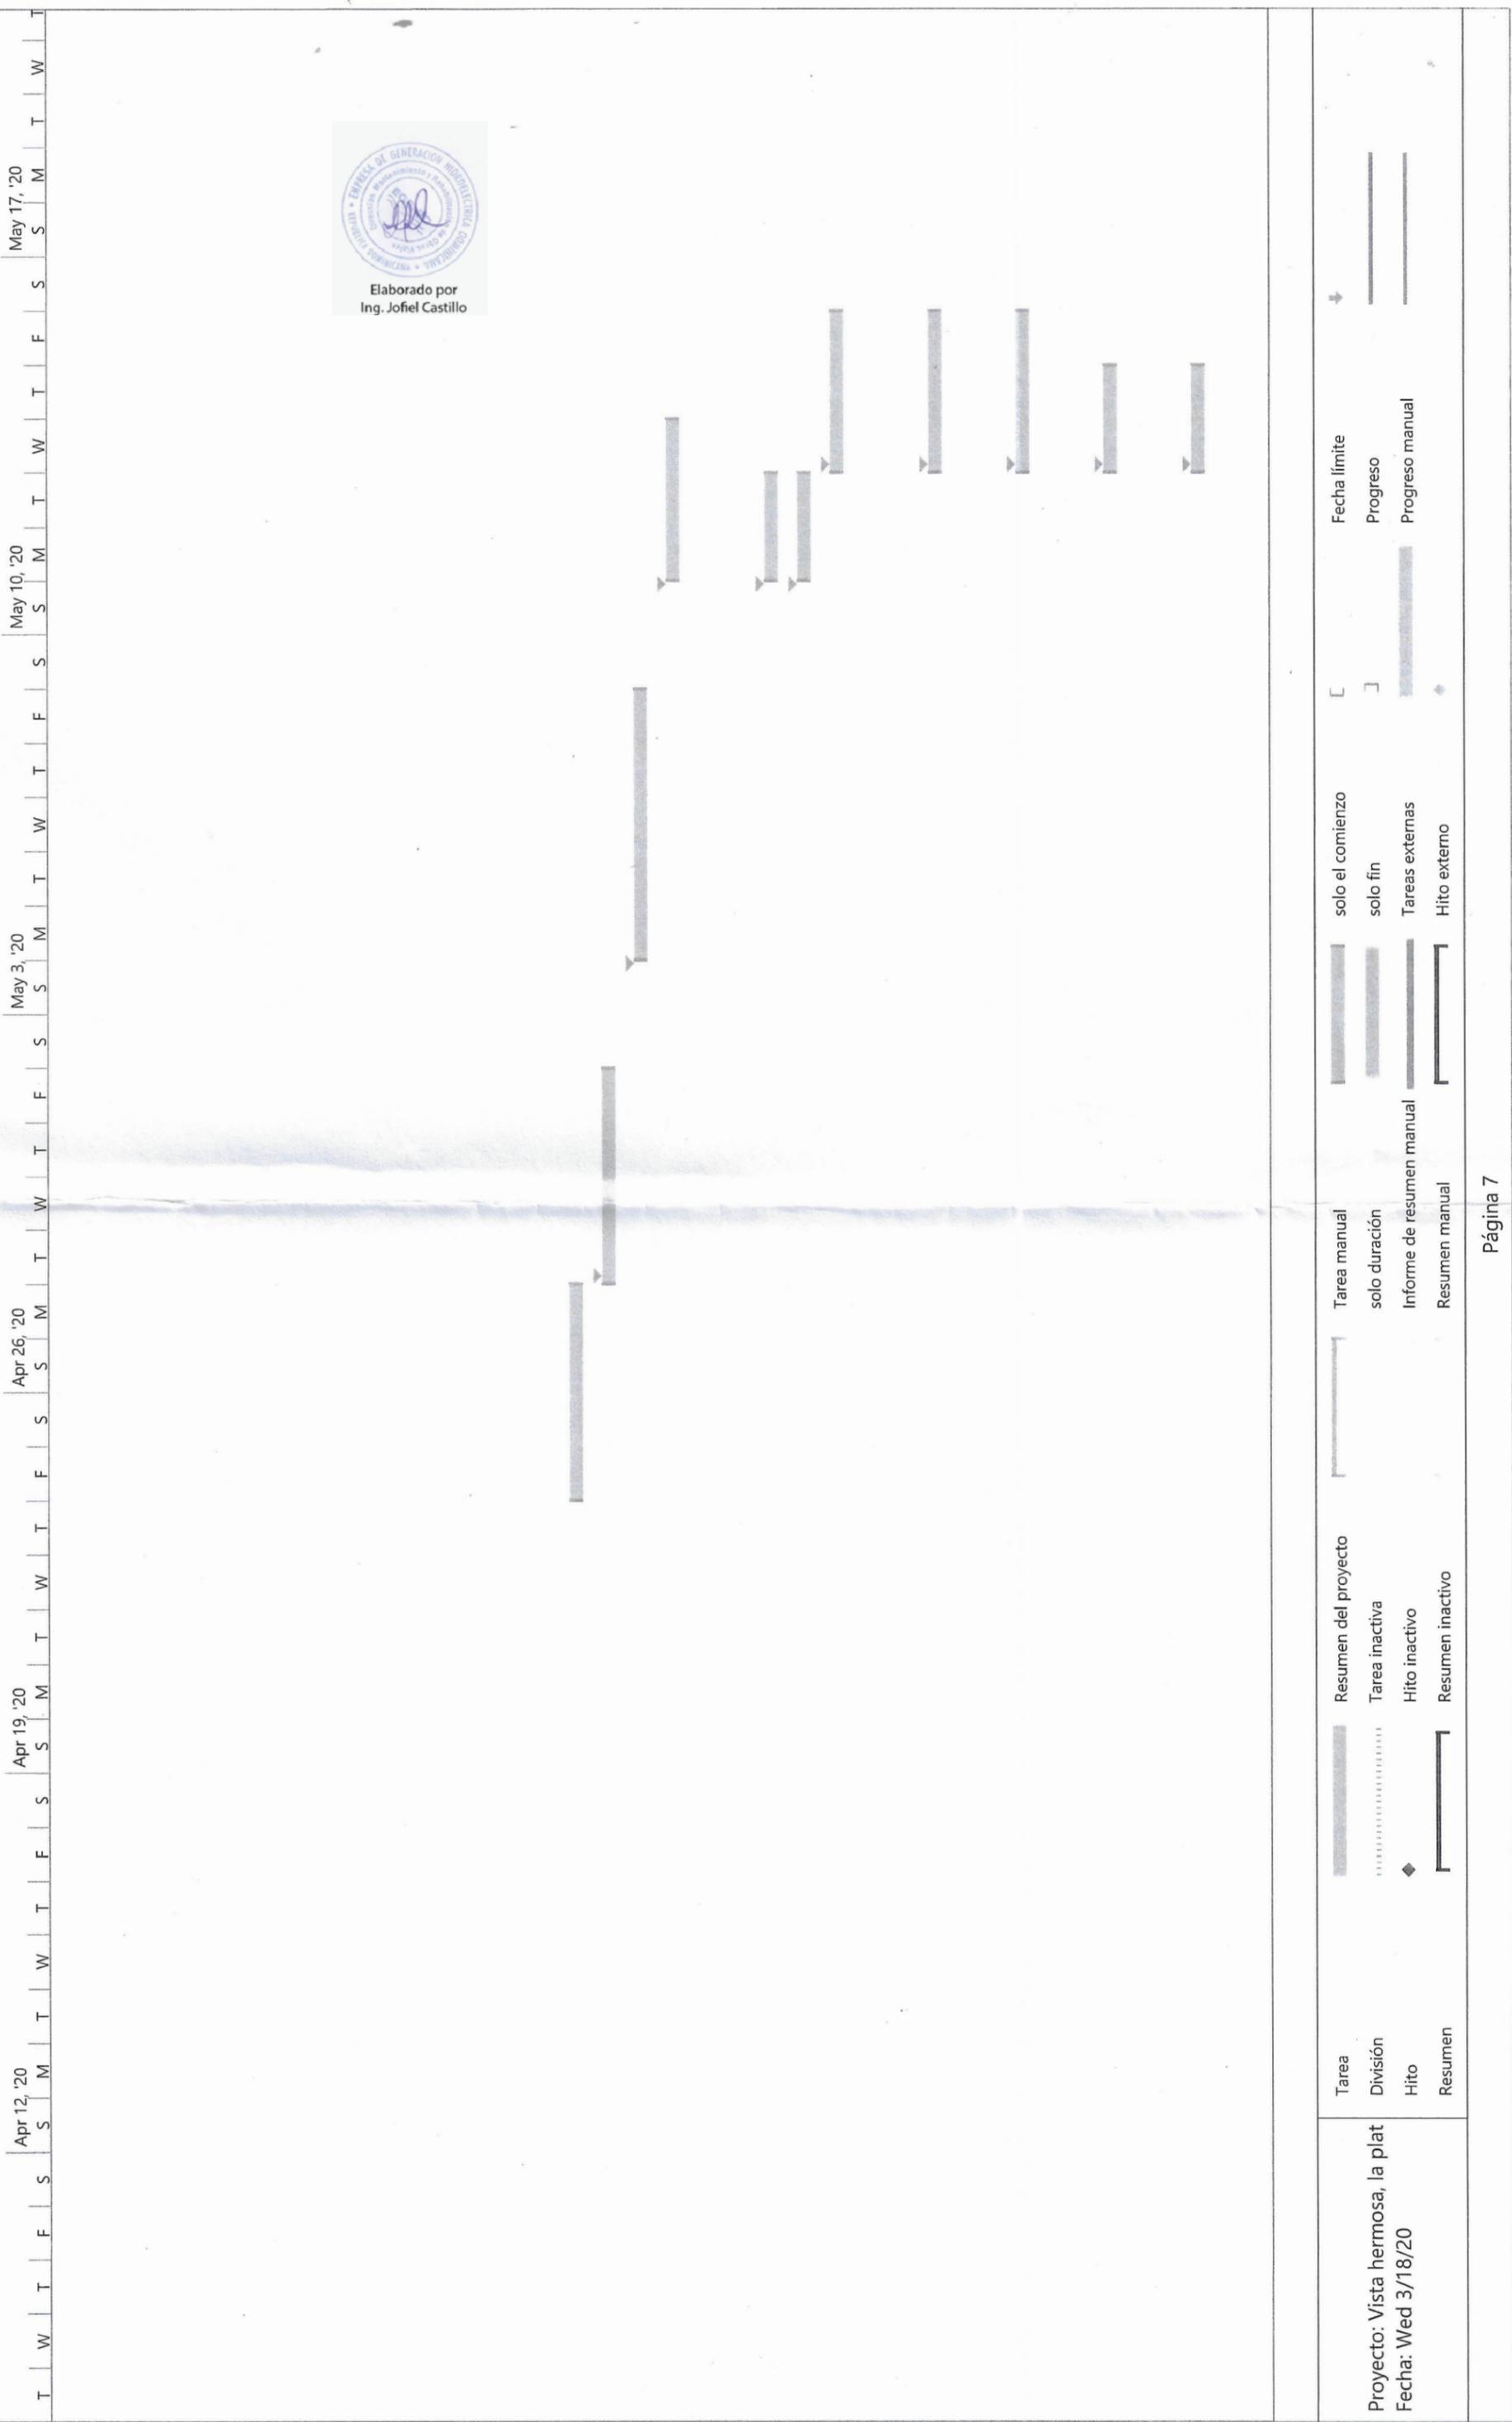

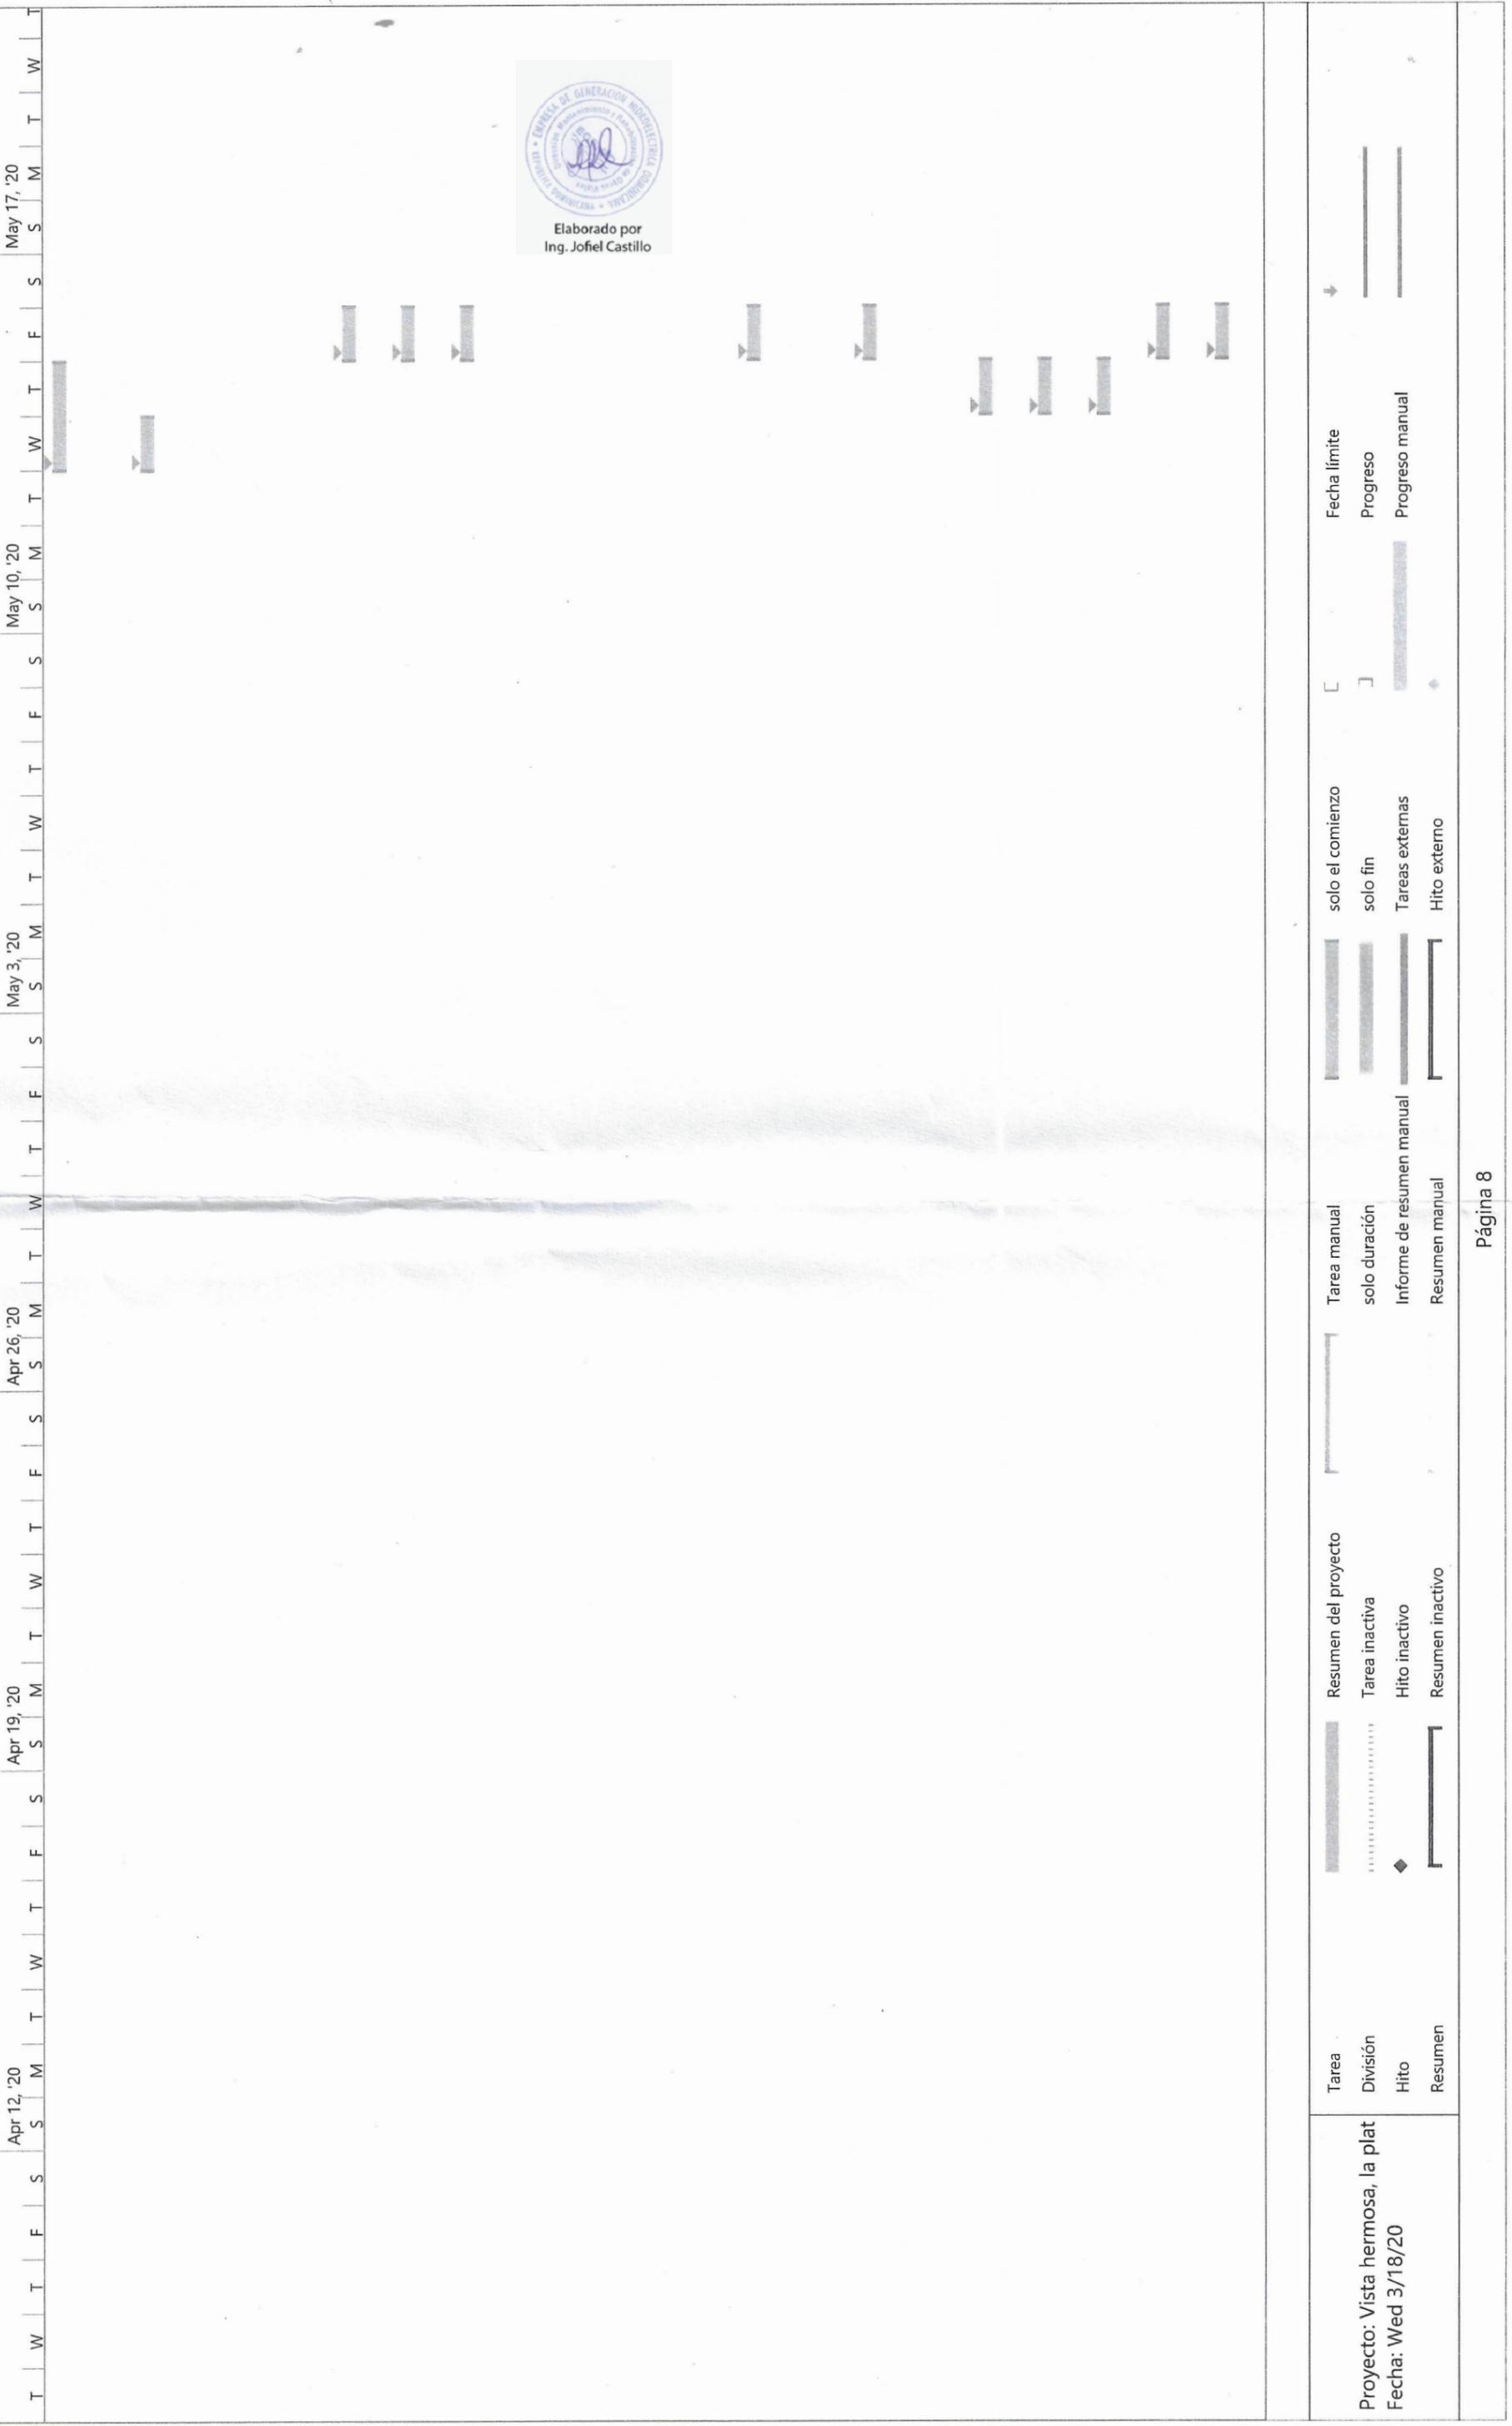


Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo




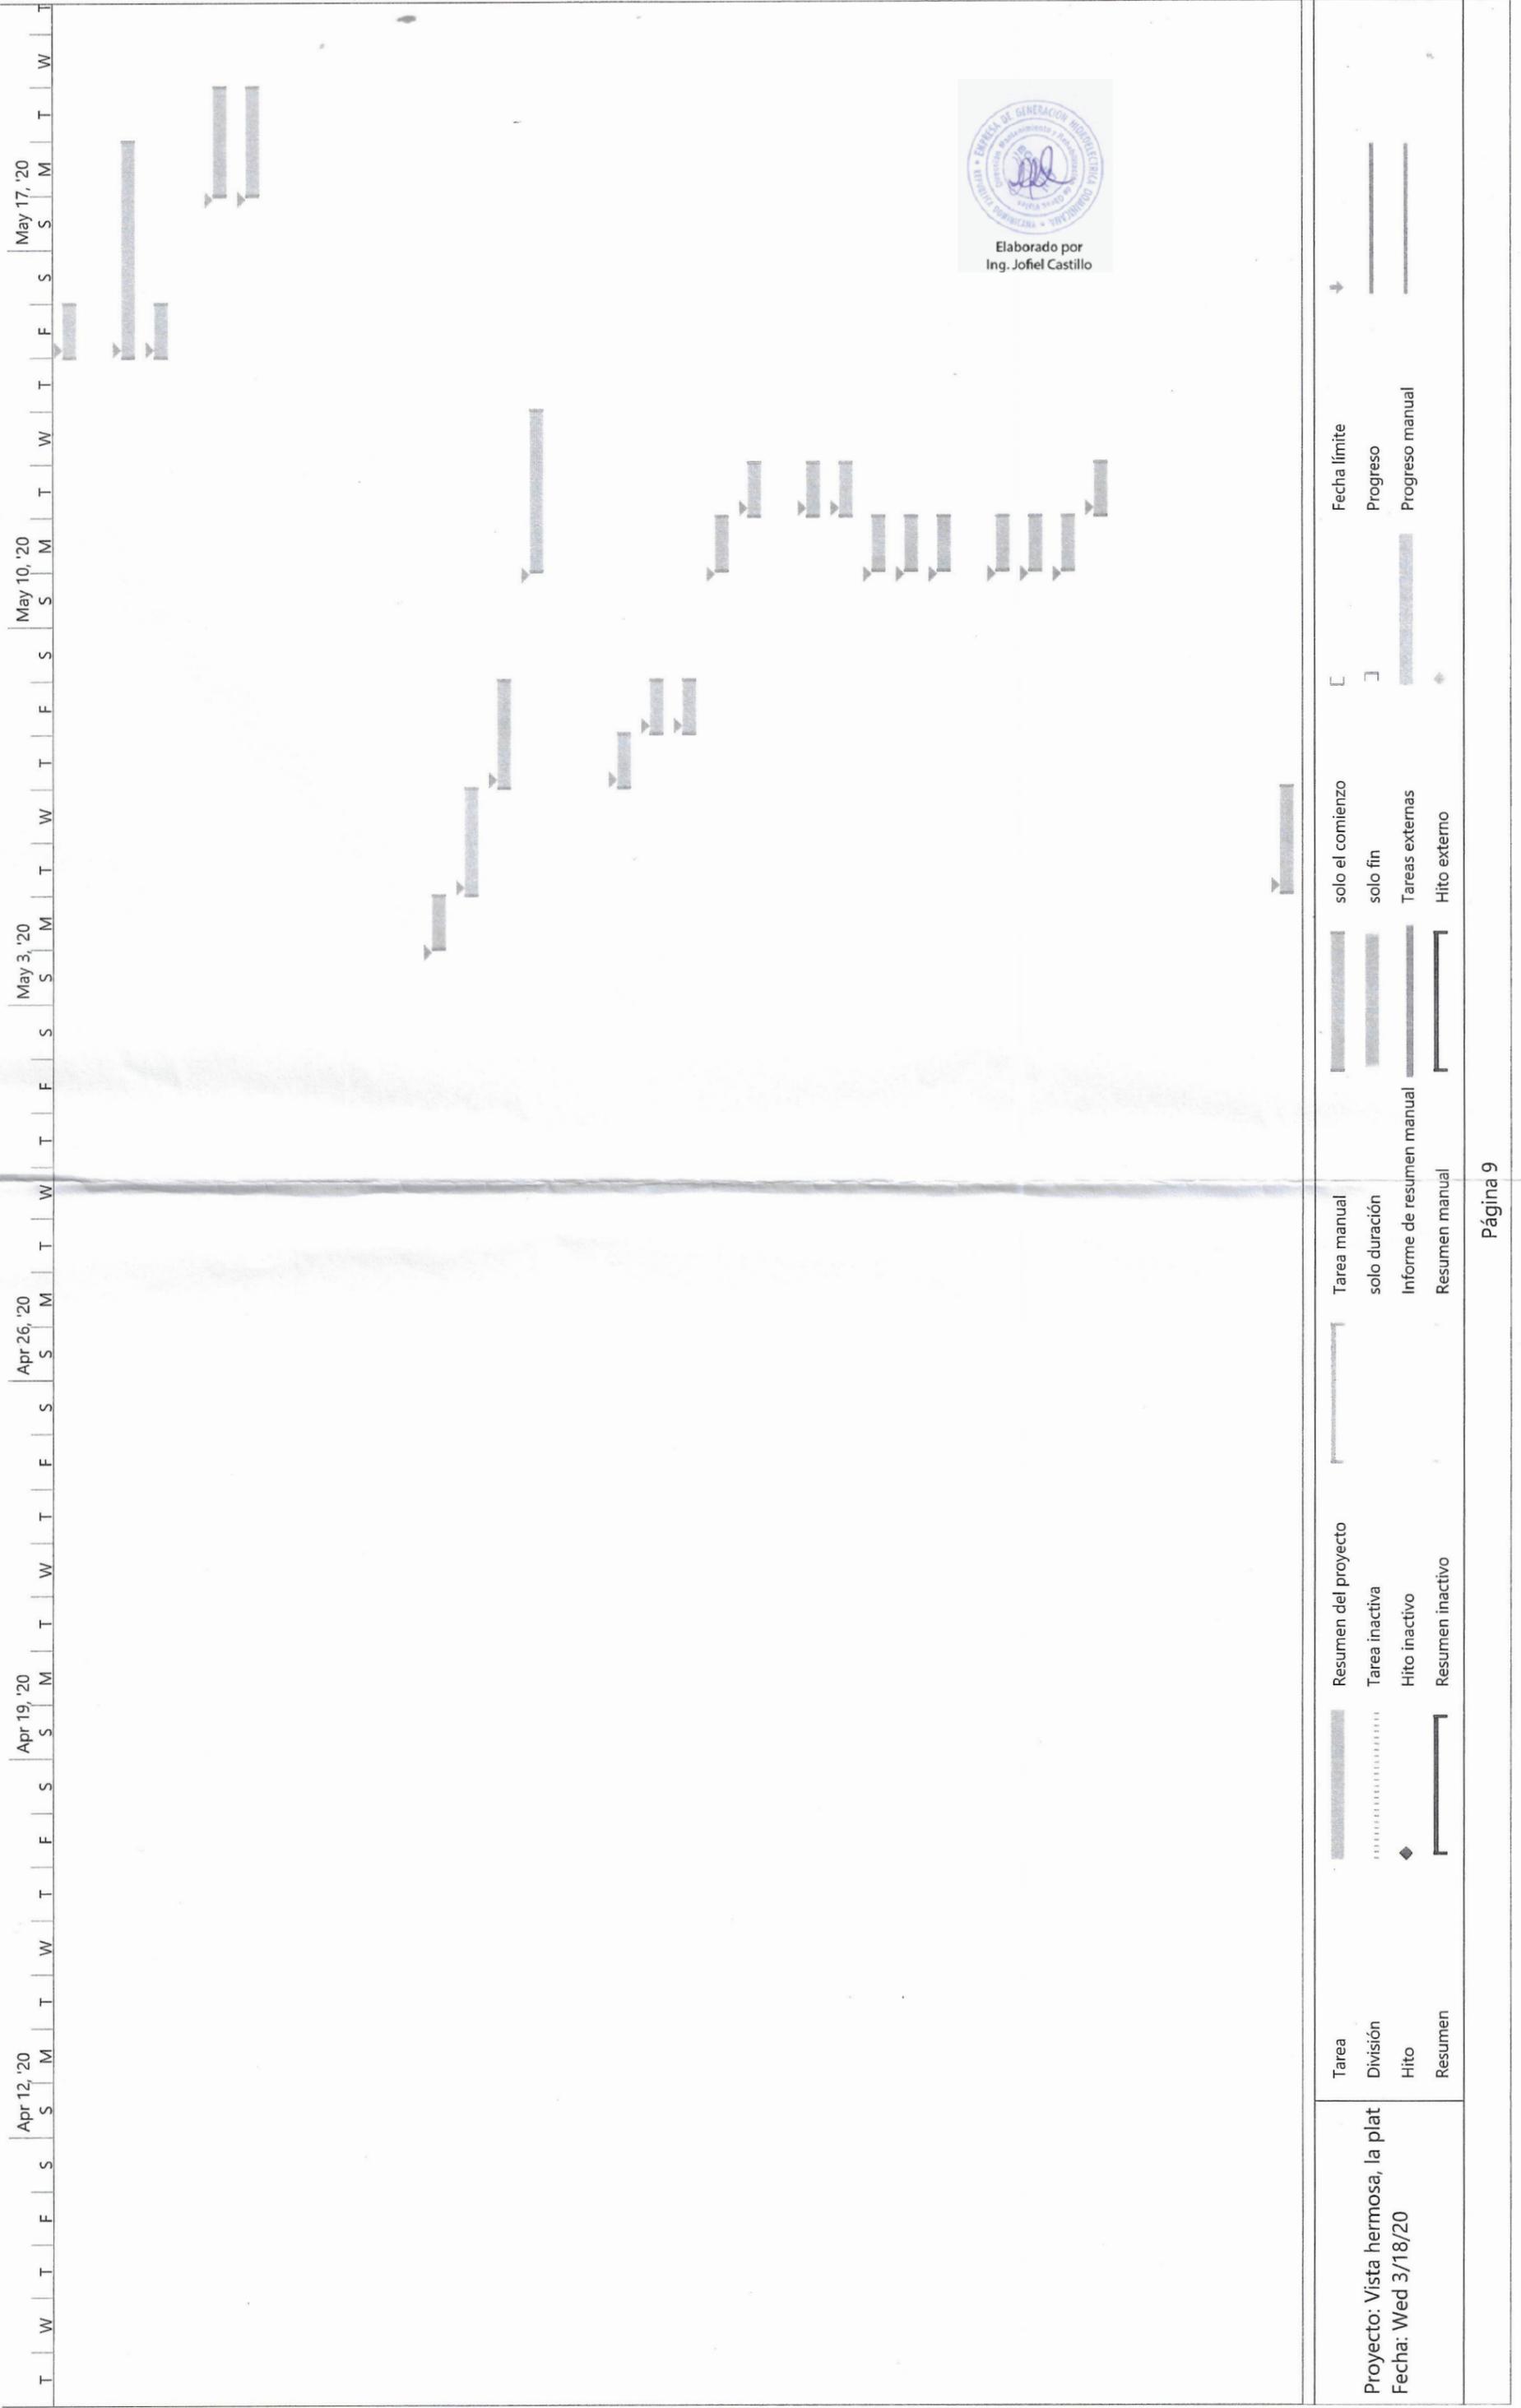


T W T T F S Apr 12, '20 Apr 19, '20 Apr 26, '20 May 3, '20 May 10, '20 May 17, '20
 S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S



Proyecto: Vista hermosa, la plat Fecha: Wed 3/18/20	Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite
	División	Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
	Hito	Hito inactivo	solo fin	Progreso manual
	Resumen	Resumen inactivo	Informe de resumen manual Resumen manual	

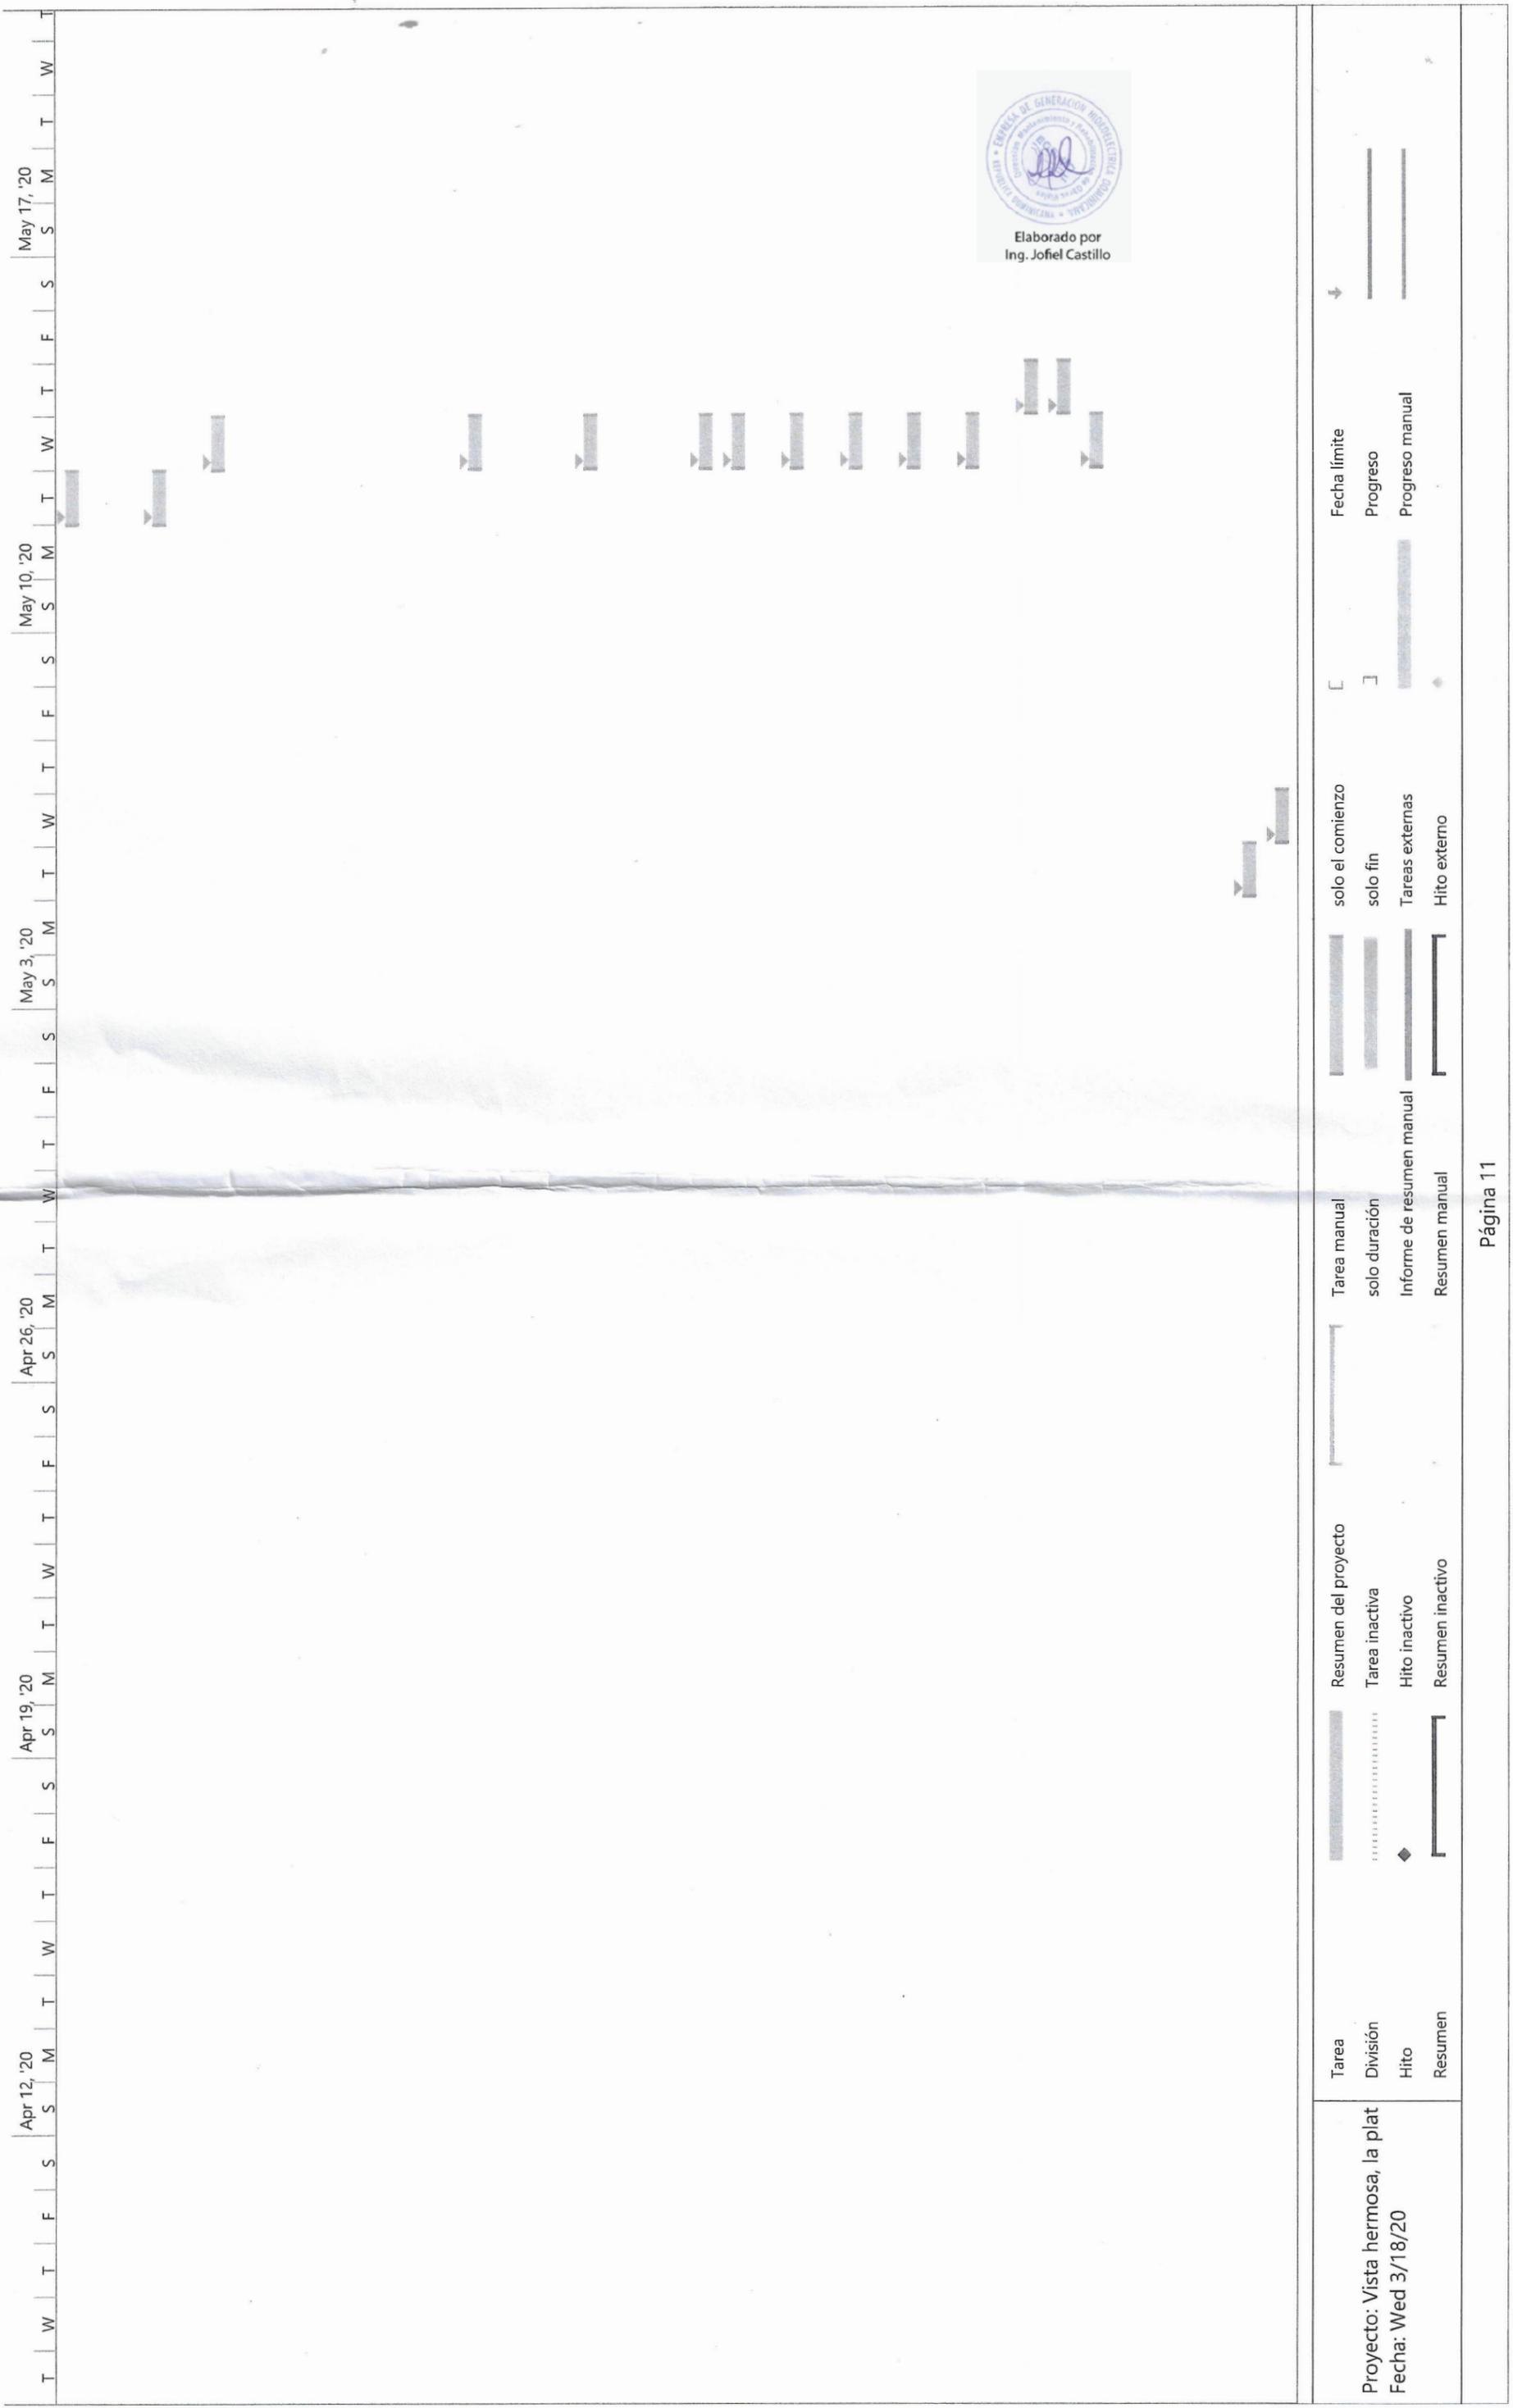

Proyecto: Vista hermosa, la plat	Tarea	Resumen del proyecto	Resumen del proyecto	Tarea manual	Resumen del proyecto	Fecha límite
Fecha: Wed 3/18/20	División	Tarea inactiva	Tarea manual	solo el comienzo	Resumen del proyecto	Progreso
	Hito	Hito inactivo	solo duración	solo fin	Informe de resumen manual	Progreso manual
	Resumen	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Resumen manual	
			Resumen manual	Hito externo		

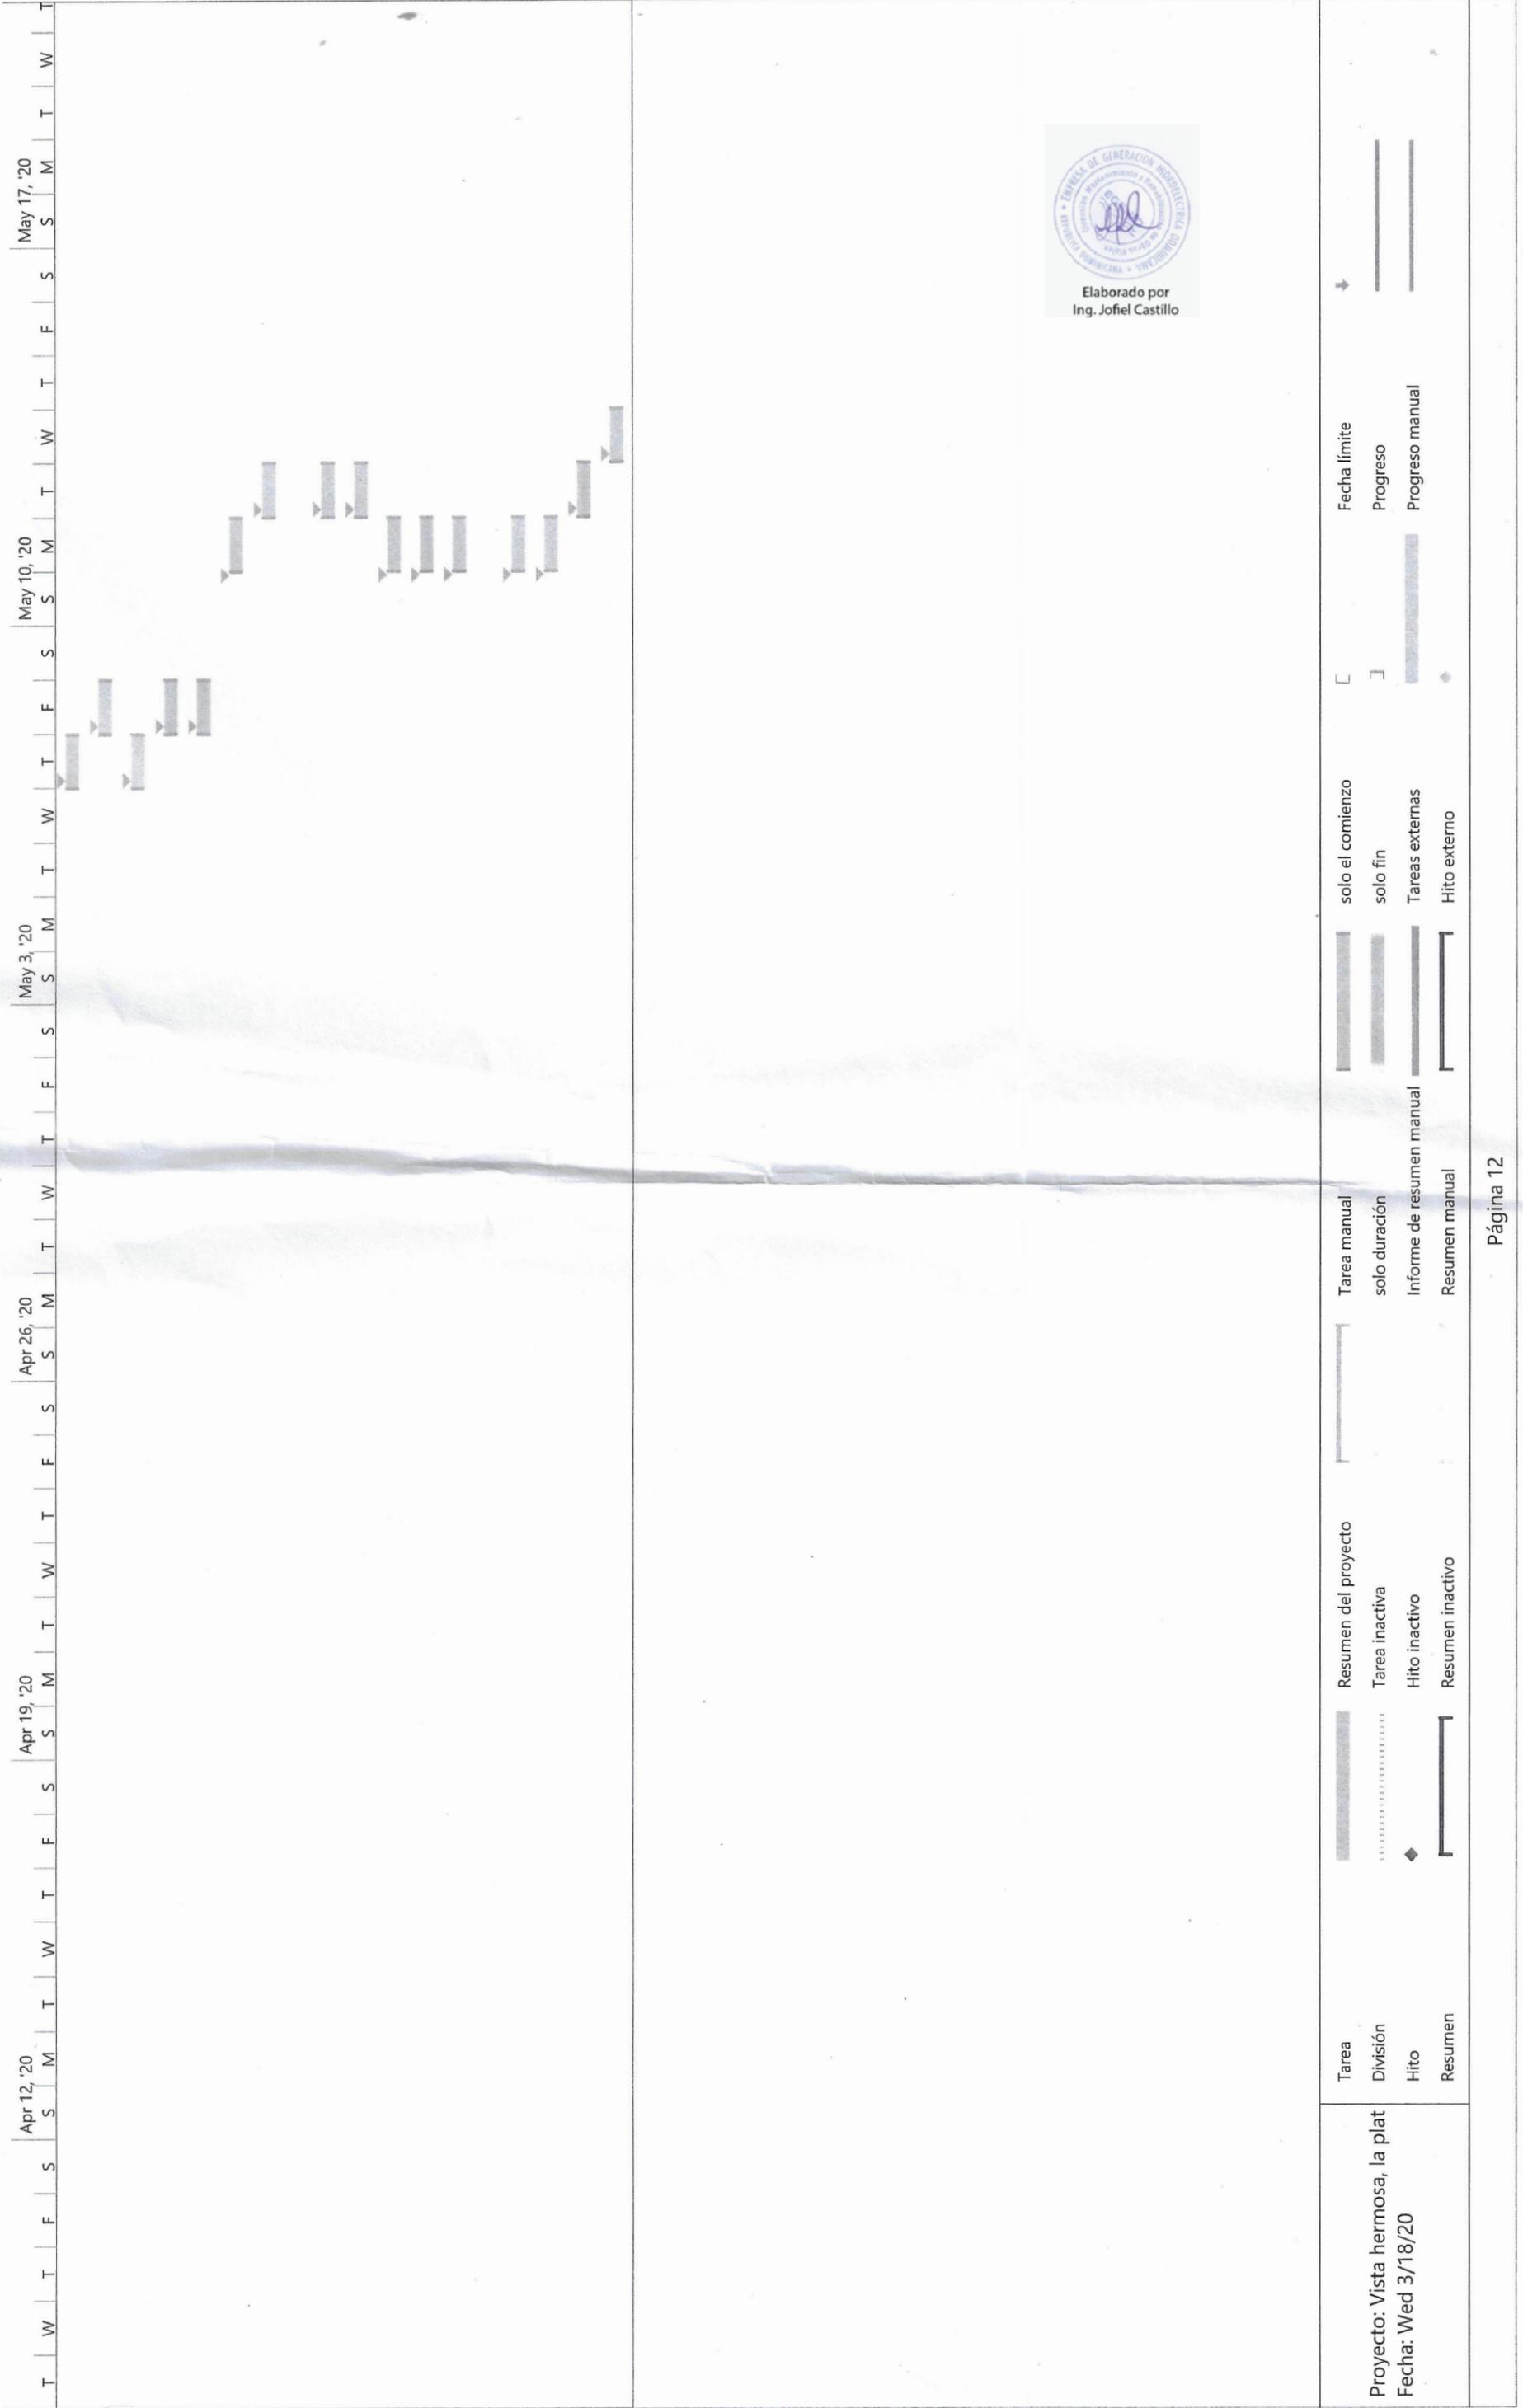

Proyecto: Vista hermosa, la plat
Fecha: Wed 3/18/20
