

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
34	Columnas C2 (0.20*0.30MTS) Acero G60.6@1/2", Est. de 3/8" a 0.25mts	49 días	mar 23/7/19	jue 19/9/19										
35	Acero	2 días	mar 23/7/19	jue 25/7/19	27CC									
36	Encofrado	2 días	mar 17/9/19	jue 19/9/19	72									
37	Hormigón	1 día	jue 25/7/19	vie 26/7/19	35									
38	Desencofrado	3 días	mar 30/7/19	vie 2/8/19	7FC+3 día									
39	Viga V2 (0.25*0.20MTS) Acero G60.2@3/8" y 3 1/2", Est. de 3/8" a	14 días	lun 30/9/19	mié 16/10/19										
40	Acero	2 días	sáb 5/10/19	mar 8/10/19	11FC+1 día									
41	Encofrado	4 días	lun 30/9/19	vie 4/10/19	61CC									
42	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	40									
43	Desencofrado	3 días	sáb 12/10/19	mié 16/10/19	2FC+3 día									
44	Viga Nivel de Techo (0.20*0.56MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a	14 días	lun 30/9/19	mié 16/10/19										
45	Acero	2 días	sáb 5/10/19	mar 8/10/19	16FC+1 día									
46	Encofrado	4 días	lun 30/9/19	vie 4/10/19	61CC									
47	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	45									
48	Desencofrado	3 días	sáb 12/10/19	mié 16/10/19	7FC+3 día									
49	Vigas Bajo Nivel de Piso (0.20*0.20MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a	12 días	sáb 24/8/19	sáb 7/9/19										
50	Acero	3 días	mar 27/8/19	vie 30/8/19	51									
51	Encofrado	2 días	sáb 24/8/19	mar 27/8/19	13									
52	Hormigón	1 día	vie 30/8/19	sáb 31/8/19	50									
53	Desencofrado	3 días	mié 4/9/19	sáb 7/9/19	2FC+3 día									
54	Dinteles	7 días	lun 30/9/19	mar 8/10/19										
55	Acero	1 día	mié 2/10/19	jue 3/10/19	6FC+1 día									
56	Encofrado	1 día	lun 30/9/19	mar 1/10/19	61CC									
57	Hormigón	1 día	jue 3/10/19	vie 4/10/19	55									
58	Desencofrado	3 días	vie 4/10/19	mar 8/10/19	57									
59	Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"	21 días	lun 30/9/19	jue 24/10/19										
60	Acero	4 días	jue 10/10/19	mar 15/10/19	1FC+3 día									
61	Encofrado	6 días	lun 30/9/19	lun 7/10/19	33:38									
62	Hormigón	1 día	mar 15/10/19	mié 16/10/19	60									
63	Desencofrado	4 días	sáb 19/10/19	jue 24/10/19	2FC+3 día									
64	Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"	79 días	lun 15/7/19	jue 17/10/19										
65	Acero	4 días	vie 11/10/19	mié 16/10/19	6FC+3 día									
66	Encofrado	7 días	lun 30/9/19	mar 8/10/19	61CC									
67	Hormigón	1 día	mar 8/10/19	mié 9/10/19	66									
68	Desencofrado	4 días	sáb 12/10/19	jue 17/10/19	7FC+3 día									






Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	2019					2020				
						jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	
106	Sum. E Instalación de Tinaco de 265 gls	3 días	jue 5/12/19	lun 9/12/19	177;183										
107	Filtrante de 12" Encamizado en 10" Aprox	80 días	sáb 27/7/19	jue 31/10/19	8										
108	Desagüe de Piso de 2"	70 días	mar 13/8/19	mié 6/11/19	71										
109	Tuberías y Piezas PVC	90 días	mar 13/8/19	vie 29/11/19	71										
110	Ventilación de 3	90 días	mar 17/9/19	vie 3/1/20	72										
111	Tuberías de Arrastres	45 días	jue 14/11/19	mar 7/1/20	34FC-1 día										
112	Acometida de Agua Potable	90 días	vie 19/7/19	mar 5/11/19	4										
113	Mano de Obra de la Plomería	1 día	lun 15/7/19	mar 16/7/19											
114	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19											
115	TERMINACION DE COCINA	123 días	lun 15/7/19	lun 9/12/19											
116	Suministro en Instalación de Meseta de G3	3 días	lun 2/12/19	jue 5/12/19	140										
117	Gabinetes de Pared en pino tratado. Incluye Tramerías y Tiradores.	2 días	jue 5/12/19	sáb 7/12/19	116										
118	Gabinetes de piso en pino tratado. Incluye Tramerías y Tiradores.	3 días	jue 5/12/19	lun 9/12/19	116										
119	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19											
120	INSTALACIONES ELECTRICAS	153 días	lun 15/7/19	mar 14/1/20											
121	Luces Centinales. Incluye Accesorios y MO	5 días	mar 19/11/19	lun 25/11/19	86										
122	Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	38CC;63CC										
123	Interruptores Doble. Incluye Accesorios y 72 días	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	122CC										
124	Toma Corrientes Dobles 110V. Incluye Acc	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	122CC										
125	Interior W	72 días	sáb 19/10/19	mar 14/1/20	122CC										
126	Tomacorrientes	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72										
127	Panel de Distribución de 4 Circuitos. Includ	1 día	mar 17/9/19	mié 18/9/19	72										
128	Registro de Teléfono. Incluye Accesorios y	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72										
129	Registro para Antena. Incluye Accesorios	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72										
130	Conexión Panel con Línea de la Calle	72 días	mar 17/9/19	jue 12/12/19	72										
131	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19											
132	PUERTAS Y VENTANAS	129 días	lun 15/7/19	lun 16/12/19											
133	Puerta Principal en Aluminio y Crystal	3 días	mié 4/12/19	sáb 7/12/19	40FC+2 días										
134	Suministro e Instalación de Puertas en Polimet	3 días	mié 4/12/19	sáb 7/12/19	140FC+2 días										
135	Suministro e Instalación de Ventanas Corrediza de Aluminio y Crystal	10 días	mié 4/12/19	lun 16/12/19	140FC+2 días										
136	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19											
137	TERMINACION DE PINTURA	117 días	lun 15/7/19	lun 2/12/19											
138	Pintura Base	10 días	sáb 9/11/19	jue 21/11/19	80										
139	Pintura Económica en Techo (Dos Manos)	5 días	jue 21/11/19	mié 27/11/19	138										
140	Pintura Semigloss en Interior (Dos Manos)	8 días	vie 22/11/19	lun 2/12/19	38FC+1 día										
141	Pintura Acrílica Exterior (Dos Manos)	3 días	vie 22/11/19	mar 26/11/19	38FC+1 día										
142	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19											

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	ene	feb
143	SEGUNDO NIVEL	152 días	lun 15/7/19	lun 13/1/20											
144	PARTIDAS GENERALES	86 días	lun 15/7/19	vie 25/10/19											
145	Replanteo	1 día	jue 24/10/19	vie 25/10/19	63;68										
146	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19											
147	HORMIGÓN ARMADO EN:	120 días	lun 15/7/19	jue 5/12/19											
148	Columnas CA (0.30*0.30MTS) Acero G60.4@3/4", Est. de 3/8" a 0.20mts	11 días	mar 5/11/19	lun 18/11/19											
149	Acero	2 días	mar 5/11/19	jue 7/11/19	185										
150	Encofrado	2 días	jue 7/11/19	sáb 9/11/19	149										
151	Hormigón	1 día	sáb 9/11/19	lun 11/11/19	150										
152	Desencofrado	3 días	jue 14/11/19	lun 18/11/19	151FC+3 día										
153	Columnas CA (0.20*0.30MTS) Acero G60.6@1/2", Est. de 3/8" a 0.25mts	11 días	mar 5/11/19	lun 18/11/19											
154	Acero	2 días	mar 5/11/19	jue 7/11/19	185										
155	Encofrado	2 días	jue 7/11/19	sáb 9/11/19	154										
156	Hormigón	1 día	sáb 9/11/19	lun 11/11/19	155										
157	Desencofrado	3 días	jue 14/11/19	lun 18/11/19	156FC+3 día										
158	Viga V-1 A Nivel de Techo (0.30*0.40MTS) Acero G60.4@3/8", Est.	11 días	lun 18/11/19	sáb 30/11/19											
159	Acero	2 días	mié 20/11/19	vie 22/11/19	160										
160	Encofrado	2 días	lun 18/11/19	mié 20/11/19	157										
161	Hormigón	1 día	vie 22/11/19	sáb 23/11/19	159										
162	Desencofrado	3 días	mié 27/11/19	sáb 30/11/19	159FC+3 día										
163	Viga A Nivel de Techo (0.20*0.56MTS) Acero G60.4@3/8", Est. de 3/8" a	11 días	lun 18/11/19	sáb 30/11/19											
164	Acero	2 días	mié 20/11/19	vie 22/11/19	165										
165	Encofrado	2 días	lun 18/11/19	mié 20/11/19	157										
166	Hormigón	1 día	vie 22/11/19	sáb 23/11/19	164										
167	Desencofrado	3 días	mié 27/11/19	sáb 30/11/19	164FC+3 día										
168	Dinteles 0.20*0.20	8 días	lun 18/11/19	mié 27/11/19											
169	Acero	1 día	mar 19/11/19	mié 20/11/19	170										
170	Encofrado	1 día	lun 18/11/19	mar 19/11/19	157										
171	Hormigón	1 día	mié 20/11/19	jue 21/11/19	169										
172	Desencofrado	2 días	lun 25/11/19	mié 27/11/19	171FC+3 día										
173	Losa de Techo Plana en H.A. (210kg/cm2) con Acero Grado 60 @3/8"	15 días	lun 18/11/19	jue 5/12/19											
174	Acero	5 días	jue 21/11/19	mié 27/11/19	175										
175	Encofrado	3 días	lun 18/11/19	jue 21/11/19	157										
176	Hormigón	1 día	mié 27/11/19	jue 28/11/19	174										
177	Desencofrado	3 días	lun 2/12/19	jue 5/12/19	174FC+3 día										





Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
216	Ventilación de 3	45 días	mar 5/11/19	sáb 28/12/19	185									
217	Tuberías de Arrastres	72 días	jue 17/10/19	sáb 11/1/20	68									
218	Mano de Obra de la Plomería	1 día	lun 15/7/19	mar 16/7/19										
219	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
220	INSTALACIONES ELECTRICAS	152 días	lun 15/7/19	lun 13/1/20										
221	Luces Cenitales. Incluye Accesorios y MO	2 días	jue 26/12/19	sáb 28/12/19	170;187									
222	Interruptores Sencillos. Incluye Accesorios	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17									
223	Interruptores TW. Incluye Accesorios y MI	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17									
224	Toma Corrientes Dobles 110V. Incluye Acr	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17									
225	Registro de Teléfono. Incluye Accesorios	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17									
226	Registro para Antena. Incluye Accesorios	32 días	jue 5/12/19	lun 13/1/20	82;185;17									
227	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
228	PUERTAS Y VENTANAS	151 días	lun 15/7/19	sáb 11/1/20										
229	Suministro e Instalación de Puertas en Polimetil Apaneladas Color Blanco	4 días	jue 2/1/20	mar 7/1/20	235FC+1 día									
230	Suministro e Instalacion de Ventanas de Aluminio Y Crystal Corrediza	8 días	jue 2/1/20	sáb 11/1/20	229CC									
231	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
232	TERMINACION DE PINTURA	142 días	lun 15/7/19	mié 1/1/20										
233	Pintura Base	5 días	lun 16/12/19	sáb 21/12/19	191									
234	Pintura Económica en Techo (Dos Manos)	3 días	lun 16/12/19	jue 19/12/19	191									
235	Pintura Semiglós Interior (Dos Manos)	6 días	mar 24/12/19	mié 1/1/20	33FC+2 día									
236	Pintura Acrílica Exterior (Dos Manos)	2 días	mar 24/12/19	vie 27/12/19	235CC									
237	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
238	SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS ESCALERA, PAR	142 días	lun 15/7/19	mié 1/1/20										
239	ESCALERA	94 días	lun 15/7/19	mar 5/11/19										
240	MOVIMIENTO DE TIERRA	7 días	lun 15/7/19	mar 23/7/19										
241	Excavación	1 día	lun 22/7/19	mar 23/7/19	8CC									
242	FIN PARTIDA	0 días	lun 15/7/19	lun 15/7/19										
243	HORMIGON ARMADO EN	92 días	lun 15/7/19	vie 1/11/19										
244	Hormigón Armado en Zapata	9 días	mar 23/7/19	vie 2/8/19										
245	Acero	1 día	mar 23/7/19	mié 24/7/19	241									
246	Hormigón	1 día	jue 1/8/19	vie 2/8/19	19CC;245									
247	Hormigón Armado en Mechón de Ram	54 días	mar 23/7/19	jue 26/9/19										
248	Acero	2 días	jue 25/7/19	sáb 27/7/19	249									
249	Encofrado	2 días	mar 23/7/19	jue 25/7/19	241									
250	Hormigón	1 día	vie 20/9/19	sáb 21/9/19	32CC									
251	Desencofrado	3 días	sáb 21/9/19	jue 26/9/19	250									
252	Hormigón Armado en Viga Apoyo Desc	8 días	jue 25/7/19	sáb 3/8/19										
253	Acero	1 día	vie 26/7/19	sáb 27/7/19	254									
254	Encofrado	1 día	jue 25/7/19	vie 26/7/19	249									

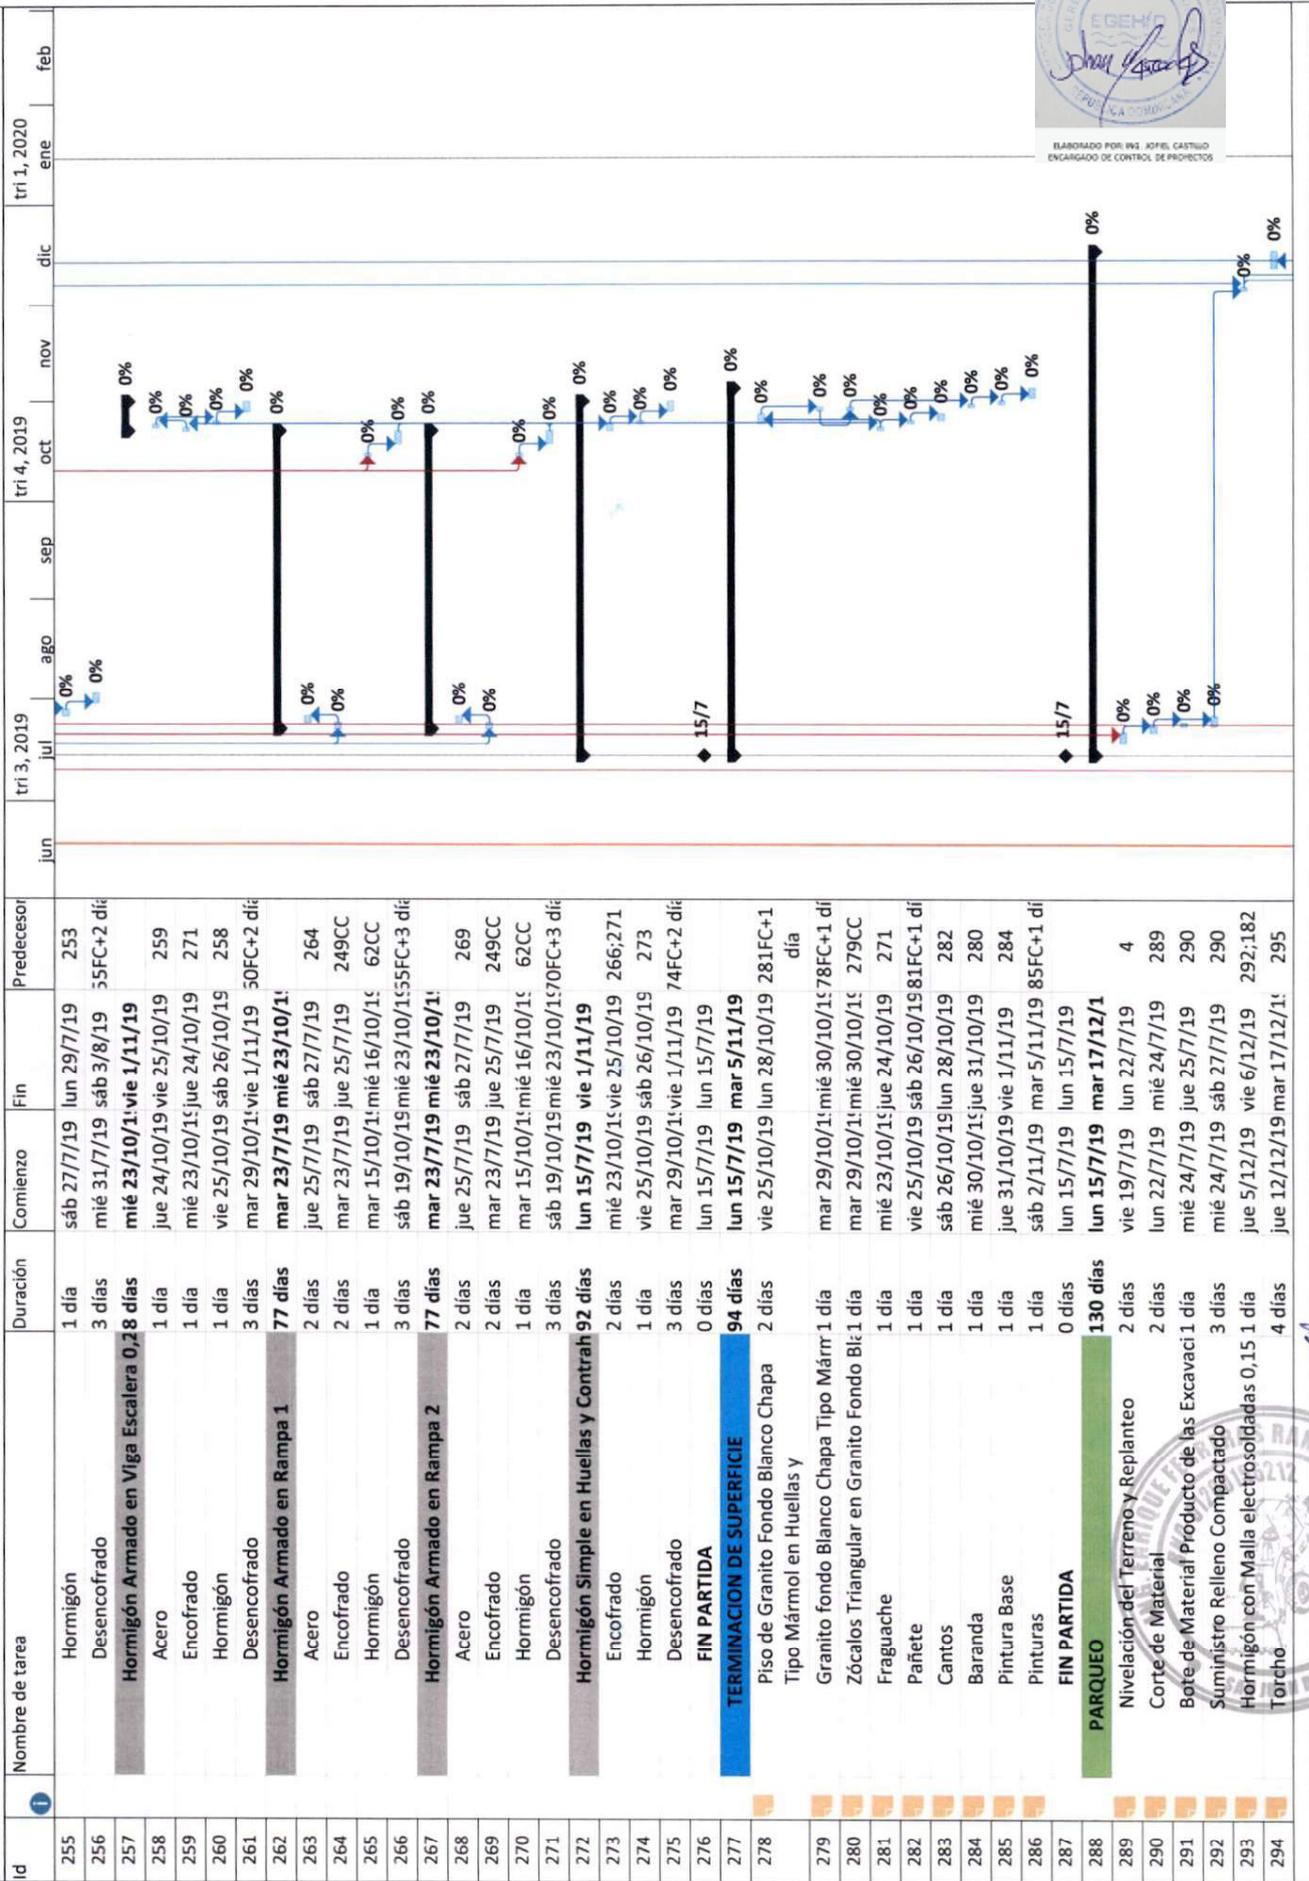

5/11



55

