


ID	Task/Mod	Duration	Start	Finish	Preced
1	IGLESIA SANTA LUCIA, MARTAS DE FARFAN	174.5 days	Thu 1/8/19	Wed 29/1/20	
2	IGLESIA Y AREAS ADMINISTRATIVAS	134 days	Thu 1/8/19	Wed 18/12/19	
3	PARTIDAS GENERALES	23 days	Thu 1/8/19	Sat 24/8/19	
4	DEMOLICIONES DE PISOS EN SALONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS	5 days	Thu 1/8/19	Tue 6/8/19	
5	DEMOLICIONES DE MUROS EN EL GRAN SALON	3 days	Tue 6/8/19	Fri 9/8/19	4
6	BOTE ESCOMBRO (VOLTEO DE 8 MB)	8 days	Fri 9/8/19	Sat 17/8/19	5
7	LIMPIEZA	5 days	Sat 17/8/19	Thu 22/8/19	6
8	REPLANTEO	2 days	Thu 22/8/19	Sat 24/8/19	7
9	MOVIMIENTO DE TIERRA	16 days	Sat 24/8/19	Tue 10/9/19	
10	EXCAVACION PARA MURO BLOCK DIVISORIO	4 days	Thu 10/9/19	Wed 28/8/19	8
11	RELLENO DE REPOSICION	3 days	Thu 28/8/19	Sat 31/8/19	10
12	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	4 days	Sat 31/8/19	Thu 5/9/19	11
13	RELLENO COMPACTADO CALICHE	5 days	Thu 5/9/19	Tue 10/9/19	12
14	HORMIGON ARMADO EN:	10 days	Tue 10/9/19	Fri 20/9/19	
15	ZANAYA DE MURO 6 DIVISORIO	4 days	Tue 10/9/19	Sat 14/9/19	13
16	ZANAYA DE COLUMNA C1	3 days	Sat 14/9/19	Tue 17/9/19	15
17	COLUMNAS PORTICO B.N.P.	3 days	Tue 17/9/19	Fri 20/9/19	16
18	HORMIGON ARMADO B.N.P.	7 days	Fri 20/9/19	Fri 27/9/19	
19	COLUMNAS PORTICO B.N.P.	4 days	Fri 20/9/19	Wed 25/9/19	17
20	VIGA CENTEL (V.O)	3 days	Wed 25/9/19	Fri 27/9/19	19
21	MUROS BLOQUES	48 days	Thu 1/8/19	Thu 19/9/19	
22	MUROS BLOQUES S.NP	1 day	Thu 1/8/19	Thu 1/8/19	
23	BLOQUES DE P.S. S.NP	5 days	Sat 14/9/19	Thu 1/8/19	15
24	TERMINACION DE SUPERFICIE	24 days	Wed 25/9/19	Sat 19/10/19	
25	FRAGUACHE SOBRE HORMIGON	5 days	Wed 25/9/19	Mon 30/9/19	19
26	PANELES INTERIORES Y EXTERIORES EL 20%	8 days	Mon 30/9/19	Tue 8/10/19	25
27	CANTOS	4 days	Tue 8/10/19	Sat 12/10/19	26
28	CORNISAS EXT. DE CEMENTO EN TODO EL PERIMETRO	7 days	Sat 12/10/19	Sat 19/10/19	27
29	CORNISAS INTERIORES DE YESO TODO PERIMETRO	5 days	Sat 12/10/19	Thu 17/10/19	27
30	DIBUÑO DECORATIVO EN CORNISA ARCO	27 days	Thu 17/10/19	Thu 14/11/19	
31	EN PARTE FRONTAL DEL EDIFICIO	4 days	Thu 17/10/19	Tue 22/10/19	29
32	REVESTIMIENTO DE COLUMNAS EN MARMOL	5 days	Tue 22/10/19	Sat 26/10/19	31
33	PEDESTALES EN COLUMNAS	3 days	Sat 26/10/19	Wed 30/10/19	32
34	REVESTIMIENTO DE COLUMNAS EN PIEDRA	3 days	Wed 30/10/19	Fri 1/11/19	33
35	GOTERO MAQUILADO	3 days	Sat 2/11/19	Tue 5/11/19	34
36	SUMINISTRO E INST. DE UN CRISTO EN BRONCE	5 days	Tue 5/11/19	Mon 11/11/19	35
37	TRABAJOS ARTISTICO EN EL PRENTE DEL TIEMPO	4 days	Mon 11/11/19	Thu 14/11/19	36
38	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE DE TECHO:	10 days	Thu 14/11/19	Mon 25/11/19	
39	CONSTRUCCION CUPULA DEL TECHO	10 days	Thu 14/11/19	Mon 25/11/19	
40	EN TEJAS METALICA	6 days	Thu 14/11/19	Mon 25/11/19	37
41	PISO DE TECHO PLANO	4 days	Thu 14/11/19	Tue 19/11/19	37
42	TERMINACION DE DE TECHO EN DUREX	6 days	Tue 19/11/19	Mon 25/11/19	41
43	ZABILETAS	2 days	Tue 19/11/19	Wed 20/11/19	41
44	APUNTES/ALICATILES	2 days	Thu 21/11/19	Fri 22/11/19	43
45	TERMINACION DE PISO:	18 days	Thu 19/9/19	Tue 8/10/19	
46	DE CERAMICA ESPANOLA DE 1m. FONDO Blanco	12 days	Thu 19/9/19	Wed 27/10/19	23
47	ZOCALO DE CERAMICA FONDO BLANCO	6 days	Wed 27/10/19	Tue 8/10/19	46
48	REVESTIMIENTO DE JARDINERAS EN LADRILLOS	5 days	Thu 19/9/19	Wed 25/9/19	23
49	LADRILLOS EN ENTRADA PUERTA PRINCIPAL	4 days	Wed 25/9/19	Sat 28/9/19	48
50	INSTALACIONES ELECTRICAS	22 days	Mon 25/11/19	Wed 18/12/19	
51	LUCES LAMPARA DECORATIVAS COLGANTES	5 days	Mon 25/11/19	Fri 29/11/19	42
52	LAMPARAS DECORATIVAS EN FRENTE DEL TEMP.	7 days	Sat 30/11/19	Sat 7/12/19	51
53	INTERRUPTORES DOBLES	4 days	Sat 7/12/19	Mon 9/12/19	52
54	INTERRUPTORES SIMPLE	4 days	Tue 10/12/19	Fri 13/12/19	53
55	TOMACORRIENTES	3 days	Fri 13/12/19	Wed 18/12/19	54
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE AERES ACONDICIONADOS DE 1800 BTU	3 days	Wed 18/12/19	Fri 29/11/19	58
57	PANEL DE DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS	2 days	Mon 25/11/19	Wed 27/11/19	42
58	AMMO DE OMBIA	5 days	Mon 25/11/19	Mon 25/11/19	42



ID	Task/Task Mod	Duration	Start	Finish	Preced
60	PORTALES Y ESTANERÍA TODO CACABA Y METALICAS	67 days	Sat 28/8/19	Sat 7/12/19	
61	PALSAJANOS BARANDAS EN MESANINE DEL CAMPANARIO DE 13 Y 14 PULO	12 days	Sat 28/8/19	Fri 11/10/19	49
62	PALSAJANOS DE 87 PULO PARA DIVIDIR EL ALTAR	10 days	Fri 11/10/19	Tue 22/10/19	61
63	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUERTAS NUEVAS EN CACABA	7 days	Tue 22/10/19	Tue 29/10/19	62
64	REPARACION PUERTAS PRINCIPALES TEMPLO	6 days	Tue 22/10/19	Mon 28/10/19	62
65	REPARACION DE PUERTAS	6 days	Mon 28/10/19	Sat 2/11/19	64
66	REPARACION DE BANCOS INCLUYE PINTURA	5 days	Mon 28/10/19	Fri 1/11/19	64
67	REPARACION DE UN JUEGO DE COMEDOR	18 days	Sat 2/11/19	Wed 20/11/19	66
68	REPARACION DE ARMARIOS GRANDES	7 days	Thu 28/11/19	Thu 28/11/19	67
69	REPARACION DE ESTANTES GRANDES	6 days	Thu 28/11/19	Wed 4/12/19	68
70	REPARACION DE BOTACAS	3 days	Wed 4/12/19	Sat 7/12/19	69
71	REPARACION DE PANELES TRAGALUZ	3 days	Thu 28/11/19	Sat 30/11/19	68
72	REPAR. VITRINA DE LA VIRGEN STA. LUCIA	12 days	Tue 22/10/19	Sat 2/11/19	62
73	REPAR. VITRINA DE LA VIRGEN ALTA GRACA	4 days	Sat 28/9/19	Thu 3/10/19	49
74	REPARACION VENTANILLAS DE ARRIBA EN EL TEMPLO	2 days	Thu 3/10/19	Fri 4/10/19	73
75	REPARACION VENTANILLAS DE ARRIBA EN EL TEMPLO	4 days	Sat 5/10/19	Mon 7/10/19	74
76	REPARACION ENTIBILLADO CON CRISTAL	2 days	Mon 7/10/19	Wed 9/10/19	75
77	CONSTRUCCION GABINETES Y DEPENSA EN COCINA	5 days	Sat 28/9/19	Fri 4/10/19	49
78	SUMINISTRO E INSTAL. DE PUERTAS METALICAS APTA MELLOS	4 days	Sat 28/9/19	Thu 3/10/19	49
79	VENTANAS REFORZADAS CORRIJIDAS DE ALUMINO Y VIDRIO EN TEMPLO	6 days	Sat 12/10/19	Fri 18/10/19	3
80	VENTANAS REFORZADAS CORRIJIDAS DE ALUMINO Y VIDRIO EN AREAS ALUMINIAS	3 days	Sat 12/10/19	Tue 15/10/19	27
81	PINTURAS	29 days	Sat 12/10/19	Mon 11/11/19	
82	REMOCCION DE PINTURA EXISTENTE	15 days	Sat 12/10/19	Mon 28/10/19	127
83	ASEILLADO Y RELLENO DE SUPERFICIE	6 days	Mon 28/10/19	Sat 2/11/19	83
84	ACRILICA ESPECIAL EN TECHO	4 days	Sat 2/11/19	Thu 7/11/19	84
85	PINTURA ESPECIAL EN PAREDES EXTERIOR, INTERIOR	8 days	Sat 2/11/19	Mon 11/11/19	84
86	UTILIZACION DE GONDOLA	8 days	Sat 2/11/19	Mon 11/11/19	184
87	MANTENIMIENTO EN PUERTAS	3 days	Thu 7/11/19	Mon 11/11/19	185
88	VARIOS	50 days	Sat 28/9/19	Wed 20/11/19	
89	ACERA PERIMETRAL	4 days	Sat 28/9/19	Thu 3/10/19	49
90	PROTECCION DE VENTANAS Y PUERTAS HIERRO	6 days	Fri 18/10/19	Thu 24/10/19	81
91	CANALERA PARA DESGUE DE TECHOS PVC	1 day	Tue 19/11/19	Wed 20/11/19	141
92	SIEMBRA DE GRAMAS Y FLORES	3 days	Thu 3/10/19	Sat 5/10/19	90
93	LIMPIEZA Y PINTURA CAMPANARIO	3 days	Sat 5/10/19	Wed 9/10/19	93
94	LIMPIEZA FINAL	2 days	Wed 9/10/19	Fri 11/10/19	94
95	CONSTRUCCION AREA DE BAÑO EXTERIOR	118 days	Tue 6/8/19	Fri 6/12/19	
96	PAREDES GENERALES	11 days	Tue 6/8/19	Sat 17/8/19	
97	DEMOLICIONES DE PISOS EN SALONES Y AREAS ADMINISTRATIVAS Y MUROS	3 days	Tue 6/8/19	Fri 9/8/19	4
98	BOITE ESCOMBRO	4 days	Fri 9/8/19	Tue 13/8/19	98
99	LIMPIEZA	4 days	Tue 13/8/19	Sat 17/8/19	99
100	MOVIMIENTO DE TIERRA	9 days	Sat 17/8/19	Tue 27/8/19	
101	EXCAVACION PARA MAJO BLOCK DIVISORIO	2 days	Sat 17/8/19	Mon 19/8/19	100
102	RELLENO DE REPOSICION	2 days	Tue 20/8/19	Wed 21/8/19	102
103	BOITE DE MATERIAL INSERVIBLE	3 days	Wed 21/8/19	Sat 24/8/19	103
104	RELLENO COMPACTADO CALICHE	2 days	Sat 24/8/19	Tue 27/8/19	104
105	HORMICON ARMADO EN:	4 days	Tue 27/8/19	Fri 30/8/19	
106	ZAPATA DE COLUMNA C1	2 days	Tue 27/8/19	Wed 28/8/19	105
107	COLUMNAS PORTICO B.N.P	2 days	Thu 29/8/19	Fri 30/8/19	107
108	HORMICON ARMADO SMP EN:	9 days	Fri 30/8/19	Mon 9/9/19	
109	COLUMNAS PORTICO S.N.P	2 days	Mon 9/9/19	Mon 2/9/19	108
110	VIGA DANTEL (V0)	2 days	Mon 2/9/19	Wed 4/9/19	110
111	VIGA DE CARGA	2 days	Mon 2/9/19	Wed 4/9/19	110
112	LOSAS Y VUELOS	5 days	Wed 4/9/19	Mon 9/9/19	112
113	MUROS BLOQUES	2 days	Tue 20/8/19	Wed 21/8/19	
114	BLOQUES DE PIS S/F0, 40 SMP	2 days	Tue 20/8/19	Wed 21/8/19	102
115	TERMINACION DE SUPERFICIE	7 days	Wed 21/8/19	Wed 28/8/19	
116	PRAGUACHE SOBRE HORMICON	2 days	Wed 21/8/19	Fri 23/8/19	115
117					

118	PAÑETES INTERIORES Y ESTERIORES	3 days	Fri 23/8/19	Tue 27/8/19	117
119	PAÑETES DE TECHO	2 days	Fri 23/8/19	Mon 26/8/19	117
120	CAYTOS	2 days	Mon 26/8/19	Wed 28/8/19	119
121	GOTERO RANURADO	1 day	Wed 28/8/19	Wed 28/8/19	120
122	TERMINACION DE TECHO:	5 days	Mon 9/9/19	Sat 14/9/19	113
123	PISO DE TECHO PLANO	2 days	Mon 9/9/19	Wed 11/9/19	113
124	ZABALETAS	2 days	Wed 11/9/19	Fri 13/9/19	123
125	IMPERMEABILIZANTES	1 day	Fri 13/9/19	Sat 14/9/19	124
126	TERMINACION DE PISO:	4 days	Tue 27/8/19	Fri 30/8/19	118
127	DE CERAMICA CROSLA	2 days	Tue 27/8/19	Wed 28/8/19	118
128	ZOCALO DE CERAMICA POMO BLANCO	2 days	Thu 29/8/19	Fri 30/8/19	127
129	INSTALACIONES ELECTRICAS	8 days	Mon 26/8/19	Tue 3/9/19	119
130	LUCES CENTIALES	2 days	Mon 26/8/19	Wed 28/8/19	119
131	INTERRUPTORES SIMPLE	2 days	Wed 28/8/19	Thu 29/8/19	130
132	TOMACORRIENTES	2 days	Thu 29/8/19	Sat 31/8/19	131
133	PANEL DE DISTRIBUCION 4 CIRCUITO	2 days	Sat 31/8/19	Tue 3/9/19	132
134	INSTALACIONES SANITARIA	8 days	Thu 29/8/19	Fri 6/9/19	140
135	INDICADOR CON TAPA	2 days	Fri 30/8/19	Mon 2/9/19	140
136	LAVAMANOS BENCILLO	2 days	Fri 30/8/19	Mon 2/9/19	140
137	DESAGUE DE PISO	1 day	Thu 5/9/19	Fri 6/9/19	138
138	TUBERIAS Y PIEZAS DE P.V.C. Y H.P	3 days	Mon 2/9/19	Thu 5/9/19	136
139	MAIO DE OBRAS PLOMERIA	7 days	Thu 29/8/19	Thu 5/9/19	127
140	COLOCACION DE TUBERIAS	2 days	Thu 29/8/19	Fri 30/8/19	127
141	CAMARA DE INSPECCION	4 days	Thu 29/8/19	Mon 2/9/19	127
142	CAMARA SEPTICA Y REFRANTE	3 days	Mon 2/9/19	Thu 5/9/19	141
143	PORTALE Y ESTANTERIA	2 days	Fri 30/8/19	Mon 2/9/19	141
144	SUMINISTRO E INSTAL DE PUERTAS METALICAS APANELADAS	2 days	Fri 30/8/19	Mon 2/9/19	128
145	VENTANAS	1 day	Wed 28/8/19	Wed 28/8/19	120
146	VENTANAS DE ALUMINIO TIPO A	1 day	Wed 28/8/19	Wed 28/8/19	120
147	PINTURAS	9 days	Wed 28/8/19	Fri 6/9/19	120
148	RENDICON DE PINTURA EXISTENTE	1 day	Wed 28/8/19	Wed 28/8/19	120
149	ASILLADO Y RELLENO DE SUPERFICIE ECONOMICA EN TECHO	2 days	Thu 29/8/19	Fri 30/8/19	148
150	ACHICLA EN PAREDES EXTERIOR, INTERIOR	2 days	Fri 30/8/19	Mon 2/9/19	149
151	MANUTENIMIENTO EN PUERTAS	2 days	Mon 2/9/19	Wed 4/9/19	150
152	VARIOS	6 days	Wed 4/9/19	Fri 6/9/19	151
153	ACERA PERIMETRAL	1 day	Sat 30/11/19	Fri 6/12/19	154
154	LIMPIEZA FINAL	5 days	Sat 30/11/19	Sat 30/11/19	154
155		110 days	Fri 30/8/19	Mon 23/12/19	
156	CONSTRUCCION GAZEBO	3 days	Fri 30/8/19	Tue 3/9/19	128
157	PANTIDAS GENERALES	2 days	Fri 30/8/19	Mon 2/9/19	128
158	LIMPIEZA	1 day	Mon 2/9/19	Tue 3/9/19	158
159	REPLANTIO	8 days	Tue 3/9/19	Wed 11/9/19	159
160	MOVIMIENTO DE TIERRA	1 day	Tue 3/9/19	Wed 4/9/19	159
161	EXCAVACION PARA MURO BLOCK	2 days	Wed 4/9/19	Fri 6/9/19	161
162	RELLENO DE REPOSICION	3 days	Fri 6/9/19	Mon 9/9/19	162
163	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	2 days	Mon 9/9/19	Wed 11/9/19	163
164	RELLENO COMPACTADO CALICHE	5 days	Sat 30/11/19	Tue 3/12/19	154
165	HORMIGON ARMADO EN:	2 days	Tue 3/12/19	Thu 5/12/19	166
166	ZAPATA DE MURO "	1 day	Thu 5/12/19	Fri 6/12/19	167
167	COLUMNAS PORTICO B.A.P.	2 days	Fri 6/12/19	Mon 9/12/19	168
168	HORMIGON ARMADO S.M.P.	2 days	Mon 9/12/19	Tue 10/12/19	170
169	COLUMNAS PORTICO S.A.P.	2 days	Tue 10/12/19	Wed 11/12/19	171
170	VIGA DE PORTICO (VPI)	2 days	Wed 11/12/19	Thu 12/12/19	172
171	LOSAS Y VUELOS	2 days	Thu 12/12/19	Fri 13/12/19	173
172	MUROS BLOQUES	2 days	Fri 13/12/19	Sat 14/12/19	174
173	BLOQUES DE P.B. 30" @ 80 S.M.P	2 days	Sat 14/12/19	Sun 15/12/19	175
174	MUROS BLOQUES S.M.P	2 days	Sun 15/12/19	Mon 16/12/19	176
175	BLOQUES DE P.B. 30" @ 80 S.M.P	2 days	Mon 16/12/19	Tue 17/12/19	177
176	TERMINACION DE SUPERFICIE	12 days	Tue 17/12/19	Mon 1/1/20	178
177	FRAGUACHE SOBRE HORMIGON	3 days	Mon 1/1/20	Tue 2/1/20	179
178	PAÑETES INTERIORES Y EXTERIORES	5 days	Tue 2/1/20	Mon 8/1/20	178
179	PAÑETES DE TECHO BERNIDA	4 days	Mon 8/1/20	Tue 9/1/20	180
180	CAYTOS	2 days	Tue 9/1/20	Wed 10/1/20	181
181	CONJUNTO EXT. DE CEMENTO GRIS EN TODO EL PERIMETRO	3 days	Wed 10/1/20	Thu 11/1/20	181
182	REVESTIMIENTO DE COLUMNAS EN PERRILLAS	2 days	Thu 11/1/20	Fri 12/1/20	182
183	PREDESTINOS EN COLUMNAS	2 days	Fri 12/1/20	Sat 13/1/20	183
184		2 days	Sat 13/1/20	Sun 14/1/20	184

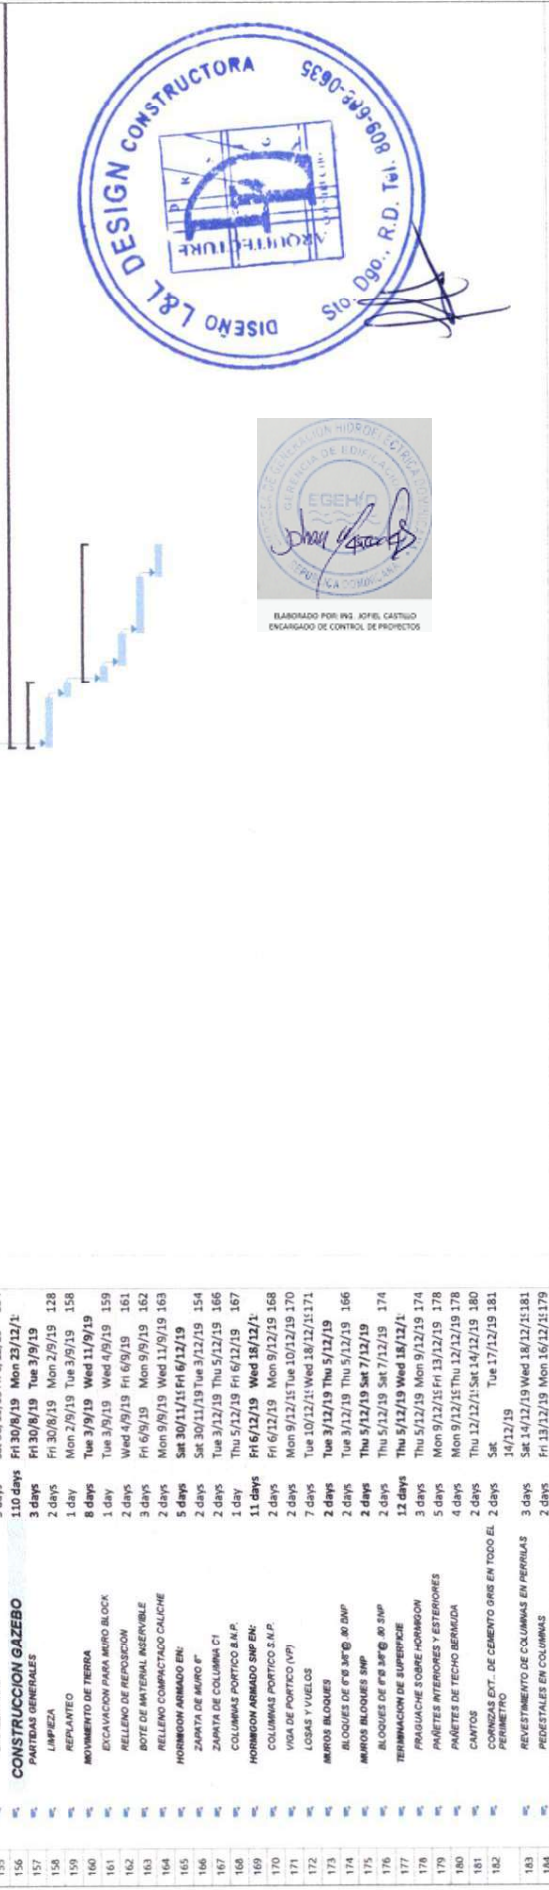

ID	Task / Task Mod	Duration	Start	Finish	Preced
185	TERMINACION DE TECHO:	5 days	Mon 9/12/11	Fri 13/12/19	
186	FINO DE TECHO BERNADA	3 days	Mon 9/12/11	Wed 11/12/11	185
187	GOTERO COLGANTE	2 days	Wed 11/12/11	Fri 13/12/19	186
188	IMPRESIONIZANTES MANTO ASFALTICO GRANULADA FINA	1 day	Wed 11/12/11	Thu 12/12/19	186
189	TERMINACION DE PISO:	5 days	Thu 12/12/11	Wed 18/12/11	
190	DE CERAMICA ESPANOLA	3 days	Thu 12/12/11	Mon 16/12/11	189
191	ZOCALO DE CERAMICA FONDO BLANCO	2 days	Mon 16/12/11	Wed 18/12/11	190
192	INSTALACIONES ELECTRICAS	6 days	Thu 12/12/11	Wed 18/12/11	
193	LUCEZ CENTRALES	2 days	Thu 12/12/11	Sat 14/12/11	192
194	INTERRUPTORES DOBLES	2 days	Sat 14/12/11	Tue 17/12/11	193
195	TOMACORRIENTES	2 days	Tue 17/12/11	Wed 18/12/11	194
196	PANEL DE DISTRIBUCION A CIRCUITO	2 days	Tue 17/12/11	Wed 18/12/11	194
197	PINTURAS	9 days	Fri 13/12/11	Mon 23/12/11	
198	ACRILICA EN PAREDES EXTERIOR, INTERIOR	3 days	Fri 13/12/11	Tue 17/12/11	197
199	ACRILICA EN TECHO INTERIOR	3 days	Tue 17/12/11	Thu 19/12/11	198
200	ACRILICA EN TECHO BERNADA EXTERIOR	3 days	Thu 19/12/11	Mon 23/12/11	199
201	CONST. DE VERJA PERIMETRAL, CALZADAS, ACERAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS	46.5 days	Wed 11/12/11	Wed 29/1/20	
202	PARTIDAS GENERALES	14.5 days	Wed 11/12/11	Thu 26/12/19	
203	DEMOLICIONES DE MUROS EXISTENTE	3.5 days	Wed 11/12/11	Sat 14/12/11	202
204	BOTE ESCOMBRO (VOLTEO DE 8 MD)	5 days	Sat 14/12/11	Fri 20/12/19	203
205	LIMPIEZA	4 days	Fri 20/12/19	Tue 24/12/19	204
206	REPLANTEO	2 days	Tue 24/12/11	Thu 26/12/19	205
207	MOVIMIENTO DE TIERRA	12 days	Thu 26/12/11	Wed 8/1/20	
208	EXCAVACION PARA MURO BLOCK	4 days	Thu 26/12/11	Tue 31/12/19	207
209	EXCAV. PARA MURO BLOCK BORDOLLO JARD.	4 days	Tue 31/12/11	Fri 3/1/20	208
210	RELLENO DE REPOSICION TOTAL	3 days	Fri 3/1/20	Tue 7/1/20	209
211	BOTE DE MATERIAL INSEVIBLE	1 day	Tue 7/1/20	Wed 8/1/20	210
212	HORRIBON ARMADO EN:	10 days	Wed 8/1/20	Sat 18/1/20	
213	ZAPATA DE MURO Y VERJA PERIMETRAL	2 days	Wed 8/1/20	Fri 10/1/20	212
214	ZAPATA DE MURO Y EN BORD. JARDINERAS	3 days	Fri 10/1/20	Mon 13/1/20	213
215	ZAPATA DE COLUMNA 20x20	3 days	Mon 13/1/20	Thu 16/1/20	214
216	COLUMNAS PORTICO B.N.P	2 days	Thu 16/1/20	Sat 18/1/20	215
217	HORRIBON ARMADO B.N.P EN:	4 days	Sat 18/1/20	Wed 22/1/20	
218	COLUMNAS PORTICO S.N.P.	2 days	Sat 18/1/20	Mon 20/1/20	217
219	VIGA DE AMARRE	2 days	Tue 21/1/20	Wed 22/1/20	218
220	MUROS BLOQUES	4 days	Tue 21/1/20	Fri 3/1/20	
221	BLOQUES DE 60x30x40 B.N.P	4 days	Tue 21/1/20	Fri 3/1/20	220
222	MUROS BLOQUES S.N.P	7 days	Fri 3/1/20	Fri 10/1/20	
223	BLOQUES DE 60x30x40 B.N.P	7 days	Fri 3/1/20	Fri 10/1/20	222
224	TERMINACION DE SUPERFICIE	11 days	Sat 11/1/20	Wed 22/1/20	
225	FRAGUACHE SOBRE HORRIBON	3 days	Sat 11/1/20	Tue 14/1/20	224
226	PANELES INTERIORES Y EXTERIORES	4 days	Tue 14/1/20	Sat 18/1/20	225
227	PERILLA EN COLUMNAS	3 days	Sat 11/1/20	Tue 14/1/20	226
228	PIEDISTALES EN COLUMNAS	3 days	Sat 18/1/20	Tue 21/1/20	227
229	CANTOS	4 days	Sat 18/1/20	Wed 22/1/20	228
230	INSTALACIONES ELECTRICAS	11 days	Sat 11/1/20	Wed 22/1/20	
231	LUCEZ CENTRALES	7 days	Sat 11/1/20	Sat 18/1/20	230
232	PANEL DE DISTRIBUCION A CIRCUITO	4 days	Sat 18/1/20	Wed 22/1/20	231
233	PORTAJE	15 days	Sat 11/1/20	Mon 27/1/20	
234	PUERTAS EN HIERRO DECORATIVO	15 days	Sat 11/1/20	Mon 27/1/20	233
235	PINTURAS	6 days	Wed 22/1/20	Wed 29/1/20	
236	ACRILICA EN PAREDES EXTERIOR, INTERIOR	4 days	Wed 22/1/20	Mon 27/1/20	235
237	MANTENIMIENTO EN PUERTAS	6 days	Wed 22/1/20	Wed 29/1/20	236
238	VAROS	36 days	Sat 14/12/11	Tue 21/1/20	
239	ACERA PERIMETRAL EN H.A Y ESTAMPADA	4 days	Sat 11/1/20	Wed 15/1/20	238
240	CALZADA EN AREA EXTERIOR Y MARQUESINA	3 days	Wed 15/1/20	Sat 18/1/20	239
241	COLOCACION DE LOZELLLOS EN JARDINERAS	3 days	Sat 18/1/20	Tue 21/1/20	240
242	DRENAJE DE LAS AGUAS EN TURO 8 F	3 days	Thu 16/1/20	Mon 20/1/20	241
243	CASITA DEPOSITO DE MATERIALES	4 days	Sat 14/12/11	Thu 19/12/19	243
244	CALLES CIRCUNDANTES	16 days	Tue 31/12/11	Thu 16/1/20	
245	MOVIMIENTO DE TIERRA	12 days	Tue 31/12/11	Sat 11/1/20	
246	Corte de material	5 days	Tue 31/12/11	Sat 4/1/20	245
247	Bote de Material Producto de Excavacion	4 days	Sat 4/1/20	Thu 9/1/20	246
248	Suministro y colocacion de Relleno para conformar explanacion (incl. transporte material a 20 Km)	3 days	Thu 9/1/20	Sat 11/1/20	247
249	CAPA DE RODADURA	4 days	Sat 11/1/20	Thu 16/1/20	

Task

Split

Milestone

Project: cerosa Santa Lucia

Date: Thu 30/5/19

Summary

Project Summary

Inactive Task

Task only

Project Summary

Manual Summary

Duration only

Manual Summary

Manual Summary

Share only

Project only

External Task

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

015

DISEÑO L&L DESIGN CONSTRUCTORA

9690-222-608

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

LABORADO POR: ING. JOSE CASTILLO

ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

015

DISEÑO L&L DESIGN CONSTRUCTORA


9690-222-608

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

ID	Task	Mod	Duration	Start	Finish	Prod
250	Rego de Impresión 0.6 g/s/m2 con Gavilla		4 days	Sat 11/1/20	Tue 16/1/20	248
						19
				4 Aug 19	11 Aug 19	
				16 Aug 19	25 Aug 19	
				5 Sep 19	8 Sep 19	
				15 Sep 19	22 Sep 19	
				29 Sep 19	6 Oct 19	
						1



Project: croco-Santa Lucia
Date: Thu 30/5/19

Task: ☐ Summary ☐ Request Summary ☐ Inactive Task

Milestone: ☐ Inactive Milestone ☐ Inactive Summary ☐ Manual Task


Duration only: ☐ Manual Summary (Setup) ☐ Manual Summary

Start only: ☐ Finish only: ☐ External Task


External Milestone: ☐ Qualifier: ☐ Progress: ☐ Manual Progress: ☐

Page 5

13 Oct 19
 20 Oct 19
 27 Oct 19
 3 Nov 19
 10 Nov 19
 17 Nov 19
 24 Nov 19
 1 Dec 19
 8 Dec 19
 15 Dec 19
 22 Dec 19
 29 Dec 19
 5 Jan 20
 12 Jan 20
 19 Jan 20
 26 Jan 20

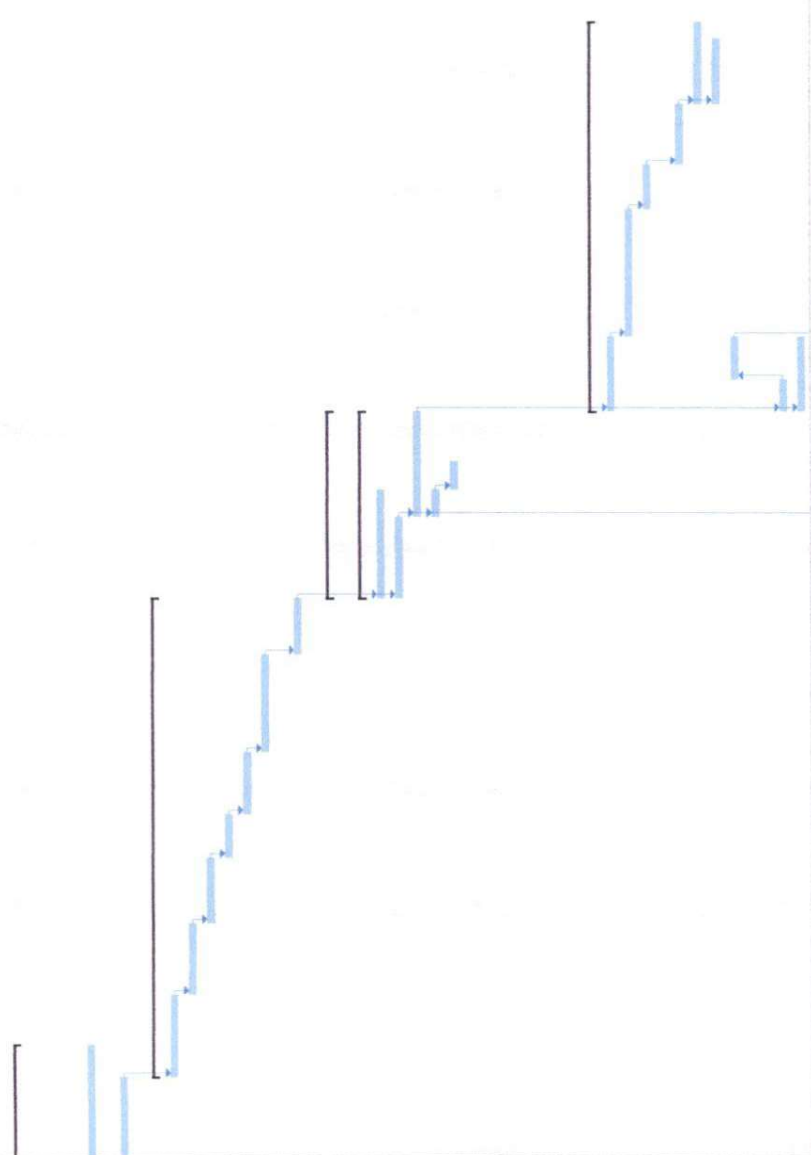

15 Oct 19
 20 Oct 19
 27 Oct 19
 3 Nov 19
 10 Nov 19
 17 Nov 19
 24 Nov 19
 1 Dec 19
 8 Dec 19
 15 Dec 19
 22 Dec 19
 29 Dec 19
 5 Jan 20
 12 Jan 20
 19 Jan 20
 26 Jan 20

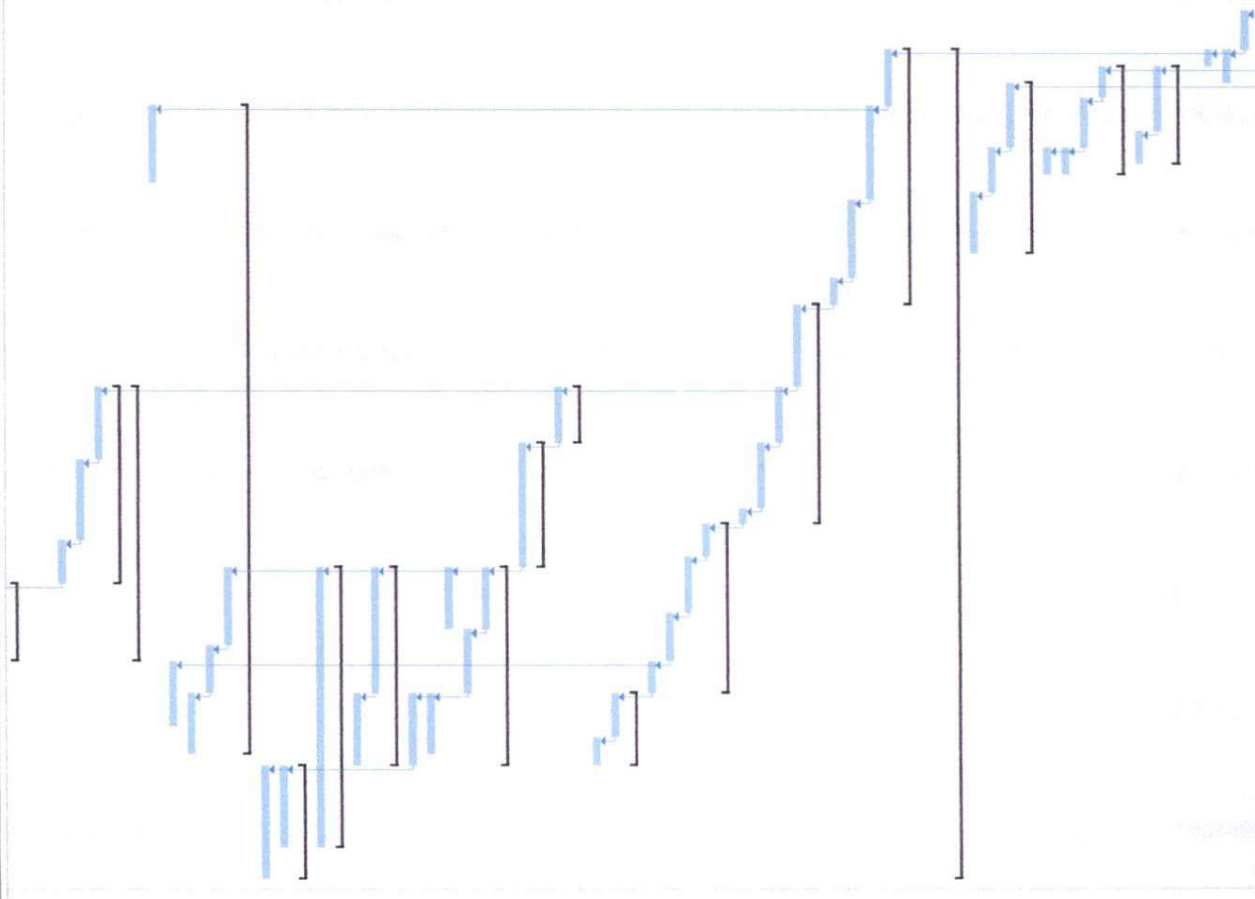

ELABORADO POR: ING. JOFEL CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



Project: cromo Santa Lucia
Date: Thu 30/9/19

Task
Sign

Summary
Request Summary
Inserta Task

Inserta Milestone
Inserta Summary
Manual Task

Question-only
Manual Summary Setup
Manual Summary

Start-only
Insert-only
External Task

External Milestone
Deadline
Project

Manual Program

13 Oct 19 S M T T W T F S S 20 Oct 19 F S S M T T W T F S 27 Oct 19 F S S M T T W T F S 3 Nov 19 S S M T T W T F S 10 Nov 19 S M T T W T F S 17 Nov 19 F S S M T T W T F S 24 Nov 19 S S M T T W T F S 1 Dec 19 F S S M T T W T F S 8 Dec 19 F S S M T T W T F S 15 Dec 19 F S S M T T W T F S 22 Dec 19 F S S M T T W T F S 29 Dec 19 S M T T W T F S 5 Jan 20 S S M T T W T F S 12 Jan 20 F S S M T T W T F S 19 Jan 20 F S S M T T W T F S 26 Jan 20 S M T T W T F S



ELABORADO POR: ING. JOSE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS
