

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Octubre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

19.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 19, EN LA COMUNIDAD DE la Florida.	3
---	---





**19.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 19, EN LA COMUDIDAD DE la Florida.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,884,525.37
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,576,905.07
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	26.80%
Contratista	Ing. Alexander Manzueta Diaz.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se trabaja en la colocación de bloques bajo nivel de piso y en la colocación de pañete en fachada. Además, se trabaja en la construcción de aceras perimetrales en algunas de las viviendas.





Vaciado y terminación de acera perimetral, casa de la Sra. Susana Ramírez, Viviendas Económicas.




Pañete de fachada, casa del Sr. Milciades Ramírez, Viviendas Económicas.





Vaciado de acera perimetral, casa de la Sra. Carmela Ramírez, Viviendas Económicas.

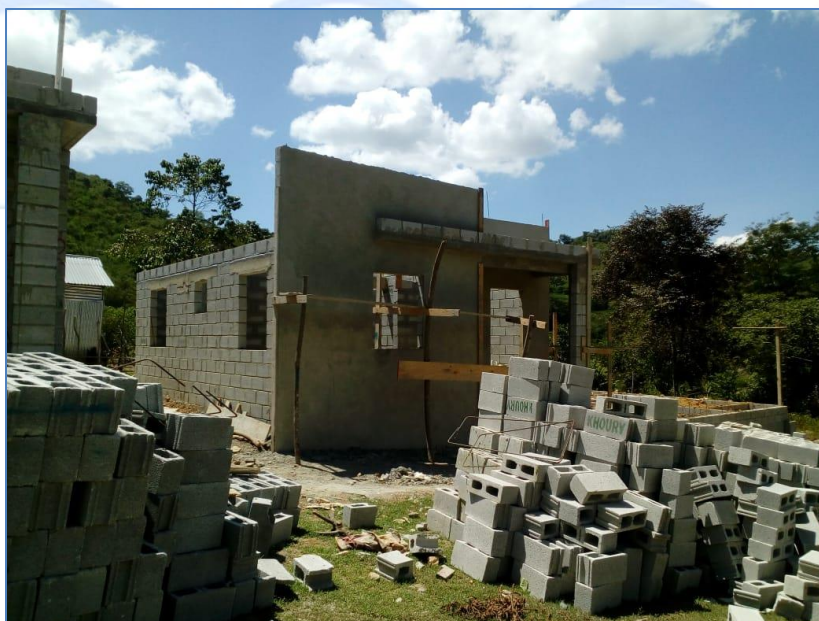

Pañete en fachada, casa del Sr. Ramón Ramírez, Viviendas Económicas.





Colocación de bloques hasta nivel de piso, casa del Sr. Sergio Ramírez, Viviendas Económicas.



Colocación de bloques bajo nivel de piso, casa del Sr. Manuel Arnó del Carmen, Viviendas Económicas.





Colocación de bloques bajo nivel de piso, casa del Sr. Pasito Jiménez de la Rosa, Viviendas Económicas

