



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS**

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
DE OBRAS CIVILES.**

ENERO 2018.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**1.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERERA LOS MINEROS A
CENTRAL HIDROELECTRICA JIGUEY, DISTRITO MUNICIPAL LOS CACAOS,
SAN CRISTOBAL, LONG. DE 5.00 KM, ANCHO PROMEDIO 7.00 MT,
SEGUNDA ETAPA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista finalizó los trabajos, estamos a la espera de que el contratista firme la cubicación final.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**2.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA
CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 0+000 HASTA EST 2+900, PROV. SAN
CRISTOBAL. PRIMERA ETAPA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**3.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA CENTRAL
HIDROELECTRICA DE PINALITO HASTA LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO,
PROV. MONSEÑOR NOUEL (SEGUNDA ETAPA) TRAMO DE LA FALLA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado, se realizó la cubicación final, el contratista se encuentra en espera de firmar la misma.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**4.0 PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO PARA
LA CONSTRUCCION CAMINO VECINAL Y CALLES INTERNAS DE LAS
COMUNIDADES EL CORTE, SEMANA SANTA Y DOÑA ANA-LA MANIGUA-
LA SIERRA, MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

En espera de que sea ejecutado el addendum por parte de la Dirección Jurídica para la ejecución de la cubicación final.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**5.0 PROYECTO RIEGO DE IMPRIMACION PARA ASFALTADO DE CALLES DEL
DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado, fue realizada la cubicación final, estamos a la espera de que el contratista firme la cubicación.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**6.0 PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO DE
LAS CALLES DEL DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado, se realizó la cubicación final, el contratista se encuentra en espera de firmar la misma.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**7.0 PROYECTO REPARACION CAUCE RIO, BERMA DEL SOCAZ CH
ANGOSTURA, PROV. SANTIAGO, ETAPA II.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se trabajó en la terminación de los contenes, en la elaboración de la parrilla que se colocaron encima de la cuneta de la entrada de la central, se colocó la baranda de 2" HG, continúan con el pañete de la parte frontal del gavion.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."











Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**8.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN EN BAIGUAQUE, CON
ALCANTARILLA DE 42", CH BAIGUAQUE, SANTIAGO, SEGUNDA ETAPA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**9.0 PROYECTO RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERA LOMA DE VIALO-
LOS CACAOS, MUNICIPIO LOS CACAOS, R.D.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO


El proyecto fue finalizado, se realizó la cubicación final, el contratista se encuentra en espera de firmar la misma.



10.0 PROYECTO ASFALTADO CARRETERA DESDE CENTRAL
HIDROELECTRICA MONCION HASTA LA PRESA DE MONCION, PROVINCIA
SANTIAGO RODRIGUEZ, PRIMERA ETAPA, TRAMO I (DESDE CENTRAL
HIDROELECTRICA MONCION HASTA CRUCE CARRETERA SAN JOSE DE LAS
MATAS (BULLA)) Y TRAMO II (DESDE CENTRAL HIDROELECTRICA
MONCION HASTA EL CONTRAEMBALSE).

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO


El contratista no se encuentra trabajando.

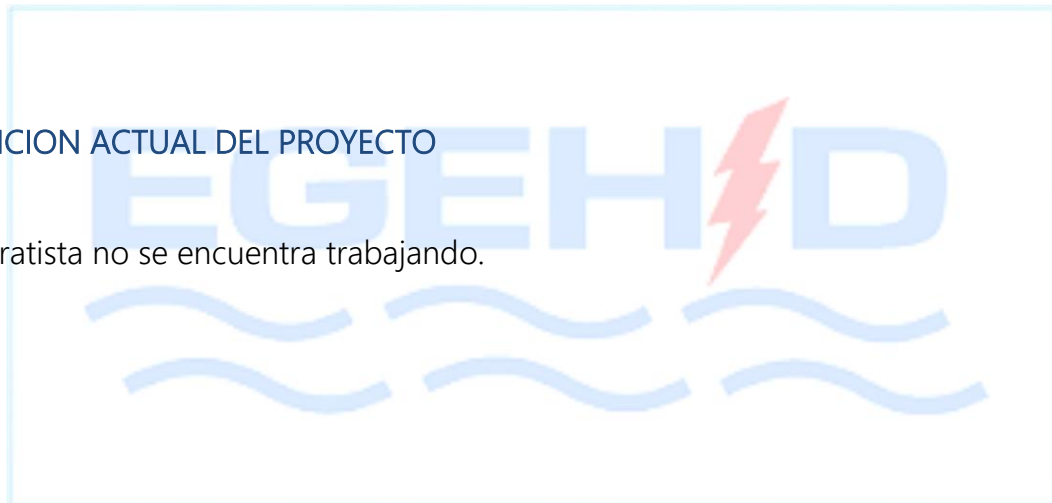

**11.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN CAÑADAS
LAS BARIAS, DEL CANAL MARCOS A. CABRAL, BANI, PROVINCIA PERAVIA,
REPUBLICA DOMINICANA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la construcción de encaches de protección de talud.

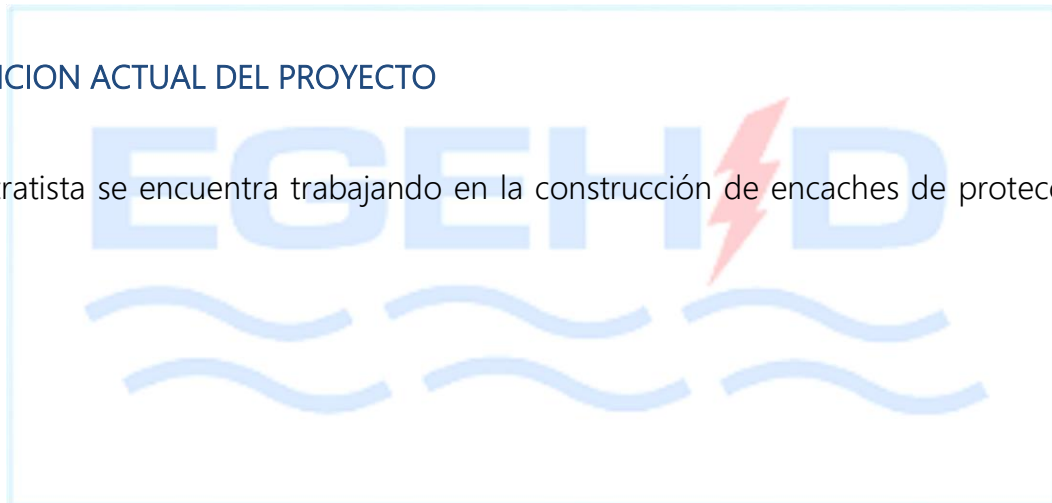








Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**12.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA
CRUCE LOS MINEROS, DESDE EST. 2+900 HASTA EST. 5+800, SEGUNDA
ETAPA, LOS CACAOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R. D.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no ha iniciado los trabajos.

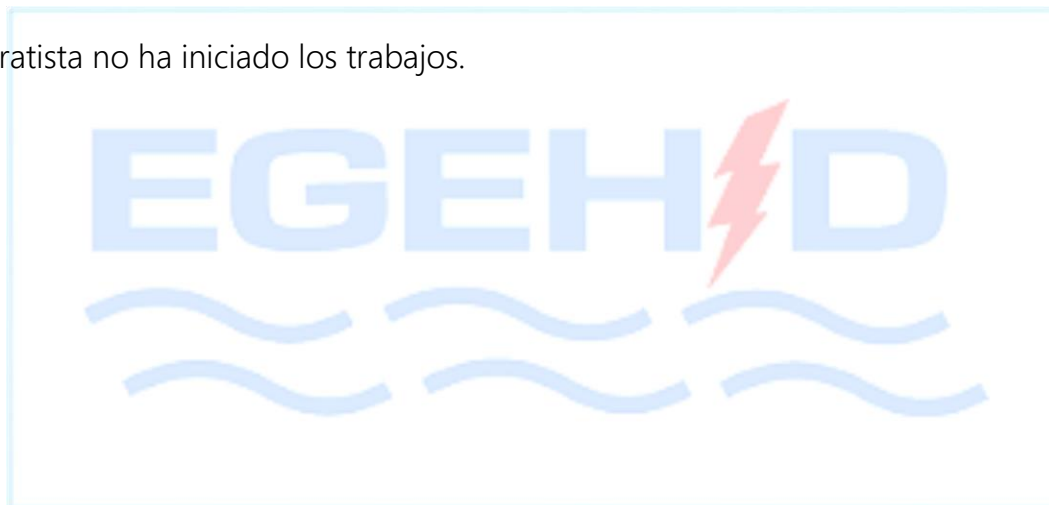



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**13.0 PROYECTO REHABILITACIÓN TRAMOS CARRETEROS CH RINCÓN,
PROV. LA VEGA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.



14.0 PROYECTO ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE LOS CACAOS A PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL, TERCERA ETAPA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la construcción de sobreanchos, cunetas de hormigón simple, alcantarilla en Est. 7+280 y muro de gaviones en Puente Rio Zumbí.









**15.0 PROYECTO CONSTRUCCION LOSA DE HORMIGON Y RAMPA EN
ENTRADA, MURO CONTENCION M1 EN CANAL, M2, M3, M4, M5 Y M6 EN
VERJA PERIMETRAL, C.H. NIZAO-NAJAYO, PROV. SAN CRISTOBAL.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista desencofró el muro M2 y el pozo de achique, se encuentra trabajando en la excavación del Muro M4. Fue realizado el replanteo en la parte de arriba del canal para poder realizar un muro lateral izquierdo desde la central, con una longitud de 85 mts de largo y una altura de 2.50 mts. Inicio de construcción de encaches protección de talud.











Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

16.0 PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EST. 14+680,
CONSTRUCCION COLUMNA, VIGA Y LOSA EN EST. 15+400, TRAMO
ACCESO A LA PRESA PALOMINO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

La contratista se encuentra trabajando en la construcción de muros de gaviones.









Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**17.0 PROYECTO ASFALTADO DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista finalizó los trabajos de asfaltado de calles, el contratista se encuentra a la espera de realización de la cubicación final.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**18.0 PROYECTO ASFALTADO ENTRADA PRINCIPAL C.H. RIO BLANCO,
BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista reinició los trabajos de limpieza, así como la recogida de escombros y bote del material en la entrada de la Central.













Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**19.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CH PINALITO HASTA CHIMENEA DE
EQUILIBRIO, BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, TRAMO FALTANTE
EN HORMIGÓN, SEGUNDA ETAPA**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista se encuentra montando el bachiplan para dar inicio a el vaciado de la capa de rodadura.



**20.0 REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS DE LA CARRETERA BOCA DE
BLANCO, LA CIÉNEGA Y EL RODEO, C.H. PINALITO, PROVINCIA
MONSEÑOR NOUEL**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista realiza las actividades de movimiento de tierra para el acceso de los lugares donde se construirán los muros de gaviones, excavación y limpieza de dichas áreas en Est. 7+410.













Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**21.0 CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES Y RECONSTRUCCIÓN TRAMO
CARRETERA CAMBITA-PUEBLECITO, CH AGUACATE, SAN CRISTÓBAL, R.D.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no ha iniciado los trabajos, se encuentra en la espera del permiso por parte del Ministerio de Medio Ambiente.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**22.0 CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE ARTE PARA LA CARRETERA PRESA
JIGÜEY-PALO DE CAJA-RODADERO, SAN JOSE DE OCOA, (TRAMO DE
IMPRIMACIÓN), SEGUNDA ETAPA**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

La brigada topográfica se encuentra realizando el levantamiento del terreno natural, para los fines de control volumétrico y de diseño.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**23.0 REHABILITACION DEL CAMINO ADYACENTE A LA PRESA DE JIGUEY
DESDE EL POBLADO DE CRUZ DE SANTA ANA HASTA LA COMUNIDAD DE
TATON (TRAMO DE HORMIGON)**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

La brigada topográfica se encuentra realizando el levantamiento del terreno natural, para los fines de control volumétrico y de diseño.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

24.0 CONSTRUCCION TRAMO PUENTE CANAL (FLUMEN) ANIANA
VARGAS, CENTRAL HIDROELECTRICA ANIANA VARGAS, PROVINCIA
MONSEÑOR NOUEL, REPUBLICA DOMINICANA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto no ha iniciado.



25.0 CONSTRUCCION MURO DE PROTECCION EN MAMPOSTERIA,
MARGEN IZQUIERDO DEL RIO YUNA, DIQUE PROYECTO AGLIPO EN LA
SECCION DE ARENOSO, PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORIS
(BARRIO LOS ESTUDIANTES DESDE EST. 0+720 HASTA EST. 2+420),
REPUBLICA DOMINICANA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto no ha iniciado.



26.0 RELACION DE COMBUSTIBLE EQUIPOS PESADOS.

DESCRIPCION

Los equipos pesados realizaron trabajos de transporte, nivelación y conformación de material, excavaciones, tiro de material, compactación y carguío de materiales en la Carretera Comunidad Mana, siendo distribuido de la siguiente manera:

Equipos	Ficha	Galones
Camioneta	3202	76
Camión	3430	53
Camión	3297	133
Camión	3637	30
Rodillo	3296	34
Greader	3295	139
Pala	3288	76
Camioneta	3173	27
Retro	3298	35

Para un total de 603.00 galones.

27.0 ALQUILER EQUIPOS PESADOS.

DESCRIPCION

Tenemos los siguientes contratos de alquiler de equipos en vigencia:

El Encargado de la Central Palomino solicitó el mantenimiento del camino de acceso a la Presa debido a que dicho camino ha presentado un acelerado proceso de deterioro por la gran cantidad de derrumbes, lo cuales no permiten el paso.

- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de mantenimiento carretera Presa Palomino, el cual consta de:

- 01 pala 950 Cat o similar.
- 01 grader Cat 12G o similar.
- 01 retroexcavadora Cat 320 o similar.
- 01 rodillo CA 25 Dynapac o similar.
- 01 camión de agua.
- 01 camión volteo 6m3e.

Se ha trabajado una longitud de 10.7 kms con ancho promedio de 6 mts, con el grader y el rodillo.

- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de Limpieza del Embalse de la Presa Aguacate, el cual consta de:
 - 01 tractor Cat D8 o similar.
 - 01 retroexcavadora Cat 320 o similar.
 - 01 pala 950 Cat o similar.

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

- Suministro y transporte de material base procesado para la Rehabilitación de las Calles de Doña Chucha en Madre Vieja Norte, Cañada Honda, Lavapiés, Calles del Barrio Don Félix, Canastica y en la Carretera Prolongación Salcedo, en El Fondo, CH Valdesia.
 - 8,000.00 M3 material base procesado.
- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en la Rehabilitación del camino vecinal Sección Iguana, Bani, CH Valdesia, el cual consta de:
 - 01 greader Cat 12G o similar.
 - 01 retroexcavadora Cat 320 B o similar.
 - 01 retropala Cat 416 o similar.
 - 01 rodillo CA 25 Dynapac o similar.
 - 01 tractor D7G Cat o similar.
 - 02 camiones volteo 14 m3e.
 - 01 camión de agua.
- Alquiler de equipos pesados para la construcción muro de protección en tierra, margen izquierda del Rio Yuna, Dique Proyecto Aglipo, en la Sección Arenoso, Prov. San Francisco de Macorís (Barrio Los Estudiantes desde Est. 0+000 hasta Est. 0+720), el cual consta de:
 - a. Dos tractores D8K Cat o similar.
 - b. Dos retroexcavadoras 320 Cat o similar.
 - c. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - e. Un greader 12G Cat o similar.
 - f. Un camión de agua.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

Tractor D6D CAT.

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	5/1/2018	Movimiento de tierra			2 horas	
2	15/1/2018	Movimiento de tierra	1:00	6:00	5 horas	
3	16/1/2018	Movimiento de tierra	07:00-12:00	1:00-5:00	9 horas	

Greaser CAT.
12G

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	5/1/2018	Conformación de camino			2 horas	
2	9/1/2018	Conformación de camino	2:00	7:00	5 horas	
3	10/1/2018	Conformación de camino	10:00-12:00	1:00-6:00	7 horas	
4	11/1/2018	Conformación de camino			5 horas	
5	22/1/2018	Conformación de camino	10:00-11:00	3:00-6:00	4 horas	
6	23/1/2018	Conformación de camino	2:00	5:00	3 horas	

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

Retroexcavadora CAT 320D

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	5/1/2018	Movimiento de tierra			9.5 horas	
2	10/1/2018	Movimiento de tierra	8:00-12:00	1:00-6:00	9 horas	
3	11/1/2018	Movimiento de tierra	8:00-12:00	1:00-4:00	7 horas	
4	15/1/2018	Movimiento de tierra	1:00	6:00	5 horas	
5	16/1/2018	Movimiento de tierra	08:00-12:00	1:00-3:00	6 horas	

Rodillo Dinapac 250

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	9/1/2018	Compactación de material	2:00	7:00	5 horas	
2	10/1/2018	Compactación de material	9:00-12:00	1:00-6:00	8 horas	
3	11/1/2018	Compactación de material	8:00-12:00	1:00-3:00	6 horas	
4	18/1/2018	Compactación de material			1 hora	
5	23/1/2018	Compactación de material	4:00	5:00	1 hora	

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

Rodillo Dinapac 252

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	9/1/2018	Compactación de material	2:00	7:00	5 horas	
2	10/1/2018	Compactación de material	9:00-12:00	1:00-6:00	8 horas	
3	11/1/2018	Compactación de material	8:00-12:00	1:00-3:00	6 horas	
4	22/1/2018	Compactación de material	10:00-11:00	5:00-7:00	3 horas	
5	23/1/2018	Compactación de material	3:00	6:00	3 horas	
6	24/1/2018	Compactación de material	8:00	12:00	4 horas	

Retropala 420E

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	9/1/2018	Extracción material de derrumbes	2:00	7:00	5 horas	
2	10/1/2018	Extracción material de derrumbes	8:00-12:00	1:00-6:00	9 horas	
3	11/1/2018	Extracción material de derrumbes	8:00-12:00	1:00-3:00	6 horas	
4	22/1/2018	Extracción material de derrumbes	10:00-12:00	1:00-6:00	7 horas	
5	23/1/2018	Movimiento de tierra	2:00	6:00	4 horas	



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

Retropala 420D

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	9/1/2018	Movimiento de tierra	9:00-12:00	1:00-7:00	9 horas	
2	10/1/2018	Movimiento de tierra	8:00-12:00	1:00-6:00	9 horas	
3	11/1/2018	Movimiento de tierra	8:00-12:00	1:00-3:00	7 horas	
4	18/1/2018	Movimiento de tierra	2:00	5:00	3 horas	
5	22/1/2018	Movimiento de tierra	10:00-12:00	1:00-6:00	7 horas	
6	23/1/2018	Movimiento de tierra	2:00	6:00	4 horas	
7	24/1/2018	Movimiento de tierra	7:00-12:00	1:00-3:00	7 horas	

Pala frontal 544 H

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	22/1/2018	Movimiento de tierra	3:00	6:00	3 horas	
2	23/1/2018	Movimiento de tierra	9:00-12:00	1:30-6:00	7.5 horas	

Camión de agua

No.	Fecha	Actividad realizada	Horas trabajadas	Observación
-----	-------	---------------------	------------------	-------------



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

1	11/1/2018		2	
---	-----------	--	---	--

Camion L 311390 (17mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	5/1/2018	Movimiento de tierra	23	391
2	9/1/2018	Movimiento de tierra	11	187
	10/1/2018	Movimiento de tierra	11	187
3	11/1/2018	Movimiento de tierra	4	68
4	22/1/2018	Movimiento de tierra	7	119

Camion L 311390 (17mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	9/1/2018		6	102
2	10/1/2018		3	51

Camion de S011228 (17 mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	9/1/2018	Bote de material	7	119
2	10/1/2018	Bote de material	9	153
3	11/1/2018	Bote de material	4	68

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

Camión L081908 (17mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	9/1/2018	Bote de material	7	119
2	10/1/2018	Bote de material	11	187
3	11/1/2018	Bote de material	3	51
4	22/1/2018		5	85
5	24/1/2018		5	85

Camion S 010121

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	24/1/2018	Movimiento de tierra	6	99

Camion S 014731

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	11/1/2018	Movimiento de tierra	2	34
2	22/1/2018	Movimiento de tierra	5	82.5

Camion I152870

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	11/1/2018	Movimiento de tierra	2	34



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

Camion I062228 (17mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	11/1/2018	Movimiento de tierra	2	34

Camion S 016503 (17mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	22/1/2018	Movimiento de tierra	3	51

Camion S 009039 (16mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	22/1/2018	Movimiento de tierra	2	32
2	23/1/2018	Movimiento de tierra	5	80
3	24/1/2018	Movimiento de tierra	3	39

Camion L 081908 (17mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	22/1/2018	Movimiento de tierra	5	85
2	23/1/2018	Movimiento de tierra	4	68

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

Camion S 006634 (17mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	11/1/2018	Movimiento de tierra	3	51
2	22/1/2018	Movimiento de tierra	5	85
3	23/1/2018	Movimiento de tierra	4	68

Camion PS 006634 (17mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	10/1/2018	Movimiento de tierra	12	204
2	11/1/2018	Movimiento de tierra	3	51
3	24/1/2018	Movimiento de tierra	4	68

- Alquiler de equipos pesados para la construcción de los caminos vecinales que comunican las comunidades Ermitaño, La Bejuquera, Caminero, Los Ramones, La Lagunita, El Mato y La Peñita, en la Sección Mucha Agua, Cambita, C.H. Aguacate, el cual consta de:
 - a. Un tractor D8 Komatsu o similar.
 - b. Un rodillo.
 - c. Una retroexcavadora 290 con cubo.
 - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - e. Un grader 12G Cat o similar.

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

- f. Un camión de agua.
- g. Un camión volteo.

Se ha trabajado con el grader una longitud de 1.1 kms., aparece una falda de loma empinada con un sistema rocoso de unos 800 metros, los cuales pueden abrirse desde la parte alta, con un ancho de 7 metros utilizando la retroexcavadora y el tracto, hasta llegar a la trocha que sale desde El Cajón.

Tractor

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	22/1/2018	Movimiento de tierra			2 horas	
2	23/1/2018	Movimiento de tierra			7 horas	
3	24/1/2018	Movimiento de tierra			6.5 horas	

Retroexcavadora

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	22/1/2018	Movimiento de tierra			2 horas	
2	23/1/2018	Movimiento de tierra			7 horas	
3	24/1/2018	Movimiento de tierra			7 horas	

- Alquiler de equipos pesados para la reparación de camino principal parcelario de productores, Paraje Chiva Prieta, Sección Guayacanal, Municipio Pueblo Viejo, CH Los Toros, el cual consta de:

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

- a. Un rodillo vibrador 25 Dynapac o similar.
- b. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
- c. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
- d. Un grader 12G Cat o similar.
- e. Un camión volteo.

Se ha trabajado una longitud de 2.3 kms con el grader sin colocación de material de base. Se replantearon 450 mts lineales de canaletas de drenaje para el mantenimiento de los estanques.

Grader Cat. 12G

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	3/1/2018	Conformación de camino			3 horas	
2	4/1/2018	Conformación de camino			2 horas	
3	10/1/2018	Conformación de camino			6.5 horas	
4	11/1/2018	Conformación de camino			7 horas	
5	16/1/2018	Conformación de camino			4 horas	
6	17/1/2018	Conformación de camino			4 horas	
7	23/1/2018	Conformación de camino			7.5 horas	
8	24/1/2018	Conformación de camino			8 horas	
9	25/1/2018	Conformación de camino			4 horas	
10	31/1/2018	Conformación de camino			7.5 horas	



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

Retroexcavadora Samsung

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	2/1/2018	Movimiento de tierra			2.5 horas	
2	3/1/2018	Movimiento de tierra			7 horas	
3	4/1/2018	Movimiento de tierra			5 horas	
4	5/1/2018	Movimiento de tierra			5.5 horas	
5	10/1/2018	Movimiento de tierra			8 horas	
6	11/1/2018	Movimiento de tierra			7 horas	
7	15/1/2018	Movimiento de tierra			4 horas	
8	16/1/2018	Movimiento de tierra			6 horas	
9	17/1/2018	Movimiento de tierra			2 horas	
10	22/1/2018	Movimiento de tierra			2.5 horas	
11	23/1/2018	Movimiento de tierra			7.5 horas	
12	24/1/2018	Movimiento de tierra			8 horas	
13	25/1/2018	Movimiento de tierra			6 horas	
14	26/1/2018	Movimiento de tierra			8 horas	
15	27/1/2018	Movimiento de tierra			4 horas	
16	31/1/2018	Movimiento de tierra			5 horas	

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

Pala CAT. 416

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	2/1/2018	Movimiento de tierra			3 horas	
2	3/1/2018	Movimiento de tierra			4.5 horas	
3	4/1/2018	Movimiento de tierra			4.5 horas	
4	5/1/2018	Movimiento de tierra			5.5 horas	
5	10/1/2018	Movimiento de tierra			4 horas	
6	11/1/2018	Movimiento de tierra			3 horas	
7	16/1/2018	Movimiento de tierra			2 horas	
8	17/1/2018	Movimiento de tierra			4 horas	
9	18/1/2018	Movimiento de tierra			8 horas	
10	22/1/2018	Movimiento de tierra			2.5 horas	
11	23/1/2018	Movimiento de tierra			2.5 horas	
12	24/1/2018	Movimiento de tierra			2.5 horas	
13	25/1/2018	Movimiento de tierra			3 horas	
14	26/1/2018	Movimiento de tierra			6 horas	



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

Rodillo Ingersoll

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	2/1/2018	Compactación de material			2 horas	
2	3/1/2018	Compactación de material			4 horas	
3	4/1/2018	Compactación de material			5 horas	
4	5/1/2018	Compactación de material			5 horas	
5	10/1/2018	Compactación de material			6 horas	
6	11/1/2018	Compactación de material			5 horas	
7	16/1/2018	Compactación de material			4 horas	
8	18/1/2018	Compactación de material			3 horas	
9	23/1/2018	Compactación de material			5 horas	
10	24/1/2018	Compactación de material			6 horas	
11	25/1/2018	Compactación de material			3 horas	

Camión I352938 (16.7mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
-----	-------	---------------------	--------	-----



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

1	2/1/2018	Movimiento de tierra	2	33.4
2	3/1/2018	Movimiento de tierra	9	150.3
3	4/1/2018	Movimiento de tierra	3	50.1
4	5/1/2018	Movimiento de tierra	13	217.1
5	10/1/2018	Movimiento de tierra	1	16.7
6	17/1/2018	Movimiento de tierra	4	66.8
7	23/1/2018	Movimiento de tierra	12	200.4
8	24/1/2018	Movimiento de tierra	3	50.1
9	25/1/2018	Movimiento de tierra	8	133.6
10	26/1/2018	Movimiento de tierra	9	150.3

Camion I352938 (16.7mt3) Acarreo

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	18/1/2018	Movimiento de tierra	5	83.5

Camión I228594 (13mt3)Acarreo

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	18/1/2018	Movimiento de tierra	4	52
2	31/1/2018	Movimiento de tierra	1	13.60

Camión I228594 (13mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	2/1/2018	Movimiento de tierra	4	52
2	3/1/2018	Movimiento de tierra	6	78
3	4/1/2018	Movimiento de tierra	1	13
4	5/1/2018	Movimiento de tierra	13	169
5	10/1/2018	Movimiento de tierra	3	39
6	17/1/2018	Movimiento de tierra	3	39
7	18/1/2018	Movimiento de tierra	1	13
8	23/1/2018	Movimiento de tierra	14	190.4
9	24/1/2018	Movimiento de tierra	11	149.6
10	25/1/2018	Movimiento de tierra	11	149.6
11	26/1/2018	Movimiento de tierra	10	136

- Alquiler Hora Equipo para el Mantenimiento del Tramo Camino La Cueva de la Mancha de Mana, C.H. Valdesia, Yaguate, el cual consta de:

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

- a. Un tractor D8K Cat o similar.
- b. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
- c. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
- d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
- e. Un grader 12G Cat o similar.
- f. Camión Volteo de 3 m o 6 m³.

Los equipos (retroexcavadora y tractor) llevan un avance de unos 1,200 mts de longitud con una buena limpieza de malezas en un ancho de vía de 8 mts, llegando al firme de la loma para un recorrido de un 50% del camino. Se realizará el mantenimiento de 2.3 kms en EL Callejón de Los Brea.

Retroexcavadora Samsung 280

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	2/1/2018	Movimiento de tierra			1 hora	
2	3/1/2018	Movimiento de tierra			8 horas	
3	4/1/2018	Movimiento de tierra			4 horas	
4	5/1/2018	Movimiento de tierra			8 horas	
5	9/1/2018	Movimiento de tierra	08:00-12:00	01:00-05:00	8 horas	
6	23/1/2018	Movimiento de tierra	08:00-12:00	01:00-05:00	8 horas	

Tractor Komatsu D6IE

No.	Fecha		Hora de inicio	Hora final		Observación
-----	-------	--	----------------	------------	--	-------------

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

		Actividad realizada			Horas trabajadas	
1	2/1/2018	Movimiento de tierra			6 horas	
2	3/1/2018	Movimiento de tierra			8 horas	
3	4/1/2018	Movimiento de tierra			4 horas	
4	5/1/2018	Movimiento de tierra			8 horas	
5	9/1/2018	Movimiento de tierra	08:00-12:00	01:00-05:00	8 horas	
6	13/12/2018	Movimiento de tierra	07:00-12:00	01:00-05:00	9 horas	
7	24/12/2018	Movimiento de tierra	10:00-12:00	01:00-05:00	6 horas	

Retropala

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	24/12/2018	Extracción material de derrumbes	08:00-12:00	01:00-05:00	8 horas	

- Alquiler Hora Equipo para el Limpieza de Cunetas y Acondicionamiento de las Vías de Acceso a la Válvula Mariposa y Terminación de trabajos de las demás captaciones, C.H. Pinalito, el cual consta de:
 - a. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - c. Un grader 12G Cat o similar.
 - d. Tres Camiones Volteo de 6 m³, 12 m³ y 16 m³.

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

Greader

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas
1	17/1/2018	Conformación de camino	09:00-12:00	01:00-04:30	6.5 horas
2	22/1/2018	Conformación de camino	08:00-12:00	01:00-04:00	5 horas
3	23/1/2018	Conformación de camino	08:00-12:00	01:00-05:00	8 horas
4	24/1/2018	Conformación de camino	08:00-12:00	01:00-04:00	

Retroexcavadora Samsung

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas
1	17/1/2018	Movimiento de tierra	08:00-12:00	01:00-04:30	7.5 horas
2	22/1/2018	Movimiento de tierra	08:00-12:00	01:00-04:00	7 horas
3	23/1/2018	Movimiento de tierra	08:00-12:00	01:00-05:00	8 horas
4	30/1/2018	Movimiento de tierra	08:00-12:00	01:00-05:00	8 horas
5	31/1/2018	Movimiento de tierra	08:00-12:00	01:00-04:30	7.5 horas

Retropala

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas
1	24/1/2018		08:00-12:00	01:00-05:00	8 horas

Rodillo

No.	Fecha			Hora final	
-----	-------	--	--	------------	--

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

		Actividad realizada	Hora de inicio		Horas trabajadas
1	22/1/2018		08:30-12:00	01:00-04:00	6.5 horas
2	23/1/2018		08:30-12:00	01:00-05:00	7.5 horas
3	24/1/2018		08:30-12:00	01:00-04:30	

Camión S 006974 (6 mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	17/1/2018	Movimiento de tierra	22	132
2	22/1/2018	Movimiento de tierra	37	222
3	23/1/2018	Movimiento de tierra	39	234
4	24/1/2018	Movimiento de tierra	38	228
5	30/1/2018	Movimiento de tierra	38	228
6	31/1/2018	Movimiento de tierra	37	222

Camión S 010680 (3 mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	17/1/2018	Movimiento de tierra	28	84
2	22/1/2018	Movimiento de tierra	42	126
3	23/1/2018	Movimiento de tierra	45	135
4	24/1/2018	Movimiento de tierra	43	129

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

5	30/1/2018	Movimiento de tierra	44	132
6	31/1/2018	Movimiento de tierra	41	123

Camión S 001447 (6 mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	22/1/2018	Movimiento de tierra	35	210
2	23/1/2018	Movimiento de tierra	38	228
3	24/1/2018	Movimiento de tierra	37	222
4	30/1/2018	Movimiento de tierra	36	216
5	31/1/2018	Movimiento de tierra	35	210

- Alquiler Hora Equipo para el Reconstrucción de Caminos Vecinales en las Comunidades Villegas, Rosa, El Zumbón, C.H. Valdesia, Yaguatero, el cual consta de:
 - a. Un tractor D7G o similar.
 - b. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - c. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - d. Un grader 12G Cat o similar.
 - e. Camión Volteo de 12 m3.

Se han trabajado 3 kms de longitud y con un ancho promedio de 7 kms, con grader y rodillo. Se depositaron 690 m3 de caliche en puntos requeridos, los cuales fueron regados y compactados.

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

- Alquiler de equipos pesados para los trabajos de construcción de los caminos vecinales Los Coles, Los Hozaderos y La Colina, Municipio Cambita Garabito, Provincia San Cristóbal, el cual consta de:
 - a. Una retropala 416 Cat o similar.
 - b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - c. Un grader 12G Cat o similar.
 - d. Un tractor D7G Cat o similar.
 - e. Camión Volteo de 12 m3.

Retroexcavadora

No.	Fecha	Actividad realizada	Horas trabajadas	Observación
1	15/12/2017	Movimiento de tierra	2 horas	
2	16/12/2017	Movimiento de tierra	2 horas	
3	18/12/2017	Movimiento de tierra	7 horas	

Tractor

No.	Fecha	Actividad realizada	Horas trabajadas	Observación
1	15/12/2017	Movimiento de tierra	2 horas	
2	16/12/2017	Movimiento de tierra	2 horas	
3	18/12/2017	Movimiento de tierra	3 horas	

- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de movimiento de tierra del mantenimiento de la Comunidad Las Auyamas, Distrito Municipal Nizao, Presa Jigüey, Prov. San Jose de Ocoa, el cual consta de:
 - a. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
 - b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - c. Un greader 12G Cat o similar.
 - d. Camión Volteo de 6 m3.

- Alquiler de equipos pesados para mantenimiento de la Berma Canal Hernán Cortes, limpieza y canalización obra de toma Canal Rio Jura, Comunidad El Barro, CH Los Toros, Prov. Azua, el cual consta de:
 - a. Un tractor D6T Cat o Similar.
 - b. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
 - c. Una retroexcavadora 416 o similar.
 - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - e. Un greader 12G Cat o similar.
 - f. Un camión de agua.
 - g. Camión Volteo de 16 m3.

Se realiza la limpieza del dique de todo el material gravo arenoso que está en el rio.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

- Alquiler de equipos pesados para los trabajos de limpieza de escombros en salida de canal y descarga de las turbinas de la CH Jigüey, el cual consta de:
 - a. Un tractor D8L Cat o Similar.
 - b. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.

Nota: Los contratos de alquiler de equipos estipula que el combustible corre por la compañía contratada.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**28.0 PROYECTO REHABILITACIÓN DE 23 CASSETAS DE COMUNICACIÓN EN
DIFERENTES CENTRALES DE EGEHID.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista continua los trabajos de impermeabilización y pintura de las casetas.



29.0 PROYECTO SERVICIO DE REMOZAMIENTO OFICINA ENCARGADO DEL TALLER, ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE, COMEDOR Y COCINA, LICKERS, BAÑOS DE MECANICOS Y ALMACEN DE PIEZAS PEQUEÑAS EN LA OFICINA DE QUITA SUEÑO.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista realizó el vaciado de hormigón en el área del taller mecánico.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."







Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**30.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN MEZZANINE EN EL ALMACÉN QUITA
SUEÑO, SAN CRISTÓBAL, R.D.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no ha iniciado los trabajos debido a que se encuentra en la espera de que arribe el furgón rentado donde se colocará todos los suministros que se encuentran en el área donde se construirá el mezzanine.



31.0 PROYECTO REMODELACIÓN PARROQUIA SANTA CRUZ, YAGUATE, SAN CRISTÓBAL, R.D.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

La contratista se encuentra trabajando en la desmantelación de pisos, colocación de impermeabilizante, construcción de muro de bloques y colocación ventanas en el Área del Santísimo.



32.0 PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN LA C. H. SABANA YEGUA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista instaló los tubos de PVC de 18" en la tubería de drenaje del parqueo, continuó con la construcción del muro de gaviones y su respectivo relleno compactado.











32.0 INFORME DE VIAJE REALIZADO A PALOMINO, PARA EVALUAR LA EXTRACCION DE UN MATERIAL SOLICITADO A EGEHID, POR LA UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE PROYECTOS DE DESARROLLO AGROFORESTAL DE LA PRESIDENCIA.

LA VISITA AL SITIO DE ACOPIO DE MATERIAL.

Los técnicos de EGEHID, en compañía del encargado de la Central de Palomino, ingeniero Luis Lugo, se trasladaron hasta el área de acopio, donde se observó que se había efectuado una extracción de material de forma inadecuada, para realizar el mantenimiento de las carreteras y caminos de acceso a los diferentes municipios y parajes del área de Bohechio, como son:

- 1.- Relleno carretera Bohechio - Guanito.
- 2.- Relleno carretera Arroyo Cano-Los fríos.
- 3.- Relleno carretera de acceso a Los Severinos.
- 4.- Relleno Carretera de Acceso a la Presa Palomino.

El proceso de extracción de estos materiales se realizó de una manera no adecuada ni planificada, dejando el área con taludes inestables y poco drenante, lo que puede implicar un riesgo sacar material de esa zona, porque podría poner en peligro vidas, propiedades y el acceso a la Puerta del túnel (ventana 2).





MATERIAL ALTERNATIVO:

Una salida alternativa a la solicitud planteada, es un acopio del Ministerio de Obras Publicas ubicado a 6 km del municipio de Bohechio, camino a Padres Las Casas. Este acopio está al borde de la carretera y tiene las mismas condiciones del material solicitado a EGEHID.



AREA DE ACOPIO CAMINO A BOHECHIO DESDE PADRE LAS CASAS.



AREA DE ACOPIO DEL MOPC.

MEDICIONES DEL ÁREA DE PARQUEO PARA EL CENTRO REGIONAL DE CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL DE PALOMINO.

Las mediciones realizadas por los técnicos de EGEHID, arrojan un total de 2,325 metros cuadrados.

Asumiendo un espesor medio de 0.15 metros, tenemos un volumen de 348 metros cúbicos.

RECOMENDACIONES:

- 1.- Evitar que equipos pesados se acerquen a esta área de acopio por las condiciones de inestabilidad de la carretera, inestabilidad de los taludes y las condiciones poco drenante de esa zona.
- 2.- De extraer material de esa zona de acopio, debe realizarse un plan de explotación que garantice que no se ponga en peligro la carretera de acceso a Ventana 2.
- 3.- Existe un acopio de material granular a 6 km desde Bohechio a Padre Las Casas que se puede conseguir con el MOPC.

33.0 REMISION DE PRESUPUESTOS.

Fueron remitidas las solicitudes de servicios para diversos tipos de servicios y centrales hidroeléctricas:

1. Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de movimiento de tierra del mantenimiento de la Comunidad Las Auyamas, Distrito Municipal Nizao, Presa Jigüey, Prov. San Jose de Ocoa, el cual consta de:
 - a. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
 - b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - c. Un greader 12G Cat o similar.
 - d. Camión Volteo de 6 m3.
2. Alquiler de equipos pesados para mantenimiento de la Berma Canal Hernán Cortes, limpieza y canalización obra de toma Canal Rio Jura, Comunidad El Barro, CH Los Toros, Prov. Azua, el cual consta de:
 - a. Un tractor D6T Cat o Similar.
 - b. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
 - c. Una retroexcavadora 416 o similar.
 - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - e. Un greader 12G Cat o similar.
 - f. Un camión de agua.
 - g. Camión Volteo de 16 m3.
3. Reconstrucción Carretera de la C. H. Baiguaque.
4. Reconstrucción Carretera de la Presa Baiguaque.
5. Alquiler de equipos pesados para los trabajos de limpieza de escombros en salida de canal y descarga de las turbinas de la CH Jigüey, el cual consta de:

- a. Un tractor D8L Cat o Similar.
 - b. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
6. Alquiler de equipos pesados para los trabajos de construcción de los caminos vecinales Los Coles, Los Hozaderos y La Colina, Municipio Cambita Garabito, Provincia San Cristóbal, el cual consta de:
- a. Una retropala 416 Cat o similar.
 - b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - c. Un grader 12G Cat o similar.
 - d. Un tractor D7G Cat o similar.
 - e. Camión Volteo de 12 m3.
7. Lista de materiales de construcción alcantarilla sencilla de 42" en camino La Cueva, CH Valdesia.
8. Lista de cantidades construcción de badenes y encache en talud en camino La Mancha, CH Valdesia.
9. Servicio remozamiento verja perimetral Escuela Primaria Valentín Salinero, Santo Domingo.
10. Servicio de impermeabilización de techos: techo alto Casa de Maquinas, caseta de control de la Sub-Estación, Válvula Mariposa, Captación de Arroyón, Blanco, Sonador Tireíto y Taller Mecánico, CH Pinalito.
11. Servicio de recrecimiento del Canal el Salto de Constanza por rebose, Mini Central Hidroeléctrica El Salto de Constanza.
