



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS**

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
DE OBRAS CIVILES.**

FEBRERO 2018.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**1.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERERA LOS MINEROS A
CENTRAL HIDROELECTRICA JIGUEY, DISTRITO MUNICIPAL LOS CACAOS,
SAN CRISTOBAL, LONG. DE 5.00 KM, ANCHO PROMEDIO 7.00 MT,
SEGUNDA ETAPA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista fue finalizado los trabajos, estamos a la espera de que el contratista firme la cubicación final.





**2.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA
CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 0+000 HASTA EST 2+900, PROV. SAN
CRISTOBAL. PRIMERA ETAPA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.



**3.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA CENTRAL
HIDROELECTRICA DE PINALITO HASTA LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO,
PROV. MONSEÑOR NOUEL (SEGUNDA ETAPA) TRAMO DE LA FALLA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado.



**4.0 PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO PARA
LA CONSTRUCCION CAMINO VECINAL Y CALLES INTERNAS DE LAS
COMUNIDADES EL CORTE, SEMANA SANTA Y DOÑA ANA-LA MANIGUA-
LA SIERRA, MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado.



5.0 PROYECTO RIEGO DE IMPRIMACION PARA ASFALTADO DE CALLES DEL DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado.



6.0 PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO DE LAS CALLES DEL DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado.



7.0 PROYECTO REPARACION CAUCE RIO, BERMA DEL SOCAZ CH ANGOSTURA, PROV. SANTIAGO, ETAPA II.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se realizó el vaciado con mallas electrosoldadas en el área del parqueo, así como el inicio del taller de recapeo del acceso a la Central Hidroeléctrica.















8.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN EN BAIGUAQUE, CON ALCANTARILLA DE 42", CH BAIGUAQUE, SANTIAGO, SEGUNDA ETAPA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.



9.0 PROYECTO RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERA LOMA DE VIALO- LOS CACAOS, MUNICIPIO LOS CACAOS, R.D.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado.



10.0 PROYECTO ASFALTADO CARRETERA DESDE CENTRAL
HIDROELECTRICA MONCION HASTA LA PRESA DE MONCION, PROVINCIA
SANTIAGO RODRIGUEZ, PRIMERA ETAPA, TRAMO I (DESDE CENTRAL
HIDROELECTRICA MONCION HASTA CRUCE CARRETERA SAN JOSE DE LAS
MATAS (BULLA)) Y TRAMO II (DESDE CENTRAL HIDROELECTRICA
MONCION HASTA EL CONTRAEMBALSE).

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.



**11.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN CAÑADAS
LAS BARIAS, DEL CANAL MARCOS A. CABRAL, BANI, PROVINCIA PERAVIA,
REPUBLICA DOMINICANA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado, el contratista se encuentra a la espera de la realización de la cubicación final.



**12.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA
CRUCE LOS MINEROS, DESDE EST. 2+900 HASTA EST. 5+800, SEGUNDA
ETAPA, LOS CACAOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R. D.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no ha iniciado los trabajos.



13.0 PROYECTO REHABILITACIÓN TRAMOS CARRETEROS CH RINCÓN, PROV. LA VEGA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista realizó algunas reparaciones en la imprimación colocada, para dar inicio a la aplicación de la carpeta de hormigón asfáltico.



14.0 PROYECTO ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE LOS CACAOS A PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL, TERCERA ETAPA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la construcción de sobreanchos, cunetas de hormigón simple y alcantarilla en Est. 7+280.













**15.0 PROYECTO CONSTRUCCION LOSA DE HORMIGON Y RAMPA EN
ENTRADA, MURO CONTENCION M1 EN CANAL, M2, M3, M4, M5 Y M6 EN
VERJA PERIMETRAL, C.H. NIZAO-NAJAYO, PROV. SAN CRISTOBAL.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Se realizó el vaciado de la zapata del muro M4, construcción de badén en la entrada de la Mini Central y preparación de la rampa para vaciado de hormigón.







16.0 PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EST. 14+680,
CONSTRUCCION COLUMNA, VIGA Y LOSA EN EST. 15+400, TRAMO
ACCESO A LA PRESA PALOMINO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

La contratista se encuentra realizando la colocación de relleno detrás de gavión.





17.0 PROYECTO ASFALTADO DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista finalizó los trabajos de asfaltado de calles, estamos a la espera de la firma de la cubicación final.



18.0 PROYECTO ASFALTADO ENTRADA PRINCIPAL C.H. RIO BLANCO, BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista reinició los trabajos de limpieza, así como la recogida de escombros y bote del material en la entrada de la Central.







19.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CH PINALITO HASTA CHIMENEA DE EQUILIBRIO, BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, TRAMO FALTANTE EN HORMIGÓN, SEGUNDA ETAPA

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista se encuentra montando el bachiplan para dar inicio a el vaciado de la capa de rodadura.



20.0 REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS DE LA CARRETERA BOCA DE BLANCO, LA CIÉNEGA Y EL RODEO, C.H. PINALITO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista realiza las actividades de movimiento de tierra para el acceso de los lugares donde se construirán los muros de gaviones, excavación y limpieza de dichas áreas en Est. 7+410.











21.0 CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES Y RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA CAMBITA-PUEBLECITO, CH AGUACATE, SAN CRISTÓBAL, R.D.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no ha iniciado los trabajos.



22.0 CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE ARTE PARA LA CARRETERA PRESA JIGÜEY-PALO DE CAJA-RODADERO, SAN JOSE DE OCOA, (TRAMO DE IMPRIMACIÓN), SEGUNDA ETAPA

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

La brigada topográfica se encuentra realizando el levantamiento del terreno natural, para los fines de control volumétrico y de diseño.



23.0 REHABILITACION DEL CAMINO ADYACENTE A LA PRESA DE JIGUEY DESDE EL POBLADO DE CRUZ DE SANTA ANA HASTA LA COMUNIDAD DE TATON (TRAMO DE HORMIGON)

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

La brigada topográfica se encuentra realizando el levantamiento del terreno natural, para los fines de control volumétrico y de diseño.



**24.0 CONSTRUCCION TRAMO PUENTE CANAL (FLUMEN) ANIANA
VARGAS, CENTRAL HIDROELECTRICA ANIANA VARGAS, PROVINCIA
MONSEÑOR NOUEL, REPUBLICA DOMINICANA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto no ha iniciado.



25.0 CONSTRUCCION MURO DE PROTECCION EN MAMPOSTERIA,
MARGEN IZQUIERDO DEL RIO YUNA, DIQUE PROYECTO AGLIPO EN LA
SECCION DE ARENOSO, PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORIS
(BARRIO LOS ESTUDIANTES DESDE EST. 0+720 HASTA EST. 2+420),
REPUBLICA DOMINICANA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto no ha iniciado.



26.0 RELACION DE COMBUSTIBLE EQUIPOS PESADOS.

Los equipos pesados realizaron trabajos de transporte, nivelación y conformación de material, excavaciones, tiro de material, compactación y carguío de materiales en la Carretera Comunidad Mana, siendo distribuido de la siguiente manera:

Equipos	Ficha	Galones
Camión	3297	166
Retropala	3298	114
Motoniveladora	3295	248
Pala	3288	115
Camion	3430	75
Camioneta	3173	18
Camioneta	3202	15
Camioneta	3193	29
Camión	3637	52
Camioneta	3201	113
Rodillo	3296	45

Para un total de 990.00 galones.

27.0 ALQUILER EQUIPOS PESADOS.

DESCRIPCION

Tenemos los siguientes contratos de alquiler de equipos en vigencia:

El Encargado de la Central Palomino solicitó el mantenimiento del camino de acceso a la Presa debido a que dicho camino ha presentado un acelerado proceso de deterioro por la gran cantidad de derrumbes, lo cuales no permiten el paso.

- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de mantenimiento carretera Presa Palomino, el cual consta de:

- 01 pala 950 Cat o similar.
- 01 grader Cat 12G o similar.
- 01 retroexcavadora Cat 320 o similar.
- 01 rodillo CA 25 Dynapac o similar.
- 01 camión de agua.
- 01 camión volteo 6m3e.

Se ha trabajado una longitud de 15.7 kms con ancho promedio de 6 mts, con el grader y el rodillo.

Rodillo

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	14/02/2018				5.30 horas	

Camion de agua

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	14/02/2018				9 horas	



- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de Limpieza del Embalse de la Presa Aguacate, el cual consta de:
 - 01 tractor Cat D8 o similar.
 - 01 retroexcavadora Cat 320 o similar.
 - 01 pala 950 Cat o similar.
- Suministro y transporte de material base procesado para la Rehabilitación de las Calles de Doña Chucha en Madre Vieja Norte, Cañada Honda, Lavapiés, Calles del Barrio Don Félix, Canastica y en la Carretera Prolongación Salcedo, en El Fondo, CH Valdesia.
 - 8,000.00 M3 material base procesado.
- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en la Rehabilitación del camino vecinal Sección Iguana, Bani, CH Valdesia, el cual consta de:
 - 01 grader Cat 12G o similar.
 - 01 retroexcavadora Cat 320 B o similar.
 - 01 retropala Cat 416 o similar.
 - 01 rodillo CA 25 Dynapac o similar.
 - 01 tractor D7G Cat o similar.
 - 02 camiones volteo 14 m3e.
 - 01 camión de agua.
- Alquiler de equipos pesados para la construcción muro de protección en tierra, margen izquierda del Rio Yuna, Dique Proyecto Aglipo, en la Sección Arenoso, Prov. San Francisco de Macorís (Barrio Los Estudiantes desde Est. 0+000 hasta Est. 0+720), el cual consta de:
 - a. Dos tractores D8K Cat o similar.

- b. Dos retroexcavadoras 320 Cat o similar.
- c. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
- d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
- e. Un grader 12G Cat o similar.
- f. Un camión de agua.

Greader CAT. 12G

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	6/2/2018	Extracción material de derrumbes	4:00-6:00		2 horas	
2	7/2/2018	Conformación de camino	9:00-12:00	4:00-5:00	4 horas	
3	8/2/2018	Conformación de camino			4 horas	
4	9/2/2018	Conformación de camino	1:00-5:00		4 horas	
5	10/2/2018	Conformación de camino	9:00-11:00	1:00-5:00	6 horas	
6	12/2/2018	Conformación de camino	3:00-4:00		1 hora	
7	13/2/2018	Conformación de camino	9:00-12:00	2:00-5:00	6 horas	

Retroexcavadora CAT 320D

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	10/2/2018		11:30-12:00	1:00-2:30	2 horas	

Rodillo

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	6/2/2018	Extracción material de derrumbes	4:00-6:00		2 horas	
2	7/2/2018	Compactación de material	9:00-12:00	1:00-6:00	8 horas	
3	8/2/2018	Compactación de material			8 horas	
4	9/2/2018	Compactación de material	9:00-12:00	1:00-6:00	8 horas	
5	10/2/2018	Compactación de material	9:00-12:00	1:00-6:00	8 horas	
6	13/2/2018	Compactación de material	2:00-3:00	4:00-6:00	3 horas	

Retropala

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	6/2/2018	Extracción material de derrumbes	11:00-12:00	3:00-6:00	4 horas	
2	7/2/2018	Extracción material de derrumbes	8:00-12:00	3:00-6:30	7.5 horas	
3	8/2/2018	Extracción material de derrumbes			9 horas	
4	9/2/2018	Extracción material de derrumbes			9 horas	
5	10/2/2018	Extracción material de derrumbes	10:00-12:00	1:00-5:00	6 horas	

6	12/2/2018	Extracción material de derrumbes	3:00-4:00		1 hora	
7	13/2/2018	Extracción material de derrumbes	9:00-12:00	1:00-5:00	7 horas	

Camion L 311390 (17mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	6/2/2018		7	119
2	2/7/2018	Movimiento de tierra	9	153
3	2/8/2018	ACARREO	8	136
3	9/2/2018		8	136
4	10/2/2018		11	154
5	12/2/2018		10	170
6	13/2/2018		3	51

Camion de S011228 (17 mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	2/7/2018	Movimiento de tierra	10	170
2	2/8/2018	ACARREO	9	153
3	9/2/2018		9	153
4	10/2/2018		12	204
5	12/2/2018		2	34
6	13/2/2018	Bote	5	85

Camión L081908 (17mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	2/7/2018	Movimiento de tierra	8	136

2	2/8/2018	Movimiento de tierra	8	136
3	10/2/2018	Movimiento de tierra	6	102

Camion S 016503 (17mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	6/2/2018	Movimiento de tierra	10	170
2	2/7/2018	Movimiento de tierra	9	153
3	9/2/2018		8	136
4	10/2/2018		8	136
5	13/2/2018		2	34

Camion S 009039 (16mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	10/2/2018		3	48
2	12/2/2018		6	96

Camion L 081908 (17mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	9/2/2018		8	136

Camion S 006634 (17mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	2/8/2018	ACARREO	10	170
2	10/2/2018		11	187

- Alquiler de equipos pesados para la construcción de los caminos vecinales que comunican las comunidades Ermitaño, La Bejuquera, Caminero, Los Ramones, La Lagunita, El Mato y La Peñita, en la Sección Mucha Agua, Cambita, C.H. Aguacate, el cual consta de:
 - a. Un tractor D8 Komatsu o similar.
 - b. Un rodillo.
 - c. Una retroexcavadora 290 con cubo.
 - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - e. Un grader 12G Cat o similar.
 - f. Un camión de agua.
 - g. Un camión volteo.

Tractor

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	2/2/2018	Movimiento de tierra			2 horas	
2	2/7/2018	Movimiento de tierra				

Retroexcavadora

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	2/2/2018	Movimiento de tierra			5 horas	

- Alquiler de equipos pesados para la reparación de camino principal parcelario de productores, Paraje Chiva Prieta, Sección Guayacanal, Municipio Pueblo Viejo, CH Los Toros, el cual consta de:
 - a. Un rodillo vibrador 25 Dynapac o similar.
 - b. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.

- c. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
- d. Un grader 12G Cat o similar.
- e. Un camión volteo.

Grader Cat.
12G

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	1/2/2018	Movimiento de tierra			7 horas	
2	2/2/2018	Movimiento de tierra			2 horas	
3	7/2/2018	Conformación de camino			2 horas	
4	9/2/2018	Conformación de camino			5 horas	
5	13/2/2018	Conformación de camino			7.5 horas	
6	14/2/2018	Conformación de camino			8 horas	
7	15/2/2018	Conformación de camino			8 horas	

Retroexcavadora Samsung

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	5/2/2018	Movimiento de tierra			8 horas	
2	7/2/2018	Movimiento de tierra			4.5 horas	
3	8/2/2018	Movimiento de tierra			6 horas	
4	9/2/2018	Movimiento de tierra			7 horas	
5	13/2/2018	Movimiento de tierra			7 horas	

6	14/2/2018	Movimiento de tierra			6.5 horas	
7	15/2/2018	Movimiento de tierra			6.5 horas	

Pala CAT. 416

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	1/2/2018	Movimiento de tierra			4 horas	
2	2/2/2018	Movimiento de tierra			6 horas	
3	5/2/2018	Movimiento de tierra			8 horas	
4	8/2/2018	Movimiento de tierra			4 horas	
5	10/2/2018	Movimiento de tierra			1 hora	

Rodillo Ingersoll

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	1/2/2018	Movimiento de tierra			5 horas	
2	9/2/2018	Movimiento de tierra			3 horas	
3	10/2/2018	Movimiento de tierra			1 hora	
4	13/2/2018	Movimiento de tierra			6 horas	
5	14/2/2018	Movimiento de tierra			8 horas	
6	15/2/2018	Movimiento de tierra			8 horas	

Camion de agua

No.	Fecha	Actividad realizada	Horas trabajadas	M3E
1	10/2/2018		3 horas	

Camion S009408

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	9/2/2018		7	
2	13/2/2018		6	
3	14/2/2018		8	
4	15/2/2018		8	

Camion S005847

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	14/2/2018		3	
2	15/2/2018		3	

Camion I352938 (18mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	5/2/2018		4	72
2	7/2/2018	BOTE DE MATERIAL	3	39
3	8/2/2018		2	36
4	9/2/2018		5	90
5	13/2/2018		6	108
6	14/2/2018		4	72
7	15/2/2018		4	72

Camión I228594 (13mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	5/2/2018		6	78
2	7/2/2018	BOTE DE MATERIAL	7	116.9
3	9/2/2018		5	65
4	8/2/2018		3	45
5	13/2/2018		6	78
6	14/2/2018		5	65
7	15/2/2018		5	65

Camión I113679 (15mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	8/2/2018		5	75
2	9/2/2018		1	15
3	13/2/2018		5	75





- Alquiler Hora Equipo para el Mantenimiento del Tramo Camino La Cueva de la Mancha de Mana, C.H. Valdesia, Yaguatero, el cual consta de:
 - a. Un tractor D8K Cat o similar.
 - b. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
 - c. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - e. Un grader 12G Cat o similar.
 - f. Camión Volteo de 3 m o 6 m³.

Retroexcavadora Samsung 280

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	14/2/2018		8:00-12:00	1:00-4:00	7 horas	

Tractor Komatsu D6IE

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	14/2/2018		8:00-12:00	1:00-2:00	5 horas	

- Alquiler Hora Equipo para el Limpieza de Cunetas y Acondicionamiento de las Vías de Acceso a la Válvula Mariposa y Terminación de trabajos de las demás captaciones, C.H. Pinalito, el cual consta de:
 - a. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - c. Un grader 12G Cat o similar.
 - d. Tres Camiones Volteo de 6 m³, 12 m³ y 16 m³.

Greader

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	8/2/2018	Conformación de camino	09:00-12:00	01:00-04:30	6.5 horas	

Retroexcavadora Samsung

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	8/2/2018	Movimiento de tierra	08:00-12:00	01:00-04:00	8 horas	

Retropala

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	6/2/2018	Movimiento de tierra	8:00-12:00	1:00-4:00	7 horas	
2	9/2/2018	Movimiento de tierra			8 horas	
3	10/2/2018	Movimiento de tierra	8:00-12:00	1:00-4:30	7.5 horas	
4	12/2/2018	Movimiento de tierra	8:00-12:00	1:00-4:00	7 horas	

Pala

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	3/2/2018	Movimiento de tierra	8:00-12:00	1:00-4:00	7 horas	
2	6/2/2018	Movimiento de tierra	8:00-1:00	1:00-4:30	8.5 horas	
3	9/2/2018	Movimiento de tierra			5 horas	

Camión S015600 (15m3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	3/2/2018	Movimiento de tierra	23	345
2	6/2/2018	Movimiento de tierra	22	330

Camión S 006974 (6 mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	3/2/2018	Movimiento de tierra	22	132
2	6/2/2018	Movimiento de tierra	37	222
3	8/2/2018	Movimiento de tierra	41	246
4	10/2/2018	Movimiento de tierra	37	222
5	12/2/2018	Movimiento de tierra	33	198

Camión S 010680 (3 mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	3/2/2018	Movimiento de tierra	41	123
2	6/2/2018	Movimiento de tierra	40	120
3	8/2/2018	Movimiento de tierra	28	84
4	9/2/2018	Movimiento de tierra	38	114
5	10/2/2018	Movimiento de tierra	45	135

6	12/2/2018	Movimiento de tierra	41	123
---	-----------	----------------------	----	-----

Camión S 001447 (6 mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	3/2/2018	Movimiento de tierra	35	210
2	6/2/2018	Movimiento de tierra	35	210
3	9/2/2018	Movimiento de tierra	35	210
4	10/2/2018	Movimiento de tierra	42	252
5	12/2/2018	Movimiento de tierra	39	234

Camión I211215 (15 mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	3/2/2018	Movimiento de tierra	15	225
2	9/2/2018	Movimiento de tierra	15	225

Camión I296466 (15 mt3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	3/2/2018	Movimiento de tierra	25	375
2	6/2/2018	Movimiento de tierra	24	600
3	9/2/2018	Movimiento de tierra	12	180

AR 807 (15 m3)

No.	Fecha	Actividad realizada	Viajes	M3E
1	3/2/2018	Movimiento de tierra	24	360
2	9/2/2018	Movimiento de tierra	12	180









- Alquiler Hora Equipo para el Reconstrucción de Caminos Vecinales en las Comunidades Villegas, Rosa, El Zumbón, C.H. Valdesia, Yaguate, el cual consta de:
 - a. Un tractor D7G o similar.
 - b. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - c. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - d. Un greader 12G Cat o similar.
 - e. Camión Volteo de 12 m3.

- Alquiler de equipos pesados para los trabajos de construcción de los caminos vecinales Los Coles, Los Hozaderos y La Colina, Municipio Cambita Garabito, Provincia San Cristóbal, el cual consta de:
 - a. Una retropala 416 Cat o similar.
 - b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - c. Un greader 12G Cat o similar.
 - d. Un tractor D7G Cat o similar.
 - e. Camión Volteo de 12 m3.

Retropala

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	1/2/2018	Movimiento de tierra			6 horas	La Colonia
2	2/2/2018	Movimiento de tierra			4 horas	La Colonia
3	7/2/2018	Movimiento de tierra			3 horas	La Colonia

Tractor

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	1/2/2018	Movimiento de tierra			6 horas	La Colonia
2	6/2/2018	Movimiento de tierra			8 horas	La Colonia
3	7/2/2018	Movimiento de tierra			2 horas	La Colonia
4	8/2/2018	Movimiento de tierra			3 horas	La Colonia
5	12/2/2018	Movimiento de tierra			3 horas	La Colonia

Retroexcavadora

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	12/2/2018	Movimiento de tierra			7 horas	La Colonia
2	13/2/2018	Movimiento de tierra			4 horas	La Colonia

Retroexcavadora

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	12/2/2018	Movimiento de tierra			6 horas	La Loma Caminero
2	13/2/2018	Movimiento de tierra			4 horas	La Loma Caminero

Tractor

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	12/2/2018	Movimiento de tierra			7 horas	La Loma Caminero



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.

"Año del Fomento a las Exportaciones."

- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de movimiento de tierra del mantenimiento de la Comunidad Las Auyamas, Distrito Municipal Nizao, Presa Jigüey, Prov. San Jose de Ocoa, el cual consta de:
 - a. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
 - b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - c. Un greader 12G Cat o similar.
 - d. Camión Volteo de 6 m3.







- Alquiler de equipos pesados para mantenimiento de la Berma Canal Hernán Cortes, limpieza y canalización obra de toma Canal Rio Jura, Comunidad El Barro, CH Los Toros, Prov. Azua, el cual consta de:
 - a. Un tractor D6T Cat o Similar.
 - b. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
 - c. Una retroexcavadora 416 o similar.
 - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - e. Un grader 12G Cat o similar.
 - f. Un camión de agua.
 - g. Camión Volteo de 16 m3.

Retro Volvo

1/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
2/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
3/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	03:00pm	6
5/2/2018	Movimiento de Tierra	09:30am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	6.5
6/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
7/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
8/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
9/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
10/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm			4
12/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
13/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
14/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
15/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
16/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
17/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm			4
19/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
20/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
21/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
22/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
23/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
24/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	04:00pm	7

Greader

1/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	03:00pm	6.0
2/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	02:00pm	5.0
3/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	03:00pm	6
5/2/2018	Movimiento de Tierra			01:00pm	05:00pm	4
6/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	03:00pm	05:00pm	6
7/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
8/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
9/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	04:00pm	7
10/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm			4
12/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
13/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
14/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
15/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	11:00pm	01:00pm	05:00pm	7
16/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	11:00pm	01:00pm	05:00pm	7
17/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm			4
19/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
20/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
21/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
23/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
24/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	02:00pm	5

Retropala

1/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
2/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	04:00pm	7
3/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	03:00pm	6.0
5/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
6/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
7/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
8/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
9/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
10/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	12:00pm			4
12/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
13/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
14/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
15/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	11:00pm	01:00pm	05:00pm	7
16/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
17/2/2018	Movimiento de Tierra	09:00am	12:00pm			3
19/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
20/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
21/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
22/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
23/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
24/2/2018	Movimiento de Tierra	08.00am	12:00pm	01:00pm	03:00pm	6



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
"Año del Fomento a las Exportaciones."

Rodillo

1/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
2/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	04:00pm	7
3/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	03:00pm	6
5/2/2018	Movimiento de Tierra	09:30am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	6.5
6/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
7/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
8/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	04:00pm	7
9/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	04:00pm	7
10/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm			4
12/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
13/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	04:00pm	7
14/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
15/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	11:00pm	01:00pm	05:00pm	7
16/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	11:00pm	01:00pm	05:00pm	7
17/2/2018	Movimiento de Tierra	09:30am	12:00pm			2.5
19/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
20/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
21/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
23/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
24/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	02:00pm	5

Camiones

Camión Alquilado Placa No.	Fecha	Capacidad del Camión (M ³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado (M ³)	Actividad Realizada
L308418	1/2/2018	17	16	272	RELLENO
L308418	2/2/2018	17	7	119	RELLENO
L308418	3/2/2018	17	12	204	RELLENO
L308418	6/2/2018	17	4	68	RELLENO
L308418	7/2/2018	17	11	187	RELLENO
L308418	8/2/2018	17	13	221	RELLENO
L308418	9/2/2018	17	10	170	RELLENO
L308418	10/2/2018	17	1	17	RELLENO
L308418	12/2/2018	17	4	68	RELLENO
L308418	13/2/2018	17	12	204	RELLENO
L308418	14/2/2018	17	12	204	RELLENO
L308418	15/2/2018	17	4	68	RELLENO
L308418	17/2/2018	17	5	85	RELLENO
L308418	19/2/2018	17	6	102	RELLENO
L308418	23/2/2018	17	6	102	RELLENO

Camión Alquilado Placa No.	Fecha	Capacidad del Camión (M ³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado (M ³)	Actividad Realizada
L308418	2/2/2018	17	5	85	BOTE
L308418	3/2/2018	17	6	102	BOTE
L308418	5/2/2018	17	20	340	BOTE
L308418	6/2/2018	17	10	170	BOTE
L308418	7/2/2018	17	1	17	BOTE
L308418	8/2/2018	17	2	34	BOTE
L308418	9/2/2018	17	8	136	BOTE
L308418	10/2/2018	17	5	85	BOTE
L308418	12/2/2018	17	7	119	BOTE
L308418	15/2/2018	17	25	425	BOTE
L308418	16/2/2018	17	20	340	BOTE
L308418	17/2/2018	17	3	51	BOTE
L308418	19/2/2018	17	16	272	BOTE
L308418	20/2/2018	17	10	170	BOTE
L308418	21/2/2018	17	20	340	BOTE
L308418	22/2/2018	17	13	221	BOTE
L308418	23/2/2018	17	5	85	BOTE
L308418	24/2/2018	17	16	272	BOTE



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
"Año del Fomento a las Exportaciones."

Camión Alquilado	Placa No.	Fecha	Capacidad del Camión (M³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado (M³)	Actividad Realizada
S016527		2/2/2018	17	8	136	RELLENO
S016527		3/2/2018	17	7	119	RELLENO
S016527		6/2/2018	17	4	68	RELLENO
S016527		7/2/2018	17	12	204	RELLENO
S016527		8/2/2018	17	14	238	RELLENO
S016527		9/2/2018	17	10	170	RELLENO
S016527		10/2/2018	17	3	51	RELLENO
S016527		12/2/2018	17	5	85	RELLENO
S016527		13/2/2018	17	13	221	RELLENO
S016527		14/2/2018	17	11	187	RELLENO
S016527		15/2/2018	17	4	68	RELLENO
S016527		17/2/2018	17	6	102	RELLENO
S016527		19/2/2018	17	5	85	RELLENO
S016527		20/2/2018	17	2	34	RELLENO
S016527		23/2/2018	17	5	85	RELLENO

Camión Alquilado Placa No.	Fecha	Capacidad del Camión (M³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado (M³)	Actividad Realizada
S015616	12/2/2018	17	2	34	RELLENO
S015616	13/2/2018	17	3	51	RELLENO
S015616	14/2/2018	17	6	102	RELLENO
S015616	15/2/2018	17	1	17	RELLENO
S015616	19/2/2018	17	2	34	RELLENO
S015616	23/2/2018	17	5	85	RELLENO



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

Camión Alquilado Placa No.	Fecha	Capacidad del Camión (M ³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado (M ³)	Actividad Realizada
S015616	12/2/2018	17	16	272	BOTE
S015616	13/2/2018	17	16	272	BOTE
S015616	15/2/2018	17	11	187	BOTE
S015616	17/2/2018	17	3	51	BOTE
S015616	20/2/2018	17	11	187	BOTE
S015616	22/2/2018	17	8	136	BOTE
S015616	23/2/2018	17	5	85	BOTE
S015616	24/2/2018	17	16	272	BOTE

Camión Alquilado Placa No.	Fecha	Capacidad del Camión (M ³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado (M ³)	Actividad Realizada
DXH2339	16/2/2018	17	19	323	BOTE
DXH2339	17/2/2018	17	3	51	BOTE
DXH2339	19/2/2018	17	17	289	BOTE
DXH2339	20/2/2018	17	13	221	BOTE
DXH2339	21/2/2018	17	20	340	BOTE
DXH2339	22/2/2018	17	14	238	BOTE
DXH2339	23/2/2018	17	3	51	BOTE
DXH2339	24/2/2018	17	16	272	BOTE

Camión Alquilado Placa No.	Fecha	Capacidad del Camión (M ³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportad o (M ³)	Actividad Realizada
DXH2339	17/2/2018	17	5	85	RELLENO
DXH2339	19/2/2018	17	5	85	RELLENO
DXH2339	23/2/2018	17	3	51	RELLENO

Camión Alquilado No.	Placa	Fecha	Capacidad del Camión (M ³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado (M ³)	Actividad Realizada
L320596		17/2/2018	15	4	60	RELLENO
L320596		19/2/2018	15	6	90	RELLENO
L320596		23/2/2018	15	2	30	RELLENO

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

Camión Alquilado Placa No.	Fecha	Capacida d del Camión (M³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transpor tado (M³)	Actividad Realizada
L320596	16/2/2018	15	12	180	BOTE
L320596	17/2/2018	15	4	60	BOTE
L320596	19/2/2018	15	15	225	BOTE
L320596	20/2/2018	15	12	180	BOTE
L320596	21/2/2018	15	15	225	BOTE
L320596	22/2/2018	15	14	210	BOTE
L320596	23/2/2018	15	6	90	BOTE

Tractor

Fecha	Actividad Realizada	Hora de inicio	Hora Final	Hora de inicio	Hora Final	Total de Horas Trabajadas
12/2/2018	Movimiento de Tierra	09:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	7
13/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
14/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
15/2/2018	Movimiento de Tierra	09:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	7
16/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
19/2/2018	Movimiento de Tierra	11:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	5
20/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
21/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
22/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8
23/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	05:00pm	8.0
24/2/2018	Movimiento de Tierra	08:00am	12:00pm	01:00pm	02:00pm	5

- Alquiler de equipos pesados para los trabajos de limpieza de escombros en salida de canal y descarga de las turbinas de la CH Jigüey, el cual consta de:
 - a. Un tractor D8L Cat o Similar.
 - b. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.

Retroexcavadora

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	12/2/2018		8:00-12:00	1:00-5:00	8 horas	
2	13/2/2018		8:00-12:00	1:00-5:00	8 horas	

Tractor

No.	Fecha	Actividad realizada	Hora de inicio	Hora final	Horas trabajadas	Observación
1	14/02/2018		8:00-12:00	1:00-5:00	8 horas	
2	13/2/2018		8:00-12:00	1:00-5:00	8 horas	




Nota: Los contratos de alquiler de equipos estipula que el combustible corre por la compañía contratada.

28.0 PROYECTO REHABILITACIÓN DE 23 CASSETAS DE COMUNICACIÓN EN DIFERENTES CENTRALES DE EGEHID.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista continúa los trabajos de impermeabilización y pintura de las casetas.

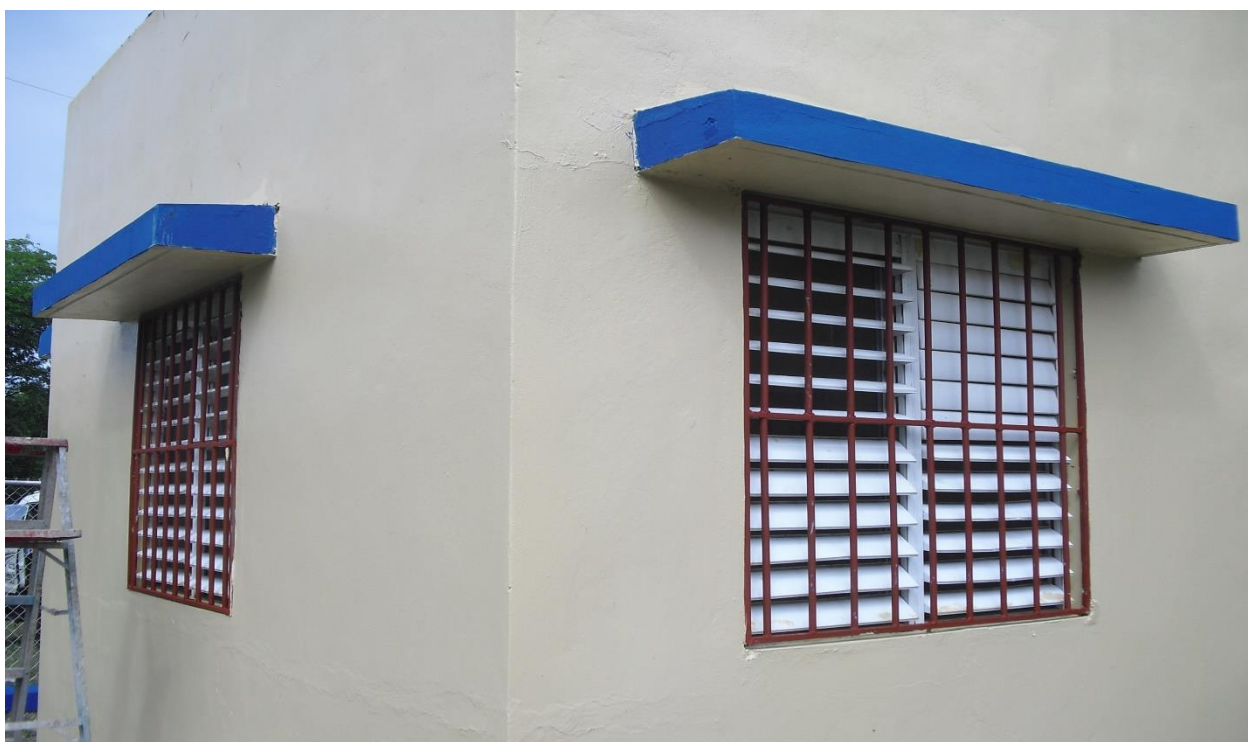





29.0 PROYECTO SERVICIO DE REMOZAMIENTO OFICINA ENCARGADO DEL TALLER, ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE, COMEDOR Y COCINA, LICKERS, BAÑOS DE MECANICOS Y ALMACEN DE PIEZAS PEQUEÑAS EN LA OFICINA DE QUITA SUEÑO.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.



30.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN MEZZANINE EN EL ALMACÉN QUITA SUEÑO, SAN CRISTÓBAL, R.D.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no ha iniciado los trabajos debido a que se encuentra en la espera de que arribe el furgón rentado donde se colocará todos los suministros que se encuentran en el área donde se construirá el mezzanine.



31.0 PROYECTO REMODELACIÓN PARROQUIA SANTA CRUZ, YAGUATE, SAN CRISTÓBAL, R.D.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

La contratista se encuentra trabajando en la desmantelación de pisos, colocación de impermeabilizante, construcción de muro de bloques y colocación ventanas en el Área del Santísimo.



32.0 PROYECTO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO AREA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION, 3ER NIVEL Y REMODELACION AREA DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE OBRAS CIVILES, 2DO NIVEL, EDIFICIO PRINCIPAL, EGEHID.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

A través de la Dirección Administrativa se contrató una empresa para trabajos complementarios del servicio área de la Dirección de Comercialización, 3er nivel y remodelación área de la Dirección de Proyectos de Obras Civiles, 2do nivel, edificio principal, EGEHID.

Los ingenieros supervisores de esta gerencia procedieron a la supervisión de dicho proyecto, el cual culminó de manera exitosa.

A continuación, enumeramos algunas partidas comprendidas en este remozamiento:

- Suministro e instalación de muros sheet rock, incluye estructura y masilla.
- Suministro y colocación de puerta de plywood de roble, incluye marcos y jamba.
- Reparación y cambio de plafond.
- Suministro y colocación de vinyl color roble en pared.
- Laminado de piso.
- Tramería en área de archivo.

33.0 PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN LA C. H. SABANA YEGUA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista finalizó la construcción de muros de gaviones, así como la construcción de encache en talud, la colocación de grama y malla ciclónica en verja.











**34.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO COMBINADO DE GAVIONES Y
HORMIGÓN CICLÓPEO EN CANAL BOCA, CH ROSA JULIA DE LA CRUZ,
NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, R.D.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto no ha iniciado.

