



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS**

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
DE OBRAS CIVILES.**

MAYO 2018.

**1.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA
CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 0+000 HASTA EST 2+900, PROV. SAN
CRISTOBAL. PRIMERA ETAPA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Fueron reiniciados los trabajos de limpieza de superficie con grader, limpieza de derrumbes con grader y compactación de superficie.



2.0 PROYECTO REPARACION CAUCE RIO, BERMA DEL SOCAZ CH ANGOSTURA, PROV. SANTIAGO, ETAPA II.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado, debido a que quedó volumen disponible, se solicitó el suministro y colocación de una compuerta flat gate en la salida de una de las alcantarillas.



3.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN EN BAIGUAQUE, CON ALCANTARILLA DE 42", CH BAIGUAQUE, SANTIAGO, SEGUNDA ETAPA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO


El proyecto fue finalizado, estamos a la espera de que el contratista firme la cubicación final.



**4.0 PROYECTO ASFALTADO CARRETERA DESDE CENTRAL
HIDROELECTRICA MONCION HASTA LA PRESA DE MONCION, PROVINCIA
SANTIAGO RODRIGUEZ, PRIMERA ETAPA, TRAMO I (DESDE CENTRAL
HIDROELECTRICA MONCION HASTA CRUCE CARRETERA SAN JOSE DE LAS
MATAS (BULLA)) Y TRAMO II (DESDE CENTRAL HIDROELECTRICA
MONCION HASTA EL CONTRAEMBALSE).**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista se encuentra a la espera del levantamiento topográfico a ser realizado por nuestra brigada debido a que existen incongruencias entre los volúmenes presentados y los nuestros del asfalto colocado en el tramo camino al Contraembalse.

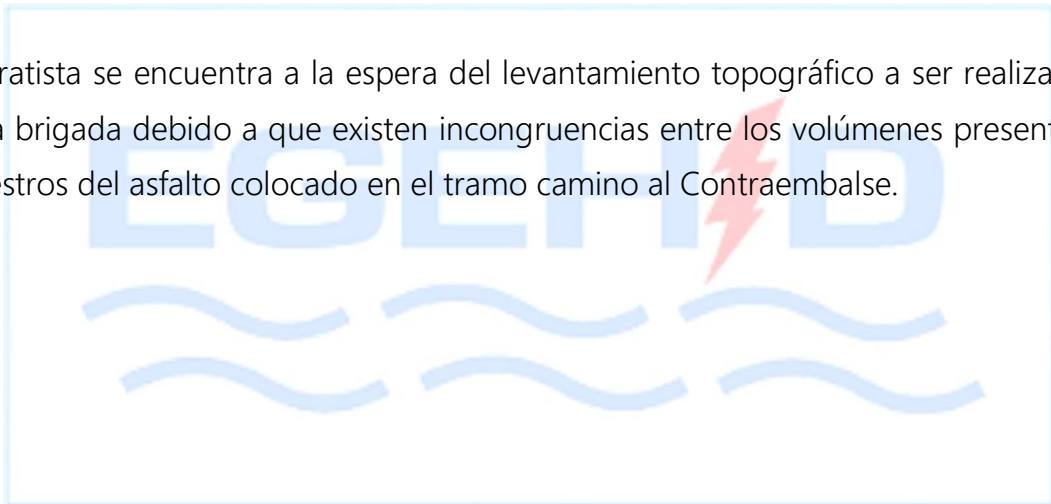

**5.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA
CRUCE LOS MINEROS, DESDE EST. 2+900 HASTA EST. 5+800, SEGUNDA
ETAPA, LOS CACAOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R. D.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

Fueron inició los trabajos de limpieza de superficie con grader, limpieza de derrumbes con grader y compactación de superficie. Asimismo, la colocación de riego de imprimación y asfaltado en la Comunidad Los Mateo.









6.0 PROYECTO ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE LOS CACAOS A PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL, TERCERA ETAPA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado, el contratista se encuentra en espera de la realización de la cubicación final.



**7.0 PROYECTO CONSTRUCCION LOSA DE HORMIGON Y RAMPA EN
ENTRADA, MURO CONTENCION M1 EN CANAL, M2, M3, M4, M5 Y M6 EN
VERJA PERIMETRAL, C.H. NIZAO-NAJAYO, PROV. SAN CRISTOBAL.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista se encuentra realizando los trabajos de construcción de cunetas de blocks y la extensión de zapata de muro M4.









**8.0 PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EST. 14+680,
CONSTRUCCION COLUMNA, VIGA Y LOSA EN EST. 15+400, TRAMO
ACCESO A LA PRESA PALOMINO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

La contratista se encuentra trabajando en la construcción de muro de gaviones y realizó el vaciado de la losa de nivelación.





9.0 PROYECTO ASFALTADO DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista se encuentra realizando los trabajos de construcción de contenes y alcantarilla cajón, así como la colocación de material de base en calles de la Comunidad Los Bancos.









10.0 PROYECTO ASFALTADO ENTRADA PRINCIPAL C.H. RIO BLANCO, BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista realizó las tareas de colocación de tubos de alcantarilla en la carretera principal, bacheo en las áreas de la carretera donde era necesario, además de iniciar los trabajos de colocación de carpeta de hormigón asfáltico.













11.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CH PINALITO HASTA CHIMENEA DE EQUILIBRIO, BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, TRAMO FALTANTE EN HORMIGÓN, SEGUNDA ETAPA

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista se encuentra realizando los trabajos de limpieza de cunetas y vaciado de la carpeta de hormigón.











**12.0 REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS DE LA CARRETERA BOCA DE
BLANCO, LA CIÉNEGA Y EL RODEO, C.H. PINALITO, PROVINCIA
MONSEÑOR NOUEL**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista se encuentra realizando la construcción de muro de gaviones en Arroyón.











13.0 CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES Y RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA CAMBITA-PUEBLECITO, CH AGUACATE, SAN CRISTÓBAL, R.D.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la construcción de muro de gaviones, asimismo debido a las precipitaciones ocurridas durante este mes, uno de los puentes de la comunidad sufrió daños en los aproches, los cuales fueron reparados con muro de gaviones.
















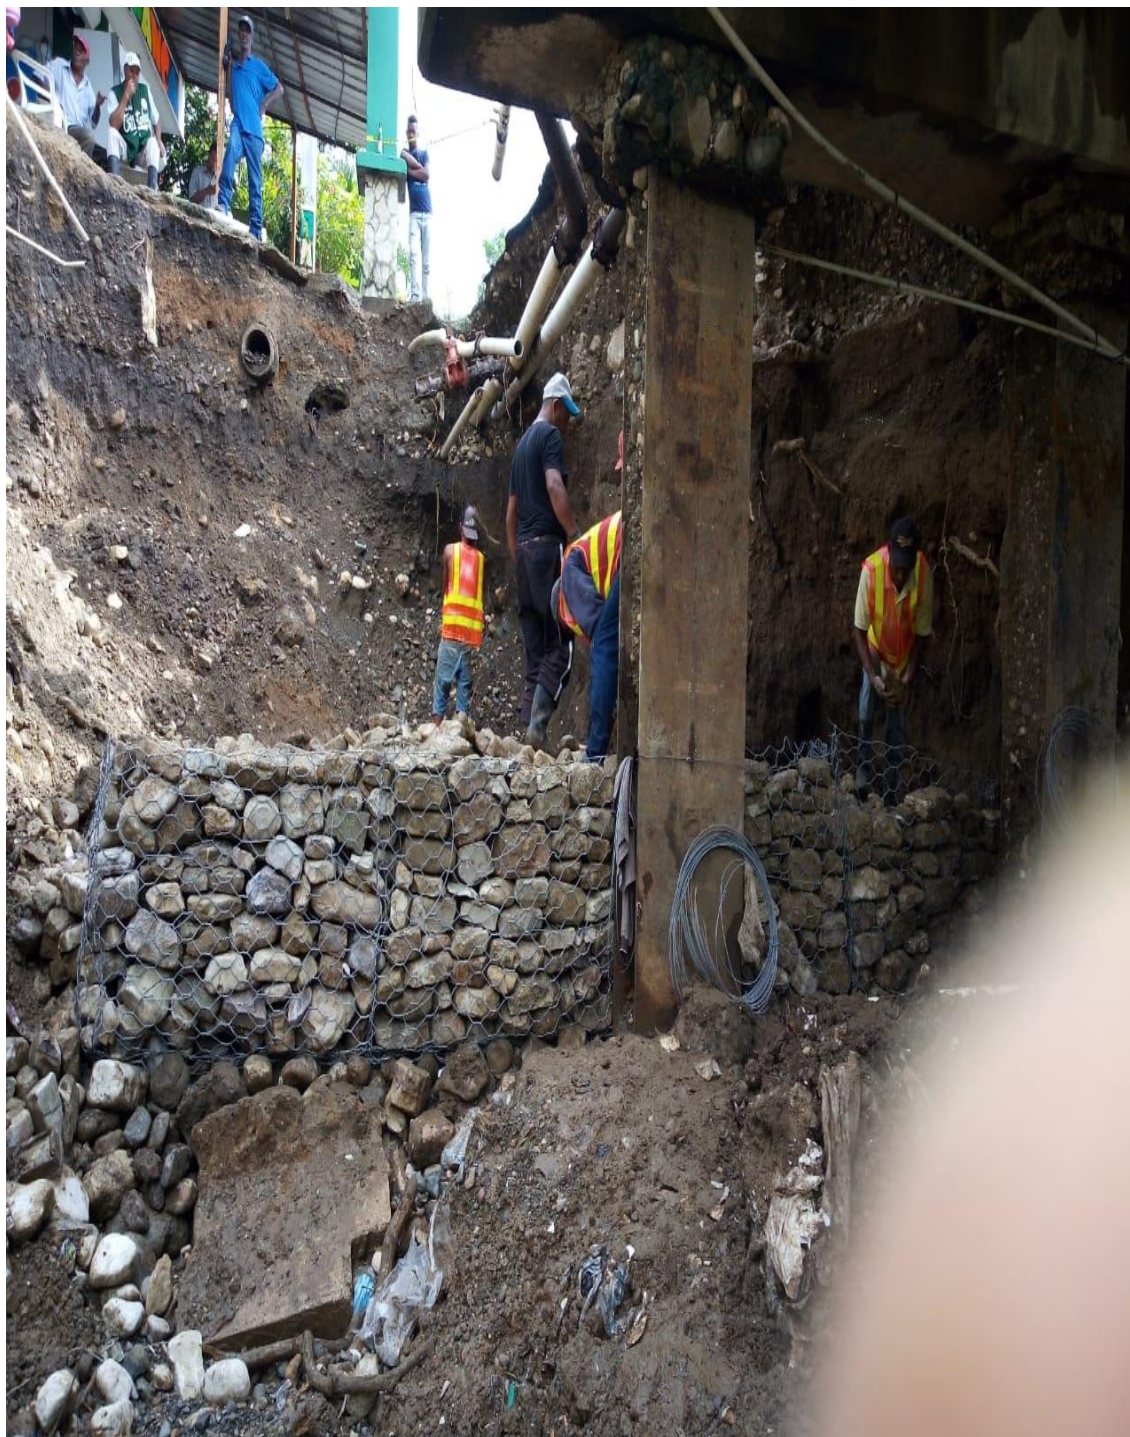









14.0 CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE ARTE PARA LA CARRETERA PRESA JIGÜEY-PALO DE CAJA-RODADERO, SAN JOSE DE OCOA, (TRAMO DE IMPRIMACIÓN), SEGUNDA ETAPA

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no ha iniciado los trabajos.



15.0 REHABILITACION DEL CAMINO ADYACENTE A LA PRESA DE JIGUEY DESDE EL POBLADO DE CRUZ DE SANTA ANA HASTA LA COMUNIDAD DE TATON (TRAMO DE HORMIGON)

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la limpieza de la superficie, ampliación del ancho del camino, construcción de muro de gaviones, y vaciado de la carpeta de hormigón.











**16.0 CONSTRUCCION TRAMO PUENTE CANAL (FLUMEN) ANIANA VARGAS,
CENTRAL HIDROELECTRICA ANIANA VARGAS, PROVINCIA MONSEÑOR
NOUEL, REPUBLICA DOMINICANA.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

La contratista continua con los trabajos de excavación para muro de gaviones en lado izquierdo de la Berma del canal según diseño. Se está colocando un empedrado en la base de lo que sería el muro de gaviones. Se procedió a descubrir y limpiar las cabezas de los pilotes para permitir la realización de la prueba de integridad a la que deberán ser sometidos.

















**17.0 CONSTRUCCION MURO DE PROTECCION EN MAMPOSTERIA,
MARGEN IZQUIERDO DEL RIO YUNA, DIQUE PROYECTO AGLIPO EN LA
SECCION DE ARENOSO, PROVINCIA SAN FRANCISCO DE MACORIS
(BARRIO LOS ESTUDIANTES DESDE EST. 0+720 HASTA EST. 2+420),
REPUBLICA DOMINICANA.**


CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista continua con el vaciado en tres bloques de altura del muro de mampostería, utilizando juntas wáter stop.







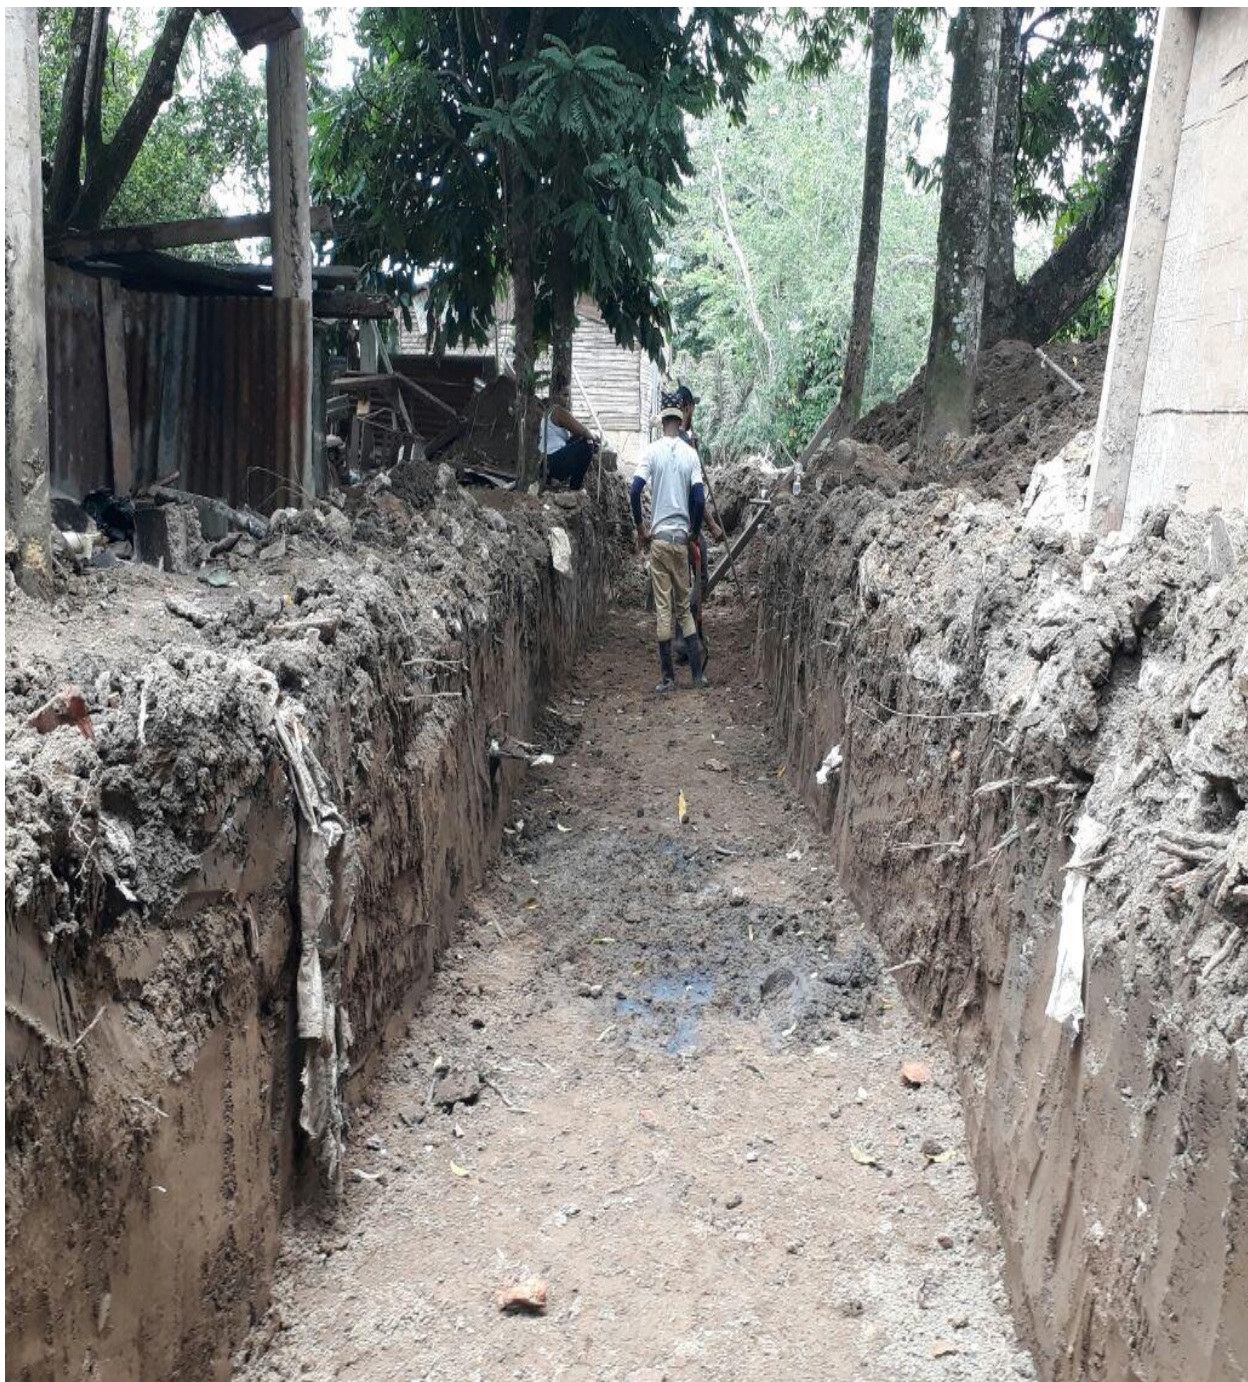







**18.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE LA PRESA DE BAIGUAQUE,
PROVINCIA SANTIAGO, R.D.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no ha iniciado los trabajos.





19.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE BAIGUAQUE, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista inició los trabajos de limpieza de la vía.







20.0 PROYECTO REHABILITACIÓN DE 23 CASETAS DE COMUNICACIÓN EN DIFERENTES CENTRALES DE EGEHID.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado, el contratista se encuentra a la espera de la realización de la cubicación final.



21.0 PROYECTO SERVICIO DE REMOZAMIENTO OFICINA ENCARGADO DEL TALLER, ENCARGADO DEL COMBUSTIBLE, COMEDOR Y COCINA, LICKERS, BAÑOS DE MECANICOS Y ALMACEN DE PIEZAS PEQUEÑAS EN LA OFICINA DE QUITA SUEÑO.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado.





22.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN MEZZANINE EN EL ALMACÉN QUITA SUEÑO, SAN CRISTÓBAL, R.D.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

La contratista se encuentra realizando los trabajos de pintura del piso del almacén.



23.0 PROYECTO REMODELACIÓN PARROQUIA SANTA CRUZ, YAGUATE, SAN CRISTÓBAL, R.D.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

La contratista se encuentra trabajando en la colocación y pulido de pisos, aplicación de pintura, trabajos eléctricos y colocación de impermeabilizante asfáltico.



24.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN TECHO EN ÁREA DE ENFRIADOR AUXILIAR EN LA CASA DE MAQUINA, C.H. PINALITO, R.D.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

La contratista no ha iniciado los trabajos.





25.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR, C.H.
PINALITO, R.D.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

La contratista no ha iniciado los trabajos.



26.0 SERVICIO DE REMODELACION DE LA OFICINA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, 2DO. PISO, EDIFICIO PRINCIPAL (EGEHID).

Este proyecto comprendió las partidas siguientes:

- Desinstalación e instalación muro de sheetrock, colocación de zócalos, pintura en muros y puertas, instalaciones eléctricas, revestimiento de columnas, suministro e instalación de puerta, gabinete de cocina, tope de granito en cocina, tope de granito en cocina y suministro y colocación de vinil.



27.0 PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN LA C. H. SABANA YEGUA.

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.



**28.0 PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO COMBINADO DE GAVIONES Y
HORMIGÓN CICLÓPEO EN CANAL BOCA, CH ROSA JULIA DE LA CRUZ,
NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, R.D.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista se encuentra realizando los trabajos de construcción del muro de hormigón ciclópeo.









**29.0 PROYECTO LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DEL CANAL HERNAN
CORTES, COMUNIDAD EL BARRO, CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS,
PROVINCIA DE AZUA, R.D.**

CONDICION ACTUAL DEL PROYECTO

El contratista se encuentra realizando los trabajos de limpieza de la berma y de rehabilitación de los paños del canal.









30.0 ALQUILER EQUIPOS PESADOS.

Tenemos los siguientes contratos de alquiler de equipos en vigencia:

- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de Limpieza del Embalse de la Presa Aguacate, el cual consta de:
 - 01 tractor Cat D8 o similar.
 - 01 retroexcavadora Cat 320 o similar.
 - 01 pala 950 Cat o similar.
- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en la Rehabilitación del camino vecinal Sección Iguana, Bani, CH Valdesia, el cual consta de:
 - 01 grader Cat 12G o similar.
 - 01 retroexcavadora Cat 320 B o similar.
 - 01 retropala Cat 416 o similar.
 - 01 rodillo CA 25 Dynapac o similar.
 - 01 tractor D7G Cat o similar.
 - 02 camiones volteo 14 m3e.
 - 01 camión de agua.
- Alquiler de equipos pesados para la construcción muro de protección en tierra, margen izquierda del Rio Yuna, Dique Proyecto Aglipo, en la Sección Arenoso, Prov. San Francisco de Macorís (Barrio Los Estudiantes desde Est. 0+000 hasta Est. 0+720), el cual consta de:
 - a. Dos tractores D8K Cat o similar.
 - b. Dos retroexcavadoras 320 Cat o similar.
 - c. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - e. Un grader 12G Cat o similar.

- f. Un camión de agua.
- Alquiler de equipos pesados para la construcción de los caminos vecinales que comunican las comunidades Ermitaño, La Bejuquera, Caminero, Los Ramones, La Lagunita, El Mato y La Peñita, en la Sección Mucha Agua, Cambita, C.H. Aguacate, el cual consta de:
 - a. Un tractor D8 Komatsu o similar.
 - b. Un rodillo.
 - c. Una retroexcavadora 290 con cubo.
 - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - e. Un grader 12G Cat o similar.
 - f. Un camión de agua.
 - g. Un camión volteo.
- Alquiler Hora Equipo para el Limpieza de Cunetas y Acondicionamiento de las Vías de Acceso a la Válvula Mariposa y Terminación de trabajos de las demás captaciones, C.H. Pinalito, el cual consta de:
 - a. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - c. Un grader 12G Cat o similar.
 - d. Tres Camiones Volteo de 6 m³, 12 m³ y 16 m³.
- Alquiler de equipos pesados para los trabajos de construcción de los caminos vecinales Los Coles, Los Hozaderos y La Colina, Municipio Cambita Garabito, Provincia San Cristóbal, el cual consta de:
 - a. Una retropala 416 Cat o similar.
 - b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.

- c. Un grader 12G Cat o similar.
 - d. Un tractor D7G Cat o similar.
 - e. Camión Volteo de 12 m3.
-
- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de movimiento de tierra del mantenimiento de la Comunidad Las Auyamas, Distrito Municipal Nizao, Presa Jigüey, Prov. San Jose de Ocoa, el cual consta de:
 - a. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
 - b. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - c. Un grader 12G Cat o similar.
 - d. Camión Volteo de 6 m3.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

Equipo:		Greader 12G CAT									
No.	Fecha	Actividad realizada	Mañana				Tarde				Horas trabajadas
			Hora inicio		Hora Final		Hora inico		Hora Final		
1	5/1/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS					1.00 pm		5.00 pm		4.00
2	5/2/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm		1.00 pm		5.00 pm		8.00
3	5/3/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm		1.00 pm		5.00 pm		8.00
4	5/4/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm		1.00 pm		5.00 pm		8.00
5	5/9/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS					1.00 pm		5.00 pm		4.00
6	5/10/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm		1.00 pm		5.00 pm		8.00
7	5/11/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm		1.00 pm		5.00 pm		8.00
8	5/12/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm						4.00
9	5/14/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	10.00 am		12.00 pm		1.00 pm		5.00 pm		6.00
10	5/15/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm		1.00 pm		5.00 pm		8.00
11	5/16/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm		1.00 pm		5.00 pm		8.00
12	5/17/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm		1.00 pm		5.00 pm		8.00
13	5/18/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm		1.00 pm		5.00 pm		8.00
14	5/19/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm						4.00
Total de Horas Trabajadas:											94.00



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

Equipo:		Rodillo CA 25							
No.	Fecha	Actividad realizada	Mañana			Tarde			Horas trabajadas
			Hora inicio		Hora Final	Hora inico		Hora Final	
1	5/1/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS				1.00 pm	5.00 pm	4.00	
2	5/2/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	8.00	
3	5/3/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	8.00	
4	5/4/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	8.00	
5	5/9/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS				1.00 pm	5.00 pm	4.00	
6	5/10/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	8.00	
7	5/11/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	8.00	
8	5/12/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm			4.00	
9	5/14/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	10.00 am		12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	6.00	
10	5/15/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	8.00	
11	5/16/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	8.00	
12	5/17/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	8.00	
13	5/18/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	8.00	
14	5/19/2018	MANT. CAM. COM. LAS AUYAMAS	8.00 am		12.00 pm			4.00	
Total de Horas Trabajadas:									94.00

No.	Camión alquilado placa No.	Fecha	Capacidad del camión en (M³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado
1	L-259037	5/3/2018	18	14	252
2	L-259038	5/4/2018	18	12	216
3	L-259039	5/9/2018	18	8	144
4	L-259040	5/10/2018	18	15	270
5	L-259041	5/11/2018	18	14	252
6	L-259042	5/12/2018	18	8	144
7	L-259043	5/14/2018	18	14	252
8	L-259044	5/15/2018	18	8	144
9	L-259045	5/16/2018	18	15	270
10	L-259046	5/17/2018	18	15	270
11	L-259047	5/18/2018	18	17	306
12	L-259048	5/19/2018	18	8	144
Total de Relleno:					2664

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

- Alquiler de equipos pesados y suministro de material de base para la Rehabilitación del Camino La Ceiba y Caobal, Sector Semana Santa, Municipio Yaguate, C. H. Valdesia, el cual consta de:
 - a. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
 - b. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - c. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - d. Un grader 12G Cat o similar.
 - e. Camión cisterna.

Equipo:		Retroexcavadora									
No.	Fecha	Actividad realizada	Mañana				Tarde				Horas trabajadas
			Hora inicio		Hora Final		Hora inico		Hora Final		
1	5/15/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO					1.00 pm		6.00 pm		5.00
2	5/16/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	9.00	am	12.00	pm	1.00	pm	5.00	pm	7.00
3	5/19/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	12.00	pm	1.00	pm	6.00	pm	9.00
4	5/21/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	11.00	am	12.00	pm	1.00	pm	3.00	pm	3.00
5	5/22/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	11.00	am	12.00	pm	1.00	pm	5.00	pm	5.00
6	5/23/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	12.00	pm	1.00	pm	5.00	pm	8.00
		TOTAL DE HORAS									37.0

Equipo:		Greader									
No.	Fecha	Actividad realizada	Mañana				Tarde				Horas trabajadas
			Hora inicio		Hora Final		Hora inico		Hora Final		
1	5/3/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	9.00	am	12.00	pm					3.00
2	5/14/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	12.00	pm	1.00	pm	4.00	pm	7.00
3	5/23/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	11.00	pm	1.00	pm	5.00	pm	7.00
		TOTAL DE HORAS									17.0



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

Equipo:		1- Rodillo											
No.	Fecha	Actividad realizada	Mañana				Tarde				Horas trabajadas		
			Hora inicio		Hora Final		Hora inico		Hora Final				
1	5/2/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	10.00	am	12.00	pm	1.00	pm	2.00	pm	3.00		
2	5/3/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO					1.00	pm	5.00	pm	4.00		
3	5/9/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO					1.00	pm	5.00	pm	4.00		
4	5/10/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	12.00	pm	1.00	pm	5.00	pm	8.00		
5	5/11/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO					1.00	pm	5.00	pm	4.00		
6	5/12/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	12.00	pm					4.00		
7	5/13/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	12.00	pm					4.00		
8	5/14/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	11.00	am	12.00	pm	1.00	pm	5.00	pm	5.00		
9	5/15/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	12.00	pm					4.00		
10	5/16/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	12.00	pm	1.00	pm	5.00	pm	8.00		
11	5/23/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	11.00	am	1.00	pm	2.00	pm	4.00		
		TOTAL DE HORAS										52.0	

Equipo:		2- Rodillo											
No.	Fecha	Actividad realizada	Mañana				Tarde				Horas trabajadas		
			Hora inicio		Hora Final		Hora inico		Hora Final				
1	5/3/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	12.00	pm	1.00	pm	5.00	pm	8.00		
2	5/11/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	12.00	pm	1.00	pm	5.00	pm	8.00		
3	5/12/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	12.00	pm	1.00	pm	5.00	pm	8.00		
4	5/14/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	12.00	pm	1.00	pm	6.00	pm	9.00		
5	5/15/2018	MANTENIMIENTO DE CAMINO	8.00	am	12.00	pm	1.00	pm	3.00	pm	6.00		
		TOTAL DE HORAS										39.0	

Equipo:		Camión de Bote			
No.	Camión alquilado placa No.	Fecha	Capacidad del camión en (M³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado
1	S014292	5/19/2018	6	7	42
2	S014292	5/21/2018	6	3	18
Total de Bote:					60

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
 “Año del Fomento a las Exportaciones.”

Equipo: Camión de Relleno					
No.	Camión alquilado placa No.	Fecha	Capacidad del camión en (M³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado
1	S014775	5/14/2018	17	1	17
2	S014775	5/15/2018	17	1	17
Total de Bote:					34
No.	Camión alquilado placa No.	Fecha	Capacidad del camión en (M³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado
1	S011769	5/14/2018	18	1	18
Total de Bote:					18
No.	Camión alquilado placa No.	Fecha	Capacidad del camión en (M³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado
1	S012390	5/15/2018	17	1	17
Total de Bote:					17
No.	Camión alquilado placa No.	Fecha	Capacidad del camión en (M³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado
1	L351722	5/14/2018	18	1	18
2	L351722	5/15/2018	18	1	18
3	L351722	5/16/2018	18	1	18
Total de Bote:					54
No.	Camión alquilado placa No.	Fecha	Capacidad del camión en (M³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado
1	S011214	5/23/2018	15.9	1	15.9
Total de Bote:					15.9
No.	Camión alquilado placa No.	Fecha	Capacidad del camión en (M³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado
1	S003080	5/15/2018	18	1	18
2	S003080	5/21/2018	18	1	18
Total de Bote:					36
TOTAL MATERIAL BASE					174.9

- Alquiler de equipos pesados para la Reconstrucción Tramo de Tierra en diferentes puntos de las Comunidades La Guama, Los Platanitos, La Ralla, Las Coles y La Garza, Agua Abajo del Dique Proyecto Aglipo, Sección Arenoso, Prov. San Francisco de Macorís, el cual consta de:

- a. Dos retroexcavadoras 320 Cat o similar.
 - b. Dos retroexcavadoras 416 Cat o similar.
 - c. Dos tractores D8K Cat o similar.
 - d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
 - e. Tres palas 950 Cat o similar.
- Alquiler de equipos pesados para los trabajos de mantenimiento del Camino El Baden-Monteadá Nueva-Melitón-Vallejuelo-Los Naranjos, C.H. Jigüey, Prov. San Cristóbal, el cual consta de:
 - a. Una retroexcavadora Volvo 210 o similar.
 - b. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - c. Un tractor D65 Ex Kom o similar.
 - d. Un grader 12G Cat o similar.
 - e. Un rodillo 25 Dynapac o similar.
 - f. Un camión cisterna.
- Alquiler de equipos pesados para la rehabilitación del Camino Los Leones, Ingenio Nuevo, Los Leones, Hoyo del Barro, Camino Ingenio Nuevo, Niza, Callejón, Los Rosarios, Callejones Moja Casabe y Bella Vista (Las Cañitas), C.H. Valdesia, Prov. San Cristóbal, el cual consta de:
 - a. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - b. Una pala 950 Cat o similar.
 - c. Dos graders 12G Cat o similar.
 - d. Dos rodillos 25 Dynapac o similar.
 - e. Un camión cisterna.

- Alquiler de equipos pesados para la colocación, transporte y suministro de material de base en Camino Villegas, C. H. Aguacate, Prov. San Cristóbal, el cual consta de:
 - a. Una retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - b. Un grader 12G Cat o similar.
 - c. Un rodillo Cat 25 o similar.
 - d. Un camión cisterna.

- Alquiler de equipos pesados para el mantenimiento Carretera Rosalito-Mahoma (Arroyo de la Caña-Florencio), Presa Jigüey, el cual consta de:

- a. Una retroexcavadora 320 Cat o similar.
- b. Un grader 12G Cat o similar.
- c. Una Retropala 416 Cat o similar.
- d. Un rodillo A 25 Dynapac o similar.
- e. Un camión cisterna.

Equipo:		Retroexcavadora 320 CAT						
No.	Fecha	Actividad realizada	Mañana		Tarde		Horas trabajadas	
			Hora inicio	Hora Final	Hora inicio	Hora Final		
1	5/5/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	8.00 am	12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	8	
2	5/9/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO			1.00 pm	5.00 pm	4	
3	5/10/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	8.00 am	12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	8	
4	5/11/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	8.00 am	10.00 am			2	
5	5/14/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	10.00 am	12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	6	
6	5/15/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	9.00 am	12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	7	
7	5/16/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	8.00 am	12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	8	
8	5/17/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	8.00 am	12.00 pm	1.00 pm	3.00 pm	6	
TOTAL DE HORAS:							49	



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

Equipo:		Greader 12g CAT												
No.	Fecha	Actividad realizada	Mañana				Tarde				Horas trabajadas			
			Hora inicio		Hora Final		Hora inico		Hora Final					
1	4/23/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	11.5 am		12.5 pm		1.00 pm		3.00 pm		3			
2	4/24/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO					3.00 pm		5.00 pm		2			
3	4/25/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	9.00 am		12.00 pm		1.00 pm		5.00 pm		7			
4	4/26/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	8.00 am		12.00 pm		1.00 pm		3.00 pm		6			
5	4/27/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO					1.00 pm		5.00 pm		4			
6	4/28/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	8.00 am		12.00 pm						4			
7	5/1/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	10.00 am		12.00 pm		1.00 pm		7.00 pm		8			
8	5/2/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	7.00 am		12.00 pm		1.00 pm		7.00 pm		11			
9	5/3/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	7.00 am		10.00 am		4.00 pm		7.00 pm		6			
10	5/4/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	8.00 am		12.00 pm		1.00 pm		7.00 pm		10			
11	5/5/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	8.00 am		12.00 pm		1.00 pm		5.00 pm		8			
12	5/9/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO					3.00 pm		5.00 pm		2			
13	5/14/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO					1.00 pm		5.00 pm		4			
14	5/15/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	10.00 am		12.00 pm		1.00 pm		3.00 pm		4			
15	5/16/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	9.00 am		12.00 pm		2.00 pm		5.00 pm		6			
		TOTAL DE HORAS:									85			



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
 "Año del Fomento a las Exportaciones."

Equipo:		Retropala 416 CAT					
No.	Fecha	Actividad realizada	Mañana		Tarde		Horas trabajadas
			Hora inicio	Hora Final	Hora inicio	Hora Final	
1	4/27/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	9.00 am	12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	7
2	4/28/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	8.00 am	12.00 pm			4
3	5/1/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	10.00 am	12.00 pm	1.00 pm	7.00 pm	8
4	5/2/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	7.00 am	12.00 am	2.00 pm	8.00 pm	11
5	5/3/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	7.00 am	12.00 pm	3.00 pm	9.00 pm	11
6	5/4/2018	REHA. CAM. MAHOMA ROSALITO	8.00 am	12.00 pm	1.00 pm	5.00 pm	8
TOTAL DE HORAS:							49

No.	Camión alquilado placa No.	Fecha	Capacidad del camión en (M³)	Cantidad de Viajes	Volumen Transportado
1	S007590	4/27/2018	3	6	18
2	S005312	5/1/2018	8	44	352
3	S005313	5/2/2018	8	51	408
4	S005314	5/3/2018	8	41	328
5	S005315	5/4/2018	8	19	152
Total de Relleno:					1258

Nota: Los contratos de alquiler de equipos estipula que el combustible corre por la compañía contratada.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
"Año del Fomento a las Exportaciones."

