
INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL

OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.

INDICE

- 1- Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tábara Abajo, provincia Azua.
- 2- Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.
- 3- Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel.
- 4- Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.
- 5- Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.
- 6- Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.
- 7- Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.
- 8- Remodelación del Play de Béisbol La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.
- 9- Construcción de Funeraria Jayaco, municipio Jayaco, Monseñor Nouel.
- 10- Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO DE LA DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES**

OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE TÁBARA ABAJO, PROV. AZUA, REP.DOM.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE TÁBARA ABAJO, PROV. AZUA, R.D.
No. Contrato:	198/2021
Contratista:	BMC, S.R.L; REPRESENTADA POR BLASINA DE LA CRUZ MARTÍNEZ.
Monto del Contrato:	RD\$ 5,158,467.09.
Monto del avance (20%):	RD\$1,031,693.41
Fecha de firma del contrato:	14 DE OCTUBRE DEL 2021.
Fecha de inicio de los trabajos:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
Fecha de Término:	TERMINADO
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: TERMINADO



**DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**

OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.

**PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL, EN DISTRITO MUNICIPAL DE MATAYAYA,
MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL, ENDISTRITO MUNICIPAL DE MATAYAYA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
No. Contrato:	177/2021
Contratista:	RAFAEL SÁNCHEZ ARAUJO & CIA; REPRESENTADAPOR RAFAEL SÁNCHEZ ARAUJO
Monto del Contrato:	RD\$ 17,267,651.34
Monto del avance (20%):	RD\$ 3,453,530.26
Fecha de firma del contrato:	12 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	24 DE ENERO DEL 2022
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un Cuartel Policial en hormigón armado. Obra solicitada por la Gobernación Provincial.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con un 80% de su ejecución, se trabajó Pañete de muros, cantos, torta de piso, caseta de bomba, instalaciones sanitarias, pintura de base blanca y algunos detalles de la verja perimetral, coordinando el reinicio de los trabajos, luego del pago de la cubicación número 4.



**DESCRIPCION DEL PROYECTO DE LA DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES**

OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.

**REPARACIÓN CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO DE JAYCO, PROVINCIA
MONSEÑOR NOUEL.**

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	REPAPARACIÓN CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO DE JAYCO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.
No. Contrato:	200/2021
Contratista:	CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO Y ASOCIADOS, S.R.L.
Monto del Contrato:	RD\$ 2,355,948.48
Monto del avance (20%):	RD\$ 471,189.68
Fecha de firma del contrato:	13 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la reparación del Centro Comunal, rehabilitación de salón multiuso, baño, oficina, verja perimetral.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución con un 98%,



**DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**

OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO LA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO LA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.
No. Contrato:	169/2021
Contratista:	MAR & LUNA INGENIEROS, S.R.L. REPRESENTANTE: ABRAHAM EDMUNDO LUNA BARRIOLA.
Monto del Contrato:	RD\$ 8.569.340.00
Monto del avance (20%):	RD\$ 1.713.868.00
Fecha de firma del contrato:	11 DE OCTUBRE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE DICIEMBRE 2021
Fecha de Término:	TERMINADA
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Proyecto consiste en construcción de un salón comunal en el Barrio la Altagracia, en la cual se realizarán partidas de preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, instalaciones eléctricas y sanitarias, revestimientos y colocación de pisos en cerámica, instalación de puertas y ventanas, la construcción de una verja perimetral en hormigón armado y malla ciclónica, instalaciones sanitarias, y eléctricas, área de servicio de cocina.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: TERMINADA



**DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**

OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.

CONSTRUCCIÓN FUNERARIA RANCHO ARRIBA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN FUNERARIA RANCHO ARRIBA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.
No. Contrato:	164/2021
Contratista:	BIENVENIDO REYES MARTE
Monto del Contrato:	RD\$12.356.751,12
Monto del avance (20%):	RD\$2,471,350.22
Fecha de firma del contrato:	11 DE OCTUBRE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	22 DE NOVIEMBRE 2021
Fecha de Término:	TERMINADO.
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una Funeraria en hormigón armado, en el Municipio de Rancho Arriba, Provincia San José de Ocoa.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de un 100%.



**DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**

OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.

TERMINACIÓN DE LA IGLESIA JUMA BEJUCAL, MUNICIPIO SABANA DEL PUERTO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	TERMINACIÓN DE LA IGLESIA JUMA BEJUCAL, MUNICIPIO SABANA DEL PUERTO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.
No. Contrato:	203/2021
Contratista:	INMOBILIARIA SIXTO 23, S.R.L. Representante: SIXTO DE LOS SANTOS BRAZOBAN
Monto del Contrato:	RD\$4,100,908.98
Monto del avance (20%):	RD\$820,181.79
Fecha de firma del contrato:	14 DE OCTUBRE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE 2021
Fecha de Término:	OBRA LISTA
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la terminación de la Iglesia Juma Bejucal, Municipio de Sabana del Puerto, Provincia Monseñor Nouel.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución 98%, se trabajan las Instalación de lámparas interior.



**DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**

OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.

CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR CARACOLES, PROVINCIA AZUA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR CARACOLES, PROVINCIA AZUA.
No. Contrato	193/2021
Contratista	BOLIVAR ANTONIO SOTO PEGUERO
Monto del Contrato	RD\$ 6,957,954.30
Monto del avance (20%)	RD\$1,173,068.19
Fecha de firma del contrato	13 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos	22 DE NOVIEMBRE 2021
Fecha de Término	TERMINADA
Tipo de Proceso	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un Cuartel Policial en hormigón armado, en el Distrito Municipal de Los Caracoles, Provincia de Azua.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: TERMINADA



DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.

REMODELACIÓN DEL PLAY DE BÉISBOL LA ESTANCIA, DM QUITA SUEÑO, MUNICIPIO QUITA SUEÑO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	REMODELACIÓN DEL PLAY DE BÉISBOL LA ESTANCIA, DM QUITA SUEÑO, MUNICIPIO QUITA SUEÑO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.
No. Contrato:	218/2021
Contratista:	ROSA ANGELA MATEO VALDEZ
Monto del Contrato:	RD\$12,810,696.65
Monto del avance (20%):	RD\$2,562,139.33
Fecha de firma del contrato:	15 DE OCTUBRE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	15 DE NOVIEMBRE 2021
Fecha de Término:	FINALIZADO
Tipo de Proceso:	SORTEOS DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Proyecto consiste en la remodelación de un play de béisbol, aplicación de pintura, construcción de graderías en hormigón armado, instalaciones eléctricas y sanitarias, readecuación del área de juego, entre otras.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: FINALIZADO



**DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**

OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.

CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA JAYACO, MUNICIPIO JAYACO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.


FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA JAYACO (CARIBE - EL VERDE), PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.
No. Contrato:	199/2021
Contratista:	JOHNAGEL FRANCISCO ORTIZ RAMIREZ
Monto del Contrato:	RD\$ 13.673.486,52
Monto del avance (20%):	RD\$ 2,734,697.30
Fecha de firma del contrato:	13 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una Funeraria en hormigón armado en el Caribe - El Verde, Municipio de Maimón, Provincia Monseñor Nouel.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de 68%,

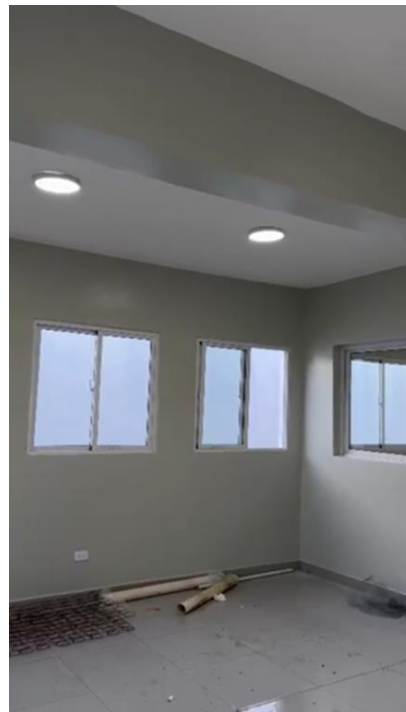

**DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**

OCTUBRE-DICIEMBRE 2024.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV.VALVERDE
No. Contrato:	135/2021
Contratista:	ORM CONSTRUCCIONES, S.R.L.
Monto del Contrato:	RD\$ 5,245,506.08
Monto del avance (20%):	RD\$ 1,040,437.32
Fecha de firma del contrato:	05 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la construcción de una Funeraria en hormigón armado, la cual vaa constar de una capilla con un área de estar o vestíbulo, un área para oficina, un área de preparación con su baño, un área de cocina y baños tanto para damas como para caballeros.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de 90%

