

INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL ENERO - MARZO 2024.

INDICE

- 1- Rehabilitación Infraestructuras Aniana Vargas, municipio de Yuna, provincia La Vega.
- 2- Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tábara Abajo, provincia Azua.
- 3- Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.
- 4- Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel.
- 5- Construcción Cuartel Policial en Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.
- 6- Construcción de Centro Comunal Barrio La Altagracia, provincia San Cristóbal.
- 7- Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.
- 8- Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.
- 9- Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.
- 10- Remodelación del Play de Béisbol La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.
- 11- Construcción de Funeraria Jayaco, municipio Jayaco, Monseñor Nouel.
- 12- Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.



DESCRIPCION DEL PROYECTO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES MARZO 2024.

REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA ANIANA VARGAS, MUNICIPIO DEYUMA, PROVINCIALA VEGA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA ANIANA VARGAS, MUNICIPIO DE YUMA, PROVINCIA LAVEGA
No. Contrato:	221/202
Contratista:	LUIS FRANCISCO RODRÍGUEZ ARACENA
Monto del Contrato:	RD\$ 9, 651,271.00
Monto del avance (20%):	RD\$ 1,930,254.20
Fecha de firma del contrato:	15 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la construcción de una carpeta de hormigón en el tramo de carretera desde la Cámara de carga hasta la central, de una carpeta de hormigón desde el tramo del camino de la entrada a la presa. El proyecto también contempla la limpieza de laberma del canal, la limpieza del embalse y la rehabilitación de baños y cocina de la central. Obra solicitada por el encargado de la Central Hidroeléctrica.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución con un 79%, se realizaron trabajos de Construcción bordillos en berma canal y terminación de los baños de la C.H.



DESCRIPCION DEL PROYECTO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES MARZO 2024.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE TÁBARA ABAJO, PROV. AZUA, REP.DOM.


FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE TÁBARA ABAJO, PROV. AZUA, R.D.
No. Contrato:	198/2021
Contratista:	BMC, S.R.L; REPRESENTADA POR BLASINA DE LA CRUZ MARTÍNEZ.
Monto del Contrato:	RD\$ 5,158,467.09.
Monto del avance (20%):	RD\$1,031,693.41
Fecha de firma del contrato:	14 DE OCTUBRE DEL 2021.
Fecha de inicio de los trabajos:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN.
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En este proyecto se construye una unidad de Atención Primaria; que cuenta con área de emergencias, marquesina para ambulancia, área de vacunación, sala de espera, baños, farmacia, archivos y cuatro consultorios médicos, además de un edificio contiguo para residencia médica, con sala comedor, cocina y baños, con el cual se brindará la asistencia médica a la comunidad de Tábara Abajo, Obra solicitada por la Gobernación Provincial.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Se encuentra en un 91% de su ejecución, se realizaron trabajos de Terminación en la verja y el parqueo.

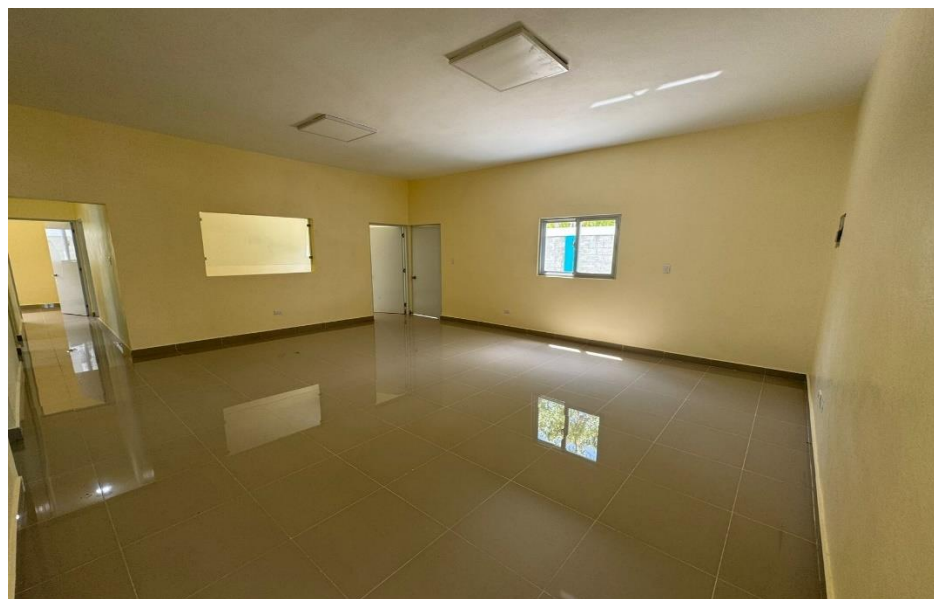

DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES MARZO 2024.

**PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL, EN DISTRITO MUNICIPAL DE MATAYAYA,
MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL, EN DISTRITO MUNICIPAL DE MATAYAYA, MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
No. Contrato:	177/2021
Contratista:	RAFAEL SÁNCHEZ ARAUJO & CIA; REPRESENTADAPOR RAFAEL SÁNCHEZ ARAUJO
Monto del Contrato:	RD\$ 17,267,651.34
Monto del avance (20%):	RD\$ 3,453,530.26
Fecha de firma del contrato:	12 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	24 DE ENERO DEL 2022
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un Cuartel Policial en hormigón armado. Obra solicitada por la Gobernación Provincial.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con un 70% de su ejecución, se trabajó Pañete de muros, cantos, torta de piso, caseta de bomba, instalaciones sanitarias, pintura de base blanca y algunos detalles de la verja perimetral, se está en proceso de la cubicación 4.



DESCRIPCION DEL PROYECTO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES MARZO 2024.

REPARACIÓN CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO DE JAYCO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	REPAPARACIÓN CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO DE JAYCO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.
No. Contrato:	200/2021
Contratista:	CONSTRUCTORA NOVO TORIBIO Y ASOCIADOS, S.R.L.
Monto del Contrato:	RD\$ 2,355,948.48
Monto del avance (20%):	RD\$ 471,189.68
Fecha de firma del contrato:	13 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la reparación del Centro Comunal, rehabilitación de salón multiuso, baño, oficina, verja perimetral.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución con un 86%, se trabaja en la colocación de cerámica de baños, verja perimetral, impermeabilizante de techo, está en proceso de la cubicación 3.



DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES MARZO 2024.

CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL EN RANCHO ARRIBA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN CUARTEL POLICIAL EN RANCHO ARRIBA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.
No. Contrato:	165/2021
Contratista:	DINNA RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES S.R.L. (DIROCA) Representante: DINNA RODRIGUEZ RAMIREZ
Monto del Contrato:	RD\$17,267,651.34
Monto del avance (20%):	RD\$3,453,530.27
Fecha de firma del contrato:	06 DE OCTUBRE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	22 DE NOVIEMBRE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto consiste en la construcción de un Cuartel Policial, en el Municipio de Rancho Arriba, Provincia José de Ocoa.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: En ejecución con un 100%. Obra lista, en proceso de instalación de mobiliario.



DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES MARZO 2024.

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO LA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.
FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL BARRIO LA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.
No. Contrato:	169/2021
Contratista:	MAR & LUNA INGENIEROS, S.R.L. REPRESENTANTE: ABRAHAM EDMUNDO LUNA BARRIOLA.
Monto del Contrato:	RD\$ 8.569.340.00
Monto del avance (20%):	RD\$ 1.713.868.00
Fecha de firma del contrato:	11 DE OCTUBRE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE DICIEMBRE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Proyecto consiste en construcción de un salón comunal en el Barrio la Altagracia, en la cual se realizarán partidas de preliminares, movimiento de tierra, hormigón armado, instalaciones eléctricas y sanitarias, revestimientos y colocación de pisos en cerámica, instalación de puertas y ventanas, la construcción de una verja perimetral en hormigón armado y malla ciclónica, instalaciones sanitarias, y eléctricas, área de servicio de cocina.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con un 93% de su ejecución, se trabaja en el parqueo, las partidas sanitarias y se encuentra en proceso cubicación no.5.



DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES MARZO 2024.

CONSTRUCCIÓN FUNERARIA RANCHO ARRIBA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN FUNERARIA RANCHO ARRIBA, MUNICIPIO RANCHO ARRIBA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA.
No. Contrato:	164/2021
Contratista:	BIENVENIDO REYES MARTE
Monto del Contrato:	RD\$12.356.751,12
Monto del avance (20%):	RD\$2,471,350.22
Fecha de firma del contrato:	11 DE OCTUBRE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	22 DE NOVIEMBRE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una Funeraria en hormigón armado, en el Municipio de Rancho Arriba, Provincia San José de Ocoa.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de un 86%, se trabajó en el vaciado de hormigón en el parqueo, colocación de los hierros en las ventanas y en las instalaciones sanitarias.



DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES MARZO 2024.

TERMINACIÓN DE LA IGLESIA JUMA BEJUCAL, MUNICIPIO SABANA DEL PUERTO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	TERMINACIÓN DE LA IGLESIA JUMA BEJUCAL, MUNICIPIO SABANA DEL PUERTO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.
No. Contrato:	203/2021
Contratista:	INMOBILIARIA SIXTO 23, S.R.L. Representante: SIXTO DE LOS SANTOS BRAZOBAN
Monto del Contrato:	RD\$4,100,908.98
Monto del avance (20%):	RD\$820,181.79
Fecha de firma del contrato:	14 DE OCTUBRE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la terminación de la Iglesia Juma Bejucal, Municipio de Sabana del Puerto, Provincia Monseñor Nouel.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución 90%, se trabajan las Instalación de lámparas interiores.



DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES MARZO 2024.

CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR CARACOLE, PROVINCIA AZUA.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR CARACOLE, PROVINCIA AZUA.
No. Contrato	193/2021
Contratista	BOLIVAR ANTONIO SOTO PEGUERO
Monto del Contrato	RD\$ 6,957,954.30
Monto del avance (20%)	RD\$1,173,068.19
Fecha de firma del contrato	13 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos	22 DE NOVIEMBRE 2021
Fecha de Término	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un Cuartel Policial en hormigón armado, en el Distrito Municipal de Los Caracoles, Provincia de Azua.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con un porcentaje de ejecución de 81%, se trabajó en la impermeabilización del techo, terminación de la verja perimetral, y pintura interior.



DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES MARZO 2024.

REMODELACIÓN DEL PLAY DE BÉISBOL LA ESTANCIA, DM QUITA SUEÑO, MUNICIPIO QUITA SUEÑO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	REMODELACIÓN DEL PLAY DE BÉISBOL LA ESTANCIA, DM QUITA SUEÑO, MUNICIPIO QUITA SUEÑO, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.
No. Contrato:	218/2021
Contratista:	ROSA ANGELA MATEO VALDEZ
Monto del Contrato:	RD\$12,810,696.65
Monto del avance (20%):	RD\$2,562,139.33
Fecha de firma del contrato:	15 DE OCTUBRE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	15 DE NOVIEMBRE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEOS DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este Proyecto consiste en la remodelación de un play de béisbol, aplicación de pintura, construcción de graderías en hormigón armado, instalaciones eléctricas y sanitarias, readecuación del área de juego, entre otras.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con un porcentaje de ejecución de un 95%, se realizaron trabajos de aplicación de pintura, colocación de maya ciclónica, trabajos eléctricos de media tensión, está en proceso de la cubicación no.3.



DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES MARZO 2024.

CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA JAYACO, MUNICIPIO JAYACO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA JAYACO (CARIBE - EL VERDE), PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.
No. Contrato:	199/2021
Contratista:	JOHNAGEL FRANCISCO ORTIZ RAMIREZ
Monto del Contrato:	RD\$ 13.673.486,52
Monto del avance (20%):	RD\$ 2,734,697.30
Fecha de firma del contrato:	13 DE OCTUBRE DEL 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de una Funeraria en hormigón armado en el Caribe - El Verde, Municipio de Maimón, Provincia Monseñor Nouel.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de 68%, se está trabajando en el parqueo y la verja perimetral.



DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES MARZO 2024.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROVINCIA VALVERDE.

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Nombre Obra:	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN LAGUNA SALADA, MUNICIPIO LAGUNA SALADA, PROV.VALVERDE
No. Contrato:	135/2021
Contratista:	ORM CONSTRUCCIONES, S.R.L.
Monto del Contrato:	RD\$ 5,245,506.08
Monto del avance (20%):	RD\$ 1,040,437.32
Fecha de firma del contrato:	05 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de inicio de los trabajos:	08 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha de Término:	EN EJECUCIÓN
Tipo de Proceso:	SORTEO DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la construcción de una Funeraria en hormigón armado, la cual vaa constar de una capilla con un área de estar o vestíbulo, un área para oficina, un área de preparación con su baño, un área de cocina y baños tanto para damas como para caballeros.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con una ejecución de 70%, trabajando en la aplicación de la Pintura final y colocación de ventanas y puertas.



