



ELABORADO POR: ING. JOSE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
Diciembre de 2020.**

ÍNDICE DE CONTENIDO

55.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE MONTERIA, ESTACION DE BOMBEO, ESTACIONES DE RELEVO, DE IMPULSION, RESERVORIOS, LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA, R.D.	3
--	---





ELABORADO POR: ING. JOSE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



55.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE MONTERIA, ESTACION DE BOMBEO, ESTACIONES DE RELEVO, DE IMPULSION, RESERVORIOS, LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA, R.D.



FICHA TECNICA DEL PROYECTO


Fecha de firma del contrato	17 de Septiembre de 2019
Monto del contrato	RD\$ 52,540,632.69
Monto del avance (20%)	RD\$ 10,508,126.53
Fecha de inicio de los trabajos	6 de Noviembre de 2019
% Avance estimado hasta la fecha	56.92%
Contratista	CONSORCIO SAVIL-COMAPA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se continúa trabajando en el encofrado y vaciado de 7 columnas restantes de la verja del tanque distribuidor de iguana. Se unieron más tubos metálicos de 8" en las cunetas para las líneas de impulsión de Los Jobitos. Se vaciaron 14 m³ de hormigón armado en la parte final de muro del tanque distribuidor de 500 m³ de Los Jobitos. Además, se trabaja en la construcción de la charrancho para la construcción de la plataforma metálica del pozo captador de iguana y la reposición de cunetas en hormigón simple en la línea de impulsión de tuberías de PVC de 8".



Vaciado final Tanque Los Jobitos, Acueducto Montería.

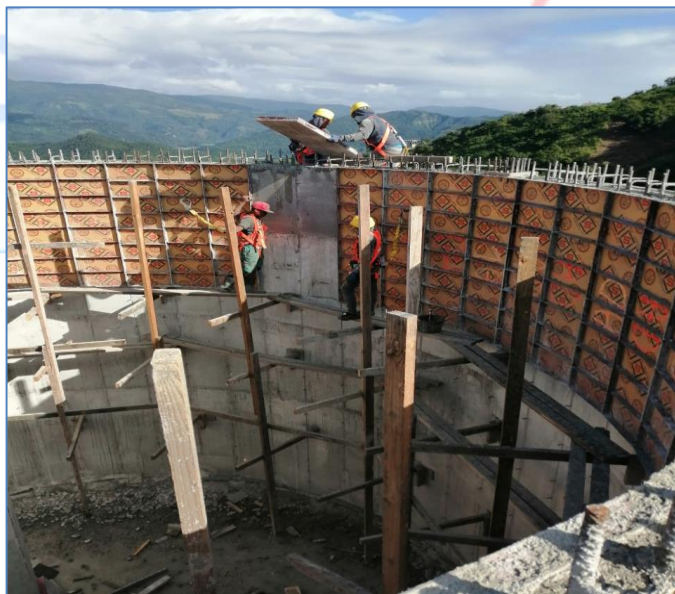

Desencofrado interior tanque Los Jobitos, Acueducto Montería.



Columnas vaciadas en verja perimetral del tanque de Iguana, Acueducto Montería.



Charrancho para replanteo de plataforma de pozo, Acueducto Montería.
