

ID	Modo de Tarea	Descripción	Duración	Comienzo	Fin
1		CRONO-PARTIDAS FINALES PROYECTO	96 días	Lunes 8/09/25	Miérc. 10/12/25
26		NOTA: ESTA PROGRAMACION ESTARA SUJETA SEGUN EL FLUIDO DE LOS PAGO DE LAS CUBICACIONES	96 días	Lunes 8/09/25	miércoles 14/12/25
27		ACCESO A AUTOVIA	30 días	dom 08/09/25	mar 8/10/25
28		1 ERA ETAPA	20 días	mié 10/09/25	mar 30/09/25
2		1a.-limpieza y desyerbo a mano	4 días	mié 13/09/25	lun 18/09/25
4		Puerta Vehicular de Acceso	3 días	jue 14/09/25	lun 18/08/25
5		0.1-Topografía (visita no.01)	1 día		mié 10/09/25
10		A-Constructon Puente acceso vehicular	15 días	11/10/25	26/10/25
3		2a. Suministro y Colocacion de Relleno para acceso vehicular	20 días	27/10/25	jue 17/11/25
6		4a. Aceras estampadas(e=0.10cm)	5 días	31/10/25	mier 5/11/25
7		3b.-Carpinteria	5 días	lun 3/11/25	sab 8/11/25
9		1b. Colocacion de Hormigon en Acera (e=0.10 cm)	3 días	jue 27/11/25	mar 30/11/25
14		B-OBRRAS COMPLEMENTARIAS	15 días	ma 2/11/25	lun 17/11/25
16		2 DA ETAPA	20 días	jue 6/11/25	lun 26/11/25
8		2b.-Contenes.	6 días	vie 14/11/25	vie 21/11/25
15		3b. Colocacion de Hormigon en Parques	8 días	mar 4/11/25	jue 13/2/25
17		3b.-Carpinteria	10 días	vie 7/11/25	mié 19/11/25
11		4b.-Constructon de Zapata de Muro de Blocks de 6" ,acero de 3/8" a 0,60m	15 días	mie 12/11/25	sab 29/11/25
12		Hormigon 210kg/cm[profundidad 0,60 cm aprox.]	17 días	lun 10/11/25	sab 29/11/25
13		3 ERA ETAPA	15 días	vie 7/11/25	mar 25/11/25
19		C-VERIA PERIMETRAL	15 días	vie 7/11/25	mar 25/11/25
20		1e.-Constructon de Muro de Blocks de 6" (SNP) Acero de 3/8" a 0,60m	4 días	mar 18/11/25	sab 22/11/25
21		2c.-Pañete de Muro	3 días	mie 26/11/25	sab 29/11/25
22		3c.-Cantos	8 días	vie 28/11/25	sab 6/12/25
23		Puertas Peatonal de Vehicular	5 días	dom 1/6/26	vie 6/6/26
24		Puertas Peatonal de Acceso	6 días	dom 1/6/26	vie 6/6/26
25		D-LIMPIEZA GENERAL(Entrega Proyecto)	6 días	dom 1/6/26	vie 6/6/26

Modulo: Construcion funeraria Sabana del Puerto, Municipio Sabana del puerto, Provincia Monseñor Nouel
 Duración: 96 días
 Comienzo: Lunes 8/09/25
 Fin: Miérc. 10/12/25


Proyecto: CRONO-4 TERMINACION
 Date: dom 06/06/2026

Division critica: Summary
 Task: Project Summary
 Split: External Tasks
 Milestone: External Milestone

Inactive Task
 Inactive Milestone
 Manual Task
 Duration-only
 Manual Summary Rollup
 Manual Summary
 Start-only
 Finish-only
 Deadline
 Progress
 Tareas criticas

Page 1

2/12	7/12	14/12	18/12	20/12	23/12	24/12	27/12	30/12	02/01	02/01	03/01	04/01	05/01	06/01	3/7
------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

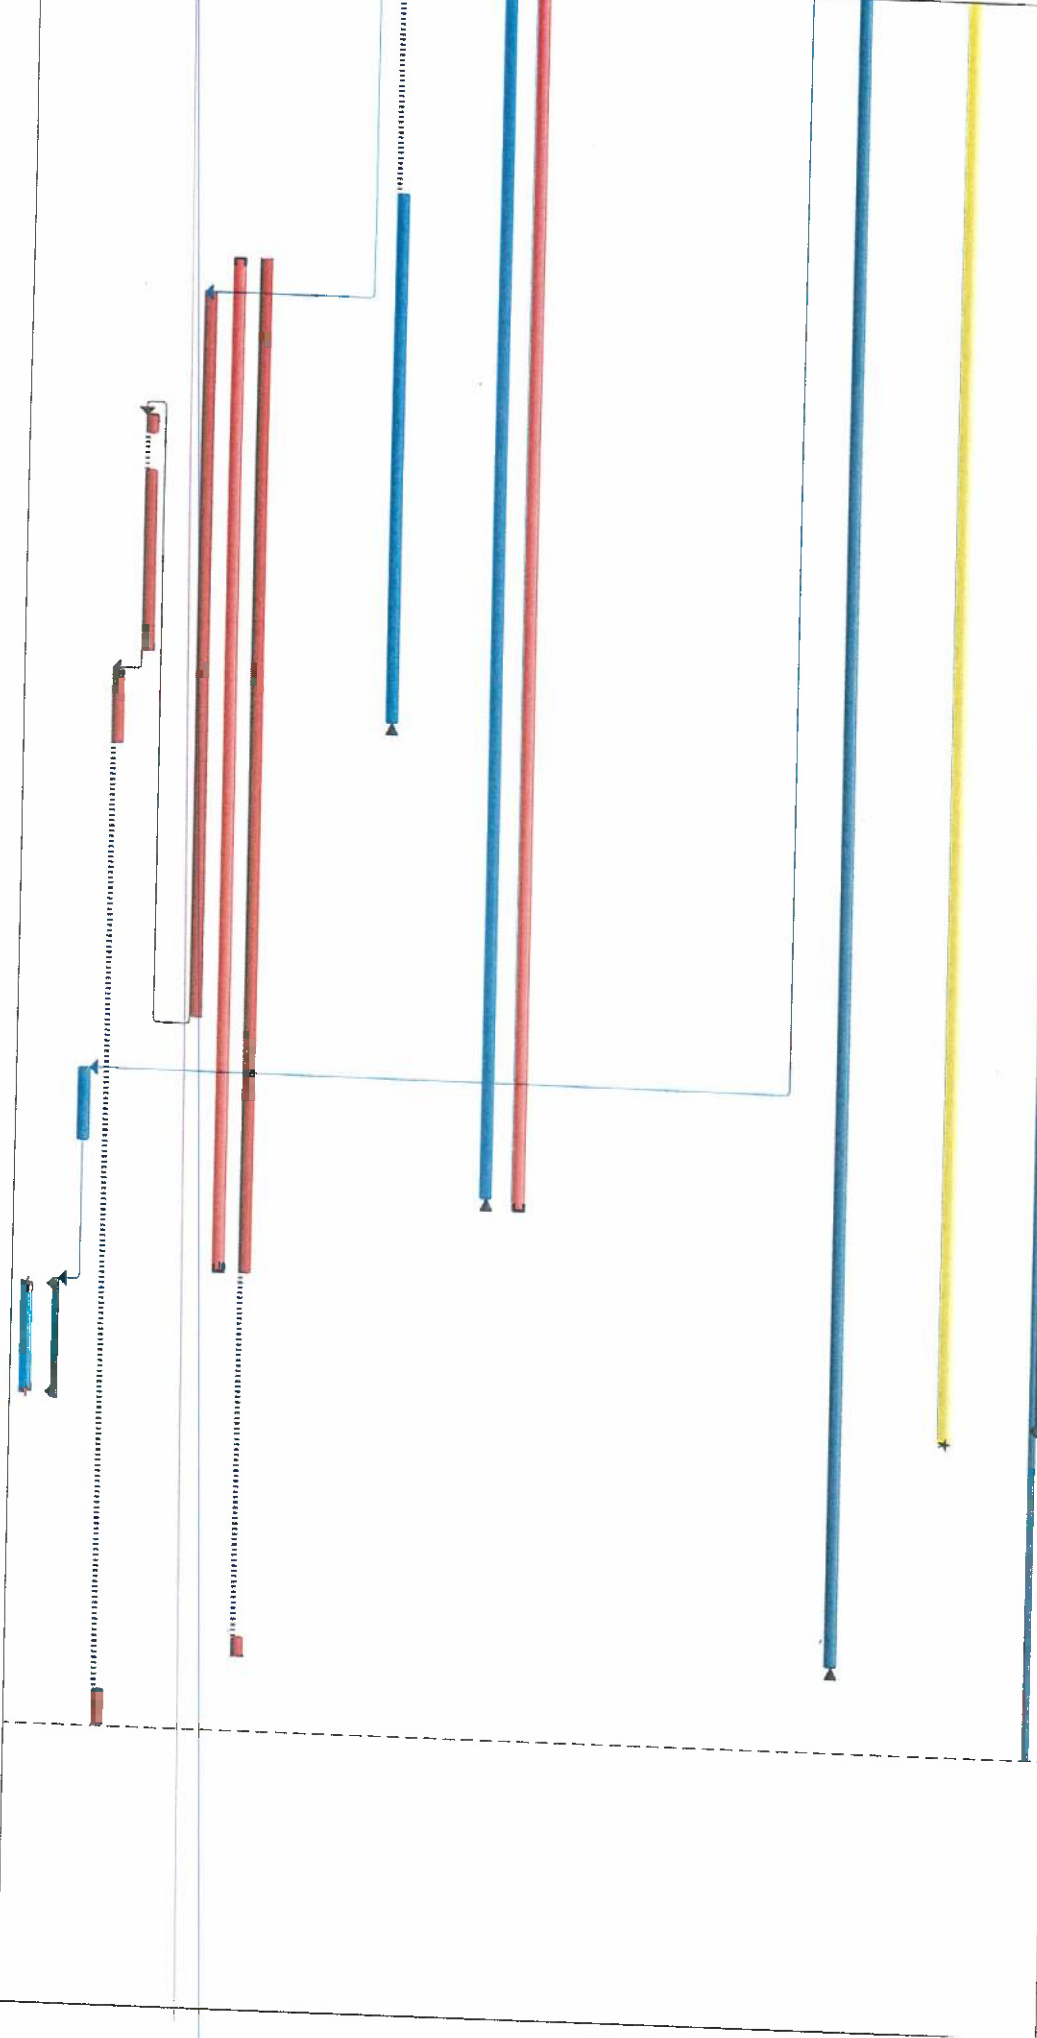

Project: CRONO-4 TERMINACION
 e: dom 06/06/2026

Division critica Summary Inactive Task Duration-only Finish-only

Task Project Summary Inactive Milestone Manual Summary Rollup Deadline

Split External Tasks Inactive Summary Manual Summary Progress

Milestone External Milestone Manual Task Start-only Tareas criticas
