


| Id | Modi de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
|----|---------------|--|----------|--------------|--------------|
| 1 | ★ | CANGCHA | | | |
| 2 | ★ | Nivelación general del terreno | 1 día | lun 28/10/24 | lun 28/10/24 |
| 3 | ★ | Replanteo | 1 día | mar 26/11/24 | mar 26/11/24 |
| 4 | ★ | Campamento | 1 día | mar 26/11/24 | mar 26/11/24 |
| 5 | ★ | Corte de material | 10 días | mar 29/10/24 | lun 11/11/24 |
| 6 | ★ | Relleno Compensado | 10 días | mar 12/11/24 | lun 25/11/24 |
| 7 | ★ | Bote de material | 9 días | mié 30/10/24 | lun 11/11/24 |
| 8 | ★ | Excavación Zapata de Muros | 5 días | mié 27/11/24 | mar 3/12/24 |
| 9 | ★ | Relleno de Reposición | 3 días | mar 10/12/24 | jue 12/12/24 |
| 10 | ★ | Hormigón en Zapata de Muros | 2 días | mié 4/12/24 | jue 5/12/24 |
| 11 | ★ | Hormigón frotado con malla eléct. | 6 días | lun 16/12/24 | lun 23/12/24 |
| 12 | ★ | Muros de 0.15 m | 2 días | vie 6/12/24 | lun 9/12/24 |
| 13 | ★ | Pañete | 2 días | mar 10/12/24 | mié 11/12/24 |
| 14 | ★ | Cantos | 2 días | mar 10/12/24 | mié 11/12/24 |
| 15 | ★ | Pintura en Piso | 2 días | lun 13/1/25 | mar 14/1/25 |
| 16 | ★ | Pintura en muro | 1 día | lun 13/1/25 | lun 13/1/25 |
| 17 | ★ | Tablero Inc. Canasto y malla | 1 día | lun 20/1/25 | lun 20/1/25 |
| 18 | ★ | Lámparas de 1000 watt | 1 día | sáb 14/12/24 | sáb 14/12/24 |
| 19 | ★ | Poste deluz dd 30 pies | 1 día | sáb 14/12/24 | sáb 14/12/24 |
| 20 | ★ | Coloc. de postes, incluye Excav. y horm. | 2 días | jue 12/12/24 | vie 13/12/24 |
| 21 | ★ | Rampa de entrada | 2 días | mar 21/1/25 | mié 22/1/25 |
| 22 | ★ | Plantas Ornamentales , Grama, Grava, et 2 días | 2 días | mié 22/1/25 | jue 23/1/25 |
| 23 | ★ | Conexión a CDEEE | 1 día | lun 27/1/25 | lun 27/1/25 |

■ Tareas externas
◆ Hitos externos
▾ Fecha límite
▬ Progreso
▬ Progreso manual
▬ Resumen inactivo
■ Tarea manual
..... solo duración
◆ Informe de resumen manual
▬ Resumen manual
▬ solo el comienzo
◇ solo fin


Proyecto: Proyecto1 -FRANCISC
 Fecha: mar 22/10/24

| Id | Modi de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Calendar | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | 20 oct '24 | 27 oct '24 | 3 nov '24 | 10 nov '24 | 17 nov '24 | S | L | M | J | V | X | | |
| 24 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | → | BASE PARA TABLERO (2 UDS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | → | Replanteo | 1 día | mar 26/11/24 | mar 26/11/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | → | Excavación Zapata | 5 días | mié 27/11/24 | mar 3/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | → | Relleno de Reposición | 1 día | mar 10/12/24 | mar 10/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | → | Bote de material | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | → | Hormigón en zapata de base | 2 días | mié 4/12/24 | jue 5/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | → | Hormigón en poste | 3 días | vie 6/12/24 | mar 10/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | → | Pañete | 3 días | jue 12/12/24 | lun 16/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | → | Cantos | 3 días | jue 12/12/24 | lun 16/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | → | Fraguache | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | → | Pintura Acrílica | 1 día | mar 14/1/25 | mar 14/1/25 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | → | GRADERIAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | → | Replanteo | 1 día | mié 11/12/24 | mié 11/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | → | Bote de material de excavación | 1 día | mar 17/12/24 | mar 17/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | → | Excavación zapata de muro | 3 días | jue 12/12/24 | lun 16/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | → | Relleno Compactado | 1 día | mié 18/12/24 | mié 18/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | → | Relleno de reposición en muros | 1 día | sáb 28/12/24 | sáb 28/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | → | Bote de material | 1 día | lun 30/12/24 | lun 30/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | → | Hormigón armado en muros | 2 días | mar 17/12/24 | mié 18/12/24 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | → | Hormigón simple en escalones | 1 día | jue 19/12/24 | jue 19/12/24 | | | | | | | | | | | | | |


Proyecto: Proyecto1-FRANCISC
 Fecha: mar 22/10/24

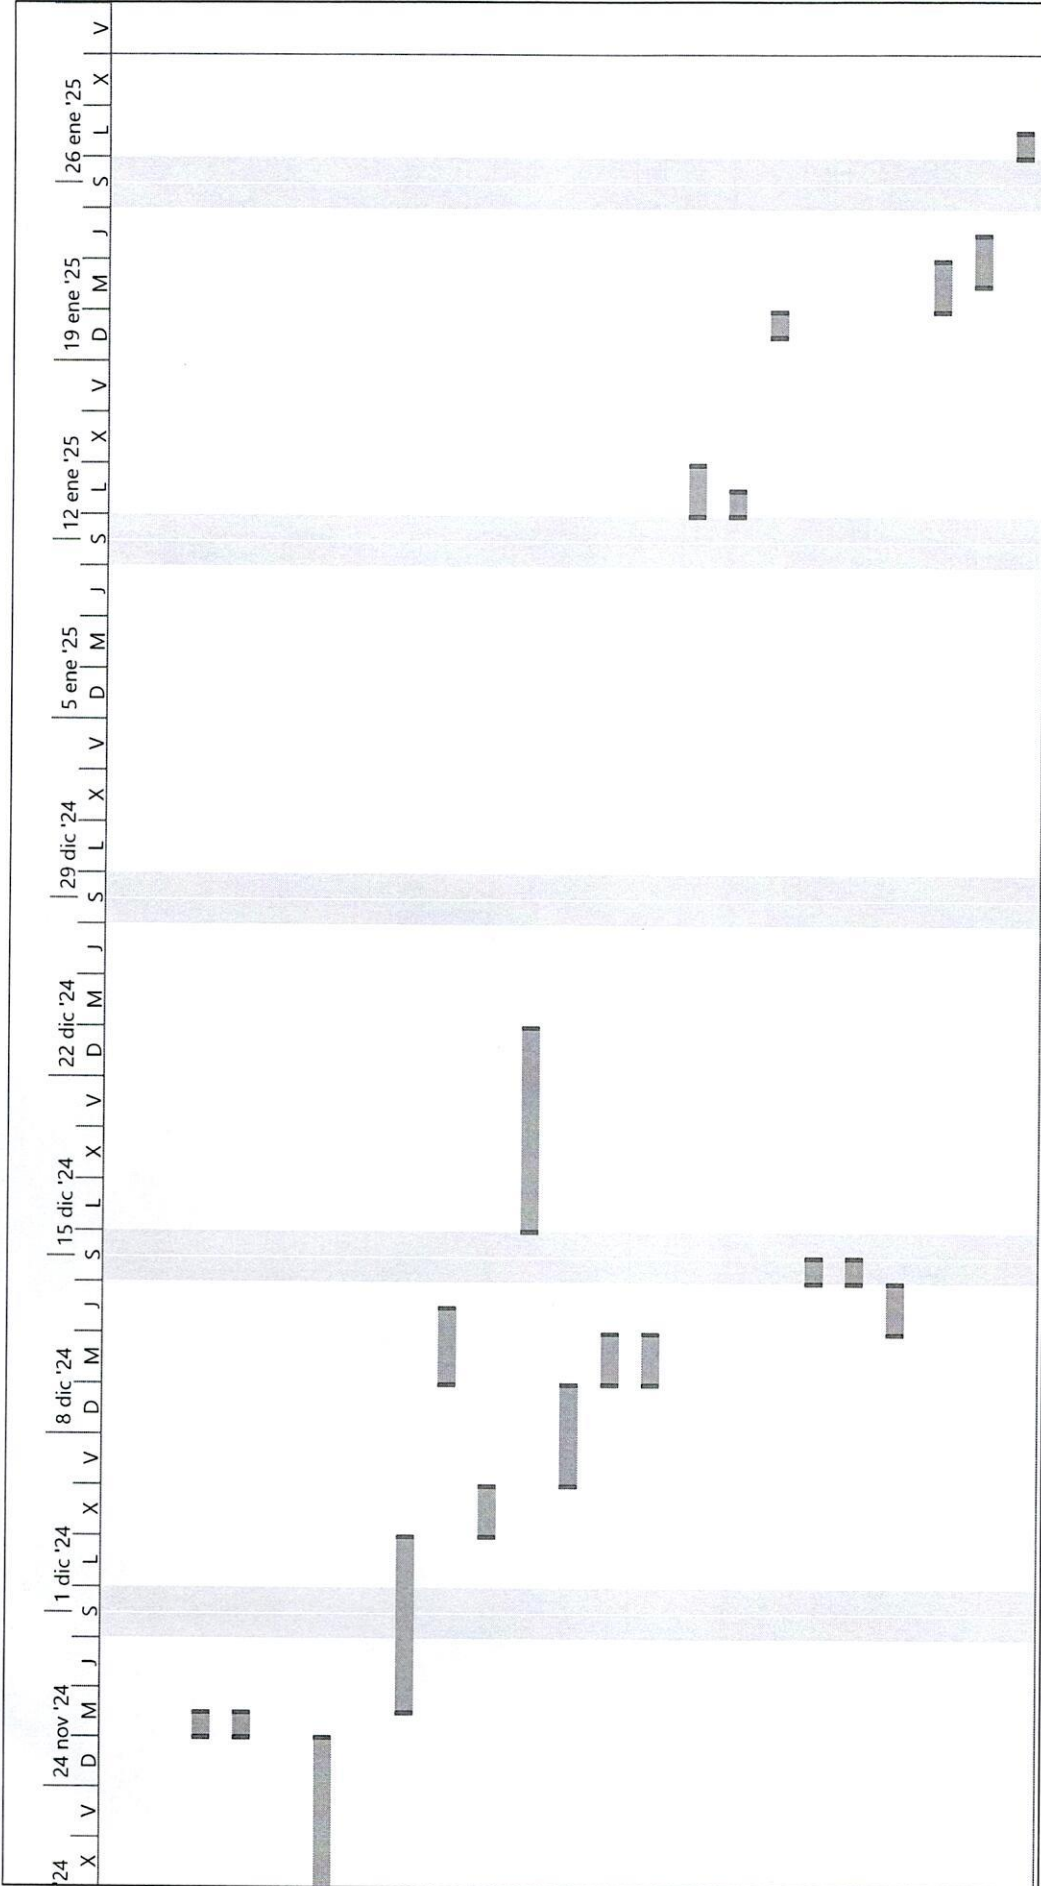


| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>Proyecto: Proyecto 1-FRANCISC</p> <p>Fecha: mar 22/10/24</p> | <p>Tarea</p> <p>División</p> <p>Hito</p> <p>Resumen</p> <p>Resumen del proyecto</p> <p>Tarea inactiva</p> <p>Hito inactivo</p> | <p>Resumen inactivo</p> <p>Tarea manual</p> <p>solo duración</p> <p>Informe de resumen manual</p> <p>Resumen manual</p> <p>solo el comienzo</p> <p>solo fin</p> | <p>Tareas externas</p> <p>Hito externo</p> <p>Fecha límite</p> <p>Progreso</p> <p>Progreso manual</p> |
|---|--|---|---|

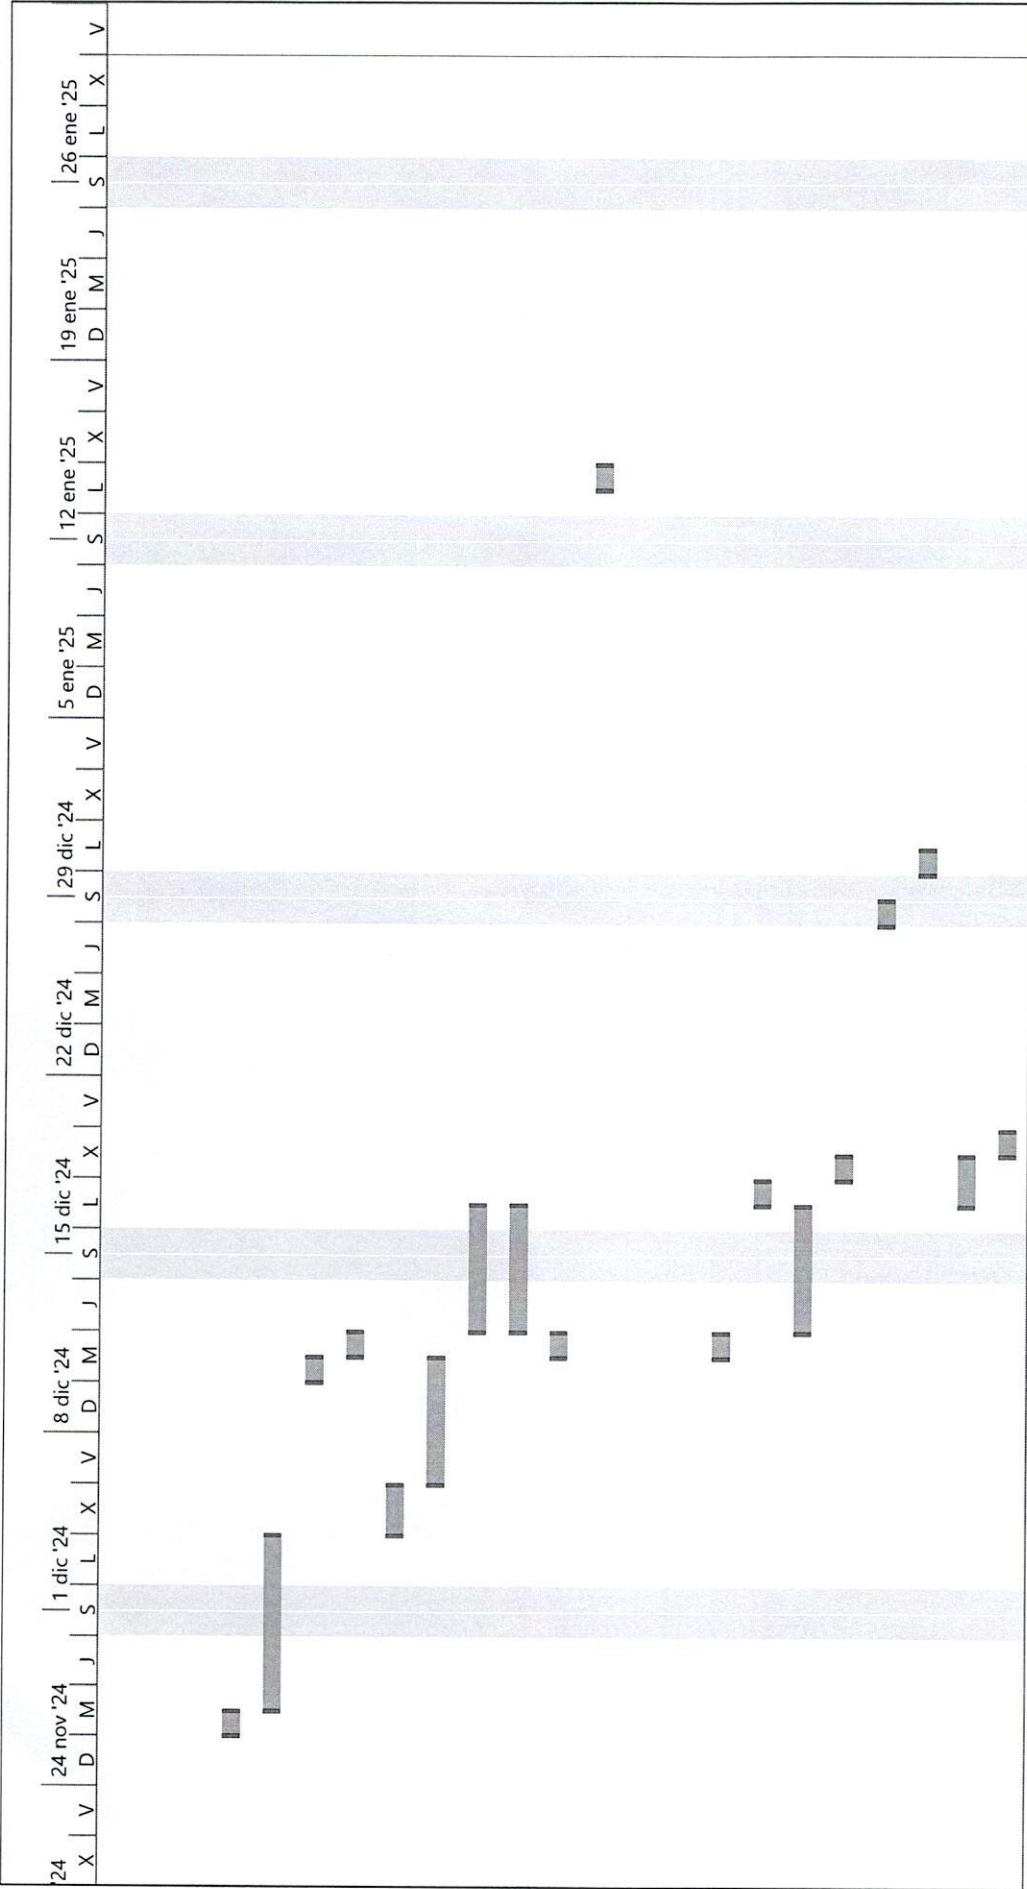

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>Proyecto: Proyecto1 -FRANCISC</p> <p>Fecha: mar 22/10/24</p> | <p>Tarea</p> <p>División</p> <p>Hito</p> <p>Resumen</p> <p>Resumen del proyecto</p> <p>Tarea inactiva</p> <p>Hito inactivo</p> | <p>Resumen inactivo</p> <p>Tarea manual</p> <p>solo duración</p> <p>Informe de resumen manual</p> <p>Resumen manual</p> <p>solo el comienzo</p> <p>solo fin</p> | <p>Tareas externas</p> <p>Hito externo</p> <p>Fecha límite</p> <p>Progreso</p> <p>Progreso manual</p> |
|---|--|---|---|

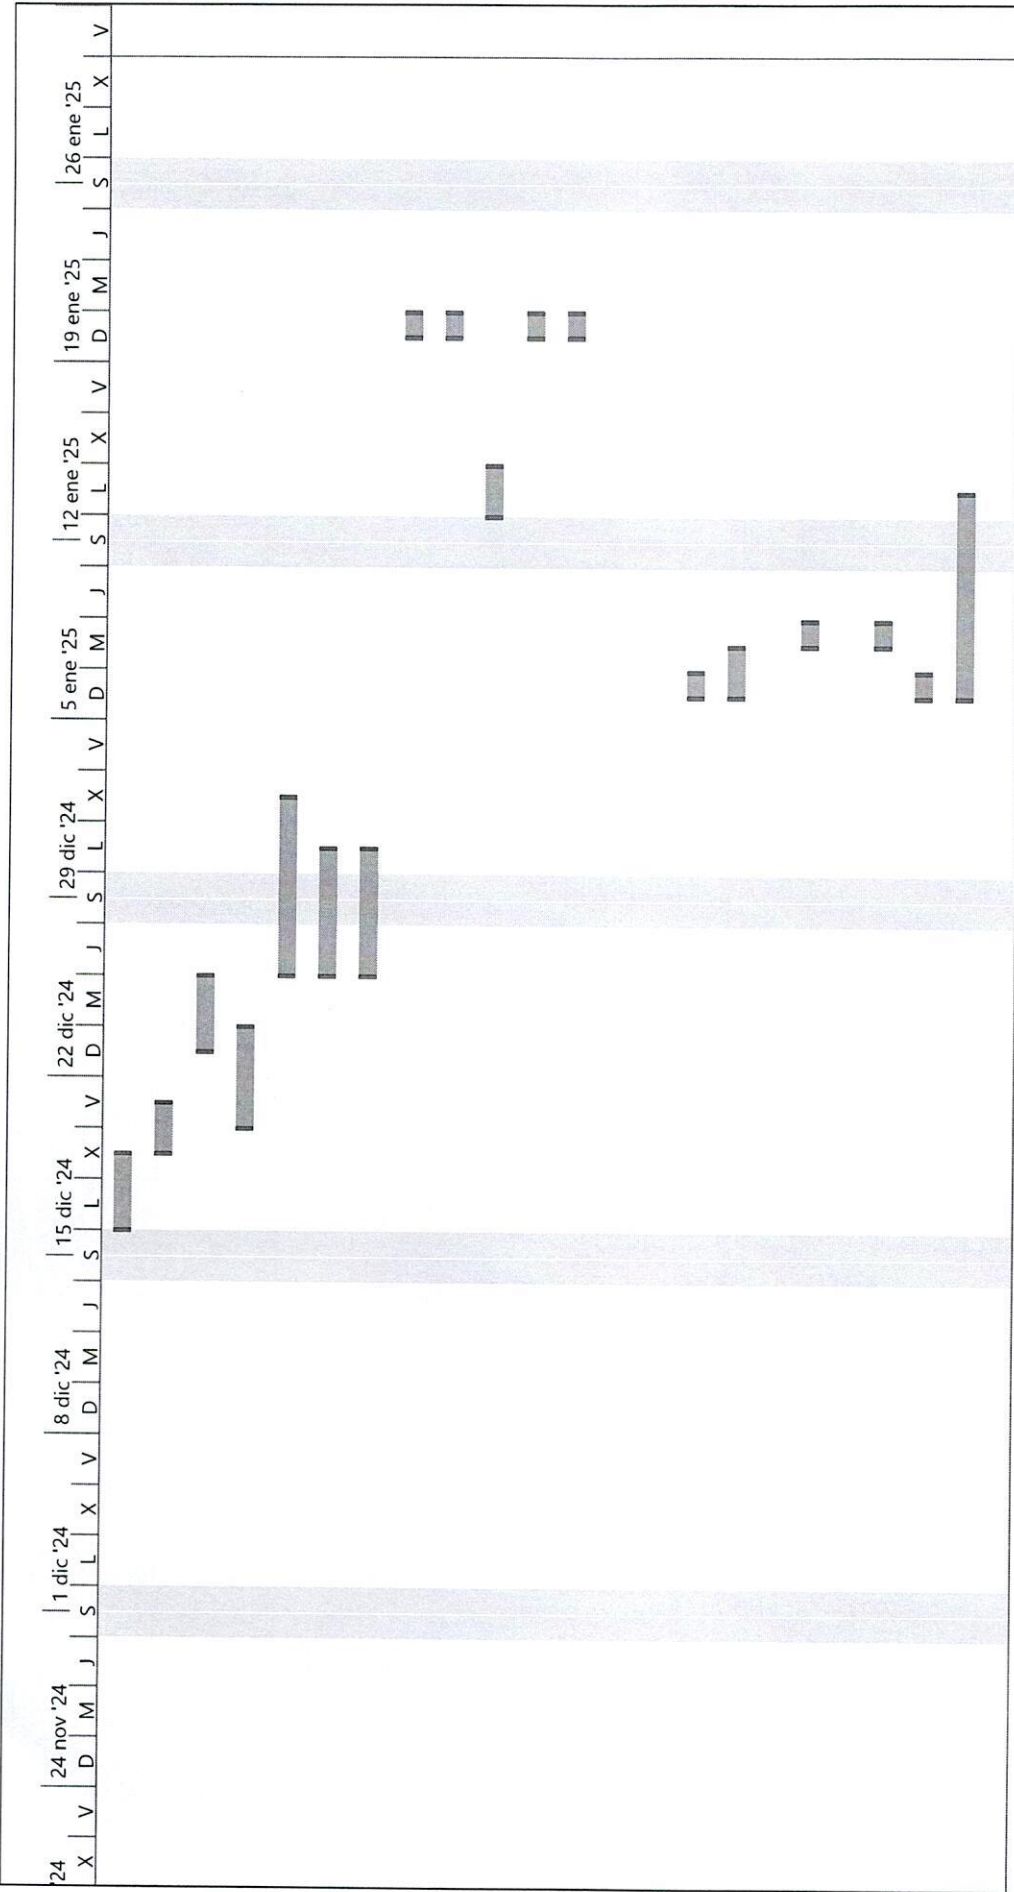


| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>24 X 24 nov '24 V 1 dic '24 S 8 dic '24 D 15 dic '24 L 22 dic '24 D 29 dic '24 S 5 ene '25 D 12 ene '25 X 19 ene '25 D 26 ene '25 X</p> | <p>Tarea</p> <p>División</p> <p>Hito</p> <p>Resumen</p> <p>Resumen del proyecto</p> <p>Tarea inactiva</p> <p>Hito inactivo</p> | <p>Resumen inactivo</p> <p>Tarea manual</p> <p>solo duración</p> <p>Informe de resumen manual</p> <p>Resumen manual</p> <p>solo el comienzo</p> <p>solo fin</p> | <p>Tareas externas</p> <p>Hito externo</p> <p>Fecha limite</p> <p>Progreso</p> <p>Progreso manual</p> |
| <p>Proyecto: Proyecto 1-FRANCISC</p> <p>Fecha: mar 22/10/24</p> | | | |

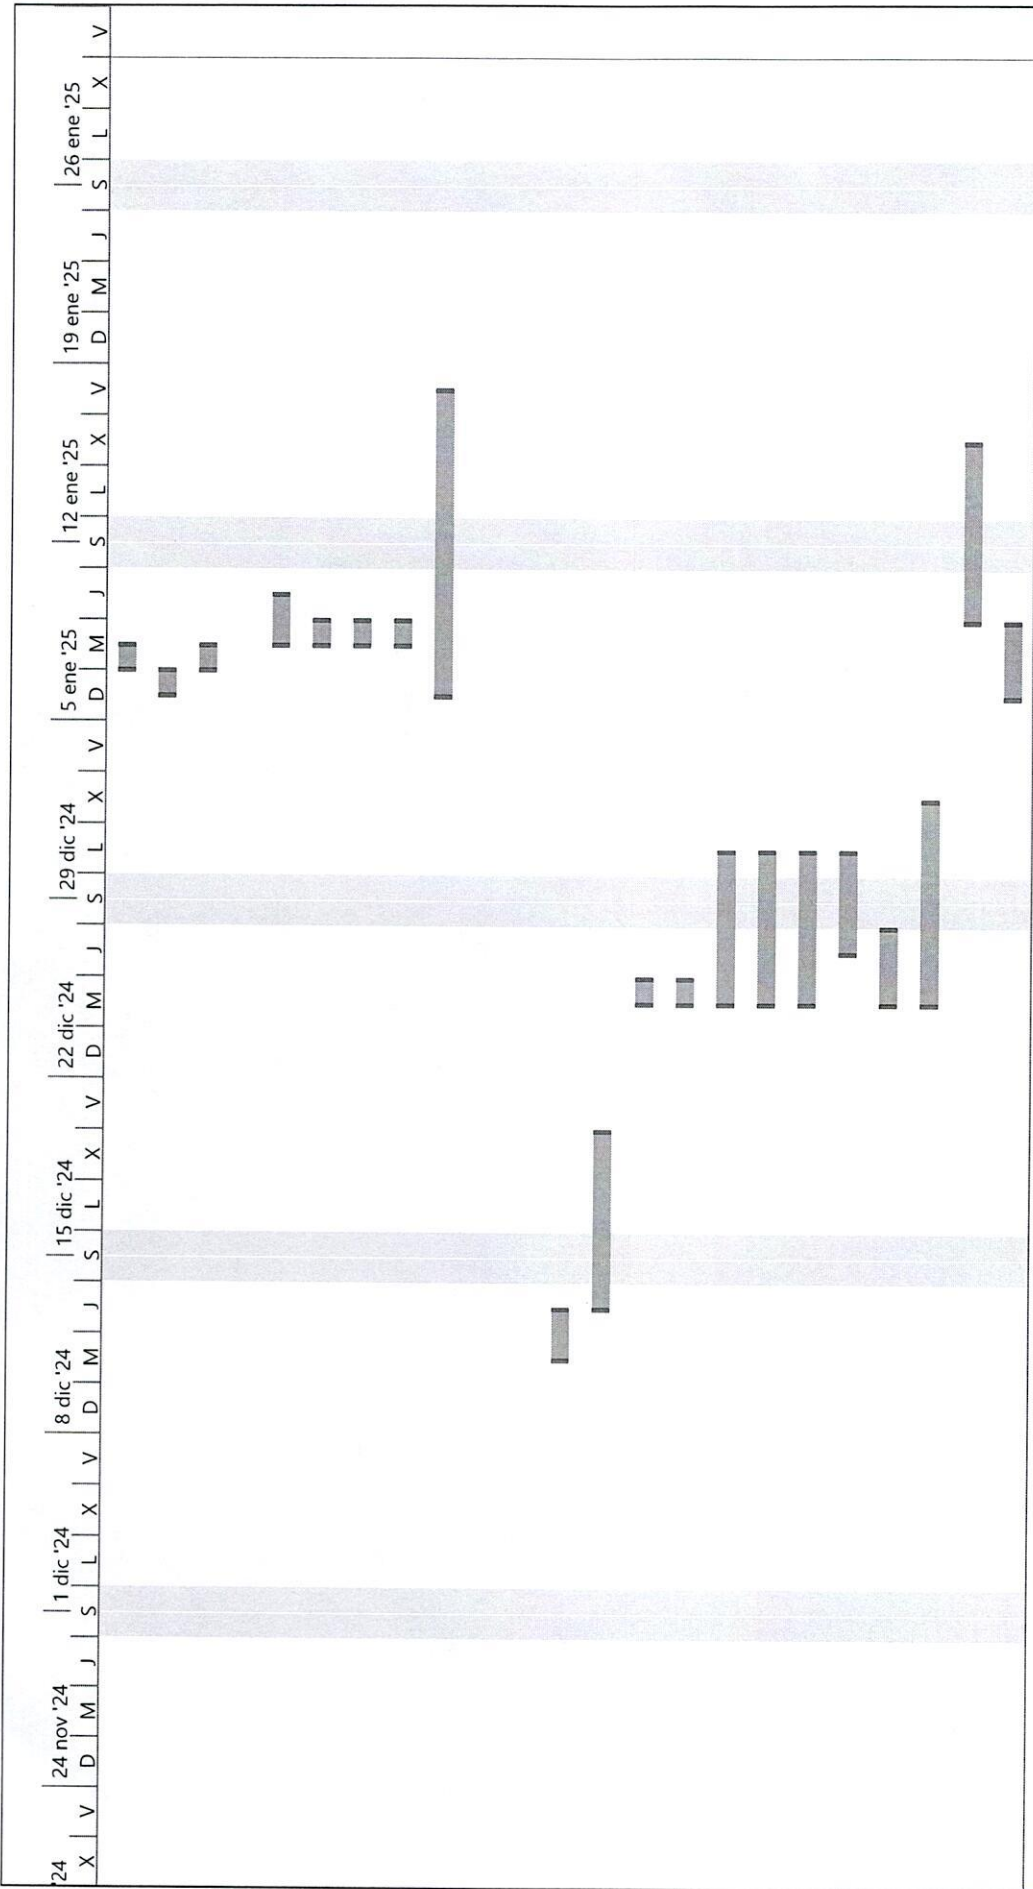

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>24 X V D M J S L X 1 dic '24</p> <p>8 dic '24 V D M J S L X 15 dic '24</p> <p>22 dic '24 V D M J S L X 29 dic '24</p> <p>5 ene '25 V D M J S L X 12 ene '25</p> <p>19 ene '25 V D M J S L X 26 ene '25</p> <p>X V</p> | <p>Tarea</p> <p>División</p> <p>Hito</p> <p>Resumen</p> <p>Resumen del proyecto</p> <p>Tarea inactiva</p> <p>Hito inactivo</p> | <p>Resumen inactivo</p> <p>Tarea manual</p> <p>solo duración</p> <p>Informe de resumen manual</p> <p>Resumen manual</p> <p>solo el comienzo</p> <p>solo fin</p> | <p>Tareas externas</p> <p>Hito externo</p> <p>Fecha limite</p> <p>Progreso</p> <p>Progreso manual</p> |
|--|--|---|---|

Proyecto: Proyecto.1-FRANCISC
 Fecha: mar 22/10/24

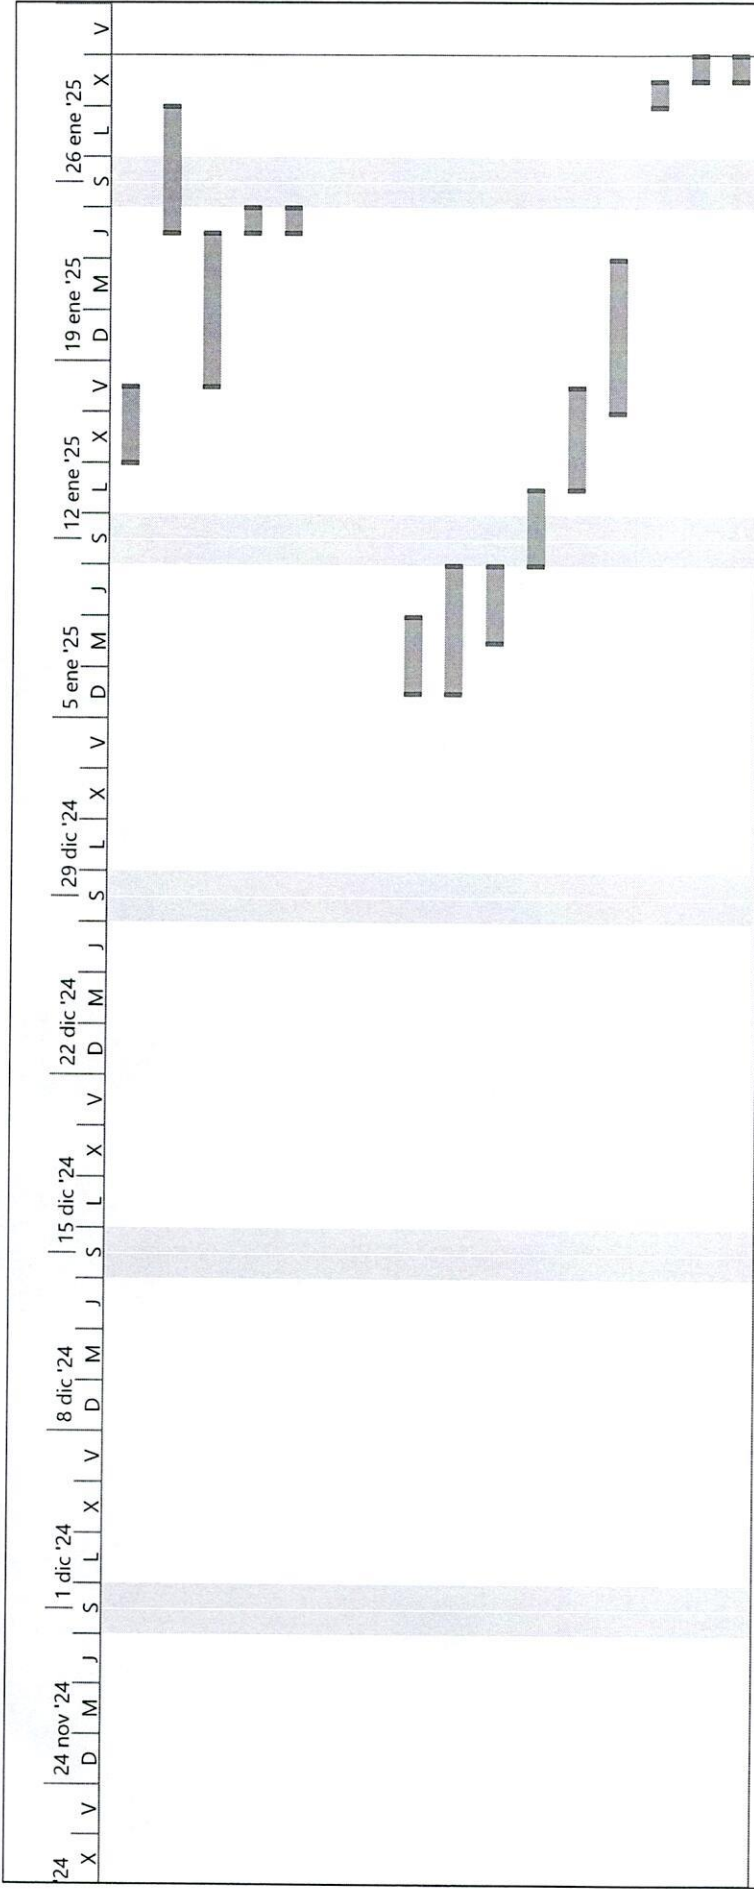

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>Proyecto: Proyecto 1-FRANCISC Fecha: mar 22/10/24</p> | <p>Tarea</p> <p>División</p> <p>Hito</p> <p>Resumen</p> <p>Resumen del proyecto</p> <p>Tarea inactiva</p> <p>Hito inactivo</p> | <p>Resumen inactivo</p> <p>Tarea manual</p> <p>solo duracion</p> <p>Informe de resumen manual</p> <p>Resumen manual</p> <p>solo el comienzo</p> <p>solo fin</p> | <p>Tareas externas</p> <p>Hito externo</p> <p>Fecha limite</p> <p>Progreso</p> <p>Progreso manual</p> |
|---|--|---|---|

La energía sostenible del país

Arq. Francis Paula Jáquez
Codia NO.36138



Por el Contratista:

Ing. Mirna Alexandra Ramirez Peña
Dirección Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles

Por EGEHID:

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), hace formal el inicio de la obra: **CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA AMIAMA GOMEZ, MUNICIPIO AMIAMA GOMEZ, PROVINCIA AZUA, contrato NO.174/2021**, la cual será realizada por **ARQ. FRANCIS PAULA JAQUEZ**, y cuyo plazo de ejecución según el contrato, en su cláusula 7, es de once (11) meses a partir de la firma de esta acta. Dichos trabajos se iniciarán el **lunes 15 del mes de mayo del año dos mil veintitres (2023)**.

ACTA DE INICIO

15 de mayo 2023
Azua, R.D

**EMPRESA DE GENERACIÓN
HIDROELECTRICA DOMINICANA**
Dirección Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles

