


ID	Task	Task Name	Duration	March	April	May	June	July	August
1		CUARTEL MILITAR LOPEZ ANGOSTURA	60 days?						
2	✓	PARTIDAS GENERALES	1 day?						
6									
7	✓	MOVIMIENTO DE MATERIALES	1 day?						
12									
13	✓	HORMIGON ARMADO EN:	1 day?						
22									
23	✓	MUROS DE BLOQUES	1 day?						
25									
26	✓	TERMINACION DE SUPERFICIES	1 day?						
32									
33		TERMINACION DE TECHO	2 days						
34	✓	Fino de techo plano	1 day						
35	✓	Antepecho terminado muro bloque 6", H=0.60m	1 day						
36	✓	Zabaleta en techo	1 day						
37		Impermeabilizante manto asfaltico granular 3mr	2 days						
38	✓	Desgüe en techo de 3"	1 day						
39									
40		PUERTAS Y VENTANAS	15 days						
41		Ventana salomonica de aluminio AA	5 days						
42		Puerta polimetal (0.80m y 0.70m x 2.10m) en b	5 days						
43		Puerta en closet tipo libro	2 days						
44		Gabinete de piso en pino tratado	3 days						
45		Gabinete de pared en pino tratado	3 days						
46		Topo de granito natural en cocina	2 days						
47									
48		PINTURA	15 days						
49		Economica en techo	3 days						
50		Acrilica en muros exteriores	5 days						
51		Semiglos en muros interiores	7 days						
52									
53		INSTALACIONES SANITARIAS	50 days?						



ID	Task	Task Name	Duration	March	April	May	June	July	August
54	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inodoro AS blanco c/tapa, incl. Sum y col.	15 days					
55	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lavamanos royal blanco, icl. Mezcladora, sum,	3 days					
56	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fregadero dos bocas de acero inox., sum. Y col	2 days					
57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desague de piso	1 day					
58	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ventilacion de 3"	1 day?					
59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trampa de grasa	5 days					
60	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Registro 0.60mx0.60m	5 days					
61	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pileta de ceramica, incl. Ducha	3 days					
62	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Camara septica 2.0x3.0x2.0m	10 days					
63	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filtrante de 10" encamizado de 8"	10 days					
64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desagues de techo Ø4" PVC	1 day					
65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acometida de agua potable	1 day					
66	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tuberia de arrastre de 4" SDR-41 y piezas	1 day?					
67	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mano de obra plomeria	50 days					
68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INSTALACIONES ELECTRICAS	27.5 days?					
69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luces cenitales	5 days					
70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Interruptores sencillos	2 days					
71	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Interruptores doble	2 days					
72	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tomacorriente 110V	2 days					
73	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salidas de Telefono	1 day					
74	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salidas de TV	1 day					
75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Salida de data	1 day					
76	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampara Exterior	1 day					
77	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tuberias soterradas y piezas especiales	10 days					
78	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Panel de distribucion de 4"x8"	1 day?					
79	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Conexión	1 day?					
80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
81	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PISOS Y CERAMICAS	3 days?					
82	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piso en porcelanato importado 0.40m x 0.40m,	1 day?					
83	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceramicas importadas en pared de baños	1 day?					
84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceramicas importadas en cocina	1 day?					
85	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

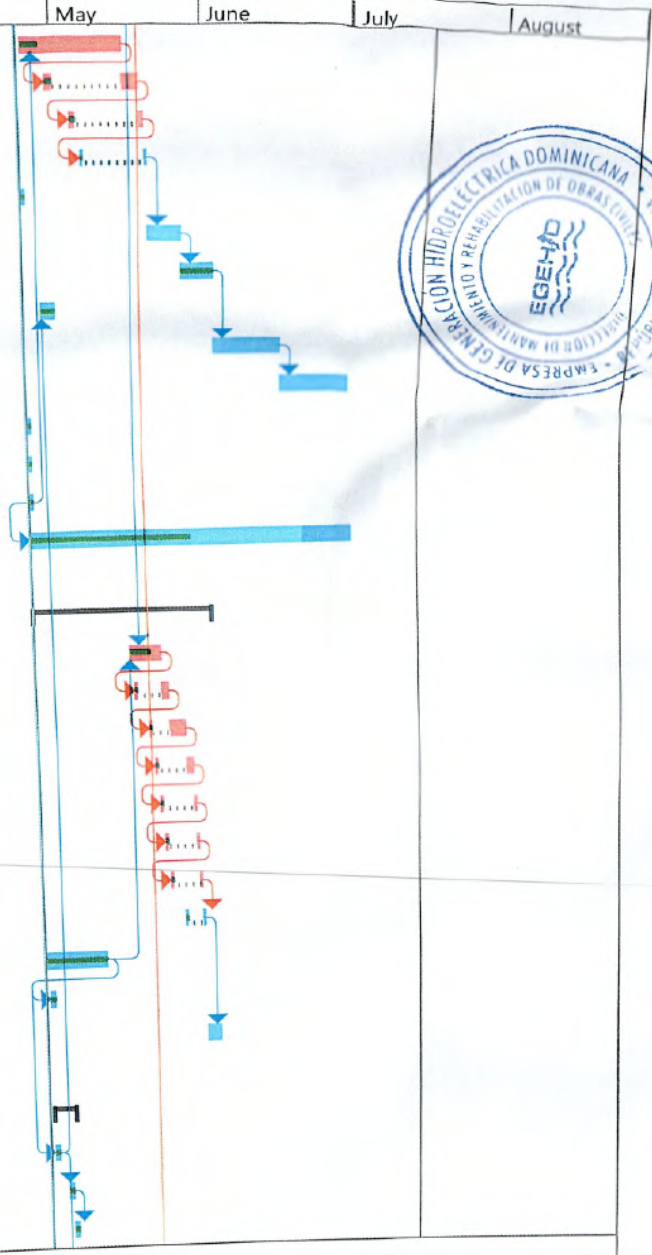

ID	Task	Task Name	Duration	March	April	May	June	July	August
86	✓	Zocalo de piso	1 day?						
87									
88		VARIOS	6 days						
89		Gramma, plantas ornamentales area exterior	3 days						
90		Limpieza final	3 days						
91									
92		VERJA DE BLOQUES	38 days?						
93		TRABAJO PRELIMINARES	1 day?						
94		Limpieza y replanteo	1 day?						
95									
96		MOVIMIENTO DE TIERRA	11 days						
97		Excavacion zapata en muro	3 days						
98		Relleno de reposicion	2 days						
99		Bote de material de excavacion	1 day						
100									
101		HORMIGON ARMADO EN:	5 days						
102		Zapata de muros	5 days						
103		Zapata de Columnas C1	2 days						
104		Zapata de Columnas C2	2 days						
105		Columnas 0.15m x 0.20m, 210kg/cm2	3 days						
106		Columnas 0.20m x 0.20m, 210kg/cm2	3 days						
107									
108		MURO DE BLOQUES	14 days						
109		Block de 6" BNP	7 days						
110		Block de 6" SNP	7 days						
111									
112		TERMINACION DE SUPERFICIES	7 days						
113		Pañete maestrado en muros, vigas y columnas	5 days						
114		Cantos generales	2 days						
115									
116		PINTURA	3 days						
117		Pintura Acrilica en muros, vigas y columnas	3 days						



ID	Task	Task Name	Duration	March	April	May	June	July	August
118									
119		PUERTAS Y MALLAS	10 days						
120		Malla ciclónica de 6"	5 days						
121		Puertas acceso y vehicular a dos hojas	3 days						
122		Puerta en malla	2 days						
123		Alambrado de puas	2 days						
124									
125		MISCELANEOS	2 days?						
126		Acera de acceso	1 day?						
127		Acera perimetral	1 day?						
128		Asta de bandera incl.base	1 day?						
129									
130		ADICIONALES	1 day?						





Project: CRONO
Date: Thu 4/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
Inactive Task		Start-only		Progress	
Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	
