



Id	Modi de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	20 oct '24				27 oct '24				3 nov '24				10 nov '24				17 nov '24				
						S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J	S	L	X	V	D	M	J
24																										
25	★	BASE PARA TABLERO (2 UDS)																								
26	★	Replanteo	1 día	mar 26/11/24	mar 26/11/24																					
27	★	Excavación Zapata	5 días	mié 27/11/24	mar 3/12/24																					
28	★	Relleno de Reposición	1 día	mar 10/12/24	mar 10/12/24																					
29	★	Bote de material	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24																					
30	★	Hormigón en zapata de base	2 días	mié 4/12/24	jue 5/12/24																					
31	★	Hormigón en poste	3 días	vie 6/12/24	mar 10/12/24																					
32	★	Pañete	3 días	jue 12/12/24	lun 16/12/24																					
33	★	Cantos	3 días	jue 12/12/24	lun 16/12/24																					
34	★	Fraguache	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24																					
35	★	Pintura Acrílica	1 día	mar 14/1/25	mar 14/1/25																					
36																										
37	★	GRADERIAS																								
38	★	Replanteo	1 día	mié 11/12/24	mié 11/12/24																					
39	★	Bote de material de excavación	1 día	mar 17/12/24	mar 17/12/24																					
40	★	Excavación zapata de muro	3 días	jue 12/12/24	lun 16/12/24																					
41	★	Relleno Compactado	1 día	mié 18/12/24	mié 18/12/24																					
42	★	Relleno de reposicion en muros	1 día	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24																					
43	★	Bote de material	1 día	lun 30/12/24	lun 30/12/24																					
44	★	Hormigón armado en muros	2 días	mar 17/12/24	mié 18/12/24																					
45	★	Hormigón simpme en escalones	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24																					

Proyecto: Proyecto1-FRANCISC
 Fecha: mar 22/10/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

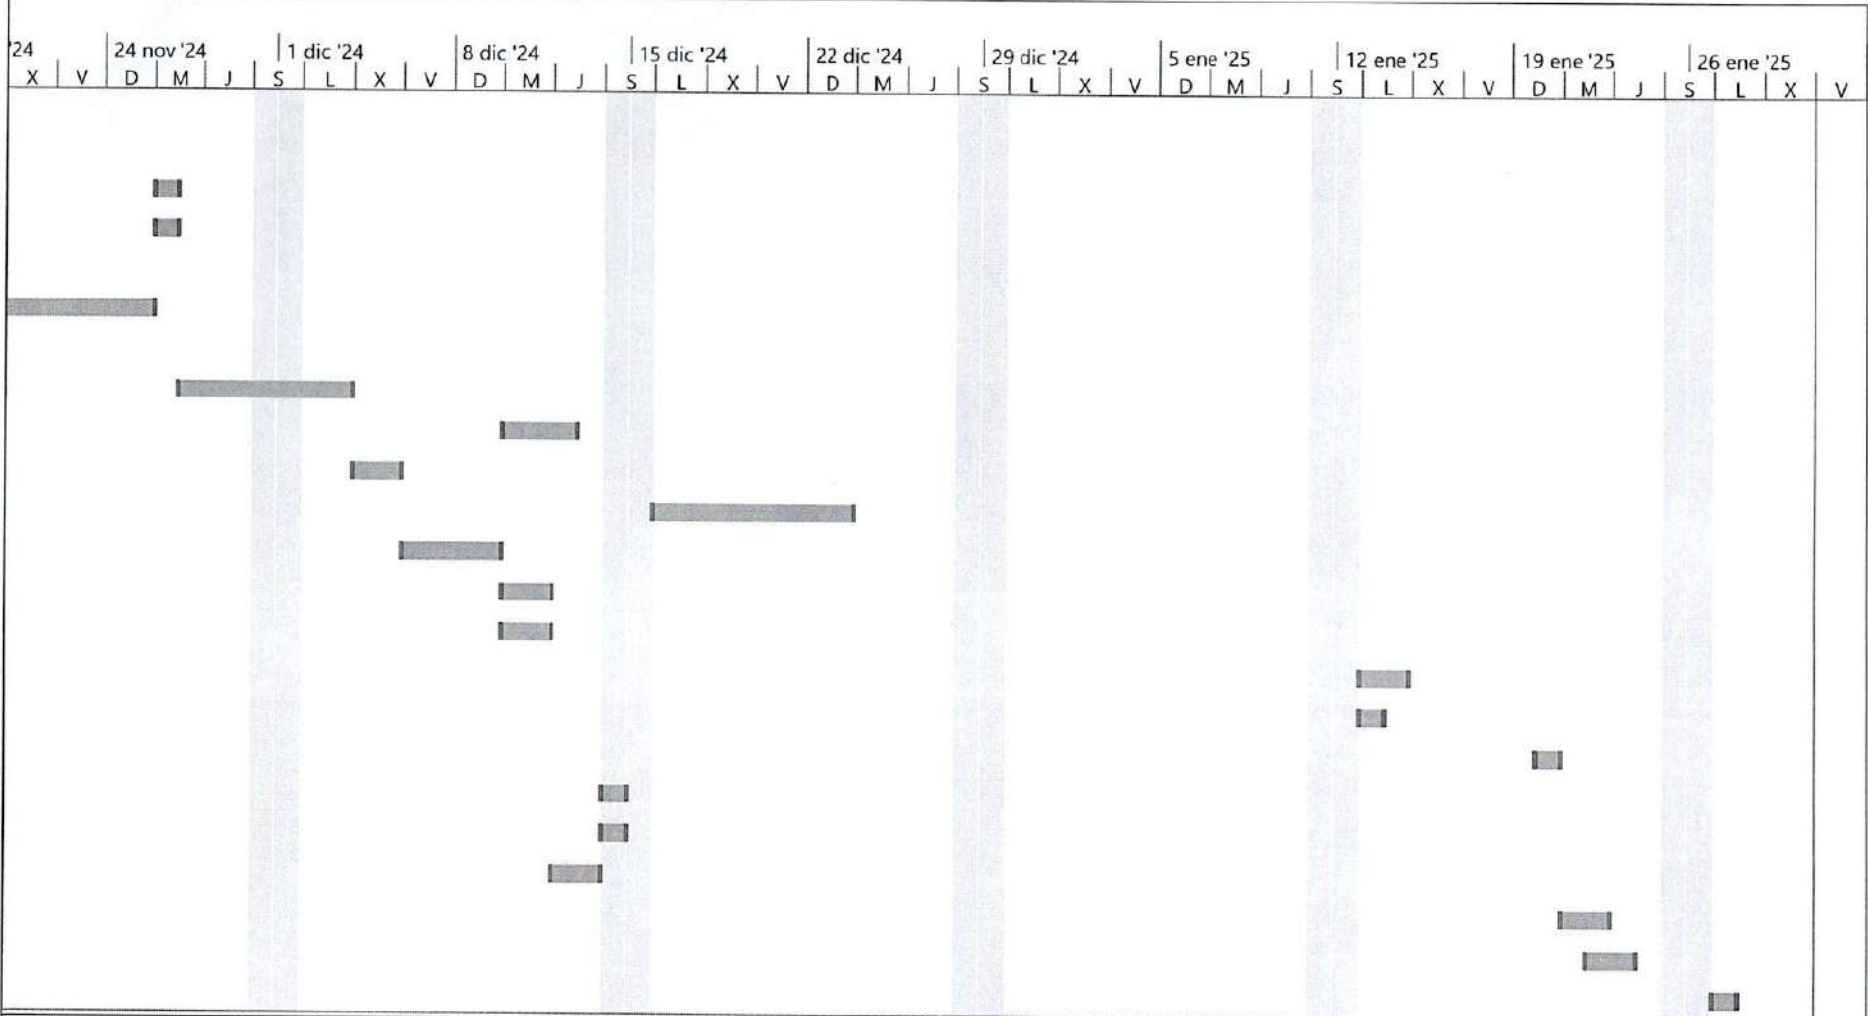


Proyecto: Proyecto1-FRANCISC Fecha: mar 22/10/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

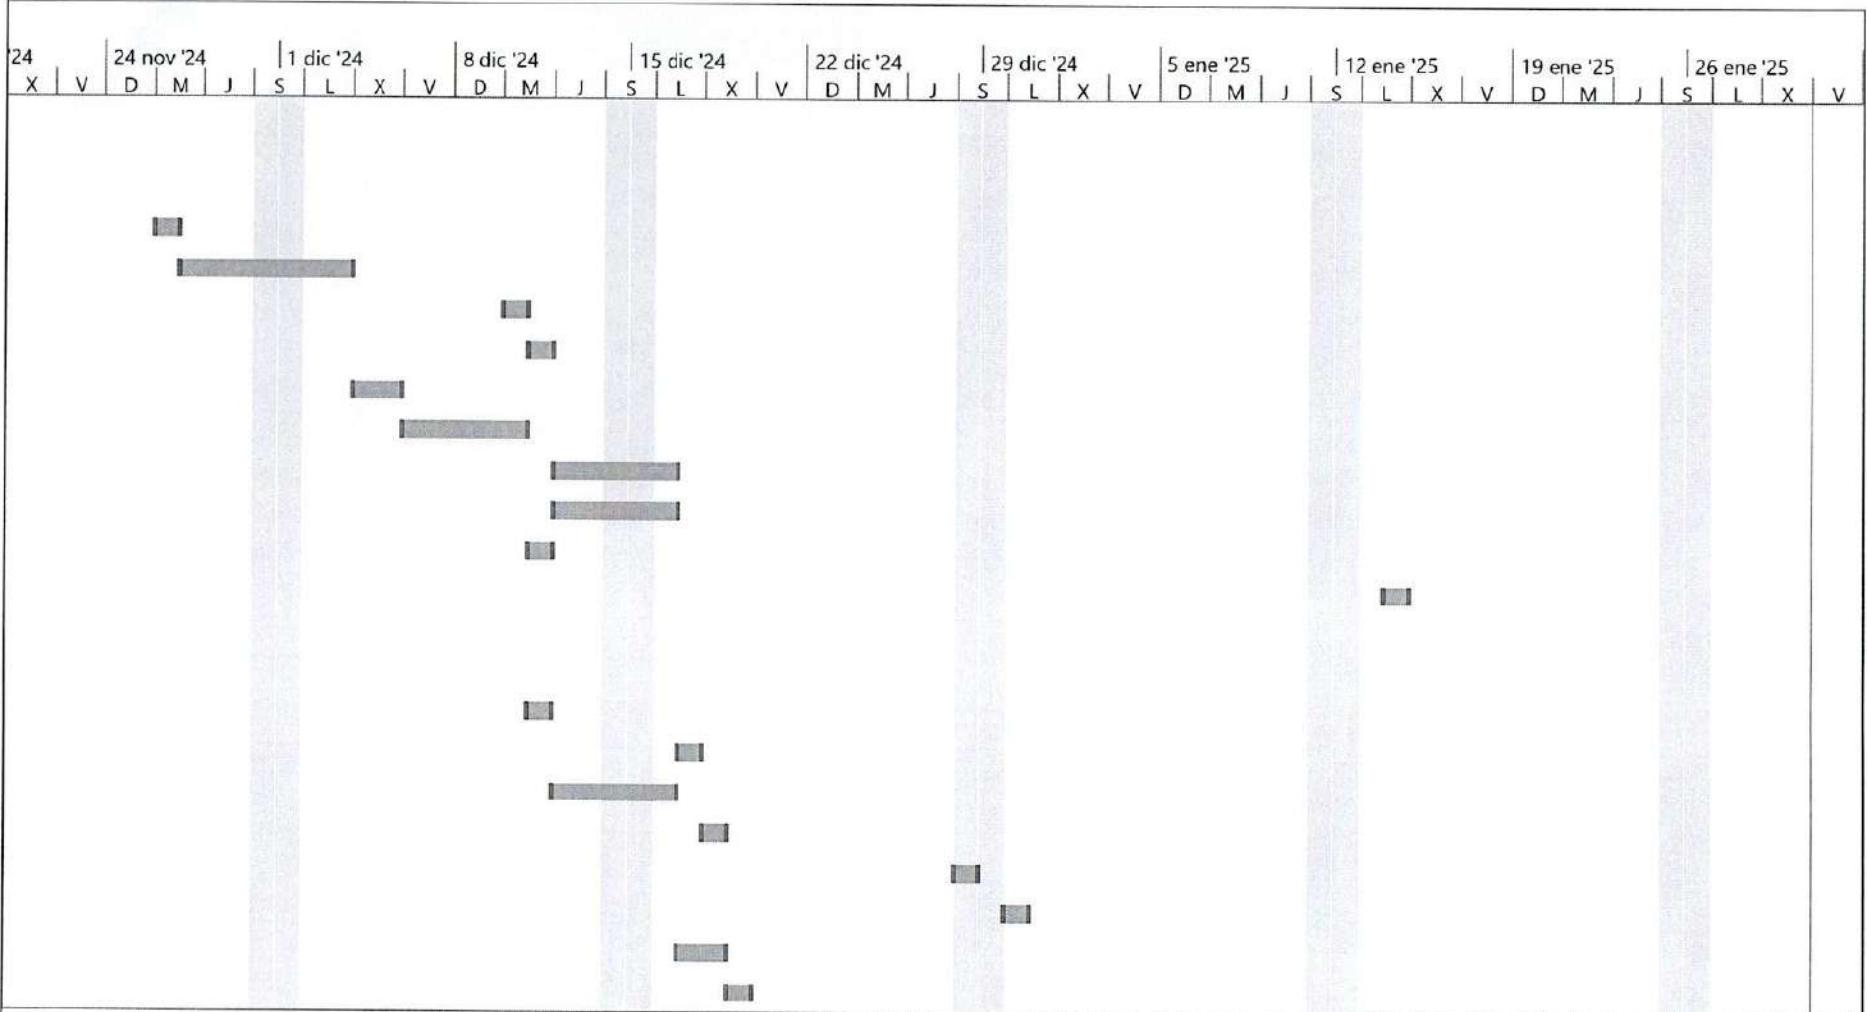

Proyecto: Proyecto1-FRANCISC Fecha: mar 22/10/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

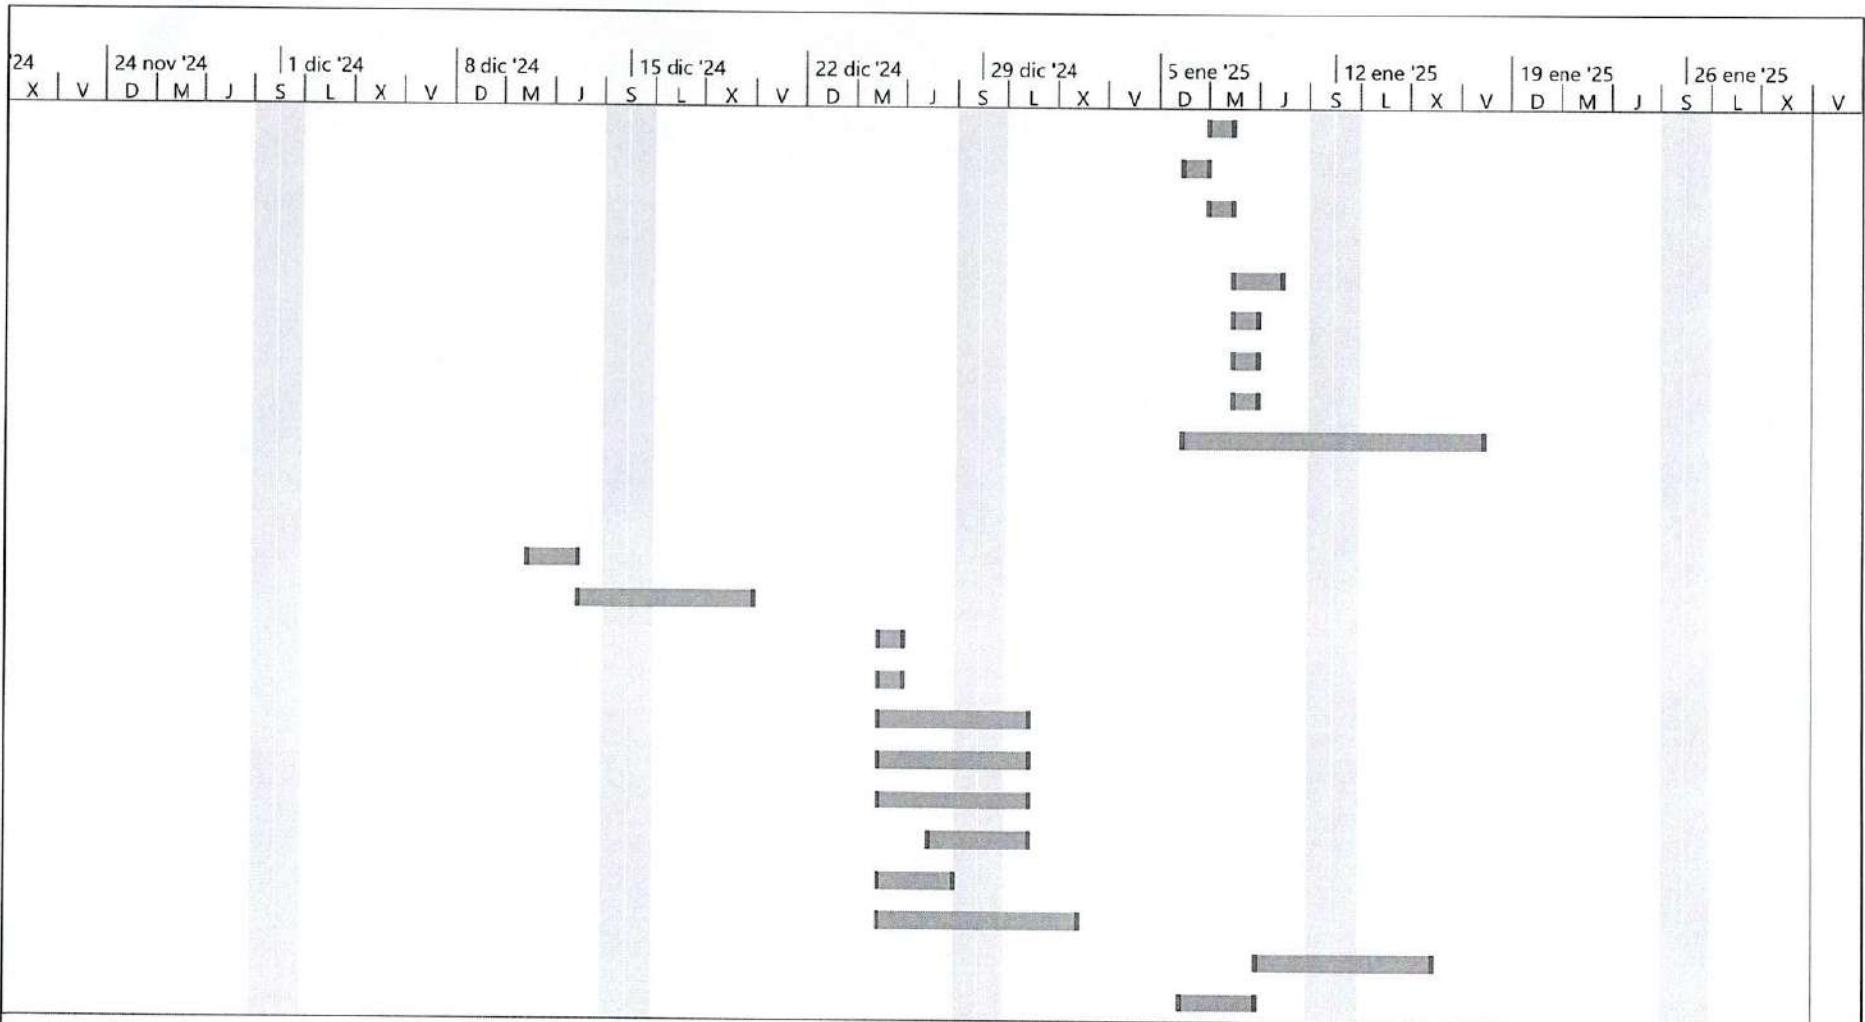

Proyecto: Proyecto1-FRANCISC Fecha: mar 22/10/24	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

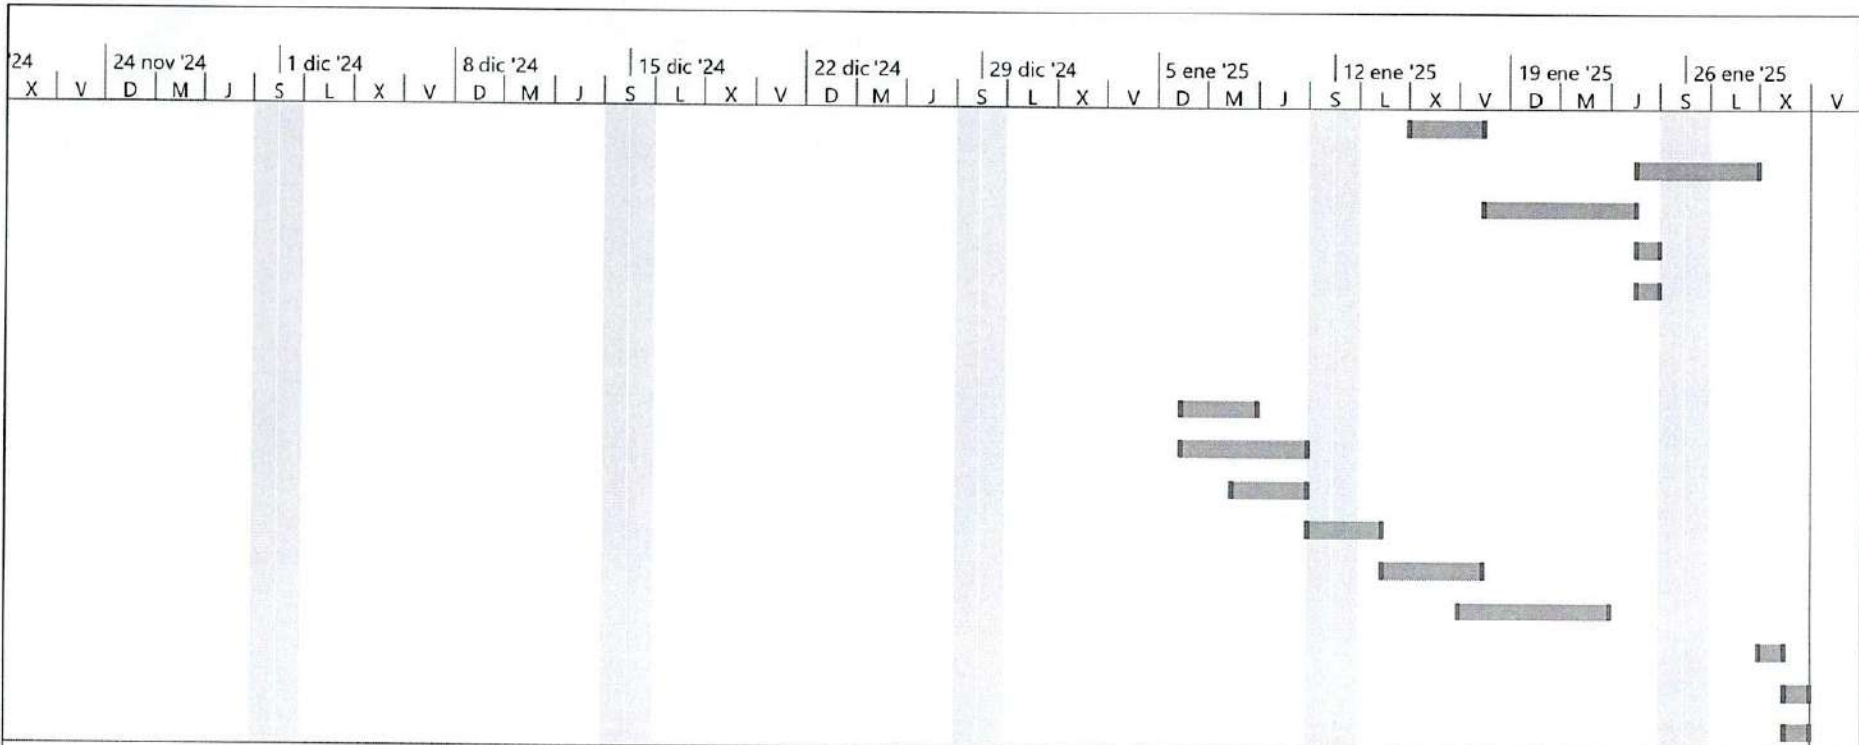

Proyecto: Proyecto1-FRANCISC
 Fecha: mar 22/10/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha limite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

15 de mayo 2023
Azua, R.D

ACTA DE INICIO

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), hace formal el inicio de la obra: **CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA AMIAMA GOMEZ, MUNICIPIO AMIAMA GOMEZ, PROVINCIA AZUA, Contrato No.174/2021**, la cual será realizada por **ARQ. FRANCIS PAULA JAQUEZ**, y cuyo plazo de ejecución según el contrato, en su cláusula 7, es de once (11) meses a partir de la firma de esta acta.

Dichos trabajos se iniciarán el **lunes 15 del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023)**.

Por EGEHID:

Ing. Mirna Alexandra Ramirez Peña
Dirección Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles

Por el Contratista:



Arq. Francis Paula Jáquez
Codia No.36138
