

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOEL.

Id	Nombre de Tarea	Duración	Comienzo		Fin	
			Inicio	Fin	Inicio	Fin
1	REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO	428 días	lun 8/11/21	mié 26/4/23	octubre	mayo
2	Partidas Generales:	132 días	lun 8/11/21	mié 27/4/22		
3	Replanteo	1 día	lun 8/11/21	lun 8/11/21		
4	Caseta de Materiales	3 días	lun 25/4/22	mié 27/4/22		
5	Letrero en Obra (Señales Informativa 48" x 96")	1 día	lun 14/2/22	lun 14/2/22		
6	Impermeabilización de techo	99 días	sáb 12/2/22	jue 9/6/22		
7	Preparación de Superficie. Incluye retiro y bote de lona vieja	2 días	sáb 12/2/22	lun 14/2/22		
8	Suministro y colocación de Impermeabilizante elastomérico con tela de refuerzo	4 días	lun 6/6/22	jue 9/6/22		
9	Remoción	56 días	mar 8/2/22	vie 15/4/22		
10	Remoción de pañete en techo	3 días	lun 14/2/22	mié 16/2/22		
11	Remoción de cerámica en pared de baños	3 días	mié 13/4/22	vie 15/4/22		
12	Remoción de cerámica en piso de baños	2 días	mar 8/2/22	mié 9/2/22		
13	Bote de material de remoción a mano	6 días	vie 11/2/22	jue 17/2/22		
14	Suministro y Colocacion de:	290 días	mar 15/3/22	vie 24/2/23		
15	Pañete en techo	4 días	mar 15/3/22	vie 18/3/22		
16	Cerámica en pared de baños (20x20)cm, h=1.80m	5 días	lun 13/2/23	vie 17/2/23		
17	Cerámica en piso de baños (30x30)cm	3 días	lun 20/2/23	mié 22/2/23		
18	Plafond pvc en baños	2 días	jue 23/2/23	vie 24/2/23		
19	Instalaciones Sanitarias:	271 días	mié 13/4/22	vie 3/9/23		
20	Desmontar Inodoro y Lavamanos	1 día	mié 13/4/22	mié 13/4/22		
21	Inodoro mediano Blancos c/Tapa	2 días	lun 27/2/23	mar 28/2/23		
22	Lavamanos pequeño Blanco Incluye Mezcladora	2 días	mié 1/3/23	jue 2/3/23		
23	Accesorios de baños (papelera, jabonera, toallero, porta vaso)	1 día	vie 3/3/23	vie 3/3/23		
24	Plomería general	5 días	lun 6/6/22	vie 10/6/22		
25	Puertas y Ventanas:	311 días	lun 21/2/22	mié 1/3/23		
26	Desmonte de puerta y ventanas existentes	1 día	lun 21/2/22	lun 21/2/22		
27	Suministro y colocación de Puerta de polimetil. Incluye llavín	5 días	lun 20/2/23	vie 24/2/23		



ING. NGOVO

Resumen del proyecto
 Tarea manual
 solo el comienzo
 Fecha límite

División
 Tarea inactiva
 solo fin
 Progreso

Hitos
 Hitos inactivos
 Informe de resumen manual
 Hitos externos
 Progreso manual

1 de 7

CONOTO, SRL

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
28	Ventana corredera de aluminio y vidrio	4 días	vie 24/2/23	mié 1/3/23
29	Pintura:	20 días	lun 6/3/23	vie 31/3/23
30	Pintura Economica en Techo	3 días	lun 6/3/23	mié 8/3/23
31	Pintura Acrilica en Paredes Exteriores	5 días	jue 9/3/23	mié 15/3/23
32	Pintura Acrilica en Paredes Interior	6 días	jue 16/3/23	jue 23/3/23
33	Pintura Mantenimiento en hierro	6 días	vie 24/3/23	vie 31/3/23
34	Instalaciones Electricas:	19 días	jue 2/3/23	mar 28/3/23
35	Salida de luces de techo con bombillo	5 días	jue 2/3/23	mié 8/3/23
36	Interruptores Doble	8 días	jue 9/3/23	lun 20/3/23
37	Interruptor Sencillo	3 días	mar 21/3/23	jue 23/3/23
38	Tomacorriente Doble	1 día	vie 24/3/23	vie 24/3/23
39	Panel de Distribucion de 2 a 4 Circuitos	2 días	lun 27/3/23	mar 28/3/23
40	Mano de obra electrica	19 días	jue 2/3/23	mar 28/3/23
41	Limpeza Final:	2 días	mar 7/6/22	mié 8/6/22
42	Limpeza final	2 días	mar 7/6/22	mié 8/6/22
43	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA	91 días	vie 4/3/22	lun 20/6/22
44	Trabajos Preliminares	1 día	vie 4/3/22	vie 4/3/22
45	Replanteo	1 día	vie 4/3/22	vie 4/3/22
46	Movimiento de Tierra	14 días	vie 4/3/22	lun 21/3/22
47	Excavación Zapata de muros	1 día	vie 4/3/22	vie 4/3/22
48	Excavación Zapata de columnas.	1 día	vie 4/3/22	vie 4/3/22
49	Relleno de Reposición(Compacción Manual)	1 día	sáb 19/3/22	sáb 19/3/22
50	Bote de material a mano	1 día	lun 21/3/22	lun 21/3/22
51	Horrigón Armado 210 KG/CM2 EN:	10 días	sáb 5/3/22	jue 17/3/22
52	Zapata de Muros, ACERO 3Ø3/8" Y 3/8" A 0.20M	7 días	sáb 5/3/22	lun 14/3/22
53	Zapata de Columnas C1,Acero Ø1/2"a 0.20M AD(0.6*0.6*0.20	7 días	sáb 5/3/22	lun 14/3/22



CENTRO COMUNAL
ARROYO TORO

Tarea: █ Resumen del proyecto

División: █ Tarea inactiva

Hito: █ Hito inactivo

Resumen: █ Resumen inactivo

Tarea manual: █ solo el comienzo

Informe de resumen manual: █ solo fin

Resumen manual: █ Tareas externas

Hito externo: █ Hito externo

Fecha límite: █ Progreso

Progreso manual: █ Progreso manual

ING. NOVO 2 de 7

CONOTO, SRL

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo
54	Columnas C1(0.20X0.20)m, Acero 4Ø1/2" y 3/8" A.0.20M, altura =2.63m	3 días	mar 15/3/22	jun 17/3/22																				
55	Muros de Bloques	1 día	mar 22/3/22	mar 22/3/22																				
56	Bloques de 0.15 M, Ø3/8" A.0.80 M cámara Llena BNP, h= 0.40 m	1 día	mar 22/3/22	mar 22/3/22																				
57	Bloques de 0.15 M, Ø3/8" A.0.80 M cámara Llena SNP, altura=0.40m	1 día	mar 22/3/22	mar 22/3/22																				
58	Pañete	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22																				
59	Pañete muros y columnas	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22																				
60	Zabaleta doble	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22																				
61	Fraguache muros y columnas	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22																				
62	Cantos	1 día	vie 25/3/22	vie 25/3/22																				
63	Verja en Malla Ciclónica	1 día	jun 24/3/22	jun 24/3/22																				
64	Malla Ciclónica de 6 pies (Suministro e instalación)	1 día	jun 24/3/22	jun 24/3/22																				
65	Suministro y Colocación de Palometas Dobles	1 día	jun 24/3/22	jun 24/3/22																				
66	Pintura:	2 días	mié 1/6/22	jun 2/6/22																				
67	Pintura Acrílica en verja	2 días	mié 1/6/22	jun 2/6/22																				
68	Miscelaneos	7 días	lun 13/6/22	lun 20/6/22																				
69	Jardinería	5 días	lun 13/6/22	vie 17/6/22																				
70	Limpieza Final y Bote	2 días	sáb 18/6/22	lun 20/6/22																				
71	ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS	323 días	mar 8/2/22	jun 2/3/23																				
72	Fino de Techo	12 días	mar 8/2/22	lun 21/2/22																				
73	Remoción de fino de techo	4 días	mar 8/2/22	vie 11/2/22																				
74	Bote de material de remoción a mano	2 días	sáb 12/2/22	lun 14/2/22																				
75	Fino de Techo	1 día	lun 21/2/22	lun 21/2/22																				
76	Pisos	307 días	jun 10/2/22	vie 10/2/23																				
77	Remoción de piso de cerámica y zocalos existente salones	4 días	jun 10/2/22	lun 14/2/22																				
78	Bote de material de remoción piso a mano	3 días	sáb 12/2/22	mar 15/2/22																				



CENTRO COMUNAL
ARROYO TORO

Tarea: [Barra de progreso] Resumen del proyecto
 División: [Barra de progreso] Tarea inactiva
 Hito: [Barra de progreso] Hito inactivo
 Resumen: [Barra de progreso] Resumen inactivo

Tarea manual: [Barra de progreso] solo el comienzo
 solo duración: [Barra de progreso] solo fin
 Informe de resumen manual: [Barra de progreso] Tareas externas
 Resumen manual: [Barra de progreso] Hito externo

Fecha límite: [Barra de progreso]
 Progreso: [Barra de progreso]
 Progreso manual: [Barra de progreso]

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
79	Suministro y colocación de Pisos Porcelanato de 0.40 x 0.40m salones de alta calidad	7 días	lun 30/1/23	mar 7/2/23
80	Suministro y colocación de zocalos de Porcelanato de 0.07mx 0.40m salones	3 días	mié 8/2/23	vie 10/2/23
81	Puertas y Ventanas:	71 días	lun 21/2/22	lun 16/5/22
82	Desmonte de puerta	1 día	mar 22/2/22	mar 22/2/22
83	Desmonte de Ventanas	1 día	lun 21/2/22	lun 21/2/22
84	Hueco en pared para colocación de ventana, incluye Demolicion muro block y Dintel, bote material, pañete en dintel, mocheta y cantos.	17 días	mié 23/2/22	mar 15/3/22
85	Construcción de dintel en ampliación de ventana de (0.15*0.20 x (3.9+2*2)), acero 4Ø3/8" y 3/8" a 0.20	2 días	mié 23/2/22	jue 24/2/22
86	Suministro y colocación de Puerta Principal en Caoba, incluye llavín de (1.45*2.10)m	2 días	sáb 14/5/22	lun 16/5/22
87	ABANICOS DE TECHO	101 días	mar 15/2/22	mar 14/6/22
88	Suministro y Colocación de Abanicos de techo de buena calidad	2 días	lun 13/6/22	mar 14/6/22
89	Desmonte de Abanicos de techo existente	2 días	mar 15/2/22	mié 16/2/22
90	Construcción de Cuneta encajada	9 días	jue 24/2/22	sáb 5/3/22
91	Construcción de cunetas encajada	5 días	sáb 26/2/22	jue 3/3/22
92	Hormigón simple en fondo de cunetas e180 kg/cm2	3 días	jue 3/3/22	sáb 5/3/22
93	Excavación de material inservible para cunetas	2 días	jue 24/2/22	vie 25/2/22
94	Bote de material producto de excavación a mano	1 día	sáb 26/2/22	sáb 26/2/22
95	Reconstrucción Escalones Entrada	314 días	vie 18/2/22	jue 2/3/23
96	Remover ceramica existente	2 días	vie 18/2/22	sáb 19/2/22
97	Bote de material producto de remoción a mano	1 día	sáb 19/2/22	sáb 19/2/22
98	Colocación de Ceramica en exterior en escalones de (0.30X0.30)m	4 días	lun 27/2/23	jue 2/3/23
99	Miscelaneos	304 días	jue 24/2/22	jue 23/2/23
100	Fraguache techo hormigón	1 día	lun 14/3/22	lun 14/3/22



ING. NOVO


Resumen del proyecto Tarea manual solo el comienzo Fecha límite
 Tarea inactiva Informe de resumen manual solo fin Progreso
 Hito inactivo Resumen manual Hitos externos Progreso manual
 Hito activo Resumen inactivo Hito externo

4 de 7

CONOTO, SRL

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO, PROVINCIA MONSEÑOR NOEL.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo
101	Impermeabilizante en los muros interiores	6 días	vie 18/3/22	jue 24/3/22																				
102	Limpieza y desinfección de muros interior y exterior	5 días	jue 24/2/22	mar 1/3/22																				
103	Construcción de Hormigón en área parques con malla electrosoldada. 2.3 x 2.3 x 10 x10, e=0.15m, 210 Kg/cm2	4 días	lun 20/2/23	jue 23/2/23																				
104	Excavación de material inservible para parqueo y encache	3 días	mié 15/2/23	vie 17/2/23																				
105	Bote de material producto de excavación a mano	2 días	vie 20/5/22	sáb 21/5/22																				
106	Encache en talud (8 9x 1.9)m	5 días	mié 25/5/22	lun 30/5/22																				
107	Verja en Malla Ciclónica	2 días	lun 13/2/23	mar 14/2/23																				
108	Puerta de Malla Ciclónica de 6 pies de 1*2.10m (Suministro e Instalación)	2 días	lun 13/2/23	mar 14/2/23																				
109																								
110	FACHADA DEL CENTRO COMUNAL	309 días	mié 13/4/22	mié 26/4/23																				
111	Remoción de losa de hormigón armado en techo inclinado fachada existente. e= 0.12m	3 días	mié 23/11/22	vie 25/11/22																				
112	Remoción de Antepecho en block de 6" fachada existente	2 días	lun 21/11/22	mar 22/11/22																				
113	Remoción de Encache en talud	5 días	mié 13/4/22	lun 18/4/22																				
114	Bote de material de remoción a mano	2 días	mié 13/4/22	jue 14/4/22																				
115	Desmonte de hierro en lateral y frente existentes	1 día	sáb 26/11/22	sáb 26/11/22																				
116	Encache en talud	6 días	mié 13/4/22	mar 19/4/22																				
117	Perforación de piso y colocación de epoxica con colocación de varillas de 3/8" a 0.2m prot de 0.20 m para construcción de muro de block de 6"	1 día	lun 28/11/22	lun 28/11/22																				
118	Uso de Resina epoxica para unir hormigón viejo con nuevo en área muro block	1 día	mar 29/11/22	mar 29/11/22																				
119	Construcción de muro de block de 6" con bastones 3/8" a 0.20 m camara llena, en fachada y laterales	4 días	mié 30/11/22	sáb 3/12/22																				
120	Construcción de losa en fachada con acero 3/8" a 0.20 m AD. e= 0.12 m	5 días	vie 9/12/22	mié 14/12/22																				

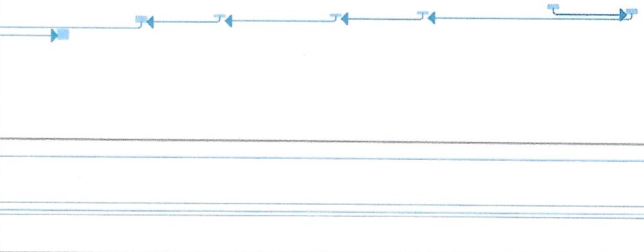

ING. NOVO

CENTRO COMUNAL ARROYO TORO

Tarea: Resumen del proyecto

División: Hito

Resumen inactivo

Tarea manual

Resumen inactivo

Informe de resumen manual

Resumen manual

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

5 de 7

CONOTO, SRL

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	
121	Construcción de viga perimetral en fachada con acero 4 Ø3/8" y est 3/8" a 0.20 m AD(0.15X0.20)M	4 días	lun 5/12/22	jue 8/12/22																					
122	Construcción de antepecho con altura de 0.20 m	2 días	vie 9/12/22	sáb 10/12/22																					
123	Belante pluvial de 3" SDR -4-1	1 día	lun 12/12/22	lun 12/12/22																					
124	Fino de techo plano	2 días	mar 13/12/22	mié 14/12/22																					
125	Zabaleta de techo plano	1 día	jue 15/12/22	jue 15/12/22																					
126	Suministro y colocación de Impermeabilizante elastomérico con tela de refuerzo en fachada	3 días	vie 31/3/23	mar 4/4/23																					
127	Pañete de Losa fachada	2 días	lun 19/12/22	mar 20/12/22																					
128	Pañete de muro interior	2 días	mié 21/12/22	jue 22/12/22																					
129	Pañete de muro exterior según diseño	3 días	vie 23/12/22	lun 26/12/22																					
130	Fraguache muros y Viga	2 días	vie 16/12/22	sáb 17/12/22																					
131	Cantos en fachada	2 días	lun 19/12/22	mar 20/12/22																					
132	Pintura interior y exterior fachada	2 días	vie 24/3/23	lun 27/3/23																					
133	Pintura Economica en Techo fachada	1 día	mar 28/3/23	mar 28/3/23																					
134	Zócalo de porcelanato en entrada	3 días	jue 23/2/23	lun 27/2/23																					
135	Salida de luces de techo con bombillo	3 días	vie 31/3/23	mar 4/4/23																					
136	Interruptores Doble, incluye ranurado pared	6 días	lun 23/1/23	lun 30/1/23																					
137	Tubo 2"SDR-26 electrico,	1 día	mar 31/1/23	mar 31/1/23																					
138	mano de obra electrico	6 días	lun 23/1/23	lun 30/1/23																					
139	Puertas de Hierro entrada, incluye instalacion y llavín, perfil de 2"x2" y barras cuadradas de 5/8" separada a 0.03m, (1.45*2.20)M, marco en perfil de 3" x 2"	2 días	lun 17/4/23	mar 18/4/23																					
140	Letra de Bronce con nombre del Centro Comunal La Alegria Arroyo Toro (35 letras de 8 Pulgadas)	2 días	mar 25/4/23	mié 26/4/23																					
141	Pintura mantenimiento de Techo metalico con andamio	4 días	lun 3/4/23	jue 6/4/23																					
142	Tomacorriente doble para UPS, incluye ranurado pared	2 días	mié 29/3/23	jue 30/3/23																					
143																									



CENTRO COMUNAL
ARROYO TORO

ING. NOVO

6 de 7

CONOTO, SRL

CRONOGRAMA PARA LA REPARACION CENTRO COMUNAL ARROYO TORO, MUNICIPIO JAYACO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	
144	Construcción Jardinera	26 días	lun 20/3/23	lun 24/4/23																					
145	Remocion de aceras existentes y escalones	3 días	lun 20/3/23	mié 22/3/23																					
146	Excavacion zapata muro	2 días	jue 23/3/23	vie 24/3/23																					
147	Bote de material	1 día	lun 27/3/23	lun 27/3/23																					
148	Zapata de Bordillo de muro de block de 6" con acero 3 Ø 3/8" y 3/8" a 0.20 m (180 kg/cm2)(0.45 x 0.20)m	2 días	mar 28/3/23	mié 29/3/23																					
149	Bordillo en Muro de block de Ø6 "acero 3/8" a 0.50 m, cámara llena, altura 0.4m	3 días	jue 30/3/23	lun 3/4/23																					
150	Pañete Bordillo en Muro de block de Ø6	3 días	mar 4/4/23	jue 6/4/23																					
151	Pintura muro Jardinera acrilico exterior	2 días	mié 12/4/23	jue 13/4/23																					
152	Construccion de Cornisa en jardinera	3 días	vie 7/4/23	mar 11/4/23																					
153	Suministro y Colocación de Tu y Yo Rosado	1 día	jue 20/4/23	jue 20/4/23																					
154	Suministro y Colocación de trituradoras enanas	1 día	vie 21/4/23	vie 21/4/23																					
155	Suministro y Colocación de Palma Real pequeña	1 día	lun 24/4/23	lun 24/4/23																					
156	Suministro y Colocación de Tierra Negra (incluye transporte), e=0.30 m	4 días	vie 14/4/23	mié 19/4/23																					



CENTRO COMUNAL
ARROYO TORO

ING. NOVO

Resumen del proyecto

Tarea: [Barra azul]

Division: [Barra azul]

Hito: [Barra azul]

Resumen: [Barra azul]

Resumen inactivo

Tarea inactiva: [Barra gris]

Hito inactivo: [Barra gris]

Resumen inactivo: [Barra gris]

Tarea manual

solo duración: [Barra azul]

Informe de resumen manual: [Barra azul]

Resumen manual: [Barra azul]

solo el comienzo

solo fin: [Barra azul]

Tareas externas: [Barra azul]

Hito externo: [Barra azul]

Fecha límite

Progreso: [Barra azul]

Progreso manual: [Barra azul]

7 de 7

CONOTO, SRL
