



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

NOVIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

3.0 PROYECTO ASFALTADO ENTRADA PRINCIPAL C.H. RIO BLANCO, BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**3.0 PROYECTO ASFALTADO ENTRADA PRINCIPAL C.H. RIO BLANCO,
BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.**






Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	06 de Octubre de 2017
Monto del contrato	RD\$49,643,180.11
Monto del avance (20%)	RD\$9,928,636.00
% Avance estimado hasta la fecha	31.82%
Contratista	Rodson Realty, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en las excavaciones y construcción de cunetas de hormigón simple.

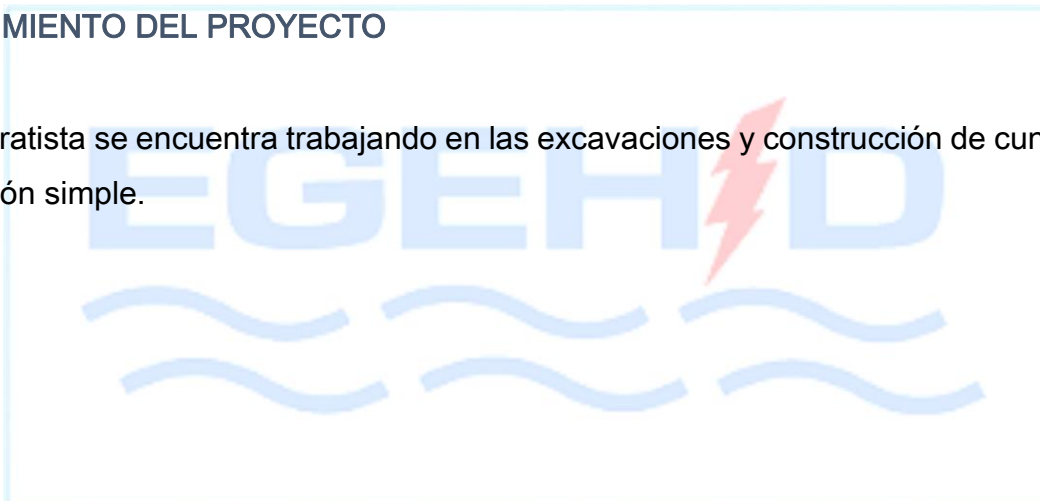







Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

