



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

DICIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

6.0 CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES Y RECONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA CAMBITA-PUEBLECITO, CH AGUACATE, SAN CRISTÓBAL, R.D.....	3
--	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

6.0 CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES Y RECONSTRUCCIÓN
TRAMO CARRETERA CAMBITA-PUEBLECITO, CH AGUACATE, SAN
CRISTÓBAL, R.D.






Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	08 de Diciembre de 2017
Monto del contrato	RD\$43,266,399.92
Monto del avance (20%)	RD\$8,653,279.98
% Avance estimado hasta la fecha	66.26%
Contratista	SOCOMATRA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la construcción de cunetas encachadas, badenes y encache en talud.

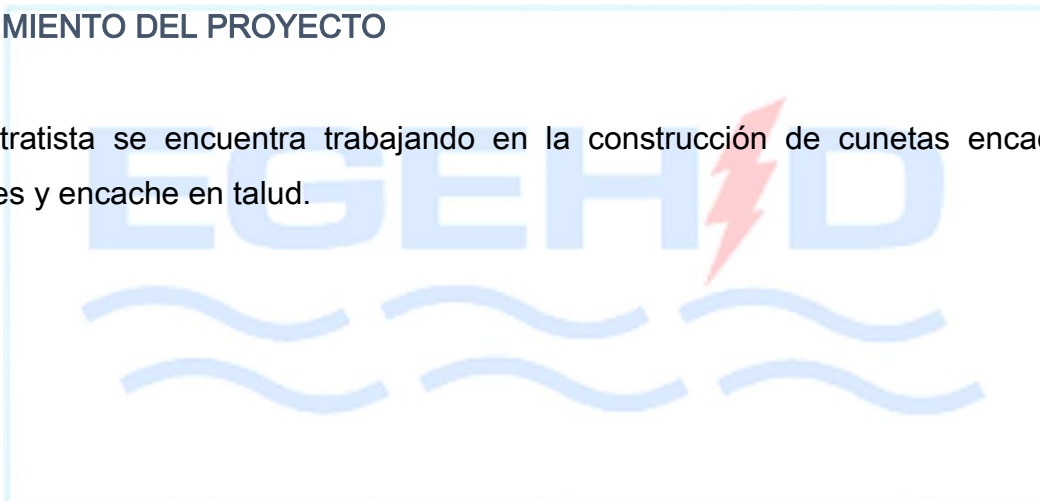





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

