



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

DICIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

21.0 RECONSTRUCCION DE LAS CALLES INTERNAS DE LOS BARRIOS LOS RONZINOS, CRISTO REY, MIRADOR DEL NORTE Y MIRABAL, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, CENTRAL HIDROELECTRICA PALOMINO, PROV. SAN JUAN.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**21.0 RECONSTRUCCION DE LAS CALLES INTERNAS DE LOS
BARRIOS LOS RONZINOS, CRISTO REY, MIRADOR DEL NORTE Y
MIRABAL, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, CENTRAL
HIDROELECTRICA PALOMINO, PROV. SAN JUAN**






Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	01 de Noviembre de 2018
Monto del contrato	RD\$75,984,202.30
Monto del avance (20%)	RD\$15,196,840.46
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	INVERSIONES BOMBARDIER, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra realizando la excavación para conformación y vaciado de contenes.

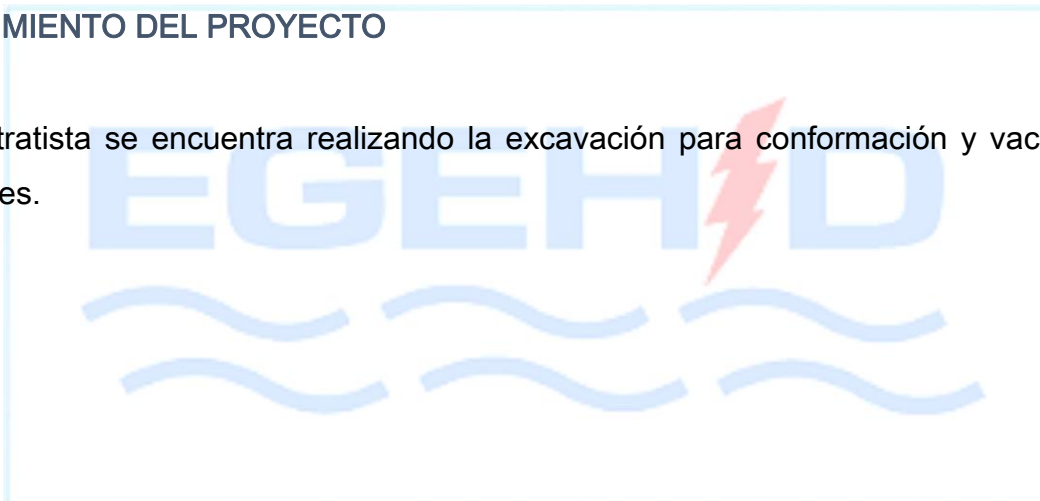

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año del Fomento a las Exportaciones."



