



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
HIDROELÉCTRICO**

Marzo de 2021



1

Elaborado por Ing. Sugely Barreras

Líder en Energía Limpia



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EXPANSIÓN HATILLO, COTUÍ



2

Elaborado por Ing. Sukey Barreras

Líder en Energía Limpia



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Contratista	Consorcio ANDRITZ-RAP.
Avance General	98%
Monto Original del Proyecto USD\$	7,526,195.00
Monto de Contrato con Ordenes de Cambio USD\$	8,430,774.96

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO


Las pruebas de la nueva Unidad del Proyecto Expansión Hatillo fueron suspendidas hasta tanto se realicen modificaciones en el sistema del gobernador de la turbina y Ley de Cierre del distribuidor de ambas Unidades, para reducir las posibles sobre presiones en el conducto forzado, las cuales fueron verificadas entre Las Partes, durante la ejecución de las pruebas conjuntas parciales de las dos Unidades.

A estos fines la EGEHID ordenó estudios transitorios adicionales para las Unidades, así como modificaciones en el sistema actualmente instalado en la Nueva Unidad.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

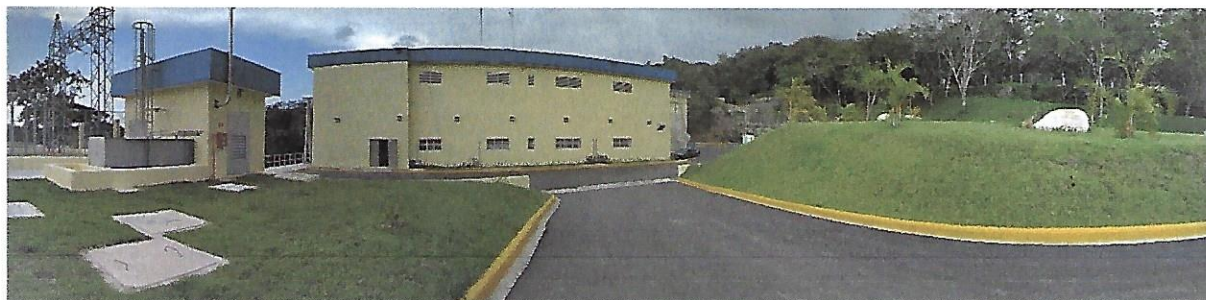

Vista general de la Expansión Central Hatillo.

