



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
HIDROELÉCTRICO**

Marzo de 2021



1

Elaborado por Ing. Sugey Barreras

Líder en Energía Limpia



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

**PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION PRESA GUAYUBÍN,
PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ.**



2

Elaborado por Ing. Sugey Barreras

Líder en Energía Limpia



FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Contratista	Consortio de Empresas Reunidas de Construcción y Servicios CERCONS-RD. (construcción) RD\$	Consortio ENGECORPS-TYPSA-IECCA (ETI)(supervisión) US\$
Avance General	7%	75.72%,
Monto Original del Proyecto RD\$	2,141,509,601.85	3,802,759.49
Monto Actualizado del Proyecto RD\$	0.00	5,704,040.55
Monto Cubicado a la Fecha RD\$/USD	255,467,802.01	4,318,914.60

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION

En proceso de la elaboración del diseño básico revisado y la Ingeniería de Detalle para la construcción y ser sometido para su aprobación por la Supervisión (ETI)-EGEHID. Se le ha autorizado la ejecución de sondeos adicionales en el Dique de Cierre, requeridos para la optimización del diseño básico revisado, se ha actualizado la topografía, se continua con las excavaciones del estribo derecho e izquierdo de la presa, los accesos provisionales y sus obras de arte, se trabaja en la parte final de las instalaciones de las plantas industriales para su prueba y puesta en operación.

Los trabajos de construcción fueron paralizados mediante Acta de Alguacil del Ministerio de Medio Ambiente en fecha 08/dic/2020, hasta tanto sea aprobada la Declaratoria de Impacto Ambiental del proyecto, en el mes de marzo/2021 los trabajos de construcción continua paralizados, se sigue trabajando en la ingeniería de detalle para la construcción de las obras objeto de este contrato.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

En fecha 26 de marzo de 2021 se realizó la segunda y final Vista Publica para la obtención de la Licencia Ambiental del Proyecto, con la representación de las autoridades congresuales, locales, municipales, juntas de vecinos, junta de regante y otros representantes comunitarios, a los fines de presentar las conclusiones del informe de EIA de manera formal a los comunitarios, explicando sobre las áreas a intervenir, los beneficios que conlleva la implementación de este Proyecto para la zona, entre otras facilidades.


Se continua en proceso de estudios y análisis por parte de la Supervisión y la EGEHID de la reclamación sometida por El Contratista por Paralización de Obra debido a causas no imputables a ellos.

Sigue el proceso de adquisición de los terrenos que serán afectados con la implementación del Proyecto.

SUPERVISION

La Empresa Consultora y de Supervisión, se encuentra en el desarrollo de la Fase II, Supervisión en donde actualmente están en proceso de revisión del diseño básico de los componentes de la obra Presa sobre el rio Guayubin, y la continuación de la revisión de la ingeniería de detalle de los accesos, y obra de desvío.



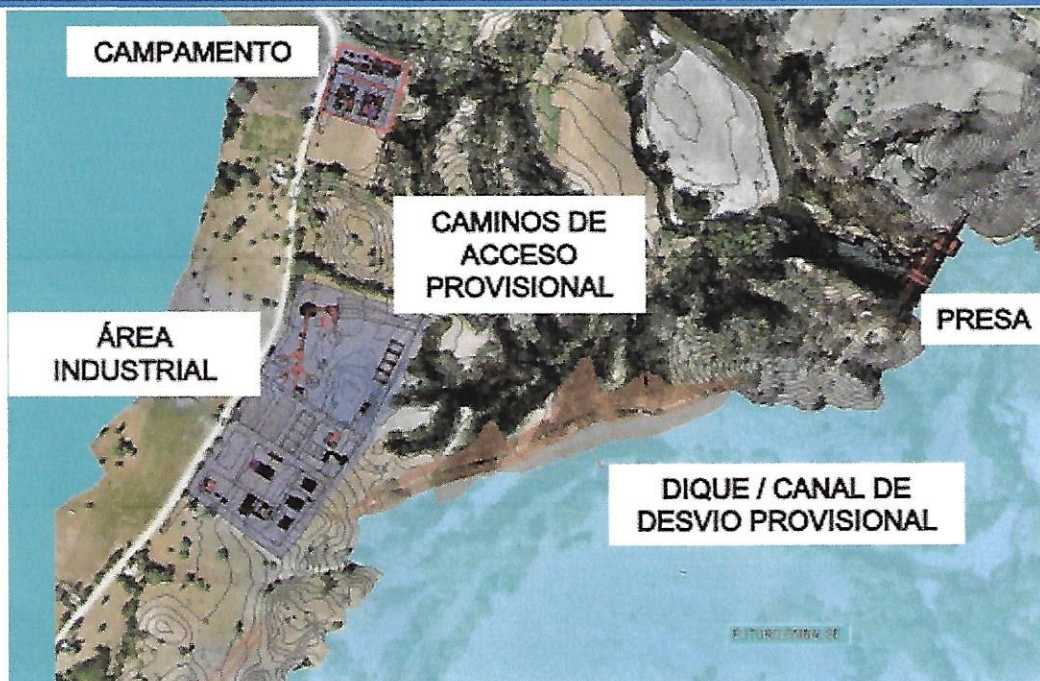

Esquema general de las Instalaciones y obras





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

Vistas de Plantas
Industriales



Vista Equipos de Plantas
Industriales





Vista Excavación estribo izquierdo y estribo derecho presa

