



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
HIDROELÉCTRICO**

Enero de 2021



1

Elaborado por Ing. Sugey Barreras

Líder en Energía Limpia



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO

**PROYECTO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL
DESLIZAMIENTO DE TIERRAS LOCALIZADO EN EL EMBALSE DE LA
PRESA DE PINALITO.**



2

Elaborado por Ing. Sugey Barreras

Líder en Energía Limpia



FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Contratista	Constructora Esparza, S.R.L.
Avance General	92%
Monto Original del Proyecto RD\$	82,428,680.69
Monto Cubicado a la fecha RD\$	79,232,189.48

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El comportamiento geológico de la zona ha obligado a la EGEHID a redefinir el diseño de las estructuras construidas de acceso al sitio de presa, cuyo diseño está pendiente de conclusión.

En ese sentido, en este mes de enero/2021, se elaboró el diseño adecuado a las condiciones geológicas del sitio, el cual fue entregado al Contratista para su ejecución. En espera de la Removilización del Contratista para la continuidad de los trabajos.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
DIRECCION DE DESARROLLO HIDROELECTRICO




Fotos de parte de los trabajos de estabilización.





Demolición losa baden de acceso a presa

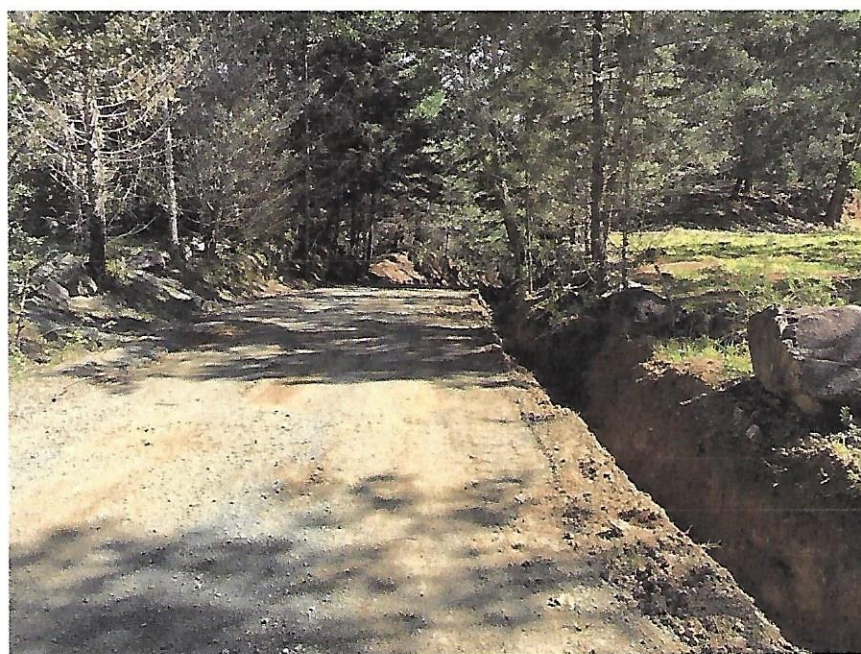

Excavación cuneta de drenaje
