



ELABORADO POR: ING. ECHÉ CASTELLÓ
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
Octubre de 2020.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

65.0 PROYECTO CONSTRUCCION PLAY DE BEISBOL EN LAS TERRERAS, MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, PROVINCIA AZUA.....	3
--	---





ELABORADO POR ING. ERMIL CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



**65.0 PROYECTO CONSTRUCCION PLAY DE BEISBOL EN LAS TERRERAS,
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, PROVINCIA AZUA.**




FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	6 de Abril de 2020
Monto del contrato	RD\$ 19,901,581.48
Monto del avance (20%)	RD\$ 3,980,316.29
Fecha de inicio de los trabajos	4 de Mayo de 2020
% Avance estimado hasta la fecha	100%
Contratista	SERVICIOS MULTIPLES 4KML, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto está en fase de terminación, se están realizando la adenda y la cubicación final.

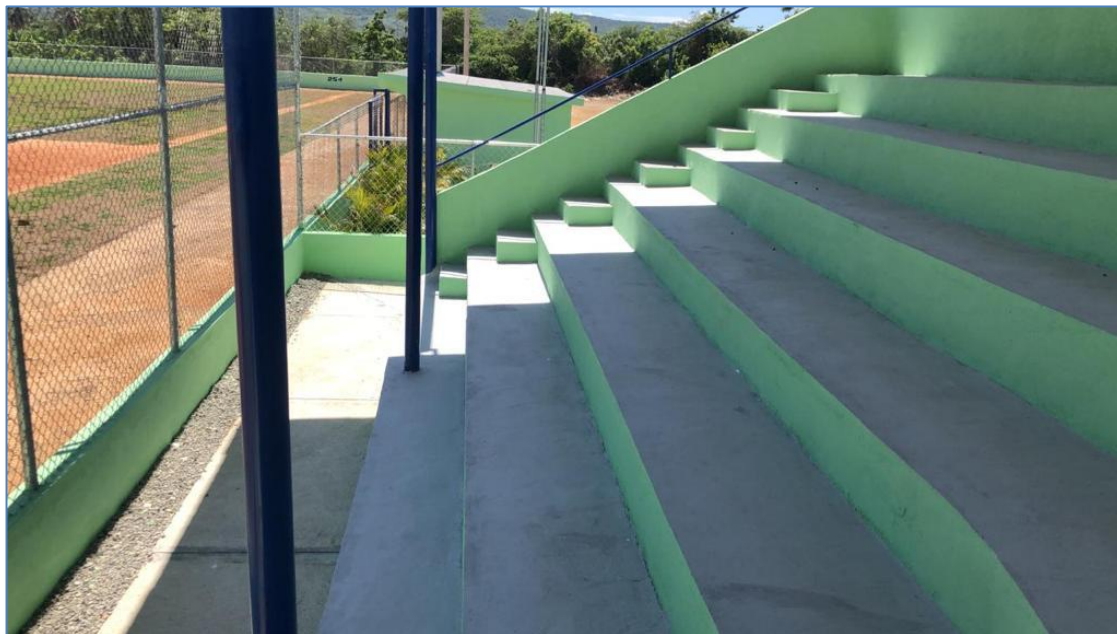

Graderías, Play de Béisbol en Las Terreras.



Vista general, Play de Béisbol en las Terreras.



Área de banderas y Tarja, Play de Béisbol en Las Terreras.
